



الجمهورية التونسية  
مجلس نواب الشعب

تقرير لجنة التنمية الجهوية  
بخصوص متابعة الأوضاع  
والمشاريع التنموية بالجهات

الدورة العادية الاولى  
2020 . 2019



مجلس نواب الشعب



## لجنة التنمية الجهوية

القائمة المحيئة بتاريخ 30 جوان 2020



مجلس نواب الشعب

الدورة العادية الاولى 2019-2020

مجلس نواب الشعب



رئيسة اللجنة  
ابتهاج بن هلال زاوش



مقرر اللجنة  
محمد القوماني



نائب رئيس  
احمد الصغير



المقرر مساعد  
كمال الحبيب



المقرر المساعد  
فخر الدين شوشوب



محمد لزهر الرمه



كنزة عجالة



فائزة بوهلال



شكري بلحاج عماره



شكري الذويبي



لطفي العيادي



سالم قشاطه



نزار المخلوقي



عماد اولاد جبريل



الجديدي السبوعي



محمد السخيري



نهي عيساوي



محمد الصالح لطيفي



مجدي بوذينه



تضال السعودي



أمين الميساوي

فهرس التقرير

الصفحة	المحتوى
8	تقديم عام
10	أشغال اللجنة
12	1- الأوضاع التتموية في الجهات بالأرقام
19	2- الإشكاليات والصعوبات المشتركة
21	أ- المسائل الهيكلية
22	ب- المسائل العقارية
22	ج- المسائل المالية
23	د- المسائل الإجرائية-الادارية
24	3- التوصيات
24	أ- فيما يتعلق بالمسائل الهيكلية
25	ب- فيما يتعلق بالمسائل العقارية
25	ج- فيما يتعلق بالمسائل المالية
26	د- فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية-الادارية
27	هـ- فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار العام والخاص بالجهات
29	و- فيما يتعلق بمهام الهياكل المعنية بالتنمية
31	الخاتمة
32	الملاحق : المشاريع التتموية في كافة جهات البلاد (كل الولايات)
1120	للاطلاع على التقرير الكامل للجنة التتموية الجهوية المتضمن لكافة الملاحق



السيدات والسادة النواب أعضاء لجنة التنمية الجهوية  
الذين واكبوا الاستماعات بخصوص المشاريع التنموية في الجهات

ابتهاج بن هلال زاوش

أحمد الصغير

محمد القوماني

فخر الدين شبشوب

كمال الحبيب

شكري بلحاج عمارة

فائزة بوهلال

كنزة عجاله

محمد لزهر الرمة

نزار المخلوفي

سالم قطاظه

لطفي العيادي

شكري الذويبي

محمد السخيري

الجديدي السبوعي

عماد أولاد جبريل

محمد الصالح لطيفي

-عياشي زمال

-كمال العوادي

السيدات والسادة النواب من غير أعضاء اللجنة  
الذين واكبوا الاستماعاات بخصوص المشاريع التنموية في الجهات

24- مريم اللغماني	1- سميرة سايجي
25- مختار اللموشي	2- زهير المغزاوي
26- حاتم المانسي	3- نسرين العماري
27- عبد الحميد المرزوقي	4- أسامة الخليفة
28- محسن عرفاوي	5- نورالدين البحيري
29- شيراز الشابي	6- سماح ديمق
30- مصطفى غربي	7- سمير ديلو
31- فيصل طاهري	8- امال الورتاني
32- محمد عمار	9- فتحي بن بلقاسم
33- لسعد حجلالوي	10- الفاضل الوج
34- محمد الزعبي	11- سهام الشريقي
35- محمد زريق	12- عبد السلام بن عمارة
36- مروة بن تمورت	13- لمياء جعيدان
37- سالم لبيض	14- نجم الدين بن سالم
38- هيكل مكي	15- رفيق عمارة
39- عامر العريض	16- فؤاد ثامر
40- بشر الشابي	17- ايمان بالطيب
41- عبد الله حريزي	18- ثامر سعد
42- نعيمة المنصوري	19- محمد بونني
43- ليلى الحداد	20- علي البجاوي
44- محمد ضياء الدين بن عمر	21- شادية الحفصوني
45- فاكر الشويخي	22- سهير العسكري
46- جميلة الجويني	23- محمد مراد الحمزاوي

السيدات والسادة ممثلي وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي  
الذين تم الاستماع إليهم والاستئناس برأيهم  
بخصوص المشاريع التنموية في الجهات  
(الترتيب حسب تواريخ الاجتماعات)

• عبد الستار الرابحي مدير عام ديوان تنمية الشمال الغربي
خليفة النوري مدير إدارة التنمية الجهوية بجندوبة
بسمة الجبالي مديرة إدارة التنمية الجهوية بالكاف
حسين القرمزي مدير إدارة التنمية الجهوية بسليانة
الاسعد بوعكاز مدير إدارة التنمية الجهوية بباجة
• احمد نداري مدير عام ديوان تنمية الوسط الغربي
رابح البكوشي مدير إدارة التنمية الجهوية بالقيروان
محمد شعباني مدير إدارة التنمية الجهوية بالقصرين
عبد الرزاق الرزقي مدير إدارة التنمية الجهوية بسيدي بوزيد
• خالد الحشيشة مدير عام ديوان تنمية الجنوب
احلام الغرابي مديرة التخطيط والاحصاء بالديوان
علي الباي مدير إدارتي التنمية الجهوية بقبلي وقفصة
محمد العيد لزوش مدير إدارة التنمية الجهوية بتوزر
سليم العصادي مدير إدارة التنمية الجهوية بقابس
وليد التريكي مدير إدارة التنمية الجهوية بمدنين
صالح درمش مدير إدارة التنمية الجهوية بتطاوين

• فوزي غراب المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية
- محمد بن الازرق المدير المركزي للوسط الشرقي
محمود عبد المولى مدير الشراكة والتعاون
خالد علولو مدير إدارة التنمية الجهوية بصفاقس
عبد الستار التومي مدير إدارة التنمية الجهوية بالمهدية
سامي بن ريانة مدير إدارة التنمية الجهوية بالمنستير
ليلى بن حفصية بالحاج حمودة مديرة إدارة التنمية الجهوية بسوسة
- محمد عبد السلام المدير المركزي للشمال الشرقي وتونس الكبرى
خالد حسني مدير إدارة التنمية الجهوية بزغوان
شكري المسلماني مدير إدارة التنمية الجهوية بنابل
عبد اللطيف حميد مدير إدارة التنمية الجهوية ببنزرت
سمير عزوز مدير إدارة التنمية الجهوية بمنوبة
سمير السبعي مدير إدارة التنمية الجهوية بين عروس
سليم سريح مدير إدارة التنمية الجهوية بإريانة
رايح خميري مدير إدارة التنمية الجهوية بتونس (العاصمة)

## تقديم عام:

شكّلت الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وعمق التفاوت التنموي بين الجهات الساحلية والداخلية وانعدام التوازن بين الجهات أهم أسباب اندلاع الثورة التونسية. وبالرغم من إيلاء مسألة تكريس مقومات الحكم الرشيد والتنمية الشاملة والمستدامة الأهمية اللازمة وتجسيمها صلب مقتضيات الدستور الجديد خاصة في الفصل 12 وإقرار مبدأ التمييز الإيجابي إلا أنه لا تزال الفوارق التنموية بين الجهات الميزة الأساسية للتنمية في تونس.

وإبان هذه الثورة، بيّنت عديد التقارير الوطنية والدولية فشل منوال التنمية في إرساء مقومات صلبة لخلق الثروة وحتى في توزيعها بشكل متوازن في أنحاء البلاد حيث أظهرت عديد المؤشرات التنموية وخاصة منها مؤشر التنمية الجهوية عمق الفجوة بين مختلف الولايات في جميع المجالات وأيضا حدّة التهميش والتفاوت التنموي داخل وبين الجهات ويُعتبر هذا بالأساس نتيجة الاخلالات التي حصلت في الخيارات الاستراتيجية للسياسات التنموية العمومية التي تمّ اعتمادها.

ومن جهة أخرى وبالنظر للتجارب الاقتصادية التي مرّت بها تونس، عرفت المخططات التنموية منذ الاستقلال الى حدّ الآن، عديد المتغيرات على مستوى التصور والمحتوى والمنهجية ممّا ميّزها بعدم التناسق والتواصل فيما بينها حيث أنه في كل مرحلة يتمّ خلالها تبنيّ منحى خيارات لا يُؤمّن الاستمرارية ومتابعة ما سبق فكانت الجهود مبعثرة وتفتقر الى النظرة الكلية والشاملة، إضافة الى ان البرامج التنموية المضمّنة بها كانت عبارة عن تدخلات يطغى عليها الجانب الاجتماعي الذي قد يمكنّ من تحسين أوضاع الافراد على المدى القصير لكن دون إرساء مقومات لخلق الثروة والاندماج بين الجهات بما يساهم في خلق قطاعات اقتصادية مترابطة على المدى المتوسط والبعيد.



وللمساهمة في تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالتنمية الجهوية وتصحيح مسار التأسيس للمرحلة القادمة، قامت السلطة التشريعية بإحداث لجنة برلمانية خاصة تعنى بالتنمية الجهوية وفقا لما نصّت عليه مقتضيات الفصل 93 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب حيث تتولى هذه اللجنة "متابعة ملفات التنمية الجهوية ومراقبة مدى مراعاة السياسة الحكومية لمبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات".

ونظرا لوعيتها بجسامة الدور الموكول لها، حرصت لجنة التنمية الجهوية في هذه الدورة الأولى من المدة النيابية الجديدة على مواصلة مباشرة مهامها ونشاطها على خطى ما تمّ تحقيقه خلال المدة النيابية الفارطة وتبني الخطوط العريضة لمنهجية العمل السابقة التي تركزت من ناحية على المتابعة والمراقبة والتقييم عبر إجراء جلسات استماع إلى كل الأطراف ذات العلاقة بمجال اختصاص هذه اللجنة لمزيد التمعّن في المؤشرات والبرامج التنموية ومكوناتها وإيلاء عناية خاصة بها للمساهمة في تدقيق المصطلحات وضبط المعايير وتوضيح التوجهات وتوحيد الرؤى للمسائل المتعلقة بملفات التنمية الجهوية والتمييز الإيجابي وكذلك لرصد المشاريع التنموية الجهوية المبرمجة أو التي لم يتم إدراجها في المخطّط التنموي 2016-2020 وتمّ إقرارها ضمن المجالس الوزارية الجهوية التي تلاقي صعوبات في تنفيذها وحصرت أسباب تعطيلها، ومن ناحية أخرى على رفع جملة من التوصيات العمليّة الإصلاحية في علاقة بمختلف مجالات السياسات التنموية الوطنية والجهوية للأطراف الحكوميّة المعنية ومتابعتها ومتابعة أيضا توصيات اللجنة المنبثقة عن برنامج عملها الذي قامت به خلال المدة النيابية الفارطة لحثّ السلطة التنفيذية على الإيفاء بوعودها والإسراع بتفعيل الحلول المقترحة بما من شأنه ان يساهم في تحسين الأوضاع التنموية في وبين الجهات.

## أشغال اللجنة:

بعد أن انطلقت لجنة التنمية الجهوية بتركيبتها الجديدة في مباشرة أعمالها خلال هذه الدورة النيابية العادية الأولى، عازمت على استكمال المسار الذي نحتته لنفسها وانفردت به منذ سنوات بوضع استراتيجية عمل واضحة تتلاءم والمهام التي تضطلع بها وتعزز الدور الهام الذي تلعبه كهمزة وصل بين مشاغل المواطنين بالجهات والأطراف المسؤولة في السلطة التنفيذية وتعكس أيضا التمشي الجديد الذي ينتهجه مجلس نواب الشعب للارتقاء بوظيفته الرقابية وإكسابها النجاعة اللازمة وذلك بغاية المشاركة الفاعلة مع جميع الأطراف المتدخلة في المجال لإرساء منوال تنموي يتماهى مع مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 ويعمل فعليا على تصحيح السياسات والبرامج الإصلاحية المتعلقة باستراتيجية التنمية الجهوية المضمّنة بالمخططات الخماسية للتنمية الجديدة في محتواها الجهوي وعلى حسن تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي في التخطيط للمشاريع التنموية بما يستجيب للحاجيات والمتطلبات الحقيقية للجهات ويتمشى والخصوصيات والإمكانيات والأولويات الواقعية لكل جهة وذلك ضمن رؤية استشرافية وتشاركية تتجاوب وأهداف التنمية الشاملة والمستدامة ومقاربة اللامركزية والسلطة المحلية.

وفي إطار مراقبة ومتابعة سياسة وتوجهات الحكومة بخصوص التنمية عموما والتنمية الجهوية خصوصا وقصد تكريس النظرة الجديدة بخصوص الدور الرقابي الحقيقي للسلطة التشريعية، قررت لجنة التنمية الجهوية في اجتماعها بتاريخ 18 ماي 2020 الاستماع على التوالي إلى ممثلين عن ديوان تنمية الشمال الغربي (ولايات جندوبة وباجة وسليانة والكاف)، وممثلين عن ديوان تنمية الوسط الغربي (ولايات القيروان القصرين وسيدي بوزيد)، وممثلين عن ديوان تنمية الجنوب (ولايات تطاوين ومدنين وقابس وقبلي وقفصة وتوزر)، ثم ممثلين عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية بخصوص المعطيات المحينة والمشاريع التنموية في ولايات الوسط والشمال الشرقيين (صفاقس والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل وبنزرت)، وولايات تونس الكبرى

(منوبة وبن عروس واريانة وتونس) لمتابعة مدى التقدم في انجاز المشاريع العمومية المدرجة بالمخطط الخماسي الحالي وقرارات المجالس الوزارية الجهوية في الولايات الراجعة لهم بالنظر بهدف حصر الإشكاليات الحقيقية المعطلة لتنفيذ هذه المشاريع وضبط المقترحات والتوصيات الرامية الى استكمال وتسريع نسق الانجاز وذلك بهدف حسن الإعداد لمخطط التنمية القادم.

ومن جهة أخرى، يهدف توجّه اللجنة للعمل المشترك مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي إلى الوصول لبناء منوال تنموي يُحاكي استحقاقات الواقع بما يُساهم في التأسيس لتنمية شاملة ومستدامة تضمن كرامة المواطن وحقه وحق الاجيال القادمة في العيش الكريم.

وبعد عقد هذا العدد الهام من الاستماع والاطلاع على مختلف العروض التي تمّ تقديمها من قبل المديرين العامين والمديرين الجهويين لدواوين التنمية في مختلف الاقاليم والتطرّق الى جملة من المؤشرات التي تبيّن الوضع التنموي والاجتماعي والاقتصادي في كل الولايات على غرار مؤشر الفقر ومؤشر التنمية الجهوية ومؤشر الجاذبية الجهوية، تمّ الوقوف على حقيقة الاوضاع التنموية الصعبة في عدد هام من معتمديات تلك الولايات والتي لم تشهد تحسّنا ملحوظا رغم انجاز بعض المشاريع التنموية فيها وهو ما يؤكّد عدم استجابة تلك المشاريع الى الحاجيات الحقيقية للجهات.

وبهدف تطوير نجاعة الدور الرقابي للسلطة التشريعية، قررت لجنة التنمية الجهوية إحالة تقريرها المتعلق بمتابعة الأوضاع والمشاريع التنموية في الجهات على مكتب المجلس الذي وافق على طلب تنظيم جلسة عامة بخصوصه يتمّ خلالها عرض التوصيات المضمّنة به والتحاور في شأنها بحضور عدد هام من أعضاء الحكومة المعيّنين بغاية حثّهم على إيجاد السبل الكفيلة بملحلة المشاريع العمومية المعطلة وتثمين الميزات التفاضلية القادرة على تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق مواطن الشغل والرفع من نسق التنمية بمختلف جهات البلاد.

كما تمّ الوقوف أيضا على مجموعة الإشكاليات والصعوبات المشتركة التي ساهمت في تعطيل او عدم البدء في تنفيذ عدد من المشاريع العمومية في مختلف المناطق. ونستعرض فيما يلي حوصلة لهذه الإشكاليات المرصودة والتوصيات المقترحة لتلافيها واستكمال انجاز هذه المشاريع، بالإضافة الى جرد للمشاريع المعطّلة أو التي تمّ ادراجها بالمخطط ولم يتم برمجتها بالميزانية أو التي لم يتم إدراجها في المخطط وتمّ إقرارها ضمن المجالس الوزارية الجهوية حسب القطاعات في كل الولايات.

## 1- الأوضاع التنموية في الجهات بالأرقام:

مؤشر التنمية الجهوية:

النتائج حسب الولايات						
الولاية	2015		2018		التطور	
	المؤشر	الترتيب	المؤشر	الترتيب		
تونس	0,628	1	0,593	1	0	
أريانة	0,578	4	0,580	2	-2	
بن عروس	0,600	2	0,577	3	1	
المنستير	0,589	3	0,553	4	1	
سوسة	0,572	5	0,533	5	0	
نابل	0,559	6	0,531	6	0	
صفاقص	0,531	8	0,520	7	-1	
منوبة	0,545	7	0,513	8	1	
قابس	0,511	11	0,501	9	-2	
بنزرت	0,513	10	0,494	10	0	
مدنين	0,517	9	0,493	11	2	
تطاوين	0,478	16	0,484	12	-4	
توزر	0,497	12	0,483	13	1	
قبلي	0,478	15	0,470	14	-1	
المهدية	0,493	14	0,469	15	1	
الكف	0,465	18	0,468	16	-2	
قفصة	0,467	17	0,453	17	0	
زغوان	0,493	13	0,452	18	5	
سليانة	0,446	20	0,449	19	-1	
بلجة	0,452	19	0,439	20	1	
سيدي بوزيد	0,419	21	0,419	21	0	
جندوبة	0,410	23	0,409	22	-1	
القيروان	0,414	22	0,398	23	1	
القصرين	0,402	24	0,388	24	0	
المعدل	0,502		0,486			
الحد الأدنى	0,402		0,388			
الحد الأقصى	0,628		0,593			




## النتائج حسب المعتمديات

الترتيب	2015 المؤشر	المعمدية	الترتيب	2018 المؤشر	المعمدية
1	0,793	باب البحر	1	0,752	باب البحر
2	0,737	حي الخضراء	2	0,679	حي الخضراء
3	0,704	المنزه	3	0,666	المنزه
4	0,679	حلق الوادي	4	0,656	أريانة المدينة
5	0,675	أريانة المدينة	5	0,650	صفافس المدينة
6	0,657	صفافس المدينة	6	0,636	مقرين
7	0,655	سوسة المدينة	7	0,633	قرطاج
8	0,654	باب سويقة	8	0,631	باب سويقة
9	0,651	المنستير	9	0,624	بن عروس
10	0,651	المرسي	10	0,618	سوسة المدينة



254	0,383	الروحية	254	0,367	جومين
255	0,382	فوساتة	255	0,359	نفزة
256	0,373	نفزة	256	0,357	سجنان
257	0,371	المزونة	257	0,357	غار الدماء
258	0,370	العلاء	258	0,356	العلاء
259	0,366	جومين	259	0,354	فوساتة
260	0,363	غار الدماء	260	0,346	ماجل بالعباس
261	0,357	بوحجلة	261	0,340	العيون
262	0,347	العيون	262	0,332	بوحجلة
263	0,330	فرناتة	263	0,316	فرناتة
264	0,329	حاسي الفريد	264	0,285	حاسي الفريد

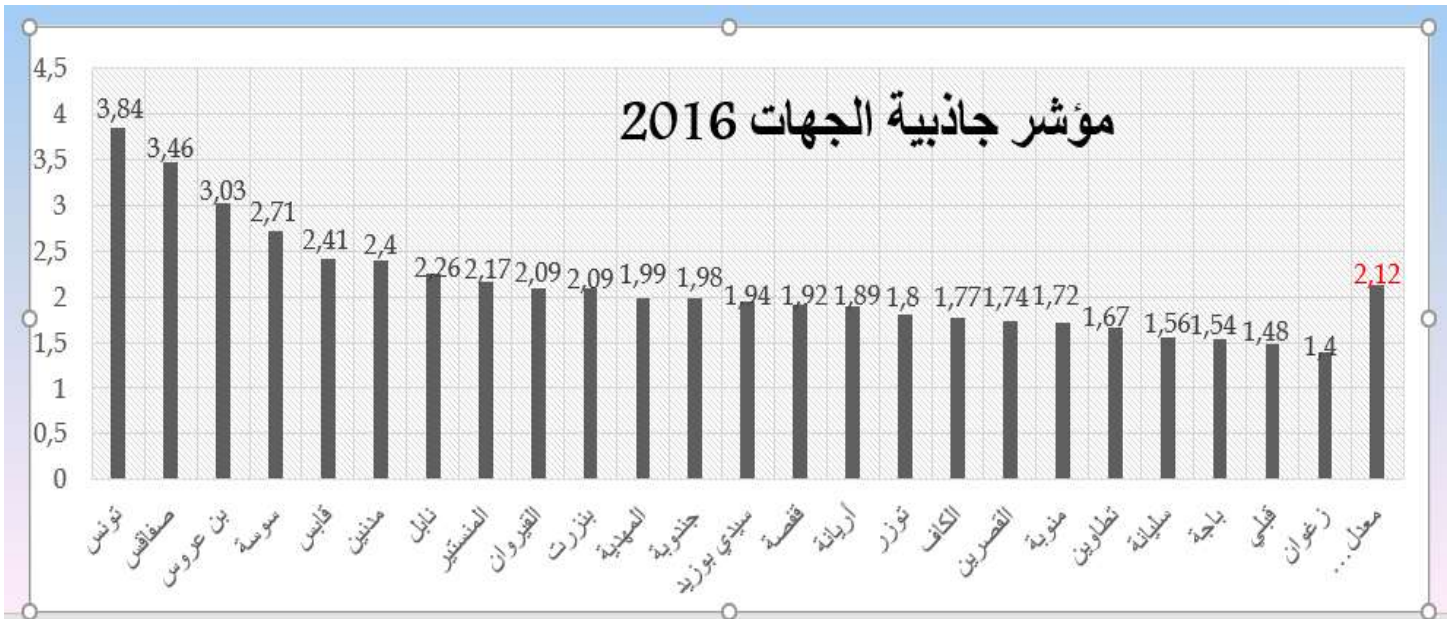

## جدول المؤشر العام والمؤشرات الجهوية للجاذبية الترابية بتونس 2016

مستوى الرضاء	توفر البد العامة	محيط الحياة والعيش	الخدمات غير البلدية	الشفافية والولوج إلى المعلومة	المقاربة التشاركية	الخدمات البلدية	المؤشر العام	الرتبة	الولاية
مرضي قليلا	8.50	5.43	2.74	1.50	3.56	2.70	3.84	1	تونس
	6.89	3.46	4.05	2.46	2.44	2.94	3.46	2	صفاقس
	4.42	2.84	2.77	2.59	2.83	3.54	3.03	3	بن عروس
	4.60	2.96	2.99	1.93	1.97	2.31	2.71	4	سوسة
	3.64	2.10	2.74	2.13	2.15	2.42	2.41	5	قابس
	3.38	2.37	2.55	2.18	1.99	2.36	2.40	6	مدنين
	4.95	3.08	2.66	0.58	1.04	1.38	2.26	7	نابل
	2.71	2.44	2.41	1.53	1.36	2.14	2.17	8	المستير
	4.03	2.03	2.25	1.77	1.61	1.93	2.09	9	القيروان
	3.80	2.26	2.29	1.69	1.10	1.98	2.09	10	بنزرت
	1.88	2.02	2.40	2.32	1.41	1.79	1.99	11	المهدية
غير مرضي تماما	4.02	1.78	2.10	1.65	1.65	1.93	1.98	12	جندوبة
	3.85	1.96	1.99	1.69	1.61	1.69	1.94	13	سيدي بوزيد
	4.22	1.74	1.92	1.92	1.33	2.01	1.92	14	قفصة
	3.63	2.19	1.70	1.14	1.14	2.01	1.89	15	أريانة
	0.06	1.52	2.17	1.60	1.29	2.59	1.80	16	توزر
	1.56	1.57	2.11	1.92	1.49	1.86	1.77	17	الكاف
	5.76	1.18	2.09	1.22	1.30	1.57	1.74	18	القصرين
	3.33	1.66	1.67	1.26	1.43	1.81	1.72	19	منوبة
	1.01	1.37	1.63	1.95	1.76	2.14	1.67	20	تطاوين
	1.57	1.70	1.91	1.31	1.32	1.20	1.56	21	سليانة
	2.54	1.29	1.98	1.19	0.72	1.78	1.54	22	باجة
	1.57	0.85	2.06	1.71	1.31	1.73	1.48	23	قبلي
	1.15	1.05	1.86	1.29	1.15	1.61	1.40	24	زغوان
3.46	2.12	2.29	1.69	1.62	2.06	2.12		المؤشر المتوسط	


المصدر : المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، 2016 : التقرير حول الجاذبية الجهوية، 2016، ص 148

Tableau 10 : Indice général du climat d'affaires local 2018 VS 2017

Gouvernorat	Rang 2018	Indice 2018	Rang 2017	Indice 2017	2018 VS 2017	Evolution
Tunis	1	5,15	1	4,87	↑	Stable
Sfax	2	4,50	2	4,40	↑	Stable
Sousse	3	4,39	4	4,00	↑	1 rang
Ben Arous	4	3,98	5	3,78	↑	1 rang
Ariana	5	3,97	3	4,32	↓	-2 rangs
Manouba	6	3,80	9	3,29	↑	3 rangs
Nabeul	7	3,76	10	3,12	↑	3 rangs
Monastir	8	3,65	8	3,34	↑	Stable
Medenine	9	3,46	6	3,64	↓	-3 rangs
Bizerte	10	3,44	7	3,45	↓	-3 rangs
Gabès	11	3,18	11	2,97	↑	Stable
Bèja	12	3,08	13	2,67	↑	1 rang
Tataouine	13	2,88	16	2,57	↑	3 rangs
Zaghouan	14	2,85	21	2,31	↑	7 rangs
Kasserine	15	2,81	14	2,61	↓	-1 rang
Jendouba	16	2,72	12	2,92	↓	-4 rangs
Siliana	17	2,68	24	2,15	↑	7 rangs
Sidi Bouzid	18	2,63	19	2,35	↑	1 rang
Kef	19	2,54	22	2,23	↑	3 rangs
Kairouan	20	2,53	20	2,31	↑	Stable
Mahdia	21	2,46	15	2,60	↓	-6 rangs
Gafsa	22	2,12	18	2,35	↓	-4 rangs
Tozeur	23	2,04	17	2,39	↓	-6 rangs
Kébili	24	1,70	23	2,18	↓	-1 rang

Source : IACE

## مؤشر جاذبية الجهات للاستثمار

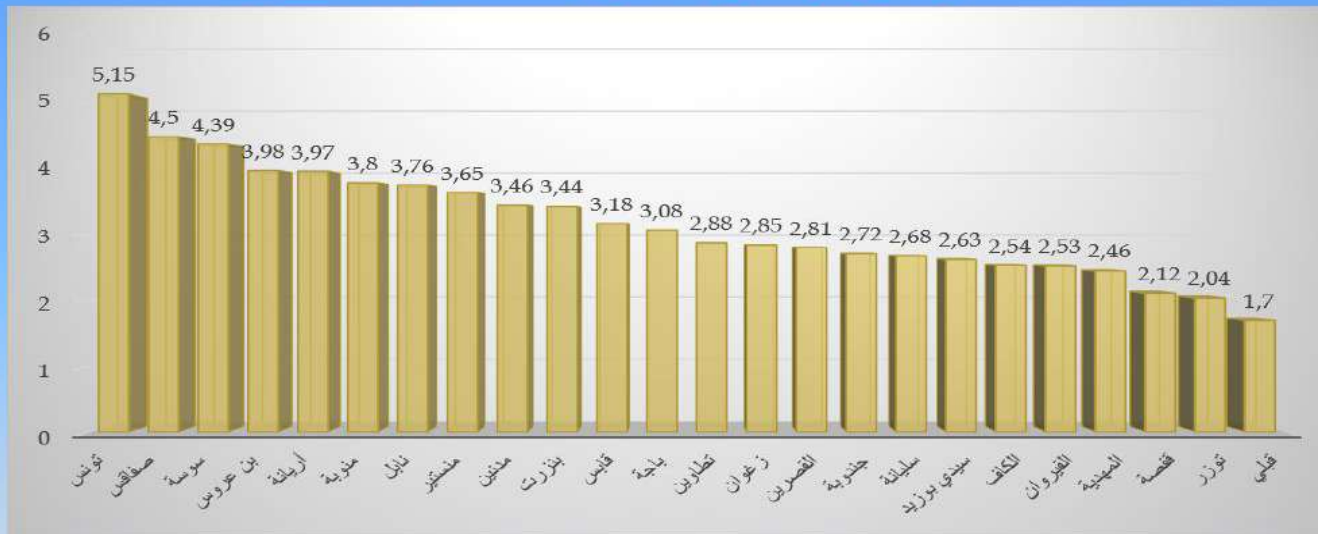

يشمل المؤشر 9 مقاييس حسب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: المؤسسات والحوكمة، البنية التحتية، الصحة، التعليم، اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاندماج المالي، سوق الشغل، ديناميكية الأعمال، الابتكار والتجديد.


### نسبة الفقر ونسبة الفقر المتقع في تونس حسب الولايات 2015 ( % )

الولاية	نسبة الفقر	الرتبة الوطنية	نسبة الفقر المتقع	الرتبة الوطنية
تونس	3.5	24	0.3	21
أريانة	5.4	22	0.1	24
بن عروس	4.3	23	0.2	23
منوبة	12.1	17	0.6	19
تابل	7.4	20	0.4	20
زغوان	12.1	17	1.2	15
بنزرت	17.5	12	3.5	11
ياجه	32.0	4	6.9	5
جندوبة	22.4	7	3.6	10
الكاف	34.2	2	8.3	4
مليانة	27.8	5	8.8	3
سوسة	16.3	13	3.2	12
المنستير	8.3	19	0.3	21
المهنية	21.1	9	4.0	8
صفاقس	5.8	21	0.9	18
القيروان	34.9	1	10.3	1
القصرين	32.8	3	10.2	2
سيدي بوزيد	23.1	6	4.1	7
قابس	15.9	14	1.2	15
مدين	21.7	8	4.7	6
تطاوين	15.0	15	1.5	14
قفصة	18.0	11	3.6	9
توزر	14.7	16	1.0	17
غلي	18.5	10	1.7	13


المصدر : المعهد الوطني للإحصاء



## نسبة الفقر حسب الجهات

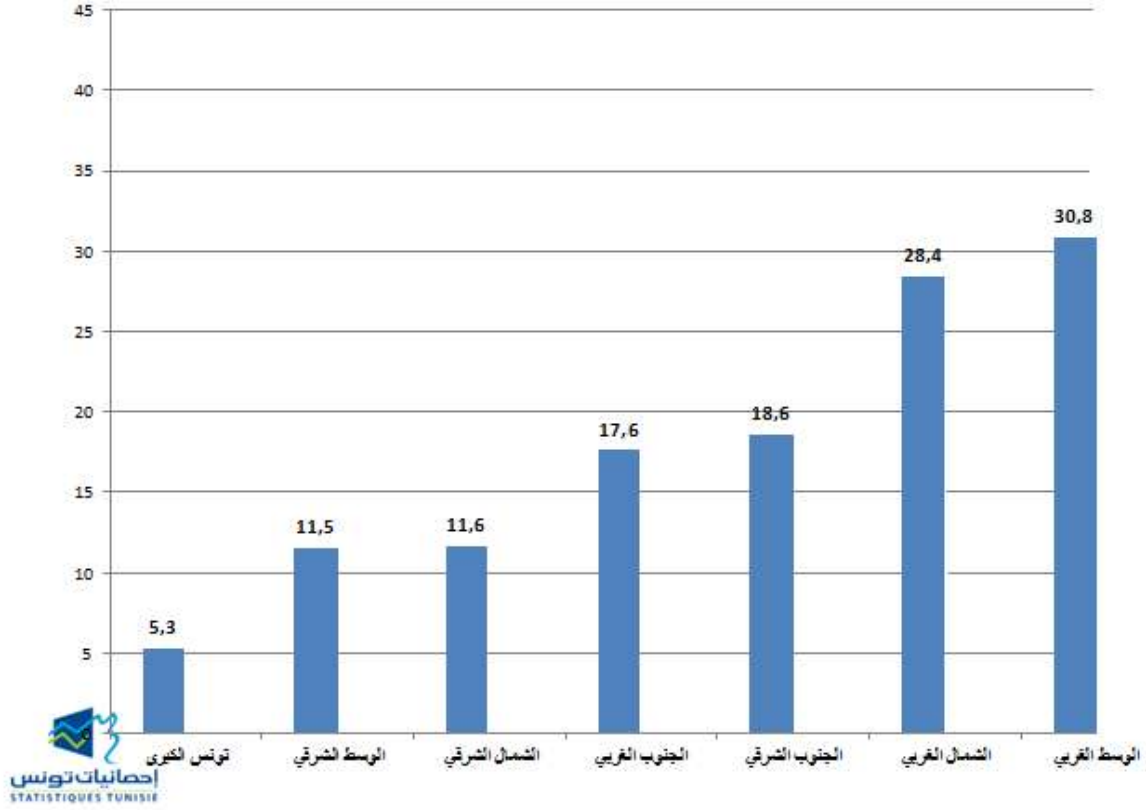


## 8. تطور نسبة الفقر المدقع حسب الجهات 2010 - 2015





مجلس نواب الشعب

## نسبة الانجاز المالي للاستثمارات الجهوية خلال الفترة 2016-2019



## أهمية الاستثمار العمومي خلال المخطط (2016-2020) حسب الولاية



## 2- الإشكاليات والصعوبات المشتركة:

تمكّنت لجنة التنمية الجهوية من خلال جلسات متابعة المشاريع التنموية جهويا ومحليا مع الادارات الجهوية للتنمية من رصد أهمّ الصعوبات التي حالت دون تحقيق التنمية الشاملة بمختلف جهات البلاد.

وتمثّل هذه الصعوبات أساسا في:

- غياب رؤية استراتيجية ومنوال تنموي واضح يتماهى مع خصوصيات الجهات ويثمن ثرواتها.

- غياب خارطة تنموية وطنية تبين الموارد الطبيعية والميزات التفاضلية الواقعية والنسيج الاقتصادي الملائم لكل جهة.

-نقص التنسيق بين الوزارات والهياكل المعنية بخصوص السياسات والبرامج والمشاريع التنموية المدرجة والمبرمجة.

- غياب أرضية حقيقية لتشجيع المستثمرين بأغلب الجهات نتيجة ضعف البنية التحتية وتردّي حالتها أو عدم استغلالها وخاصة غياب بنية تحتية مهيكلة وداجمة، إضافة إلى محدودية الرصيد العقاري وبطء تهيئة المناطق الصناعية.

- غياب مؤسسات تلعب دور القاطرة لدعم النسيج الصناعي والاقتصادي.

- ضعف وهشاشة النسيج الإقتصادي وعدم قدرته على استيعاب طلبات الشغل وخاصة من حاملي الشهادات العليا ممّا أدى إلى تفاقم نسبة البطالة بالجهات.

- اقتصار الأنشطة في قطاعات الإنتاج على الاستغلال المحدود للموارد المتاحة وفي مستواها الخام دون تطوير لسلاسل القيمة وحلقات الإنتاج بما يحدّ من الرفع من القيمة المضافة والنهوض بالتصدير.

- ضعف تثمين ما تزخر به الجهات من إنتاج فلاحي وثروات طبيعية وبيئية ومواد إنشائية ومخزون حضاري وثقافي وإدماجه في الدورة الاقتصادية.

- محدودية الموارد المائية وتدني نوعيتها، إلى جانب استنزافها بالاستغلال المفرط خاصة في المجال الصناعي.
- محدودية قدرة القطاع الصناعي على التحول من قطاع يركز على المناولة في أنشطة صناعية ذات قيمة مضافة ضعيفة إلى قطاع يتموقع ضمن سلاسل القيمة المتطورة.
- ضعف تثمين وتنويع منتوج القطاع السياحي ومحدودية استغلال المخزون الأثري والثقافي والايكولوجي على الوجه المطلوب.
- تراجع دور القطاع الخاص في خلق الثروة ودفع الاستثمار وإحداث مواطن الشغل.
- ضعف عقلية الشراكة في بعث المؤسسات والمبادرة الخاصة في الجهات.
- صعوبات القطاع الخاص في التموقع في الأسواق الخارجية وفي سلسلة القيم ومنظومات الإنتاج، بالإضافة إلى محدودية تواجدته في الأنشطة والقطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية.
- محدودية التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص وغياب شبه كلي لمشاريع الشراكة بينهما.
- ضعف مساهمة القطاع البنكي في تمويل المشاريع بالجهات.
- البناء الفوضوي واحتياج الأودية والمناطق الخضراء ومداخل المدن.
- نقص فادح في منظومات المحافظة على البيئة والمحيط بكل الجهات وضعف أدائها، إضافة إلى الاوضاع البيئية الكارثية نتيجة تفاقم ظاهرة التلوث.
- محدودية منظومة التكوين المهني بمختلف الجهات مما أدى إلى نقص في توفير اليد العاملة المختصة، إضافة إلى غياب رؤية شاملة لهذه المنظومة على المستوى الوطني قصد تفادي اشكالية عدم التناسب بين مخرجات منظومة التكوين ومتطلبات الاقتصاد وحاجيات سوق الشغل.

- ضعف البنية الأساسية وغياب الإطار الحياتي النوعي من حيث تواضع التجهيزات الجماعية وتردّي الخدمات العمومية المقدّمة في أغلب المجالات كالتربية والصّحة والإحاطة الاجتماعية والتكوين والتشغيل والثقافة والاتصالات وهو ما يؤثر سلبا على الارتقاء بجاذبية الجهات للاستثمار.

- تأخر إنجاز عديد المشاريع المحورية والهامة التي بوسعها تحسين مناخ الاستثمار بالجهات (المناطق اللوجستية، الاقطاب التكنولوجية، تهيئة المطارات، الربط بالغاز الطبيعي، المستشفيات متعددة الاختصاصات...).

- نقص فادح في الموارد البشرية واللازمة لتوفير الحدّ الأدنى من الخدمات نتيجة إيقاف العمل بالمناظرات للانتداب في الوظيفة العمومية وضعف نسبة التأطير ونقص هام للإمكانيات المادية واللوجستية بالإدارات والمصالح الجهوية والمحليّة، إضافة إلى غياب التمثيليات الجهوية لبعض هيكل الدولة.

ويمكن حصر أهمّ الأسباب التي تُعطل وتؤخّر إنجاز العديد من المشاريع التنموية فيما هو هيكلية وعقاري أو إجرائي-إداري أو مالي.

#### أ- المسائل الهيكلية:

- غياب رؤية استراتيجية طويلة المدى في التخطيط.  
- كانت منهجية عمل اعداد المخطط تركز على التوازنات والاقتصاد الكلي والمؤشرات المتشابهة دون الاخذ بعين الاعتبار توزيع الثروة بين الجهات وافراد المجتمع مما أنتج عديد الفوارق والتناقضات.

- البرمجة المتوخاة في المخططات أغلبها برمجة مركزية مسقطة على الجهات ويطغى عليها الجانب القطاعي.

- على مستوى المرحلة الرابعة من منهجية اعداد مخطط التنمية الجهوي، يتم توزيع الاعتمادات بين القطاعات دون الامام بالاستراتيجية الجهوية والرجوع اليها.

- عدم إلمام عدد من المشاركين (المجلس الجهوي) بالمفاهيم والمصطلحات التقنية المستعملة وبما في الوثائق التوجيهية المرجعية في إعداد الرؤية الاستراتيجية التنموية بالمخطط.

- رزنامة إعداد المخطط غير واقعية ومستعجلة وهو ما من شأنه أن يتسبب في تسرب العديد من الأخطاء الفنية والتقديرية.

### ب- المسائل العقارية:

- نقص في الرصيد العقاري المخصص لمشاريع التجهيزات الجماعية بجلّ المعتمديات مما أثر وسيؤثر على إنجاز المشاريع في ظل عدم وجود مرونة في توفير ورصد اعتمادات ضمن ميزانيات المشاريع لاقتناء أراضي تخصص لبناء المشاريع العمومية.

- طول وتشعب إجراءات الانتزاع لفائدة المصلحة العامة وتغيير صبغة الأراضي وتخصيص العقارات المناسبة للمشاريع العمومية.

- اعتراضات المواطنين.

- عدم الأخذ بعين الاعتبار كلفة اقتناء الأراضي عند تحديد كلفة المشاريع.

### ج- المسائل المالية:

- تأخر في فتح الاعتمادات تعهدا ودفعاً مما أدى إلى فسخ عديد الصفقات.

- ارتفاع كلفة المشاريع خاصة على إثر الانزلاق المتواصل للدينار.

- نقص في الاعتمادات المخصصة لبعض المشاريع مقارنة بين الكلفة الحقيقية المحددة عند إسناد الصفقة والكلفة التقديرية الأولية.

- طول إجراءات فتح الاعتمادات المحالة تعهدا ودفعاً خاصة المتعلقة بالمشاريع العمومية ذات الصبغة الجهوية.

- طول إجراءات المصادقة من طرف وزارة المالية على الملاحق التعديلية للكلفة الأولية للإنجاز نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والتجهيزات.

- عزوف المقاولات عن المشاركة في طلبات العروض لبعض المشاريع بسبب عدم خلاص مستحقاتهم.

- تراجع قدرة المقاولات على الإيفاء بالتزاماتها وهشاشة وضعيتها المالية.

#### د- المسائل الإجرائية-الادارية:

- مركزية القرار الإداري وغياب بعض التمثيليات الجهوية لبعض الإدارات.

- ضعف نسبة التأطير بالإدارات الجهوية خاصة منها المفوض لها اعداد الدراسات وملفات الصفقات ومتابعة انجاز المشاريع، إضافة إلى نقص وسائل العمل بأغلبها.

- نقص في الموارد البشرية للإدارات الفنية مما أنجر عنه نقص في متابعة الانجاز وبطء في إعداد البرامج الوظيفية.

- ضعف نسبة التأطير بالجماعات المحلية خاصة الجديدة منها.

- عدم جاهزية الدراسات الفنية المسبقة للمشاريع.

- نقص في الإمكانيات المادية.

- طول مراحل إعداد الدراسات الفنية وإجراءات القيام بالصفقات العمومية.

- طول إجراءات اعداد المشاريع (مرحلة إعداد الدراسات والتّحوّز العقاري والمصادقات).

- غياب رزنامة تنفيذية لكل مشروع.

- عدم تفاعل السلطة المركزية بصفة ناجعة مع الملفات المحالة الخاصة بالإجراءات المقترحة لتجاوز الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المشاريع مما يعرقل عملية التقدم في الإنجاز والمتابعة على المستوى الجهوي.

- ضعف قدرة المؤسسات والهياكل العمومية على تنفيذ المشاريع في آجالها ونقص الموارد البشرية بولايات الإقليم،

- انجاز ومتابعة بعض المشاريع من طرف المصالح المركزية لبعض الوزارات على المستوى الوطني (التعليم العالي، التكوين المهني...) دون الرجوع للجهة.
- عدم دخول بعض المشاريع المنجزة حيز الاستغلال لعدة أسباب منها عدم توفر الإطار البشري و/أو التجهيزات اللازمة أو الربط بالشبكات...

### 3- التوصيات:

لتفادي الإشكاليات والصعوبات التي تُعيق انجاز المشاريع العمومية التنموية وتحسين مستوى وظروف عيش المتساكنين في الجهات، تقدّم ممثلو كافة الادارات الجهوية للتنمية في كل الولايات والاقاليم بعدد المقترحات في الغرض وخلصت اللجنة إلى تبني مجموعة من التوصيات التي تعلقت خاصة بالمحاور التالية:

#### أ- فيما يتعلق بالمسائل الهيكلية:

- ضرورة تحديد رؤية استشرافية موحدة على المدى الطويل بطريقة تشاركية لمختلف الحساسيات السياسية والمنظمات الوطنية والمتدخلين في المجال التنموي لما لها من قيمة توجيهية في توضيح ملامح الخيارات الوطنية والتوجهات المستقبلية.
- ضرورة إعادة النظر في طريقة التخطيط والتهيئة الترابية للبلاد التونسية لثمين الإمكانات الحقيقية في كل الجهات وحسن استثمارها.
- التخطيط الاقتصادي يجب ان يكون في إطار التكامل مع التهيئة الترابية.
- مشاركة أفضل للمتدخلين الجهويين والمجتمع المدني في رسم منوال التنمية وتحديد المشاريع التي تتماشى مع خصوصية الجهات.
- التزام السلطة المركزية ومخططات التنمية بأولويات ومخرجات الاستشارات الجهوية حول مشاريع التنمية.
- وجوب توحيد المفاهيم المتعلقة بالمخطط ونشرها وتعميمها.
- تحديد رزنامة واقعية للمخطط دون تسرع لضمان إنجازه.
- ضرورة منح الجهة دور فاعل في تحديد أولوياتها الجهوية وتنفيذها.



- دعوة كافة الوزارات المعنية الى مزيد التنسيق مع الجهة وافادتها بكل المستجدات التي تخص القرارات الراجعة لها بالنظر.

### ب- فيما يتعلق بالمسائل العقارية:

- دعوة الجماعات المحلية لتكوين رصيد عقاري خاص بالمشاريع العمومية.  
- العمل على إدراج كلفة اقتناء العقارات ضمن مكونات المشاريع العمومية المزمع إنجازها.

- ضرورة دراسة الجانب العقاري جهويا وقطاعيا قبل ترسيم المشاريع بالميزانية.  
- عدم برمجة أي مشروع إلا بعد توفير العقار المزمع إنجاز المشروع عليه وضرورة إرفاق ملف اقتراح البرمجة بملف عقاري.

- التبسيط والتسريع في الإجراءات القانونية المتعلقة بالانتزاع وتغيير الصبغة.  
- تفويض إتمام إجراءات تغيير صبغة العقارات إلى اللجنة الجهوية وكحدّ أدنى فيما يتعلق بالعقارات المزمع تخصيصها لفائدة المشاريع العمومية.

- التسريع في دراسة أسباب اعتراض المواطنين واقتراح الحلول المعقولة والقانونية والحسم في تنفيذها.

- تصفية الأوضاع العقارية للأراضي الاشتراكية بكافة معتمديات الولايات المعنية وتكوين مخزون عقاري صناعي للحدّ من التفاوت بينها.

- تسريع أعمال المسح العقاري وفضّ الإشكاليات المتعلقة بملكية الأراضي وتسجيلها.

- العناية بملف الأراضي الدولية وتعزيز قدرات شركات الإحياء وتنمية مواردها.

- الحدّ من تشتت ملكية الأراضي الفلاحية.

### ج- فيما يتعلق بالمسائل المالية:

- الحرص على فتح الاعتمادات تعهّدا في بداية السنة.

- فتح اعتمادات الدفع على ثلاثة أقساط وحسب تقدم إنجاز المشاريع (عوضا عن اعتماد كشوفات الخلاص).

- إضفاء أكثر مرونة لآمري الصرف بالمجالس الجهوية للتصرف الوقي في الاعتمادات المحالة تفاديا لتعطّل بعض المشاريع العمومية ذات الصبغة الجهوية خاصة فيما يتعلق باعتمادات الدفع.

- ضرورة توفير الاعتمادات المتعلقة بأشغال المصمّمين قصد الإسراع باستكمال ملفات طلبات العروض.

- توفير الاعتمادات التكميلية والعمل على الحدّ منها وذلك بمزيد التثبّت في تقديرات الكلفة.

- الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات الجهات المناخية والجغرافية عند تحديد كلفة المشاريع.

#### د- فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية-الادارية:

- باعتبار أهمية المتابعة للمشاريع والبرامج والقرارات الوزارية بصفة عامة والمهيكلّة بصفة خاصة ولمزيد التنسيق والتدقيق في عناصر هذه المشاريع والبرامج والقرارات لدفع الإنجاز، اقترح تكوين لجنة فنيّة صلب رئاسة الحكومة تجتمع على الأقل كل ثلاثة أشهر لها سلطة تقريرية وتضمّ ممثلي عن الجهة وعن الوزارات، يتمّ من خلالها التدقيق في كل عنصر للاتفاق المشترك على رزامة تنفيذه والوقوف على الصعوبات وتذليلها.

- ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية (CNAP) لاقتراح وتنسيق المشاريع الوطنية.

- إعادة هيكلة دواوين التنمية مع أفرادها بإمكانيات ووسائل العمل اللازمة، إضافة إلى ضرورة تمكين الإدارات الجهوية للتنمية من اخذ بعض القرارات لفائدة التنمية وتنفيذ المشاريع في الجهات حتى لا يبقى دورها فقط استشاريا او تنسيقيا.

- تعزيز صلاحيات المصالح الجهوية ودور الوالي في التنسيق والمراقبة استعداداً لتركيز اللامركزية والسلطة المحلية.
- إعطاء الجماعات المحلية الجديدة الأولوية عند تنفيذ البرنامج الحكومي المتعلق بإعادة توزيع الإطارات والعاملين بالقطاع العمومي.
- التثقيف من الدورات التكوينية مواكبة للتطورات والإجراءات المحدثة في العمل الإداري.
- الترفيع في نسبة التأطير بالإدارات الجهوية.
- تدعيم الإدارات الجهوية الفنية بالمعدات اللوجستية والإمكانات البشرية اللازمة خاصة أسطول النقل قصد تيسير عملية المتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع العمومية في جميع مراحل الانجاز.
- إعداد الدراسات والتصميمات واقتناء الأراضي سنة قبل ترسيم المشاريع بالميزانية.
- مراجعة بعض الفصول المتعلقة بأوامر الصفقات العمومية في توجّه يلائم بين الشفافية والتقليص من الآجال وتحسين جودة المشاريع.
- هـ- فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار العام والخاص بالجهات:**
- ضرورة وضع سياسة وطنية واضحة في مجال التعاون الدولي الموجه لدعم الجهات.
- ضرورة تقييم قانون الاستثمار الجديد ومراجعته في إطار مزيد تحفيز الاستثمار الخاص.
- تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
- مراجعة القوانين المنظمة لهياكل التمويل والمساندة خاصة في علاقة بالبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدفع وتحفيز الانتصاب للحساب الخاص والاستثمار بالجهات.

- تكفل الدولة بتوجيه بعض الاستثمارات الخارجية ذات التشغيلية العالية الى الجهات الداخلية (قطاع النسيج، قطاع تركيب السيارات، صناعة بعض مكونات السيارات...).
- تطوير الاعتمادات المرصودة للمجالس الجهوية لتمويل المشاريع العمومية.
- تفعيل إجراء إحداث بنك جهوي للتنمية.
- تعزيز دور القطاع البنكي في التمويل والتأطير والمرافقة خاصة بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي.
- تعزيز متابعة البنوك للمشاريع التي تمولها ومتابعة مدى تقدمها.
- حث المؤسسات البنكية على دعم القروض الموجهة للفلاحين.
- وضع خطة لإعادة جدولة القروض الفلاحية وحلّ مشكلة التمويل الموسمي للنشاط الفلاحي وتأمينه من الأخطار.
- دعم البنية الأساسية بالمناطق الصناعية وربطها بالغاز الصناعي وتعميم إحداث مناطق جديدة بالمعتمديات الداخلية.
- تحسين وتطوير البنية التحتية الأساسية بين الجهات وداخل نفس الجهة لتيسير اندماجها في الدورة الاقتصادية ودفع الاستثمار بها.
- تركيز العمل على خصوصيات الجهات ذات القيمة التفاضلية وتشجيع الباعثين على الاستثمار في الفرص التي تُتيحها منظومات الإنتاج.
- دراسة ومعالجة اشكالية تمويل القطاع الخاص بالجهات.
- الإسراع بتفعيل بنك الجهات قصد الرفع من نسق تمويل المشاريع.
- إحداث وتفعيل فضاءات موحدة لإسداء الخدمات للباعثين مع تقييم تجربة الشباك الموحد.
- الاسراع في انجاز المناطق الصناعية المرجحة وربطها بالشبكات الخارجية.

## و- فيما يتعلق بمهام الهياكل المعنية بالتنمية:

- ضرورة إعادة النظر في مفهوم التمييز الإيجابي وضبط مقاييس موضوعية وآليات جديدة لتفعيله تراعي خصوصيات وحاجيات كل جهة حتى لا يُحدث تطبيقه إعاقاة تنمية عديد الولايات دون تحقيق أي نفع في المقابل للجهات الأقل تنمية.
- ضرورة وضع خارطة وطنية للتجهيزات الجماعية لإحكام توطيد المشاريع الكبرى (برنامج السكك الحديدية، برنامج الطرقات السيارة، القطاع الصحي، البنية التحتية والاساسية...).
- يجب تقديم معطيات إحصائية أكثر واقعية وجدية تتماشى مع الواقع الاقتصادي المعاش وتترجم حقيقة الأوضاع بالجهات.
- ضرورة اعتماد مؤشر التنمية الجهوية حسب المعتمديات وليس حسب الولايات.
- ضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات في مجال التنمية وذلك لتحقيق الأهداف المبرجة بالمخطط وتفادي التعطيلات وإهدار المال العام.
- دعوة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لإعطاء أكثر صلاحيات لإداراتها الجهوية في علاقة بانجاز المشاريع التنموية.
- ضرورة ادماج منظومة التكوين للموارد البشرية مع الاقطاب الاقتصادية وذلك بالنظر لخصوصيات الجهات وميزاتها التفاضلية لتفادي اشكالية عدم التناسب بين مخرجات التكوين وحاجيات سوق الشغل.
- ضرورة التدخل السريع للمحافظة على الأراضي السقوية بالحدّ من الزحف الفوضوي في عديد الجهات.
- إعادة تأهيل استراتيجية التنمية السياحية لحسن تثمين المخزون السياحي المتنوع الذي تزخر به الجهات وإدماجه في الدورة الاقتصادية.
- تطوير البنى الأساسية والتهنية بجميع الولايات وتعزيز ربطها بالمناطق المجاورة لها.

- استحداث نسق مشاريع تحسين نوعية مياه الشرب وتدعيم تزويد العديد من المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب.
- إيجاد حلول جذرية لإشكالية استنزاف الموارد المائية بالجهات.
- تهيئة وتدعيم فضاءات الخدمات الاجتماعية ودور الثقافة ونوادي الشباب المتواجدة حالياً أو التي سيتم استكمال أشغالها بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة وإحداث دُور خدمات ودُور ثقافة ونوادي شباب جديدة بالمعتمديات المتبقية لتقريب إسداء هذه الخدمات وتحسين جودتها.
- مزيد دعم المؤسسات الجامعية والأقطاب التكنولوجية بالجهات، إلى جانب استكمال إنجاز المؤسسات التربوية بكل المعتمديات والمناطق الريفية وتحسين البنية التحتية الأساسية لهذه المؤسسات من مطاعم ومبيلات ونقل مدرسي.
- الإسراع بربط مختلف الولايات بشبكة الغاز الطبيعي وتوسعتها على كافة المعتمديات.
- ربط الموانئ التجارية والمناطق التجارية واللوجستية بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح المشاريع الكبرى ودعم قطاع النقل العمومي للأشخاص والبضائع والمحافظة على الشبكة الطرقية بالجهات.

خاتمة:

ستواصل لجنة التنمية الجهوية العمل على متابعة المشاريع التنموية جهويا ومحليا مع الإدارات الجهوية للتنمية وذلك لمزيد التمعن في أسباب تعطل تنفيذ ما يتم برمجته وتحسين وتدقيق القراءات الصحيحة للأوضاع التنموية في الجهات بما يساعد على توجيه البرامج التنموية للجهات والمعتمديات الأكثر استحقاقا.

كما ستقوم اللجنة بمتابعة مدى استجابة الحكومة لتوصياتها المتعلقة بمتابعة الأوضاع والمشاريع التنموية بالجهات وذلك لتحفيز المسؤولين على الإيفاء بالتزاماتهم بغاية التسريع في استكمال تنفيذ المشاريع المعطلة المدرجة بالمنخطط الحالي والمساهمة في تصحيح مسار التنمية بكل الولايات والمعتمديات وحسن الاعداد للمخطط القادم.

مقرر اللجنة

السيد محمد القوماني



رئيسة اللجنة

السيدة ابتهاج بن هلال زاوش



# الملاحق





مجلس نواب الشعب

**\*\* لجنة التنمية الجهوية \*\***

عرض حول الوضع التنموي

بإقليم الشمال الغربي

15 جوان 2020

# محتوى العرض

تقديم الديوان ✓

أهم أنشطة الديوان ✓

متابعة المخطط التنموي (2016-2020) ✓

متابعة تنفيذ القرارات الوزارية ✓

# تقديم الديوان

## الإحداث

أحدث ديوان تنمية الشمال الغربي بمقتضى القانون عدد **85** لسنة **1994** المؤرخ في **18** جويلية **1994** . مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والإستقلال المالي، وتخضع إلى إشراف وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ومقره الإجتماعي سليانة، كما تم ضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره بالأمر عدد **420** لسنة **1998** المؤرخ في **18** فيفري **1998** .

# مهام الديوان


- ✓ جمع ونشر المعلومات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية
- ✓ مساعدة الجماعات المحلية على إعداد مخططات وبرامج التنمية
- ✓ إعداد برامج وخطط عمل متكاملة لتنمية المناطق ذات الإشكاليات الخصوصية
- ✓ متابعة إنجاز وتقييم المخططات والبرامج بالتنسيق بين مختلف المتدخلين
- ✓ إعداد الدراسات القطاعية والجهوية لإبراز فرص الإستثمار الموجه للقطاع الخاص
- ✓ إعداد الدراسات الفنية والإقتصادية للمشاريع الخاصة
- ✓ مرافقة الباعثين في البحث على مصادر التمويل (البنوك وشركات الإستثمار) وفرص

الشراكة


## الميزانية

%	2020	%	2019	%	2018	
90	2.560	90	2.248	92	2.216	العنوان الأول
10	300	10	240	8	200	العنوان الثاني
100	2.860	100	2.488	100	2.416	المجموع

## العنوان الأول

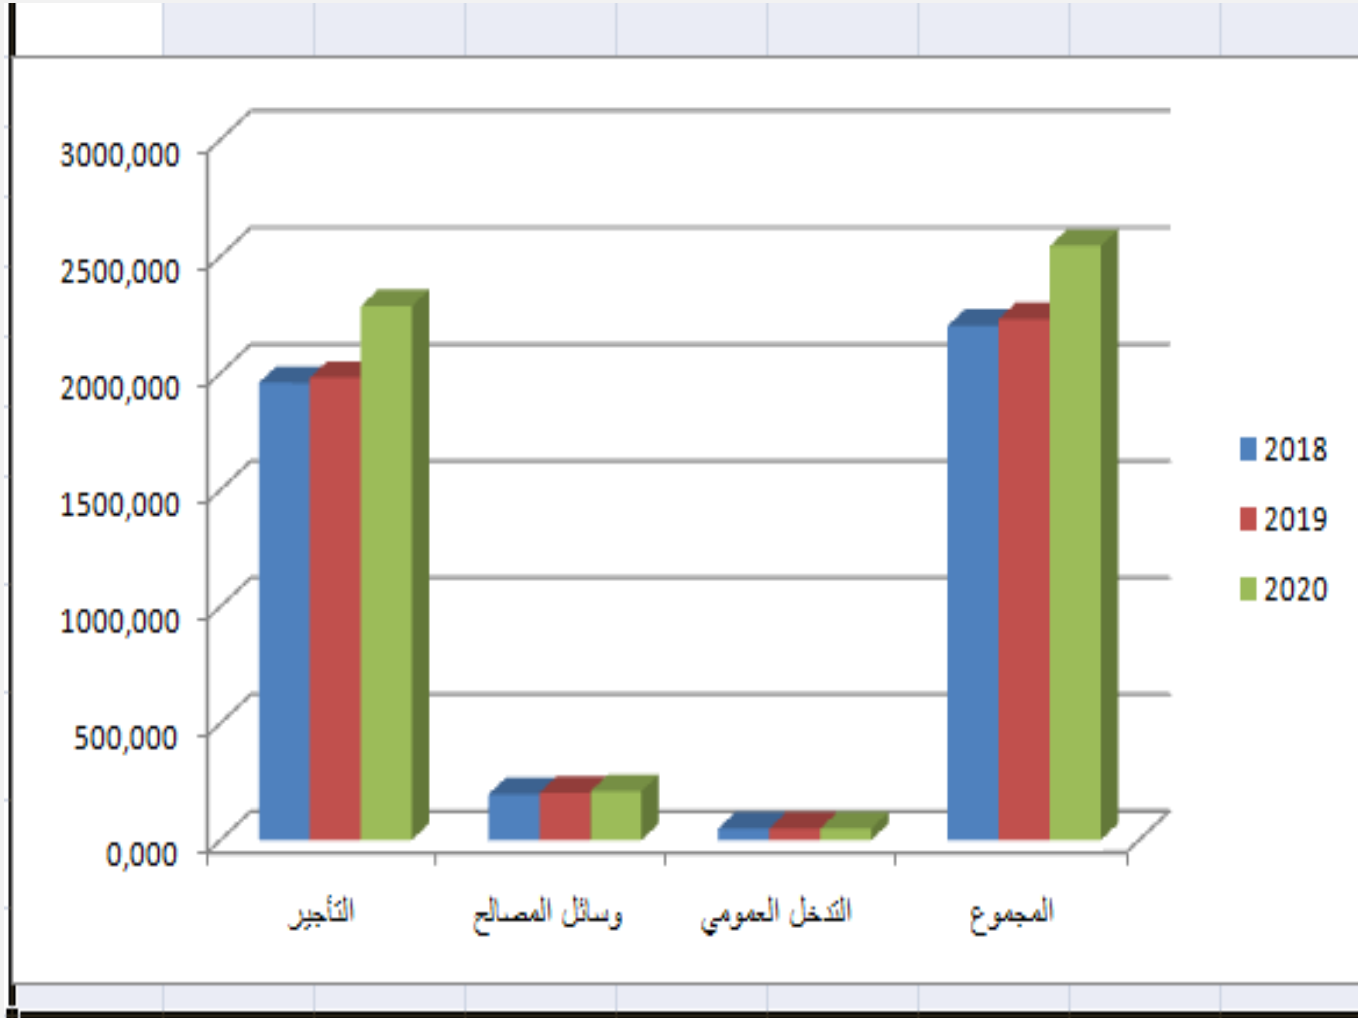

## العنوان الثاني

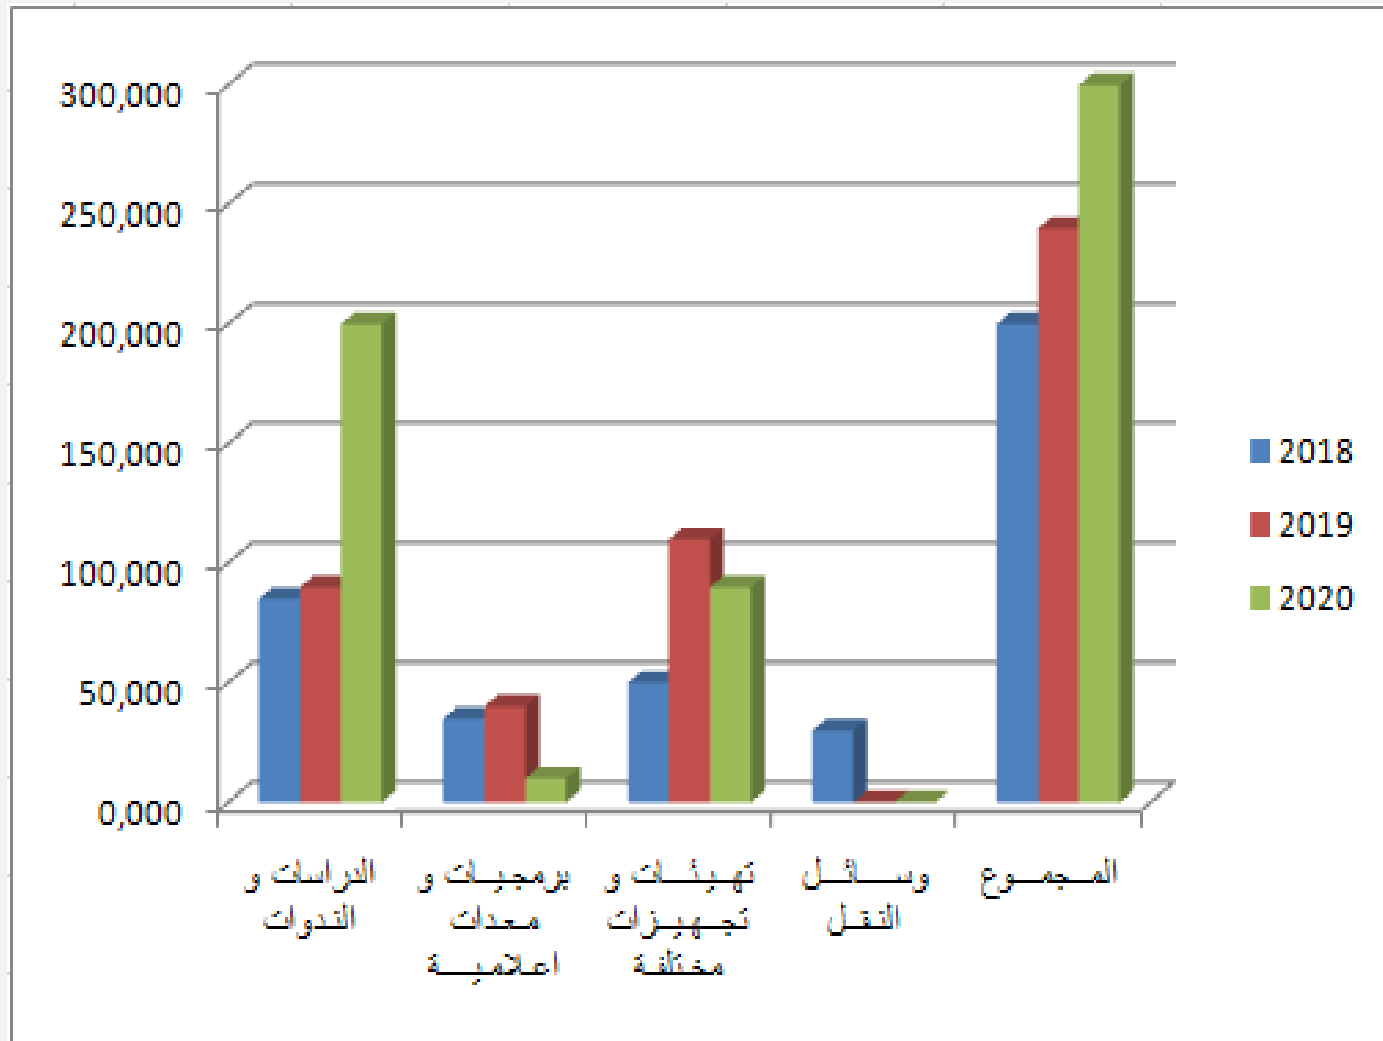

# أهم أنشطة الديوان

الدراسات القطاعية

1

الاستثمار الخاص

2

متابعة إنجاز المخططات التنموية

3



# الدراسات القطاعية



## دراسة حول الهياكل المهنية الفلاحية بالإقليم

- تشخيص للهياكل المهنية الفلاحية ويشمل الإطار القانوني المنظم لها والإطار المؤسساتي والاجتماعي التي تعمل فيه وكيفية هيكله الفلاحين
- إعداد قاعدة بيانات مرجعية للهياكل المهنية الفلاحية قابلة للتحيين
- وضع تصورات وأهداف إستراتيجية للنهوض بالهياكل المهنية الفلاحية وتفعيل

دورها في تنظيم القطاع

كلفة الدراسة : 60 ألف دينار.

## دراسة قطاعية حول السياحة البديلة بإقليم الشمال الغربي

### الأهداف

- اقتراح سيناريوهات لمسالك سياحية بإدماج الإمكانيات الطبيعية والبيئية والثقافية للإقليم في إطار خطة عمل إستراتيجية لتنمية السياحة البديلة بالإقليم
- تقديم فرص الاستثمار الممكنة والمرتبطة بالمسالك السياحية المقترحة لوضعها على نمة الباعثين الخواص وتحديد دور القطاع العام
- اقتراح الإجراءات المصاحبة لتنمية السياحة البديلة بإشراك المتساكنين المحليين

كلفة الدراسة: 57 ألف دينار

## المخطط الإستراتيجي لتنمية ولاية جندوبة في أفق 2050

يندرج إعداد المخطط الإستراتيجي لتنمية ولاية جندوبة في أفق 2050 في إطار تمكين الجهة من وضع رؤية

تنموية متوسطة وبعيدة المدى تشمل مختلف القطاعات والفاعلين في المجال التنموي قصد تيسير عملية إعداد

المخططات التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة .

ويتم إعداد هذا المخطط تحت إشراف وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وبالشراكة مع

وكالة التعاون الفني الألماني

# دراسة حول منظومة النباتات الطبية والعطرية بالإقليم

بصدد إعداد الخطوط المرجعية للدراسة

## الأهداف

- أهمية الفضاء الغابي بإقليم الشمال الغربي نحو **483** ألف هك ( **44 %** من المساحة المحترثة )
- تنوع وتعدد النباتات الطبية والعطرية المتعددة الإستعمالات
- خلق ديناميكية إقتصادية بالجهة
- تحسين طرق وأساليب ترويج المنتج في الأسواق الداخلية والخارجية

# شريط ترويجي لإقليم الشمال الغربي

تم إنجاز فيلم ترويجي لإبراز إمكانيات الإنتاج والمخزون التاريخي والثقافي و فرص الاستثمار بالإقليم قصد تعزيز جاذبية الجهة والتعريف بها لجلب المستثمرين.

**مدة العرض : 20 دقيقة.**

**اللغات : العربية والفرنسية والإنجليزية.**

**نوعية الصورة : FHD**

**كلفة الإنجاز : 44 ألف دينار.**

## الاستثمار الخاص

2

## إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية خلال الفترة (2019 / 2017)

مواطن الشغل	حجم الإستثمارات م د	عدد المشاريع	القطاع
269	15,24	78	الفلاحة والصيد البحري
735	71,74	64	الصناعة
436	20,42	58	الخدمات
<b>1440</b>	<b>107,4</b>	<b>200</b>	المجموع



## متابعة مراحل إنجاز المشاريع المدروسة

مواطن الشغل	حجم الإستثمارات م د	عدد المشاريع	
1440	107,4	200	المشاريع المدروسة
163	6,82	27	المنجزة أو بصدد الإنجاز
158	12,29	22	المتحصلة على موافقة التمويل
1047	86,33	137	بصدد البحث عن التمويل
72	1,96	14	تخلى عنها اصحابها

## متابعة آلية اعتماد الانطلاق (17-19)

عدد مواطن الشغل	قيمة التمويل الذاتي المصادق عليه من طرف الصندوق (م د)	حجم الإستثمار (م د)	عدد المشاريع الموافق عليها	الولاية
463	2,11	8 ,87	257	باجة
744	1,95	9,20	281	جندوبة
748	2,33	10,02	280	الكاف
514	2,43	11,7	314	سليانة
2469	8,82	39,79	1132	المجموع

## متابعة إنجاز المخططات التنموية



# القطاع العام

النسبة %	الاستثمارات المنجزة (2019-2016)	الاستثمارات المبرمجة (2020-2016)	الولاية
42,7	440,7	1031,8	باجة
29,6	393,5	1330,5	جندوبة
40,5	447,5	1105,1	الكاف
26	505,1	1940,4	سليانة
33	1786,8	5407,8	الإقليم

# المشاريع المنجزة

ولاية باجة

ولاية سليانة

ولاية الكاف

ولاية جندوبة

# أهم المشاريع المعطلة

ولاية باجة

ولاية جندوبة

ولاية الكاف

ولاية سليانة

أهم الإشكاليات المسجلة



# المسائل العقارية

□ عدم برمجة اعتمادات لاقتناء العقارات التي ستقام عليها المشاريع

□ إعتراض المواطنين

□ طول وتشعب اجراءات الإنتزاع وتغيير صبغة الأراضي لإنجاز المشاريع

□ نقص فى الرصيد العقاري لدى الجماعات المحلية

## المسائل المالية

□ عدم كفاية الإعتمادات المبرمجة من طرف المصالح

المركزية نظرا لعدم الأخذ بعين الإعتبار لخصوصيات

الجهات ،سوء تقدير للكلفة أو تأخر

في الانجاز.

□ عدم تحويل الإعتمادات المطلوبة في الآجال

# المسائل الإدارية

□ نقص الموارد البشرية والمادية، ببعض

الإدارات الفنية الجهوية.

□ تواضع نسبية التأطير بالدارة الجهوية.

# القطاع الخاص

النسبة %	الاستثمارات المنجزة (2019-2016)	الاستثمارات المبرمجة (2020-2016)	الولاية
69,0	474,1	686,7	باجة
72,6	321,5	443,1	جندوبة
19,6	144,4	735 ,0	الكاف
67,0	317,2	473,1	سليانة
53,8	1257,2	2337,9	الإقليم

# متابعة القرارات الوزارية

ولاية باجة

ولاية جندوبة

ولاية الكاف

ولاية سليانة

# مع الشكر



شارع الطيب المهيري - 6100 سليانة

**E-mail :** [odno@mdci.gov.tn](mailto:odno@mdci.gov.tn) / **Site Web :** [www.odno.nat.tn](http://www.odno.nat.tn)

**Tel :** (78) 871 515 /871 516 **Fax:** ( 78) 871 517

## المشاريع المعطلة

المقترحات	الاشكالية	نسبة الانجاز	الكلفة م د	المشروع
التسريع بإتمام اجراءات الانتزاع.	<p>إشكال عقاري</p> <p>- عدم توفر قطعة أرض بالمواصفات المطلوبة على ملك الدولة لتتركيز محطة الضخ الرئيسية.</p> <p>- تم اختيار قطعة أرض على ملك أحد الخواص والاتفاق معه على ثمن التقيوت إلا أنه بعد سنة 2011 طالب بالترقيع في الثمن بدرجة مبالغ فيها.</p> <p>- أمام تمسكه تم الاتفاق على استصدار أمر بالانتزاع وقامت مصالح الولاية بالإجراءات اللازمة لتأمين غرامة الانتزاع وإيداعها لدى السيد أمين المال العام للبلاد التونسية منذ سنة 2014.</p> <p>- كما تم خلال شهر اكتوبر 2016 إنجاز مثال اشغال مختلفة جديد واحالته الى وزارة الشؤون المحلية لإتمام بقية اجراءات الانتزاع بمقتضى المكتوب عدد 8555 بتاريخ 1 نوفمبر 2016 والتي طالبت بدورها إعادة صياغة مشروع الامر وتمت موافاتها بالمطلوب يوم 14 فيفري 2017</p> <p>في انتظار استصدار الأمر الحكومي بالانتزاع (موضوع استشارة لدى الهياكل المختصة).</p>	92	1,614	تطهير قرية السلوقية وربطها بمحطة التطهير بتستور
ادراج المشروع بالمخطط التنموي 2021-2025 وبرمجة إنجازه انطلاقا من سنة 2021 خاصة وأن جميع الدراسات جاهزة.	<p>- نظرا لخصوصية الأشغال التي يتطلبها المشروع على طول الشارع الرئيسي للمدينة والمحاذية للبناءات والمؤسسات فإنه من الضروري تكفل إدارة المياه العمرانية (وزارة التجهيز) بالأشغال.</p> <p>- تمت مراسلة السيد وزير التجهيز في الغرض مصحوبة بنسخة من الدراسة بتاريخ 14 افريل 2017 وفي ردها بتاريخ 02 ماي 2017 أفادت إدارة المياه العمرانية ان المشروع ليس مبرمجا بالمخطط 2016/2020.</p> <p>- الكلفة المحينة أصبحت في حدود 2,7 مليون دينار</p>		1,500	تهذيب قنال بوزقدم بمدينة باجة



<p>ادراج المشروع ضمن مشاريع المخطط الخماسي 2021-2025 وبرمجة تمويله عن طريق ميزانية الوزارة خلال سنة 2021 باعتبار أن الدراسات جاهزة.</p>	<p><b>البحث عن التمويل.</b></p> <p>- أفادت وزارة التعليم العالي في مراسلتها عدد 5580 بتاريخ 31/10/2014 أن الممول الياباني (JICA) تراجع عن تمويل المشروع.</p> <p>خلال جلسة العمل بمقر رئاسة الحكومة يوم 05/04/2017 تمت دعوة ممثل وزارة التعليم العالي:</p> <p>1- لمد وزارة التنمية بقائمة المراكز المبرمجة وطنيا للبحث عن ممول جديد.</p> <p>2 - او برمجة المشروع على سنتين ضمن ميزانية الدولة.</p>		1,6	<p>بناء مركز جامعي للتشيط الثقافي والرياضي بباجة</p>
<p>- دعوة المصالح المركزية المعنية للإسراع بالانتهاء من اجراءات تخصيص العقار.</p> <p>- ايجاد التمويلات الضرورية إما بالبحث عن ممول أجنبي جديد أو إقرار إنجازة عن طريق الموارد الذاتية للدولة.</p>	<p>- تم عرض المشروع خلال ندوة الاستثمار تونس 2020 وحظي بالموافقة على التمويل من طرف أحد الممولين البريطانيين. إلا أنه بعد ذلك اشترط التصرف في المستشفى وهو ما لا يسمح به القانون التونسي.</p> <p>- تقرر خلال الجلسة التي انعقدت بمقر رئاسة الحكومة يوم 01/08/2019 دعوة وزارة التنمية للبحث عن ممول جديد عوضا عن الجانب البريطاني.</p> <p>(الكلفة حسب المخطط 180 مليون دينار).</p> <p><b>اشكال عقاري.</b></p> <p>- تم تمكين وزارة الصحة من محضر تحويل وقتي لقطعة الأرض بتاريخ 08/06/2017.</p> <p>- قامت مصالح وزارة التجهيز والإسكان بعقد جلسة عمل مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تم الاتفاق خلالها على تصنيف العقار المخصص لبناء المستشفى كمنطقة تجهيزات عمومية ضمن المراجعة الحالية لمثال التهيئة.</p> <p>- لم يتم تخصيص العقار.</p>		54 (البرمجة الاصلية)	<p>بناء مستشفى متعدد الاختصاصات بباجة</p>
<p>إعادة النظر في ملفات خلاص المصممين في مستحقاتهم مع المصالح الجهوية والمركزية لمراقبة الصفقات العمومية و خلاص المقاوله في 6 كشوفات حساب.</p>	<p><b>اجرائي / مالي.</b></p> <p>- المقاوله لم تستجب لاستئناف الاشغال منذ 2019/8/1 وتم توجيه قرار تنبيهه حيث تعللت بعدم حضور بعض أعضاء فريق المصممين لمتابعة الاشغال بسبب وضعياتهم التعاقدية مع المشتري العمومي (عدم خلاص مستحقاتهم).</p> <p>- عدم تسوية الوضعيات المالية للمصممين وعدم خلاص المقاوله في مستحقاتها</p>	45	8,071	<p>القسط الثالث من المستشفى الجهوي بمجاز الباب</p>

<p>التعجيل بإخلاء المقاوله لتتمكن من استكمال الاشغال وتسليم المشروع.</p>	<p><b>مالي</b></p> <p>- الأشغال تسير بنسق بطيء نظرا لتلكؤ المقاوله رغم اصدار تنبيهين لحثها على استكمال الاشغال لكنها لم تستجب متعللة بتأخر خلاص مستحقاتها (كشوفات حساب عدد 12 و13). - التامت جلسة عمل يوم 26 سبتمبر 2019 وحيث تم خلاص المقاوله في كل مستحقاتها تعهدت باستكمال الاشغال في 3 اشهر وسيتم ادراج بقية الاشغال ضمن قسط 2 قيمته 662 أد لتصبح الكلفة الجمليه في حدود 3.5 م.د - تم التعهد خلال جلسة 25 اكتوبر 2019 بضرورة استدعاء المقاوله مرة ثانية للتنبيه عليها باستكمال الاشغال حتى تتمكن الإدارة من الاعداد للقسط 2 والا فان النية تتجه الى اصدار قرار تنبيهه ومن ثمة فسخ الصفقة. - لم تتمكن المقاوله من انهاء الاشغال في الموعد المحدد إضافة الى تزامن ذلك مع فترة الحجر الصحي.</p>	92	2,293	<p>بناء المستشفى المحلي بتيبرسق</p>
<p>تكفل الوكالة العقارية الصناعية بإعادة تهيئة المنطقتين عن طريق ميزانية الدولة خاصة أمام الحالة الكارثية التي أصبحت عليها البنية التحتية.</p>	<p><b>اجرائي / مالي.</b></p> <p>- مشروع إعادة التهيئة مرتبط بضرورة وجود مجمع الصيانة والتصرف لكن عند إقرار المشروع كان المجمع غير ناشط فتم تكوينه وضبط الميزانية وطرق الإستخلاص. لكن في الأثناء تمت إحالة رئيسه على التقاعد وبالتالي بقي المجمع غير مفعّل. - عدم رغبة وتحمس الصناعيين المنتصبين بالمنطقتين لإعادة تفعيل المجمع. (الكلفة المحينة 2,3 مليون دينار)</p>		3,300	<p>إعادة تهيئة المناطق الصناعية باجة أود</p>
<p>- تخصيص الاعتمادات</p>	<p><b>مالي</b></p> <p>- لا يوجد مجمع صيانة وتصرف بالمنطقة. - تعهدت بلدية قبلاط باستلام الأشغال بعد إعادة التهيئة من طرف الوكالة العقارية الصناعية وبصيانة المنطقة الصناعية لحين تفعيل مجمع الصيانة والتصرف وتحديد الميزانية. - المشروع معطل لعدم توفر الاعتمادات. (التكلفة المحينة 02 مليون دينار)</p>		1,100	<p>إعادة تهيئة المنطقة الصناعية بقبلاط</p>

<p>- خلال جلسة العمل بمقر رئاسة الحكومة بتاريخ 01 أوت 2019 أفاد ممثل وزارة المالية أنه سيتم تغيير التسمية من مدرسة اعدادية الى معهد ثانوي عند مناقشة ميزانية وزارة التربية لسنة 2020.</p>	<p><b>اجرائي</b> - تمت المصادقة على عقود الدراسات إلا أن الإشكال المطروح يتمثل في تسمية المشروع حيث أنه تم التعامل معه كمعهد ثانوي في حين أنه تم ترسيمه كمدرسة إعدادية.</p>		2,750	بناء معهد ثانوي بوشناتة
<p>توفير الاعتمادات الضرورية.</p>	<p><b>مالي</b> تم فسخ الصفقة نظرا لتقاعس المقاوله عن الإنجاز والاعلان عن طلب عروض لاستكمال الأشغال. العروض تجاوزت الاعتمادات المتوفرة بـ400 أ.د.</p>	80	0,850	بناء مبيت بالمعهد الثانوي بياجة الشمالية
	<p><b>عقاري</b> أشغال متوقفة جزئيا لصعوبات عقارية (اعتراض بعض السكان على التقويت في بعض الأمتار من أراضيهم لتهيئة حواشي الطريق) واشغال تحويل قنوات مياه الشرب.</p>	42	15,855	إتمام أشغال تهذيب الطريق المحلية رقم 585 (10 كلم)
	<p><b>اجرائي/ عقاري</b> الأشغال متوقفة بالجزء الأخير من المشروع الى حين تحويل شبكة المياه الصالحة للشرب مع صعوبات عقارية ببعض الأجزاء (وجود آثار).</p>	78	21,358	سد ثغرات الطريق الجهوية رقم 76 (25 كلم)
<p>- التسريع بإتمام إجراءات تغيير صبغة قطعة الأرض وتخصيص الاعتمادات اللازمة للشروع في الإنجاز في أقرب الأجل.</p>	<p><b>اجرائي/ عقاري</b> تم إقرار إحداث محكمة استئناف بياجة تبعا للأمر 3608 لسنة 2014 المؤرخ في 3/10/2014 - تم تسوغ محل وتهيئته وانطلقت محكمة الاستئناف في العمل بياجة يوم 2018/06/18. قامت الجهة بتوجيه مراسلات بتاريخ 8/4/2017 و 19/4/2017 و 27/4/2017 إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتخصيص قطعة الأرض لفائدة المشروع. <b>في انتظار تخصيص العقار.</b> لم تتم برمجة المشروع بميزانية وزارة العدل.</p>			بناء محكمة الاستئناف بياجة

## المشاريع المرسمة بالمخطط ولم تدرج ضمن الميزانية

الكلفة م د	بيان المشروع
	<b>وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري</b>
	احداث المناطق السقوية
25	احداث منطقة سقوية بمرنيسة ( باجة الجنوبية )
19	احداث منطقة سقوية بالزرايب ( مجاز الباب)
	تدعيم المناطق السقوية
10	تدعيم و توسعة المنطقة السقوية بدجبة ( تيبار )
15	توسعة المنطقة السقوية بالنشيمة ( تيبار )
	<b>وزارة التجهيز و الاسكان و التهيئة الترابية</b>
	القطاع: الطرقات والمسالك
	تدعيم الشبكة
3	تدعيم الجهوية رقم 28 من الطريق الجهوية 29 إلى حدود ولاية زغوان
7	تدعيم الجهوية 49 مجاز الباب ( ط ج 28 ) إلى ط ج 131
4	تدعيم الجهوية 131 بين باجة وحدود ولاية جندوبة
9	تدعيم الوطنية 7 بين الطريق المحلية 618 والجهوية 126
9	تدعيم الجهوية 56 بين حدود ولاية منوبة والوطنية 6

القطاع : التطهير		
4	برنامج تطهير المدن الصغرى - القسط الأول - قبلاط	3م
	<b>وزارة الصحة</b>	
120	بناء مستشفى جديد بباجة	
60	تجهيز المستشفى الجديد بباجة	
60	اقتناء شاحنة خفيفة للمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والاسرة	

## مشاريع المجالس الوزارية

(المشاريع التي تلاقي صعوبات)

المشروع	الكلفة م د	نسبة الانجاز	الإشكالية	الإجراءات	الاقتراحات
إعداد دراسة لإنجاز مرفأ للصيد البحري بكاب نيقرو	50		<p><b>اجرائي</b></p> <p>- خلص فريق العمل المتكون من إدارات وزارة الفلاحة على المستوى المركزي إثر زيارته الميدانية بتاريخ 2018/05/14 أن إنجاز المرفأ لن يكون مجدياً.</p> <p>- تمسك الجهة بالمشروع باعتبار مساهمته في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية وتثمين المنتج البحري مما سيساهم في تثبيت السكان بالمنطقة.</p> <p>- أعربت وزارة الثقافة عن عدم موافقتها على أحداث المشروع لوجود آثار ذات أهمية بالغة بالمنطقة وذلك ضمن مراسلتها الموجهة الى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتاريخ 2019/03/08.</p>	<p>- خلال جلسة انعقدت بمقر وزارة الفلاحة يوم الأربعاء 24 جويلية 2019 تم الاتفاق على:</p> <p>* دمج الدراسة الفنية لفرضية انشاء ميناء صيد بحري بكاب نيقرو ضمن دراسات التهيئة الجارية بالمنطقة من طرف الوكالة العقارية السياحية "AFT"</p> <p>* دراسة مقترح انشاء ميناء ترفيهي متكامل يتضمّن جزء يخصّص للصيد البحري.</p>	<p>حث الأطراف المعنية على انجاز الدراسة ثم النظر في إمكانية إقرار المشروع من عدمه.</p>
تحيين الدراسة وإنجاز مشروع القاعدة الاقتصادية بضيعة السمان على مراحل لفائدة بلدية باجة			<p>- تمت برمجة سوق جملة بباجة ببرنامج الاستثمار البلدي 2007-2011 بكلفة 1.8 م.د.</p> <p>- تم خلال سنة 2013 تحيين المعطيات المتعلقة بإنجاز المشروع ليصبح قاعدة اقتصادية بكلفة تقديرية 11 م.د.</p> <p>- قامت الجهة بإعداد الملفات الفنية والعقارية وتوفير المعطيات الضرورية حول المشروع وإحالتها إلى وزارة التجارة يوم 21/11/2017 قصد إتمام بقية الإجراءات.</p> <p>- افاد السيد وزير التجارة خلال جلسة العمل بتاريخ 1 اوت 2019 بانه ستتكفل الوزارة بترسيم اعتمادات الدراسة ضمن ميزانيتها لسنة 2020.</p>	<p>- افاد السيد وزير التجارة خلال جلسة العمل بتاريخ 1 اوت 2019 بانه ستتكفل الوزارة بترسيم اعتمادات الدراسة ضمن ميزانيتها لسنة 2020.</p>	<p>المساعدة على إيجاد التمويلات الضرورية لتمويل انجاز المشروع.</p>

<p>- دعوة المصالح المركزية المعنية للإسراع بالإنهاء من إجراءات تخصيص العقار.</p> <p>- ايجاد التمويلات الضرورية إما بالبحث عن ممول أجنبي جديد أو إقرار إنجازة عن طريق الموارد الذاتية للدولة.</p>	<p>- تقرر خلال الجلسة التي انعقدت بمقر رئاسة الحكومة يوم 2019/08/01 دعوة وزارة التنمية للبحث عن ممول جديد عوضا عن الجانب البريطاني.</p> <p>(الكلفة حسب المخطط 180 مليون دينار).</p>	<p><b>البحث عن التمويل.</b></p> <p>- تم عرض المشروع خلال ندوة الاستثمار تونس 2020 وحظي بالموافقة على التمويل من طرف أحد الممولين البريطانيين. إلا أنه بعد ذلك اشترط التصرف في المستشفى وهو ما لا يسمح به القانون التونسي.</p> <p>- تقرر خلال الجلسة التي انعقدت بمقر رئاسة الحكومة يوم 2019/08/01 دعوة وزارة التنمية للبحث عن ممول جديد عوضا عن الجانب البريطاني.</p> <p>(الكلفة حسب المخطط 180 مليون دينار).</p> <p><b>اشكال عقاري.</b></p> <p>- تم تمكين وزارة الصحة من محضر تحويل وقتي لقطعة الأرض بتاريخ 2017/06/08.</p> <p>- قامت مصالح وزارة التجهيز والإسكان بعقد جلسة عمل مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تم الاتفاق خلالها على تصنيف العقار المخصص لبناء المستشفى كمنطقة تجهيزات عمومية ضمن المراجعة الحالية لمثال التهيئة.</p> <p>- لم يتم تخصيص العقار.</p>	54	بناء مستشفى متعدد الاختصاصات بياجة
<p>إعادة النظر في ملفات خلاص المصممين في مستحقاتهم مع المصالح الجهوية والمركزية لمراقبة الصفقات العمومية و خلاص المقاول في 6 كشوفات حساب</p>	<p>- تم بتاريخ 27 اوت 2019 عرض الملف برمته على انظار المجلس الجهوي للصحة بمقر الوزارة تحت اشراف السيدة وزيرة الصحة</p>	<p>- المقالة لم تستجب لاستئناف الاشغال منذ 2019/8/1 وتم توجيه قرار تنبيه حيث تعللت بعدم حضور بعض أعضاء فريق المصممين لمتابعة الاشغال بسبب وضعياتهم التعاقدية مع المشتري العمومي (عدم خلاص مستحقاتهم).</p> <p>- عدم تسوية الوضعيات المالية للمصممين وعدم خلاص المقاول في مستحقاتها</p>	45	8,071 القسط الثالث من المستشفى الجهوي بمجاز الباب
<p>توفير فارق الاعتمادات باعتبار من المتوقع ألا تغطي الاعتمادات المتوفرة قيمة العروض المقدمة</p>	<p>- تم فسخ الصفقة بتاريخ 2020/1/20 ويصدد اعداد ملف طلب عروض لإتمام بقية الاشغال.</p>	<p>- الاشغال متوقفة. المقاول طالب بفسخ الصفقة.</p>	40	0,6 تهيئة ملعب البشير بن كوسة لكرة السلة

توفير فارق الاعتمادات باعتبار من المتوقع ألا تغطي الاعتمادات المتوفرة قيمة العروض المقدمة	- تم عقد جلسة عمل بمقر وزارة المالية وتم الاتفاق على إعادة الدراسة طبقا لشروط المعهد الوطني للتراث.	- رفض المعهد الوطني للتراث الموافقة على انجاز المشروع بصيغته الحالية نظرا لتواجد البناية داخل حدود النسيج العمراني العتيق كما هو منصوص عليه في مثال التهيئة العمرانية لمدينة باجة لسنة 2008.		1,753	- بناء مقر أمانة المال الجهوي وقباضة مالية
---	---	--	--	-------	--



## أهم المشاريع العمومية المعطلة بولاية جندوبة

المشروع	مكان المشروع	نسبة الانجاز (%)	الكلفة (م,د)	الصعوبات	الإجراءات والمقترحات
بناء مكتبة عمومية بجندوبة الشمالية	جندوبة الشمالية	0	0,4	اشكال عقاري (عدم توفر عقار)	مطالبة الوزارة بشراء قطعة أرض لتنفيذ المشروع نظرا لعدم توفر عقار على ملك المجلس أو البلدية تمت مراسلة الإدارة العامة للإقتناء والتحديد من طرف مصالح وزارة الشؤون الثقافية لضبط القيمة الشرائية لعقار راجع بالنظر لـ SNIT
- منحرج جندوبة يربط الطريق الوطنية رقم 6 ن/ك 000+89 بالطريق الوطنية رقم 17 ( ن/ك 57 + 000) : عدد 2 سبل ومنشآت فنية (7,9 كم) (مشروع وطني)	جندوبة	5	13,1	تم الإعتراض من طرف المواطنين المالكين للعقار بما لم يمكن من تحرير حوزة الطريق ، تم فسخ الصفقة مع المقاوله وارجاء تنفيذ المشروع	تمت إفادتنا من طرف مصالح التجهيز، انه وقع إدراج المشروع ضمن الوصلة المبرمجة بين مدينة جندوبة والطريق السيارة (بوسالم – الحدود الجزائرية) والمرجو دعوة مصالح التجهيز للتسريع في الدراسات.
تهيئة المنطقة السياحية فج الأطلال بعين دراهم (مشروع وطني)	فج الأطلال بعين دراهم	0	10,0	تم اصدار أمر حكومي عدد 437 لسنة 2016 مؤرخ في 25 مارس 2016 يتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة التفصيلي توقف المشروع لدى الوكالة العقارية السياحية. في انتظار تحويل الإعتمادات	-دعوة الوكالة العقارية السياحية للإسراع في القيام بإجراءات التهيئة على غرار بقية المناطق السياحية - مراسلة الوكالة العقارية السياحية حول ربط المنطقة بالشبكات المختلفة وذلك بتاريخ 2020/01/20
احداث منطقة لوجستية (مشروع وطني)	بوسالم(الروماني)	0	10,0	دراسة الجدوى لم تبدأ بعد	تم إختيار الموقع بمنطقة الروماني على مساحة 40 هك وبصدد إعداد دراسة الجدوى من طرف وزارة النقل أرض تابعة للرسم العقاري عدد 155026

تم اقتراح مكان آخر بولاية باجة وبصدد إعداد استشارة اجتماعية من قبل مكتب دراسات لتوعية السكان بجدوى المشروع	المكان المقترح ليس محل إجماع لدى المتساكنين	22,0	0	بوسالم	إنجاز وحدة تئمين الفضلات بمنطقة الروماني (بوسالم) و8 مراكز تحويل مرتبطة به و10 مصبات ريفية (مشروع وطني)
ضرورة الإسراع في تكوين مجمع الصيانة والتصرف	عدم تكوين مجمع صيانة وجود إشكالية في رسم حدود المنطقة الصناعية وتداخل المنطقة السكنية مع المنطقة الصناعية	3,8	0	جندوبة الشمالية	إعادة تهيئة المنطقة الصناعية ببلدية جندوبة (22هك)
دعوة السلط الجهوية لاقتراح مواقع على لجنة المدخرات العقارية الصناعية	عدم توفر عقار	3,1	0	غار الدماء	إحداث منطقة صناعية بغار الدماء (20هك)
- تم الحصول على موافقات الربط بالشبكات الخارجية من طرف (steg,sonede,telecom,onas) - سيتم إعلان طلب العروض الخاص بأشغال التهيئة خلال شهر ديسمبر 2020 بعد المصادقة على ملف التقسيم من قبل اللجنة الجهوية للتقسيمات	تأخير شديد في المصادقة على ملف التقسيم	3,7	0	جندوبة الشمالية	إحداث منطقة صناعية ببن بشير (12هك)
-إعادة مراسلة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للحصول على الكشوفات التقديرية	-الملف لا يزال بصدد التنقيح من طرف مكتب الدراسات -عدم موافقة الديوان الوطني	11,6	0	بوسالم	إحداث منطقة صناعية بالروماني بوسالم (120هك)

<p>لربط المنطقة بالشبكات الخارجية للماء الصالح للشرب و الطاقة الكهربائية. -ضرورة تركيز محطة تطهير خاصة بالمنطقة. -ضرورة الحصول على رأي المعهد الوطني للتراث. -كلفة القسط الأول 11,6 م.د</p>	<p>للتطهير على ربط المنطقة بالشبكة العمومية للتطهير</p>				
<p>-ضرورة التسريع في إجراءات تغيير الصبغة والإحالة على المجلس الجهوي - تمت المصادقة على إحالة العقار من أملاك الدولة إلى المجلس الجهوي خلال دورته المنعقدة بتاريخ 16 أوت 2019 وبصدد إتمام الإجراءات الخاصة بذلك.</p>	<p>بطء في الإنطلاق في الدراسات</p>	<p>2,5</p>	<p>0</p>	<p>فرنانة</p>	<p>إحداث منطقة صناعية بفرنانة (8 هك)</p>
<p>ضرورة التسريع في القيام بالدراسات اللازمة بالتنسيق مع مكتب الدراسات الكويتي والبدء في الإنجاز</p>	<p>بطئ في اعداد الدراسات</p>	<p>52,3</p>	<p>0</p>	<p>غار الدماء</p>	<p>المستشفى الجهوي صنف "ب" بغار الدماء</p>

أهم المشاريع العمومية المرسمة بالمخطط

و لم تدرج ضمن الميزانية بولاية جندوبة

المشروع	الكلفة (م. د)
المنطقة الصناعية الروماني ببوسالم : قسط أول(50 هك)	15
برنامج المحلات الصناعية	15
تهيئة المنطقة السياحية فج الأطلال بعين دراهم	14
تهيئة المسلك السياحي المؤدي للحصن الجنوبي بطبرقة	0,5
إحداث مركز ترفيه للأطفال بطبرقة	4
إحداث مركب طفولة مبكرة ببني مطير	1,6
إنجاز جسر على وادي ملاق عين الكريمة بجندوبة	15
منعرج مدينة جندوبة ط و 6 - ط و 17 - ط و 6	18
إنجاز الطريق الحزامية لمدينة جندوبة	90

1,5	مشروع الحماية من الفيضانات بغار الدماء
2,3	تهذيب حي السعادة ميتيل بجندوبة
44	تهذيب المنطقة السقوية ببوهرتمة 1 وبيدرونة
14,2	تهذيب المنطقة السقوية بغار الدماء ووادي مليز
26	تهذيب المنطقة السقوية بسوق السبت وبوهرتمة 3
18	تجفيف منطقة الشط بين بشير - الإرتياح
10	إحداث منطقة لوجستية بولاية جندوبة
4	برنامج تطهير المدن الصغرى بني مطير ووادي مليز
15	مستشفى جهوي بغار الدماء

## مشاريع وقرارات المجالس الوزارية

الملاحظات	تقدم الانجاز	الاجراءات المتخذة	الهيكل المعني بالتنفيذ	الكلفة	المشروع
	لم يرد أي مطلب تخصيص.	تم إختيار الموقع بمنطقة الروماني على مساحة 40 هك وبصدد إعداد دراسة الجدوى من طرف وزارة النقل - أرض تابعة للرسم العقاري عدد 155026			- انطلاق دراسات انجاز المنطقة اللوجستية بالروماني
مشروع مرتبط بانتزاعات على مستوى سد سيدي البراق ومشارف مدينة طبرقة  فض نزاعات التعدي على الملك الحديدي وخاصة على مشارف مدينة طبرقة.		*بصدد إعداد دراسة الجدوى من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف وزارة النقل  <b>Scet tunisie</b>  *تم اسناد صفقة إعداد دراسة إعادة تشغيل الخط 2 بتاريخ 13 مارس 2019 إلى مكتب الدراسات Scet tunisie  بفترة 12 شهرا مقسمة على ثلاثة مراحل (APS APD Et dao)  وبتاريخ 25 مارس 2019 انطلقت المرحلة الأولى المتعلقة بالدراسة التمهيدية (APS)	وزارة النقل		إتمام الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لإعادة تشغيل الخط الحديدي رقم 2 الرابط بين ماطر وطبرقة

	<p>سيتم تخصيص 200 هـك في مرحلة أولى لفائدة حاملي الشهائد العليا</p> <p>* تم فتح باب الترشيحات بتاريخ 02 مارس 2020 ثم التمديد إلى 30 جوان 2020</p>	<p>تم ضبط القائمة الأولية للمقاسم التي يقترح كرائها في إطار هذا البرنامج وتم إرسالها إلى مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم 18 جويلية 2019 للمصادقة والإرجاع حتى يتسنى الإعلان عن كرائها .</p>	<p>وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</p>		<p>- تخصيص 367 هـك من الأراضي الفلاحية لفائدة الشبان العاطلين عن العمل بالجهة.</p>
	<p>بصدد التنسيق مع بلدية المكان لإعداد ملف فني لعملية المعاوضة</p>	<p>الملف تعهدت به الإدارة العامة للإقتناء والتجديد بوزارة أملاك الدولة</p>	<p>وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</p>		<p>- تمكين الجهة من مساحة 10 هـك من العقار المسمى "القفصية" بجهة المعاريف جندوبة لإنجاز قاعدة تجارية فلاحية عن طريق المعاوضة بعقار ثان موضوع على ذمة البلدية يتم تخصيصه لاحقا لفائدة مشروع ثقافي بالجهة.</p>

الملاحظات	تقدم الانجاز	الاجراءات المتخذة	الهيكل المعني بالتنفيذ	الكلفة	المشروع
	سيتم النظر في القرار		وزارة الداخلية		- الانطلاق في إنجاز دراسة جدوى لإنجاز المركز الإقليمي لمجابهة الكوارث الطبيعية ببلاريجيا
في إنتظار تقديم النتائج الأولية للمرحلة الثانية من الدراسة وإقتراح المناطق التي سيتم إقامة المشروع عليها.	- تم الانتهاء من المرحلة الأولى للدراسات. - في مرحلة اختيار الموقع	- تم تكليف مكتب الدراسات ACC من قبل وزارة التجارة لتشخيص وإختيار المنطقة	وزارة التجارة		- بعث منطقة تجارية للتبادل الحر بالجهة
	من المنتظر: انطلاق الدراسات نهاية الثلاثي الأول 2020 (مدتها سنة) انطلاق الأشغال منتصف سنة 2021 (مدة الانجاز 24 شهرا). <b>الكلفة المحينة 52,3 م.د</b>	إنطلاق الدراسات الفنية في شهر جانفي 2020.		40,5 م د	- انطلاق دراسات المستشفى الجهوي بغار الدماء .



		<p><u>برنامج سنة 2020:</u></p> <p><u>المرحلة الأولى</u>  على مساحة جمالية في حدود 13400 هك يشمل المناطق السقوية ببوسالم (4000 هك)، سوق السبت (5300 هك)، الجريف السعادة (4100 هك)</p> <p><u>المرحلة الثانية:</u>  11600 هك بالمناطق السقوية غار الدماء، وادي مليز، طبرقة، حمام بورقيبة، سيدي علي الجبيني</p>	<p>وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري</p>	<p>01 م د</p>	<p>- دراسة إعادة تهيئة المناطق السقوية على مساحة 25 ألف هك.</p>
		<p>برنامج سنة 2020 (30 كلم):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ تم ترسيم 3 م د ت ضمن ميزانية التنمية لسنة 2020</li> <li>▪ دراسة التهيئة منجزة على حوالي 43 كلم من المسالك</li> <li>▪ تم تحديد برنامج أول للتدخل على حوالي 18 كلم</li> </ul>		<p>18 م د</p>	<p>- تهيئة وتعبيد مسالك فلاحية بالمناطق السقوية على طول 60 كلم .</p>

		* تم ترسيم 2.4 م د ت ضمن ميزانية التنمية لسنة 2020 لإعادة تهيئة المنطقة السقوية والتوسع فيها  * دراسة المشروع منجزة		5,35 م د	- رصد اعتمادات لإنجاز التوسعة المبرمجة بالمنطقة السقوية بفرنانة ( إعادة تهيئة 1300 هك وتوسعة على مساحة 100 هك) على امتداد ثلاثة سنوات:
		عدم ترسيم إعتمادات للغرض بعنوان سنة 2020		3 م د	- دعم الجهة بوسائل التدخل الثقيلة لمجابهة الكوارث والفيضانات .
		من أنظار وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري		- إعداد خطة عملية لجهر ميناء الصيد البحري بطبرقة
		بصدد التنسيق لتحديد الخطوط المرجعية للدراسة		500 أ.د	- برمجة إنجاز دراسة لتهيئة شلالات بني مطير .
		على مستوى مركزي			- إقرار إجراءات على مستوى قانون المالية لسنة 2020 لمعالجة مديونية المجامع المائية

		تم إعداد الخرائط لحصر الأبار المزمع تجهيزها بالتيار الكهربائي، قدرت الشركة الكلفة الجمالية بـ 18 مليون دينار			إنجاز دراسة لتزويد المناطق السقوية بولاية جندوبة بالتيار الكهربائي ثلاثي الأطوار .
		في طور إعداد الرسم التمهيدي المفصل (APD) وملف التنفيذ وملفات طلبات العروض (DAO) بعد أن تمت المصادقة على الرسم التمهيدي الموجز للدراسة (APS)		3.56م.د.  5.2م.د.(بوسد الم)	إتمام دراسة حماية مدينتي بوسالم وجندوبة من الفيضانات.
		● بالنسبة لمنطقة الطلايبيبة من معتمدية بوسالم: تم تقييم العروض بالنسبة لمعتمديتي وادي مليز وغار الدماء: طلبات المواطنين : تحسين نوعية مياه الشرب من خلال تزويدهم عبر شبكة الشركة بالنسبة لمنطقة عين قناع: جاري إعداد ملف طلب العروض		5 م د	وتحسين نوعية مياه الشرب لعدد من الأحياء والمناطق بولاية جندوبة

<p>تم تنقيح مداولة المجلس بإعتبار أن الكلفة تعادل حوالي 200أ.د (160أ.د مساعدة إستثنائية و40 أ.د تمويل ذاتي)</p>	<p>-بصدد إستكمال بقية الاجراءات مع مصالح صندوق القروض</p>	<p>لم يتم تسليم الشاحنة للبلدية</p>		<p>160 أ.د</p>	<p>- تمكين بلدية بوسالم من شاحنة ضاغطة .</p>
<p>لم يتم الإعلان عن طلب عروض إلى حد هذا التاريخ</p>	<p>تمت برمجة تدخل للغلق التدريجي للمصب البلدي وذلك في إطار صفقة غلق وإستصلاح المصبات العشوائية عدد 2019/3 المعروضة حاليا على أنظار اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية.</p>			<p>50 أ.د</p>	<p>- تخصيص اعتماد للغلق التدريجي للمصب البلدي ببوسالم.</p>
<p>لم يتم الإعلان عن طلب عروض إلى حد هذا التاريخ</p>	<p>تمت برمجة تدخل للغلق النهائي للمصب القديم وذلك في إطار صفقة غلق وإستصلاح المصبات العشوائية عدد 2019/3 المعروضة حاليا على أنظار اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية.</p>	<p>لم يتم التحويل</p>		<p>80 أ.د</p>	<p>- تخصيص اعتماد لغلق المصب القديم للفضلات بطبرقة.</p>
<p>لم يتم الإعلان عن طلب عروض إلى حد هذا التاريخ .</p>	<p>*تم إعلان القسط الأول من طلب العروض عدد 2019/03 اشغال (باجة وجندوبة و الكاف</p>	<p>لم يتم التحويل</p>		<p>50 أ.د</p>	<p>- الشروع في تهيئة وتحسين وضعية المصب</p>

الجديد بطريقة .				وسليانة ) غير مثمر وسيتم إعادة إدراج القسط المذكور بطلب العروض المبرمج لسنة 2020.	وتم التدخل من قبل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إلى جانب التدخل من قبل مقاوله مكلفه من قبل البلدية (تدخل ظرفي لتحسين المصب)
-----------------	--	--	--	---	--

- مضاعفة ميزانية مركز الفنون الدرامية والركحية بجندوبة			في إنتظار تحويل لإعتمادات.	الترفيه في الميزانية إلى 120 ا.د تم رصد 85 ا.د مازلت الإجراءات مع مكتب الدراسات المكلف بإعداد المشروع	بصدد مراجعة كلفة المشروع بإعتبار الدراسات السابقة تمت سنة 2010. - في إنتظار رصد بقية الإعتماد
- إحداث متحف اثري ببلاريجيا.			بصدد تحيين الدراسات الفنية اللازمة	مازلت الإجراءات مع مكتب الدراسات المكلف بإعداد المشروع.	بصدد مراجعة كلفة المشروع بما أن الدراسات السابقة تمت سنة 2010
- إحداث معهد نموذجي بفرنانة.			-		مقترح إحداث مركز للتكوين المهني عوضا عن المعهد النموذجي
- إنجاز المصعد الآلي بجندوبة Téléphérique	وزارة الفلاحة/وزارة السياحة		نشر ملف التعبير عن الرغبة في لزمة تركيز وإستغلال المصعد الآلي بعين دراهم.	وزارة الفلاحة والصيد البحري تنشر يوم 9 جانفي 2020 إعلانا يدعو الراغبين في إنجاز واستغلال مشروع ترفيهي بكل من ولاية جندوبة وزغوان إلى تقديم عروضهم.	

وقد حدد يوم 5 مارس 2020 آخر أجل لتقديم العروض. - بصدد الإعلان عن طلب عروض ثاني .					
---	--	--	--	--	--

## المشاريع المعطلة

المشروع	الكلفة م د	نسبة الانجاز (%)	الإشكالية	المقترحات
تهيئة المنطقة الصناعية وادي الرمل ( قسط أول 10 هك)	4.634	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تأخر في الربط بشبكة التطهير (وقع اختيار المقاوله وبصدد إعداد الصففة بالنسبة لربط المنطقة بشبكة التطهير)</li> <li>- تأخر في تزويد المنطقة بالشبكة الخارجية بالماء الصالح عن طريق SONEDE</li> <li>- التكلفة المتبقية لانجاز هذين العنصرين 1.660 م.د.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- الإسراع في ربط المنطقة بشبكة التطهير والشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب</li> </ul>
إحداث منطقة صناعية بالسرس (55 هك)	15	لم ينطلق	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم انجاز الدراسات في النصف الأول من سنة 2018 بالنسبة للمنطقة الصناعية السرس</li> <li>- تم المصادقة على الدراسة المرورية بتاريخ 12 جوان 2019.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- التسريع باستكمال ملف طلب العروض من طرف الوكالة قصد الدخول في الانجاز</li> </ul>

	<p>- تمت المصادقة ملف مثال التهيئة التفصيلي من طرف إدارة التعمير بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.</p> <p>- ستقوم الوكالة بإعلان طلب عروض دراسات التهيئة خلال شهر جوان 2020.</p>			
<p>- الحد من تفعيل قرارات الإخلاء</p> <p>- التسريع في إعداد الرفع التوبوغرافي والسبر الجيوتقني والدراسة الجيوفيزيائية</p>	<p>- تم المصادقة عليه بتاريخ 17 افريل 2018 وتم تخصيص قطعة ارض محاذية لمعلم القصبة بالكاف * معارضة مواطنين</p> <p>- تم إصدار قرارات إخلاء وهدم من طرف بلدية الكاف ولم يقع التنفيذ.</p>	لم ينطلق	3.444	إحداث مسرح للهواء الطلق ( تنمية مندمجة)
<p>- التسريع في تخصيص قطعة الأرض التي هي على ملك الإدارة العامة للغابات للقيام بأعداد الدراسات اللازمة</p>	<p>بعد انجاز مثال الأشغال المختلفة ( TPD ) تم مراسلة وزير الفلاحة خلال شهر مارس 2020 (الإدارة العامة للغابات) لتخصيص قطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع.</p>	لم ينطلق	2.790	المركب الشبابي ( تنمية مندمجة)
<p>- إصدار الحكم النهائي لاستكمال المشروع.</p>	<p>- الأشغال متوقفة بعد إقرار تعيين مكتب مراقبة لإجراء اختبار فني لأشغال . الملف تعهد به القضاء 2018.</p>	83	0.522	تهيئة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية (قسط 1).



<p>- عرض تقرير تقييم العروض للمصادقة عليها من طرف اللجنة الوزارية للصفقات بوزارة المالية.</p>	<p>- تم إحالة تقرير تقييم العروض بتاريخ 30 مارس 2018 إلى السيد حافظ الملكية العقارية قصد عرضه على اللجنة الوزارية بعد رفع التحفظات المرفوعة</p>	<p>لم ينطلق</p>	<p>4.7</p>	<p>توسعة و إعادة تهيئة مقر إدارة الملكية العقارية بالكاف</p>
<p>- التسريع باعداد الدراسات</p>	<p>- في انتظار الدراسة الجيوتقنية - بصدد اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة للأقسام الخاصة</p>	<p>لم ينطلق</p>	<p>5.5</p>	<p>إحداث مسبح بلدي مغطى</p>
<p>- توفير الاعتمادات الإضافية</p>	<p>مشروع يشمل 5 عناصر: ✓ تهيئة الملعب الفرعي (تكلفة تقدر بـ 650 ا.د) بصدد الانجاز 10 % ✓ التعشيب الاصطناعي للملعب (تكلفة تقدر بـ 350 ا.د) بصدد الانجاز 10% ✓ تهيئة حجرات الملابس والسور الخارجي (تكلفة تقدر بـ 350 ا.د) تم اسناد الصفقة ✓ التعشيب الطبيعي للملعب (تكلفة محينة 650 ا.د ) لم يقع اسناد الصفقة إلى حين توفير الاعتمادات الإضافية بـ 150 ا.د قسط الإنارة (تكلفة تقدر بـ 305 ا.د) لم يقع إسناد الصفقة إلى حين توفير الاعتمادات</p>	<p>معطل</p>	<p>2.7</p>	<p>مواصلة تهيئة المركب الرياضي :</p>

<p>-رصد الاعتمادات اللازمة لانجاز المناطق السقوية المتبقية</p>	<p>تم إعادة برمجة هذا المشروع على الميزانية السنوية لوزارة الفلاحة في عنصر تعهد قنوات الري وتم تهيئة جزئية للمنطقة السقوية سواري عبدة3 سنة 2018 وبصدد التهيئة الجزئية للمنطقة السقوية دوار السند في طور الانجاز(50%) وفي انتظار استكمال تهيئة باقي المناطق</p> <p>- التريشة مبرمجة في سنة 2020 - عبد الباسط 1 مبرمجة في سنة 2022 - عبد الباسط 2 مبرمجة في سنة 2021</p>	<p>معطل</p>	<p>3.45</p>	<p>- إعادة تهيئة المناطق السقوية عبد الباسط 1 و 2 بتاجروين ( 110هك) وسواري عبدة 3 بالدهماني (75هك) والتريشة بالسرس (140هك) ودوار السند بالكاف الغربية(25هك)</p>
<p>- احالة الاعتمادات المتعهد بها من طرف وزارة الثقافة والوزارة السياحة لانجاز هذا البرنامج الوظيفي</p> <p>- التسريع برصد الاعتمادات المتبقية في حدود 1.4 م.د</p>	<p>- تم توفير اعتماد قدره 200 ألف دينار ضمن ميزانية المجلس الجهوي بعنوان سنة 2017 لهذا الغرض كما تم التعهد من قبل وزارة الشؤون الثقافية لتوفير 200 ألف دينار ووزارة السياحة 200 ألف دينار (في انتظار إحالتها لفائدة المجلس الجهوي) وتم الاتفاق على ضبط برنامج وظيفي في حدود 600 أدمع تحديد أوليات التدخل قصد الانطلاق في الأشغال في حدود الاعتمادات المتوفرة لدى المجلس الجهوي.</p>	<p>لم ينطلق</p>	<p>2</p>	<p>تهيئة لأمسلك السياحي</p>

<p>- الإسراع باعداد مقرر المصادقة على الدراسة الجيوتقنية</p>	<p>- هذا المشروع يشمل عنصرين:  ✓ بناء مبيت جديد (كلفة جمالية تقدر بـ1.8 م.د) تمت المصادقة على الدراسة الجيوتقنية بداية سنة 2020 وتمت إحالة الملف على الإدارة العامة للوكالة لإعداد المقرر.  ✓ اقتناء معدات وتجهيزات (تكلفة جمالية تقدر بـ1م.د ) بصدد إعداد ملف طلب العروض من طرف الوكالة</p>	<p>لم ينطلق</p>	<p>3.3 ( محينة )</p>	<p>إعادة هيكلة مركز التكوين و التدريب المهني</p>
<p>-التسريع بتوفير الاعتمادات الإضافية</p>	<p>- نقص في الاعتمادات المرصودة</p>	<p>لم ينطلق</p>	<p>35 ( المبرمج )</p>	<p>إحداث مستشفى جهوي صنف"ب" وتجهيزه</p>
<p>- دعوة وزارة الفلاحة لتخصيص قطعة الأرض في اقرب الآجال</p>	<p>- إشكال عقاري : في انتظار تخصيص قطعة الأرض ( ملك دولي غابي) من طرف وزارة الفلاحة</p>	<p>لم ينطلق</p>	<p>1</p>	<p>احداث دار شباب بالطويرف</p>
<p>- التسريع بتوفير ارض</p>	<p>- إشكال عقاري: في انتظار تخصيص قطعة أرض</p>	<p>لم ينطلق</p>	<p>2.8</p>	<p>احداث وتجهيز فضاء للأسرة</p>
	<p>- في انتظار تفعيل مجمع الصيانة والتصرف</p>	<p>لم ينطلق</p>	<p>1.925</p>	<p>إعادة تهيئة المنطقة الصناعية القديمة بالكاف(2012/2016)</p>

السعي لتوفير أرض -	- اشكال عقاري : لا يتوفر رصيد عقاري بالمنطقة	لم ينطلق	3	- إنجاز منطقة صناعية بساقية سيدي يوسف (2012)
--------------------	--	----------	---	---

## المشاريع المرسمة بالمخطط و لم تدرج ضمن الميزانية

المشروع	الكلفة م.د.
تهيئة مدخل مدينة الكاف على الجهوية 71 ( 4 كلم )	3
تهيئة مدخل مدينة تاجروين على الوطنية 17 ( 3 كلم )	2.5
تهيئة مدخل مدينة نبر على الوطنية 17 ( 3 كلم )	2.5
تدعيم ط.و رقم 18 الدهماني ( 14 كم )	6.5
تدعيم ط.و 18 السرس ( 59.9 كلم )	17
تهيئة وتوسعة قسم التوليد وامراض النساء بالمستشفى الجهوي بالكاف	3
مشروع تهيئة وتثمين المتنزه الحضري الدير بمدينة الكاف	1
إحداث وصيانة المناطق الخضراء	1
إحداث بنك جهوي لنقل الدم بالكاف وتجهيزه	1.1
إحداث مركز صحة أساسية صنف 2 بالمدينة بالدهماني	-
إحداث دار شباب بمنزل سالم	1

## مشاريع المجالس الوزارية

### الولاية: الكاف

المشروع	الكلفة م.د	نسبة الانجاز	الإشكالية	الإجراءات	الاقتراحات
* في القطاع الفلاحي: مضاعفة مساحة الأراضي السقوية من 20000 إلى 40000 هكتار.	-	بصدد الدراسة 40 %	- البحث عن التمويل	تمّ إعداد الخطوط المرجعية لدراسة الجدوى (faisabilité) الخاصة بإحداث المناطق السقوية المقترح ريبها من مياه سد ملاق العلوي مع توفر مساحات للغرض في حدود حوالي 20000 هك . * أدرج تمويل الدراسة ضمن ميزانية التنمية لسنة 2018 وتم الاختيار على مكتب الدراسات ( hydro-plante ). انطلقت الدراسة * تمت دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى التنسيق مع وزارة التنمية والتعاون الدولي للبحث على مصادر لتمويل إحداث المنطقة السقوية	
* ربط الآبار بالضغط ثلاثي الأطوار.	13م.د	-	اشكال مالي	تمّت عملية المسح وإحصاء الآبار ودراسة الكلفة ووقع تضمين مواقع الآبار على خرائط وأحيل الملف إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي أعدت جدول تقديري في كلفة	توفير باقي الاعتمادات المرصودة

	<p>المشروع بحوالي 13م.د</p> <p>- أدرج القسط الأول بالمخطط 2016-2020 في حدود مبلغ 5 م د والبقية 8 م د لما بعد المخطط</p> <p>- تم فتح اعتماد أولي بـ 1,2 م د ضمن ميزانية التنمية لسنة 2018 التابعة للمندوبية المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف</p> <p>- تم ترسيم اعتماد ثاني بقيمة 1,4 م د ضمن اقتراحات ميزانية سنة 2019.</p> <p>تم الاختيار على ربط 140 بئر من معتمدية قلعة سنان ونسبة تقدم الأشغال 20% إلى حدود ماي 2020 .</p>				
<p>توفير الاعتمادات اللازمة للاستكمال تهيئة باقي المسالك المبرمجة</p>	<p>تم انجاز دراسة فنية في الغرض (APS / APD/DAO). * أدرج القسط الأول بالمخطط 2016-2020 في حدود مبلغ 4 م د لتهيئة حوالي 17 كم والبقية 6 م د لتهيئة 33 كم لما بعد المخطط.</p> <p>تم فتح اعتماد بـ 1,546 م د سنة 2018</p> <p><b>قسط أول:</b> لتهيئة 5,7 كم بالمنطقة السقوية سلامة</p> <p><b>قسط ثاني:</b> لتهيئة 5,8 كم من المسالك بصواري عبيدة 3 وعبيدة 11</p> <p><b>قسط ثالث:</b> تهيئة 8 كم من المسالك الفلاحية داخل</p>	<p>إشكال مالي:</p> <p>تأخر في فتح الاعتمادات</p>	<p>-القسط الأول 75%.</p> <p>-القسط الثاني 90%.</p> <p>-القسط الثالث 20%.</p>	<p>10م.د</p>	<p>* تهيئة 50 كلم من المسالك الفلاحية داخل المناطق السقوية.</p>

	المناطق السقوية دوار تراكي بوعلودة- الدهماني.				
<p>- تسوية ملف اقتناء قطعة الأرض التي سيقام عليها المخبر</p> <p>- العمل على ايجاد شريك استراتيجي</p>	<p>- تم تركيز إدارة شركة دراسات استغلال فسطاط سراورتان وذلك بداية من شهر أكتوبر 2016.</p> <p>وفي شهر مارس 2017 تم انتداب 11 إطار لفائدة المشروع</p> <p>- تم الاتفاق على إتمام بقية الانتدابات عند تاريخ الانطلاق الفعلي في انجاز المشروع.</p> <p>- في 23 مارس 2018 انعقد مجلس إدارة شركة دراسات استغلال فسطاط سراورتان و اقر الشروع في الإعلان عن طلب العروض الدولي لاختيار الشريك الاستراتيجي.</p> <p>- في 27 مارس 2018 تم الإعلان عن طلب العروض الدولي لاختيار الشريك الاستراتيجي .</p> <p>- و تم التمديد في الإعلان إلى غاية 2018/10/31.</p> <p>- تم اقتناء قطعة الأرض من بلدية الدهماني بتاريخ 5 ماي 2017.</p> <p>- تم تخصيص أرض لبناء مخبر للبحوث و التجارب بمعتمدية الدهماني.</p> <p>- معارضة مواطن في ما يخص ملكية الأرض التي سيقام</p>	<p>- إشكال عقاري</p> <p>-عدم توفر الشريك الاستراتيجي</p>	-	-	<p>* في قطاع الطاقة والمناجم:</p> <p>إنجاز المرحلة الأولى من مشروع سراورتان</p>



	<p>عليها المخبر الملف في القضاء إلى حد هذا التاريخ</p> <p>- في 2018/07/04 انعقدت جلسة عمل بمقر الولاية و ذلك للنظر في ملف تسوية قطعة الأرض المعدة لبناء مخبر للتجارب لشركة دراسات استغلال فسطاط سراورتان .</p>				
<p>- التسريع في انطلاق الأشغال المرتبطة بمد وبناء انابيب الغاز الطبيعي بالنسبة لولاية الكاف ( معتمديات الكاف الشرقية والغربية والدهماني والقصور).</p>	<p>خط تزويد باجة- الدهماني بالغاز الطبيعي :</p> <p>- مرحلة أولى: مد أنبوب رئيسي على امتداد 120 كم تمويل المرحلة الأولى عن طريق الصندوق السعودي للتنمية FSD</p> <p>- مرحلة ثانية مد أنابيب فرعية على طول 140 كم تمويل المرحلة الثانية عن طريق البنك الإفريقي للتنمية</p> <p>- بصدد الإعلان طلب العروض</p> <p>* لم تتطلق الأشغال إلى حد هذا التاريخ ويصدد استشارة العموم بخصوص المثال الموقعي لمسار مد وبناء انابيب الغاز الطبيعي بالنسبة لولاية الكاف ( معتمديات الكاف الشرقية والغربية والدهماني والقصور).</p>	<p>اشكال اداري</p>	<p>-</p>	<p>150م.د</p>	<p>* تغطية كامل ولاية الكاف بالغاز الطبيعي :</p>

<p>- فض الإشكال المتعلق بالربط الخارجي بالشبكة العمومية للتطهير للقيام بأشغال التهيئة الخارجية</p> <p>- مد الوكالة بالكشف التقديري لتوسيع الشبكة الخارجية للماء الصالح للشراب من طرف الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه.</p>	<p>انجاز المنطقة الصناعية الكاف الشرقية 10هك (القسط الثاني)</p> <p>تمت المصادقة على مثال التقسيم للمنطقة الصناعية "الكاف الشرقية توسعة" بتاريخ 07 مارس 2018.</p> <p>* تم إعداد ملف الدراسة التفصيلية فيفري 2018 وتم تقديمه للمستلزمين العموميين للنظر فيه.</p> <p>* تم تنقيح الدراسة حسب ملاحظات الديوان الوطني للتطهير وتم إحالة الملف معدل بتاريخ 30 جانفي 2019 في انتظار المصادقة عليه.</p> <p>* تم اختيار مقولة للقيام بأشغال التهيئة الداخلية للمنطقة و من المؤمل أن تنطلق هذه الأشغال خلال شهر جويلية 2020.</p> <p>* في انتظار فض الإشكال المتعلق بالربط الخارجي بالشبكة العمومية للتطهير للقيام بأشغال التهيئة الخارجية.</p> <p>* في انتظار مد الوكالة بالكشف التقديري لتوسيع الشبكة الخارجية للماء الصالح للشراب من طرف الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه.</p>	<p>اشكال اداري</p>	<p>-</p>	<p>3 م د.</p>	<p>* في قطاع الصناعة: مضاعفة مساحة المناطق الصناعية</p>
<p>التسريع بأعداد الدراسات و بانجاز أشغال التهيئة</p>	<p>انجاز المنطقة الصناعية بالسرس على مساحة 55 هك</p> <p>تم انجاز الدراسات في النصف الأول من سنة 2018 بالنسبة للمنطقة الصناعية السرس</p> <p>* تم المصادقة على الدراسة المرورية بتاريخ 12 جوان 2019.</p>	<p>إشكال إداري</p>	<p>-</p>	<p>15 م د.</p>	

	<p>* تمت المصادقة على ملف مثال التهيئة التفصيلي من طرف إدارة التعمير بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.</p> <p>* ستقوم الوكالة بإعلان طلب عروض دراسات التهيئة خلال شهر جوان 2020.</p>				
<p>- التسريع في انجاز أشغال التهيئة الداخلية حسب ما هو مبرمج أواخر 2020.</p> <p>- العمل على استكمال التهيئة الخارجية وربط المنطقة بكل الشبكات الخارجية</p>	<p>التهيئة الجزئية للمنطقة الصناعية محطة المحاميد بتاجروين</p> <p>تمت المصادقة على ملف طلب العروض (DAO) التهيئة الخارجية:</p> <p>* تم إمضاء و إرسال الاتفاقيات الممضاة مع الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه لربط المنطقة الصناعية بالشبكات الخارجية للكهرباء و الغاز و المياه إلى وزارة الصناعة مرفقة بقاتورات التسبقة لصرفها و الانطلاق في أشغال الربط .</p> <p>التهيئة الداخلية:</p> <p>* تمت المصادقة على ملف طلب العروض (DAO) حيث تم اختيار المقاول و بصدد انجاز أشغال التهيئة الداخلية بنسبة 40 % و من المتوقع استكمالها موفى 2020.</p>	-	-تهيئة داخلية (%40)	7 م د	

<p>التسريع في استكمال إعداد الدراسات</p>	<p>- فتح العروض المالية للدراسات يوم 2017/10/18 لاختيار مكتب دراسات. - انطلقت دراسة الطريق السيارة بتاريخ 2018/06/27 و لمدة 20 شهر من طرف مكتب الدراسات STUDI/EGIS . - الممول : الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي FADES - تم عقد جلسة عمل بمقر ولاية الكاف في 2018/07/19 بحضور مكتب الدراسات و جميع الهياكل المعنية لتقديم برنامج دراسة الطريق السيارة و تحديد مسار الطريق كما يلي: الكاف تونس عبر مجاز الباب. - تم عقد جلسة بتاريخ 22 افريل 2019 استشارة العموم بخصوص الدراسة التمهيدية لمشروع ائصال الطريق السيارة - تم اختيار شركة "AYDROSOL FONDATIONS" لانجاز الأشغال الجيوتقنية الخاصة بالمشروع منذ 17 فيفري 2020.</p>		-	-	<p>* البنية الأساسية: إنجاز الطريق السيارة تونس - الكاف والانطلاق في إعداد الدراسة الفنية والدراسات المفصلة المتعلقة بها.</p>
--	--	--	---	---	---

<p>- استكمال تقييم ملفات طلب العروض . - التسريع في إعداد الدراسات</p>	<p>- تم انجاز 57 كلم بنسبة 100% . - 43. كلم في مرحلة تقييم العروض و عرضها على لجنة الصفقات الخاصة بمكتب الدراسات الجزء الأول من الدفعة الأولى (6 مسالك بطول 43.3 كلم). - بقية المسالك في طور دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسة الفنية.</p>		-	-	<p>* تهيئة 400 كلم من المسالك الفلاحية والريفية.</p>
	<p>- رصد اعتماد بقيمة 300 أ د بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 وذلك لإعداد الدراسة المخصصة لإنجاز المخطط المديرية لبعث مناطق حرة بالمناطق الحدودية و المتضمنة إحداث منطقتين بكل من ساقية سيدي يوسف و قلعة سنان. - تم اختيار مكتب دراسات وانطلق في إعداد المرحلة الأولى من الدراسة لاختيار الموقع الجغرافي.</p>	-	-	-	<p>* في القطاع التجاري: إنجاز منطقتين للتبادل الحر بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان في ضوء الدراسة التي تم الشروع في إنجازها للغرض.</p>
<p>توفير الاعتمادات اللازمة لاستكمال القسط الأول والثاني</p>	<p>- القسط الأول : بصدد بناء قسم استعجالي و مخبر التحليل و قسم الأشعة(86%) تمت الموافقة على توفير اعتمادات ملحقة الصفقة و استأنفت الأشغال فيفري 2020. - القسط الثاني:</p>	<p>إشكال مالي و إداري</p>	<p>قسط أول : 86% قسط ثاني :</p>	<p>قسط أول : 4.999 م.د. قسط ثاني : 6.2 م.د.</p>	<p>* في القطاع الصحي : تحويل المستشفى الجهوي بالكاف إلى مستشفى جامعي</p>

<p>- التسريع للاتفاق ما بين كل الأطراف المعنية لحل مشكل المصممين</p>	<p>- تهيئة و توسعة قاعات العمليات و بناء قسم للتخدير و الإنعاش. - تمت المصادقة على الدراسة التمهيديّة المفصلة مع بعض التحفظات من قبل الوزارة وبصدد تقديم ملف منقح من قبل المهندس المعماري وفي انتظار تقديم الأقساط الخاصة - بصدد تسوية عقود المصممين على اثر التغييرات التي طرأت على البرنامج الوظيفي من قبل المصالح المركزية لوزارة الصحة.</p>				
<p>التسريع في اختيار مواقع محطات التطهير وإعداد الدراسات اللازمة</p>	<p>- مشروع تطهير مدينتي ساقية سيدي يوسف وقلعة سنان (بتكلفة جمالية محينة تقدر ب 30م د) : في طور إعداد الدراسات الأولية واختيار مواقع محطات التطهير: ممول من طرف التعاون التونسي الايطالي(برنامج تحويل الدين الايطالي) - مشروع تطهير مدينتي نبر والقلعة الخصبة ( تدعيم شبكات و انجاز محطتي تطهير بكلفة محينة تقدر ب 25 م.د ) في طور إعداد الدراسات الأولية واختيار مواقع محطات التطهير: ممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية</p>	<p>إشكال اداري</p>		<p>55م د</p>	<p>* في القطاع البيئي: إحداث شبكات ومحطات تطهير بكل من نبر وساقية سيدي يوسف وقلعة سنان والقلعة الخصبة لفائدة 20000 ساكن.</p>

	(BAD)				
العمل على تخصيص قطعة الأرض التي ستقام عليها الوحدة و الانطلاق الدراسات الأولية	<p>- تم عقد جلسة عمل بمقر الولاية بتاريخ 2018/05/31 و ذلك للنظر في مشاريع التصرف في النفايات المنزلية و المشابهة.</p> <p>- عقدت جلسة بتاريخ 5 ماي 2020 بولاية سليانة للمصادقة على إحداث مشروع وحدة لمعالجة و تثمين النفايات بمنطقة سيدي بورويس.</p> <p>بصدد استكمال الإجراءات الخاصة بتخصيص قطعة الأرض التي ستقام عليها الوحدة و في انتظار انطلاق الدراسات الأولية</p>				* إنجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات وعدد من مراكز التحويل لفائدة البلديات والتجمعات السكنية الريفية.
التسريع بوضع خطط لانجاز مراكز تحويل	<p>- تم حاليا برمجة عدد 10 مراكز تحويل بولاية الكاف. وفي انتظار تحديد مواقع المراكز المبرمجة مع البلديات المعنية لانطلاق الدراسات البيئية والفنية ونشر طلب العروض.</p>				

قائمة المشاريع المعطلة بولاية سليانة

الفلاحة

الإجراءات المقترحة لتجاوز الصعوبات	الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ	ما تم إنجازه	كلفة المشروع (أ د)	معطيات حول المشروع	سنة الادراج	المشروع
صدر أمر الانتزاع في شهر افريل 2018 وورد على المصالح الجهوية للولاية خلال شهر سبتمبر 2018 بصدد القيام بعملية الإشهار على المستوى الجهوي خلال شهر أكتوبر تنتهي مدة الإشهار في 27 ديسمبر 2018 ثم تليه عملية التنفيذ	المشروع يشهد صعوبات في الإنجاز نتيجة : إعتراض مواطنين معينين بالتعويض على أراضيهم التي غمرها حوض السد التلي "أركو" - حوالي 70 هك مطالبة شركة "القنوات" بمراجعة و تحيين الأثمان بعد انقضاء الأجال التعاقدية واستحالة مواصلة عملية التزويد بالقنوات والقطع الخاصة بسبب تعطل إنجاز المشروع	■ 50% من الاشغال تم إصدار أمر الانتزاع تمت إحالة نتيجة الإشهار على المصالح المركزية لوزارة أملاك الدولة مع استمرار اعتراض عزوز الزغلامي	5342	مساحة المنطقة السقوية 390 هك	2012	إحداث منطقة سقوية على سد وادي اركو
تنفيذ امر الانتزاع التعويض العيني ممكن لفائدة المجموعة التي تراجعت عن التعويض المادي يبقى الإشكال في تحديد المستحقين ومناباتهم			5342			المجموع

الشباب والرياضة



مشروع	سنة الادراج	معطيات حول المشروع	كلفة المشروع (أ.د.)	ما تم إنجازه	الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المشروع	الإجراءات المقترحة لتجاوز الصعوبات
إحداث مضممار إصطناعي لألعاب القوى	2012	تمت البرمجة بعنوان سنة 2012 . المكونات:مضممار إصطناعي لألعاب القوى – ملعب معشب- حجرات ملابس .	200 دراسة	خلال شهر أفريل 2017 تم إعلان المناظرة المعمارية لاختيار المصممين و على إثر اكتشاف الإشكال العقاري تم إيقاف جميع الإجراءات إلى حين إشعار اخر . تم الاتفاق في جلسة العمل المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 2017/11/21 على اقتطاع قطعة أرض مساحتها 3هك من الرسم العقاري عدد SODAL 6789 بسليانة لإنجاز المشروع و قد تم تحديد حدود القطعة قامت مصالح الولاية بمراسلة وزارة الفلاحة لتغيير الصبغة بتاريخ 21 أكتوبر 2018 ومراسلة مصالح وزارة املاك الدولة لتخصيص العقار بتاريخ 21 أكتوبر 2018	تم تداخل في حدود القطعة عدد 07 من الرسم العقاري عدد 68762/190072 بالحي الإداري بسليانة المخصصة لإنجاز المشروع، من قبل المدرسة الإعدادية المجاورة . و الجزء المتبقي من القطعة لا يستجيب لمتطلبات المشروع . لا يوجد قطعة أرض تتماشى والمواصفات المطلوبة لإنجاز المشروع	بعد أن تم التخلي عن قطعتي الأرض المقترحتين المقترح التسريع في توفير قطعة أرض تستجيب لمواصفات إنجاز المشروع .
المجموع			200			

## المناطق الصناعية

مشروع	سنة الادراج	معطيات حول المشروع	كلفة المشروع (أ.د.)	ما تم إنجازه	الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المشروع	الإجراءات المقترحة لتجاوز الصعوبات
إحداث منطقة صناعية ببرقو		المساحة الجمالية : ( 50 هك )		<p>اقترحت الجهة موقع تم رفضه بتاريخ 2016/04/19 من طرف اللجنة الوطنية للمدخرات العقارية الصناعية وانطلاق الأشغال مرتبط ببيجاد موقع ثاني لا يقل مساحته على 50 هك تمت الموافقة على موقع ثاني من طرف اللجنة الجهوية .الوكالة بصدد إعداد الدراسات البيئية الأولية والرفع الطبوغرافي</p> <p>تمت مراسلة وزارة الصناعة بتاريخ 13 اكتوبر 2017 لإبداء الرأي في القطعة المقترحة</p> <p>تمت معاينة القطعة من طرف اللجنة الفنية بوزارة التجهيز خلال شهور اوت 2018</p> <p>تم الإنطلاق في دراسة التهيئة في شهر أوت 2019 .</p>	<p>إجراءات تخصيص قطعة الأرض لفائدة الوكالة العقارية الصناعية وكلفة الربط بالشبكات (التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب)</p>	التسريع في إجراءات تغيير الصبغة وتخصيص الأرض لفائدة الوكالة العقارية الصناعية
المنطقة الصناعية بالعروسة	2012	المساحة الجمالية : ( 20 هك )	5510	<p>قامت الوكالة بإعداد مثال الأشغال الطبوغرافية المختلفة (TPD)</p> <p>قامت الوكالة بتعديل الأشغال الطبوغرافية المختلفة (TPD) بطلب من اللجنة الإستشارية الجهوية لتغيير صبغة الأراضي وذلك بعد التثبت من وجود مساحة 2000 متر تمثل منطقة سقوية داخل مثال التقسيم.</p> <p>تم إعداد الدراسة البيئية الأولية وسيتم إرسال ملف تغيير الصبغة خلال شهر جويلية 2018</p> <p>تم إعلان الإستشارة المتعلقة بدراسة تهيئة المنطقة</p>		التسريع في الدراسات التنفيذية للمشروع

		<p>الصناعية بتاريخ 04 ماي 2018.</p> <p>تم الإنطلاق بالدراسة بتاريخ 26 جوان 2018</p> <p>قامت الوكالة بتعديل الأشغال الطبوغرافية المختلفة (TPD) بطلب من اللجنة الإستشارية الجهوية لتغيير صبغة الأراضي وذلك بعد التثبت من وجود مساحة 2000 متر تمثل منطقة سقوية داخل مثال التقسيم.</p> <p>تم إعداد الدراسة البيئية الأولية وتم إرسال ملف تغيير الصبغة خلال شهر جويلية 2018</p> <p>تم إعلان الإستشارة المتعلقة بدراسة تهيئة المنطقة الصناعية بتاريخ 04 ماي 2018.</p> <p>قامت اللجنة الجهوية الفنية الإستشارية للأراضي الفلاحية بالموافقة بالإجماع على تغيير الصبغة بتاريخ 29 نوفمبر 2018 وتمت إحالة كامل الملف الى وزارة الفلاحة لإصدار امر تغيير الصبغة بتاريخ 4 ديسمبر 2018</p> <p>صدر أمر تغيير الصبغة</p> <p>◆ تم إعداد ملف التقسيم وسيتم تقديمه للبلدية لعرضه على اللجنة الجهوية للتقسيمات خلال شهر جانفي 2020 وجود بعض الإحترازاات للتعديل من طرف afi</p> <p>◆ تم تعديل مثال الأشغال الطبوغرافية المختلفة و بصدد استلام الملف الطبوغرافي.</p> <p>◆ تم قبول الدراسة الجيوتقنية</p> <p>الإشكال يتمثل في بقاء في الإجراءات التخصيص بصدد إجراءات التحويل الوفاي بوزارة أملاك الدولة</p>				
--	--	--	--	--	--	--

<p>التسريع في إحالة ملف التقسيم الى بلدية المكان والإنطلاق في الإنجاز</p>	<p>بطء في تقديم ملف التقسيم معدلا بصيغته النهائية</p>	<p>تم الإنطلاق بالدراسة بتاريخ 26 جوان 2018 الوكالة بصدد دراسة تزويد المنطقة بالتيار الكهربائي و الماء الصالح للشرب.</p> <p>الدراسات المائية بصدد التنقيح بعد رد وزارة الفلاحة ( إدارة التخطيط و الموازنات المائية) التي تعتبر ضرورية للقيام بدراسات المؤثرات على المحيط.</p> <p>تمت إحالة ملف التقسيم للبلدية بتاريخ 2016/05/26 وطلبت القيام بملف السلامة وذلك طبقا لقرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 سبتمبر 2013.</p> <p>تم إعداد ملف السلامة وقد تحصلت الوكالة على المصادقة في شهر ماي 2017.</p> <p>تم تقديم ملف التقسيم خلال شهر مارس وفي شهر سبتمبر 2017 وقد تم إعادة الدراسة للملف التقسيم لمرور الطريق الحزامية لمدينة سليانة داخل المنطقة الصناعية.</p> <p>سيتم تقديم ملف التقسيم معدلا بصيغته النهائية خلال شهر جويلية 2020</p>	<p>5564</p>	<p>المساحة الجمالية : ( 15 هك )</p>	<p>2018</p>	<p>المنطقة الصناعية سليانة 3</p>
---	---	---	-------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------------------

الثقافة

مشروع	سنة الادراج	معطيات حول المشروع	كلفة المشروع (أ.د)	ما تم إنجازه	الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المشروع	الإجراءات المقترحة لتجاوز الصعوبات
انجاز مشروع المتحف الجهوي بسليانة	2015		7000	تم استكمال الدراسات الفنية والعلمية بصدد الاعداد للمناظرة الوطنية في التصميم مع عمادة المهندسين ترسيم كلفة انجاز المتحف الأثري بسليانة على ميزانية . 2018	عدم توفر الإعتمادات ببطء في إعداد الدراسات الفنية الضرورية	تسريع نسق الدراسات وتوفير الإعتمادات
تهذيب الموقع الأثري بجامعة			1000	تمت الدراسة الفنية وإعداد تقرير فرز العروض	يتمثل الإشكال في عدم توفر الاعتماد المطلوب في حدود 448 لدعوة المقاوله للانطلاق في الأشغال (من طرف وزارة الثقافة)	التدخل لدى وزارة الثقافة لتوفير الإعتمادات المطلوبة والمقدرة بـ 448 أ.د
تدعيم وترميم متحف مكثر		أشغال هامة لترميم وتهيئة المبنى وكافة مكوناته وفق المعايير العصرية المعمول بها في المتاحف العالمية	1750	تم إعداد الملف العلمي والمالي الخاص بتهيئة المتحف سيتم انجاز المشروع سنة 2020 مع العلم أن الأشغال تنجز من طرف المعهد الوطني للتراث.	عدم توفر الإعتمادات	توفير الإعتمادات المطلوبة

الكهرباء والغاز

مشروع	سنة الإدراج	معطيات حول المشروع	كلفة المشروع (أ.د.)	ما تم إنجازه	الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المشروع	الإجراءات المقترحة لتجاوز الصعوبات
كهربة 279 بئرا سطحيا بكامل معتمديات الولاية مساهمة الشركة 1170 دينار مساهمة المجلس الجهوي 1596 دينار مساهمة المنتفعون 764 دينار	2014		3530	تمت الدراسات الأولية بكافة المعتمديات تم إجراء المعاينة الميدانية مع مصالح الفلاحة تم إعداد الصفحة	الإشكال يتمثل عدم توفر الإعتمادات وقدرها 1596 لفائدة المجلس الجهوي	التدخل لدى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لتوفير الإعتمادات

## الصناعات التقليدية

المشروع	سنة الإدراج	معطيات حول المشروع	كلفة المشروع (أ.د.)	ما تم إنجازه	الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المشروع	الإجراءات المقترحة لتجاوز الصعوبات (إن وجدت)
بعث قرية حرفية بولاية سليانة	2015	- تم خلال سنة 2017 تحديد قيمة العقار البالغ مساحته 2م500 بـ 62.500 د. من خلال اختبار قامت به مصالح وزارة أملاك الدولة.	3000	الديوان الوطني للصناعات التقليدية بصدد تأمين قيمة اقتناء العقار	طول إجراءات اقتناء العقار	التسريع في عملية اقتناء العقار من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية وهذا وقد تم التحويز الوقي من طرف الإدارة الجهوية لأملاك الدولة

**القرارات المنبثقة عن الجلسة الممتازة  
للمجلس الجهوي  
بتاريخ 08 جوان 2017**



# جدول تألفي لتقدم تنفيذ القرارات

النسبة من الكلفة %	النسبة من العدد %	الكلفة (م.د)	العدد	
3,3	26	28,4	13	مشاريع منجزة
31,0	30	269,1	15	مشاريع بصدد الإنجاز
21,6	14	188,2	07	مشاريع في مرحلة طلب العروض
44,1	30	383,1	15	مشاريع في طور الدراسة
<b>100</b>	<b>100</b>	<b>868,8</b>	<b>50</b>	<b>المجموع</b>

مع الإشارة الى أن:  
-09 قرارات ليست لها كلفة محددة.  
-تم اعتماد الكلفة المحينة.

# المشاريع المنجزة

# المشاريع المنجزة

الملاحظات	نسبة الإنجاز المادي %	الكلفة المحيئة (أ د)	القرارات
انتهت الاشغال	100		تهيئة الأراضي الفلاحية
انتهت الاشغال	100	2 853	تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب
انتهت الأشغال	100	1640	تهيئة المسالك الفلاحية داخل المناطق السقوية
تمّ تضمين القرار في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 وذلك بالترفيغ في المبلغ المخصص لعمليات التخلي عن القروض الفلاحية	100	11845	إعداد مشروع قانون حول معالجة مديونية الفلاحين والبحارة
			برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية:
- انتهت الأشغال.	100	5 000	باجة
- انتهت الأشغال.	100	3 000	مجاز الباب
- انتهت الأشغال.	100	1 000	نفزة
انتهت الاشغال	100	611	تعشيب الملعب البلدي بعمدون
انتهت الاشغال	100	722	تعشيب الملعب البلدي بقبلاط
4			

# المشاريع المنجزة

الملاحظات	نسبة الإنجاز المادي %	الكلفة المحيئة (أ د)	القرارات
انتهت الاشغال	100	203	- بناء وحدة محلية للنهوض الاجتماعي بعمدون
انتهت الاشغال	100	61	دار خدمات ادارية بنفزة
انتهت الاشغال.	100	526	إحداث مركب طفولة بزهرة مدين
تم تمويل 60 مشروعا.	100	كلفة غير محددة	المساهمة في تمويل 60 مشروع ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة
تم إبرام 1146 مقرا موزعة حسب السنوات الى. - 526 عقدا سنة 2017. - 383 عقدا سنة 2018. - 237 عقدا سنة 2019.	283		إبرام 405 عقدا في إطار برنامج عقد الكرامة
تم إسناد 160 قرضا.	100	920	- تمويل 160 مشروعا صغير لخلق مواطن شغل بشكل فوري

# المشروع بصدد الإنجاز

# المشاريع بصدد الإنجاز

الملاحظات	نسبة الإنجاز المادي %	الكلفة المحيئة (أ د)	القرارات
نسبة تقدم الأشغال تتراوح بين 20% و 70% حسب الأقسام	20% و 70%	170000	تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي بولاية باجة بلوغ 98% نسبة تزود
<p><b>02 مواقع بنفزة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الأشغال الغابية: طلب عروض اول غير مثمر</li> <li>- غراسة 150 هك زيتون: في طور إبرام العقد مع المقاول.</li> <li>- تشجير غابي ميكانيكي على مساحة 100 هك: توقفت الأشغال بسبب اعتراض مواطنين</li> <li>- تهيئة مسالك غابية على طول 17,5 كلم: بصدد تعيين مكتب دراسات لإنجاز الدراسة.</li> <li>- ارساء مجموعة من الروابط الإنتاجية (Alliance Productive): طلب عروض غير مثمر</li> <li>- تشجير غابي على مساحة 170 هك: بصدد إعداد ملف طلب العروض.</li> <li>- تم بتاريخ 2019/7/5، تسليم الاتفاقية في التصرف المشترك الى مجمعي طبوبة ووادي المعدن، وبصدد إعداد برنامج استغلال الموارد الغابية المسموح بها طبقا للاتفاقية.</li> <li>- تم بتاريخ 07 جانفي 2020، عقد جلسة مع بعض المجامع من متساكني هذه المناطق وبحضور خبراء المشروع قصد التحضير لمشروع اتفاقيات شراكة بينهم وبين الإدارة العامة للغابات لاستغلال المنتوجات الغابية.</li> <li>- بصدد إعداد ملفات فنية لأشغال متعلقة بتحسين ظروف عيش متساكني المناطق المستهدفة بالتنسيق مع دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية</li> <li>- انتداب 04 خبراء ضمن الوحدة الجهوية لتنفيذ المشروع بتاريخ 2019/9/2.</li> <li>- اقتناء تجهيزات إعلامية ومكتبية: استشارة غير مثمرة.</li> <li>- <b>02 مواقع بعمدون وتستور:</b> تم تحديد مناطق التدخل وستنطلق الدراسات المعمقة.</li> </ul>		35 000	مشروع التصرف المندمج في المشاهد بالمناطق الأقل نموا بالشمال الغربي والوسط الغربي. (موقعين بنفزة وموقعين بعمدون وتستور)
			7

# المشاريع بصدد الإنجاز

الملاحظات	نسبة الإنجاز المادي %	الكلفة المحينة (أ د)	القرارات
<p>- خلص فريق العمل المتكون من إطارات وزارة الفلاحة على المستوى المركزي إثر زيارته الميدانية بتاريخ <b>2018/5/14</b> أن <b>إنجاز المرفأ لن يكون مجديا</b> وبالتالي فإنه من غير الضروري إجراء تحيين الدراسة المنجزة في الغرض سنة 1996 من طرف مصالح وزارة التجهيز.</p> <p>- بتاريخ <b>2019/4/2</b> قام السيد كاتب الدولة للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بزيارة ميدانية تعهد خلالها بإطلاق الدراسة لإحداث ميناء للصيد البحري والترفيه والسياحة.</p> <p>- أعربت وزارة الثقافة عن <b>عدم موافقتها على احداث المشروع</b> لوجود آثار ذات أهمية بالغة بالمنطقة وذلك ضمن مراسلتها الموجهة الى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتاريخ <b>2019/3/08</b>.</p> <p>- <b>خلال جلسة عمل انعقدت بوزارة الفلاحة يوم الأربعاء 24 جويلية 2019 تم الاتفاق على:</b></p> <p>* <b>دمج الدراسة الفنيّة لفرضية انشاء ميناء صيد بحري بكاب نيقرو ضمن دراسات التهيئة الجارية بالمنطقة من طرف الوكالة العقارية السياحية AFT</b></p> <p>* <b>دراسة مقترح انشاء ميناء ترفيهي متكامل يتضمّن جزء يخصّص للصيد البحري وإعداد مذكرة في الغرض مع شرح الأسباب.</b></p> <p>* <b>اعداد تصوّر من قبل وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري حول إمكانية تركيز مجبد لسحب القوارب على اليابسة قريبا من منطقة كاب نيقرو وتمويله ضمن مشروع المشاهد الغابية.</b></p> <p>* <b>احداث لجنة دعم تضمّ كلّ الأطراف المتداخلة (وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة السياحة ووزارة البيئة والشؤون المحلية..) لمعاودة مجهودات الوكالة العقارية السياحية.</b></p>		50	إعداد دراسة لإنجاز مرفأ للصيد البحري بكاب نيقرو

# المشاريع بصدد الإنجاز

الملاحظات	نسبة الإنجاز المادي %	الكلفة المحينة (أ د)	القرارات
انتهت الأشغال بالنسبة لكل الأقساط ما عدى الأقساط الأربعة التالية:	100	4072	تحسين استغلال المناطق السقوية
سيتم انجاز هذا المشروع ضمن مشروع دعم الموارد المائية بالمنطقة السقوية بدجبة.		340	* تأهيل محطة الضخ بالسد التلي تيبار
لم يتم تخصيص اعتمادات بعنوان ميزانيات 2018 و2019		585	* تغيير جزء من قناة الجلب بالمنطقة السقوية بوزنة نفزة
		100	* حماية محطة الضخ بتستور
في طور الاعداد لإعادة الإعلان عن طلب العروض.		400	* إحداث منطقة سقوية بعين القرشية بعمدون
الاشغال جارية.	52	12500	- تدعيم الطريق الجهوية رقم 62 بين باجة (ط ف 361) وحدود ولاية جندوبة (18.5 كلم)
الأشغال جارية	35	11650	- بناء جسر على وادي مجردة بالطريق الجهوية 131 بتستور
تم فتح العروض المتعلقة بـ ط ش م ومن المتوقع ان تمتد الاشغال بين شهري مارس وسبتمبر 2020		7515	- انجاز 163 مسكنا اجتماعيا:
31 جانفي 2020 التاريخ المتوقع لانتهاء الاشغال	98	3321	- 78 مسكنا بمجاز الباب
31 مارس 2020 التاريخ المتوقع لانتهاء الاشغال	70	4194	- 85 مسكنا بقبلاط (حي الزهور).



# المشاريع بصدد الإنجاز

الملاحظات	نسبة الإنجاز المادي %	الكلفة المحيئة (أ د)	القرارات
<p>- تم تحيين قائمة التجمعات السكنية بكل المعتمديات والبالغ عددها 104 تجمعا على مساحة جمالية تفوق 692 هك منها 34 تجمعا داخل المناطق العمرانية.</p> <p>- بعد إتمام المعاينات والأبحاث العقارية تم الشروع في عملية التسوية حيث تم:</p> <p>* قبول الملفات وتم إبرام 11 عقد و توجيه 12 اذن بالدفع لاستكمال ابرام العقود ( بحى محسن الامام بنفزة وابن زيدون بتستور)</p> <p>* بالنسبة للأراضي المقامة على الأراضي المسجلة والتي شملها أمر 504 لسنة 2015 فقد تم إبرام اتفاقية مع OTC لإعداد الرفع الطبوغرافي وستنطلق الأشغال حال توفر التسبقة.</p>			<p>- تسوية وضعية 100 تجمعا سكنيا مقاما على أراضي دولية بولاية باجة بما فيها إعادة إيواء متساكني حوضي سد سيدي البراق وسد سيدي سالم.</p>
<p>- تم تسوية 29 وضعية على مساحة 544 هك 60 آر 97 ص</p>	6,5		<p>- تسوية 448 وضعية من المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية</p>
			<p>- تأهيل المستشفى الجهوي بمجاز الباب</p>
	100 %		القسط الثاني:
<p>- المقاوله لم تستجب لاستئناف الاشغال منذ 2019/8/1 وتم توجيه قرار تنبيه حيث تعللت بعدم حضور بعض أعضاء فريق المصممين لمتابعة الاشغال بسبب وضعياتهم التعاقدية مع المشتري العمومي.</p> <p>- لم يتسنى للإدارة على المستوى الجهوي المصادقة على بقية عقود المصممين</p> <p>- تمت مراسلة الهيئة العليا للطلب العمومي قصد الحصول على ملحوظة تفسيرية في الغرض وتم اعلام الوزارة بكل الحثيات والاشكاليات لمد الجهة برأيها في الغرض.</p> <p>-تم الاتفاق على عقد جلسة عمل بحضور الأطراف المعنية في الأسبوع الأول من شهر فيفري 2020 لفض إشكالية بقية العقود.</p>	45 %	8500	القسط الثالث:

# المشاريع بصدد الإنجاز

الملاحظات	نسبة الإنجاز المادي %	الكلفة المحينة (أ د)	القرارات
- تم اعداد الدراسة الأولية ومد الجهة (الولاية، بلدية زهرة مدين، بلدية قبلاط) بنسخة منها لإبداء الرأي. - من المنتظر نشر طلب العروض لإنجاز الأشغال نهاية السداسي الأول لسنة 2020 على أن تنطلق الأشغال موفى سنة 2020.		100	إطلاق دراسة تطوير شبكات التطهير لمعمدية عمدون وقبلاط
تم اقتناء 10 حافلات رفاهة و 12 حافلة مزدوجة. وسيتم خلال 2020 اقتناء 10 حافلات أخرى عادية و 7 حافلات صغرى	46	13 500	اقتناء 47 حافلة في إطار الصفقة العامة
- الأشغال جارية.	40	1 500	إعادة بناء محطة النقل البري بباجة
- الاشغال متوقفة. المقاول طالب بفسخ الصفقة. - تم فسخ الصفقة بتاريخ 2020/1/20 وبصدد اعداد ملف طلب عروض جديد لإتمام بقية الاشغال.	40	600	تهيئة ملعب البشير بن كوسة لكرة السلة
الاشغال جارية: وموفى شهر مارس 2020 حدد كأخر اجل لانتهاء الاشغال	85	4 150	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بتيباز

# المشاريع في مرحلة طلب العروض

# المشاريع فى مرحلة طلب العروض

الملاحظات	الكلفة المحيئة (أ د)	القرارات
- تمت المصادقة على اتفاقية التمويل من طرف مجلس نواب الشعب يوم 2020/1/16. - من المبرمج انطلاق الأشغال سنة 2020 على أن تنتهي سنة 2023.	154 000	إقامة سد على وادي خلاد بتبرسق
		تعهد هياكل الماء الصالح للشرب:
بصدد إبرام الصفقات لـ 06 أقساط وإعادة نشر طلب العروض للأقساط 4 و 8 و 9.	4000	*البرنامج الجهوي للتنمية (09 أقساط) تطهير المنطقة الريفية وادي الزرقة:
في انتظار إتمام إجراءات التمويل المشروع مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)	5 000	* انجاز محطة تطهير (طاقة استيعاب 900 م <sup>3</sup> / اليوم)
سيتم نشر طلب العروض بعد انطلاق أشغال مشروع محطة التطهير	5 000	* مد حوالي 12 كلم من القنوات لفائدة 500 ساكن.
بصدد تحيين ملف طلب العروض ومن المنتظر نشره بداية سنة 2020 بعد استكمال إجراءات التمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).	2 500	انجاز محطة تطهير للمنطقة الريفية سيدي إسماعيل
1- محطة التطهير بمجاز الباب: ملف طلب العروض جاهز. 2- محطة التطهير بباجة: ملف طلب العروض في صيغته الوقتية بصدد المصادقة ومن المتوقع نشره بداية سنة 2020.	12 000	توسيع وتهذيب محطتي تطهير باجة ومجاز الباب
تم الإعلان عن طلب العروض خلال سنة 2018. تبين أن كلفة المشروع تضاهي ضعف الاعتمادات المرصودة. -خلال زيارته الى ولاية باجة بتاريخ 2019/8/29، أفاد السيد وزير النقل أن الوزارة تعهدت بالمشروع بكلفة 05 م.د وتم ترسيم الاعتمادات بميزانية سنة 2020 وستنطلق الأشغال خلال الأشهر الأولى من سنة 2020 بعد التأكد من تمسك المقاوله بعرضها.	5 000	بناء وتهينة المباني الفنية والإدارية بالشركة الجهوية للنقل (الورشة + تهينة وتوسيع المقر الاجتماعي)
- في طور اعادة طلب العروض وتم اعداد استشارة بخصوص الدراسة الطبوغرافية	687	تعشيب الملعب البلدي بتبرسق

# المشاريع في مرحلة الدراسة

# المشاريع في مرحلة الدراسة

الملاحظات	الكلفة المحيئة (أد)	القرارات
<p>- القسط الأول المتعلق بدراسة إعادة تهيئة المنطقة السقوية بمجاز الباب: تمت الموافقة على الدراسة الأولية وانطلقت الدراسة التفصيلية.</p> <p>- القسط الثاني المتعلق بدراسة إعادة تهيئة المنطقة السقوية بتستور: تمت الموافقة على الدراسة التفصيلية بتاريخ 2019/10/7 وانطلقت الدراسة التنفيذية.</p> <p>- دراسة تطهير وتجفيف المنطقة السقوية بقبلاط: انطلقت الدراسة بتاريخ 2019/9/12</p>	78 600	تثمين المناطق السقوية العمومية الكبرى
<p>- تم تغيير وصف العقار وإحالته من ملك الدولة الغابي إلى ملك الدولة الخاص (أمر حكومي عدد 463 لسنة 2019 صادر بالرائد الرسمي عدد 45 بتاريخ 31 ماي 2019)، وحاليا في انتظار تسليم العقار بصفة نهائية لمصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية.</p>	كلفة غير محددة	دراسة بعث قرى غابية
<p>- قامت الجهة بإعداد الملفات الفنية والعقارية والجداول التفصيلية للأثمان لمكونات المشروع وتوفير المعطيات الضرورية حول المشروع وإحالتها إلى وزارة التجارة قصد إتمام بقية الإجراءات.</p> <p>- تولت مصالح وزارة التجارة إعداد كراس العناصر المرجعية للدراسة وإرسالها إلى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي يوم 2017/12/5 التي تعهدت بالملف وشرعت في البحث عن ممولين محتملين.</p> <p>- تم ادراج المشروع ضمن برنامج compact في إطار التعاون الدولي الأمريكي ولا تزال المفاوضات جارية قصد حثهم على تمويل المشروع. مع الإشارة إلى أن وفدا من وزارة التجارة مصحوبا بخبير أمريكي قام يوم 21 سبتمبر 2018 بعقد جلسة بمقر الولاية وزيارة موقع المشروع.</p> <p>- تعهد السيد وزير التجارة خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 2019/8/1 بمقر رئاسة الحكومة بإدراج اعتمادات الدراسة ضمن ميزانية الوزارة لسنة 2020.</p>	كلفة غير محددة	- تحيين الدراسة وإنجاز مشروع القاعدة الاقتصادية بضيعة السمان على مراحل لفائدة بلدية باجة
<p>- تمت برمجة انجاز المشروع على ميزانية الوكالة لسنة 2018</p> <p>- تراجع المساحة الى حدود 23 هك نظرا لاقطاع أجزاء لفائدة مشاريع المستشفى متعدد الاختصاصات والاعدادية النموذجية والمعهد النموذجي كما تبين أن 30 هك هي على ملك الخواص.</p> <p>- أعدت الوكالة العقارية مثال الأشغال المختلفة بتاريخ 30 مارس 2018 وتم اختيار مكتب دراسات عن طريق استشارة وانطلقت الدراسات يوم 2019/11/21. (إمكانية ان تصبح المساحة 27 هك)</p> <p>- مع الإشارة الى إمكانية استغلال 10 هك من المساحة بصفة فورية متى توفر باعثين جدد ومشاريع مشغلة.</p>	20 000	- تهيئة المنطقة الصناعية هنشير بوتفاحة (85 هك)
		15

# المشاريع في مرحلة الدراسة

الملاحظات	الكلفة المحيطة (أد)	القرارات
<p>- من خلال معاينة ميدانية قامت بها الوكالة لم يتسنى إيجاد مساحة 50 هك وبالتالي سيتم الاقتصار على مساحة 20 هك التي وافقت عليها اللجنة الوطنية بتاريخ 26 ماي 2015.</p> <p>- أعدت الوكالة العقارية مثال الأشغال المختلفة بتاريخ 29 سبتمبر 2016 وتم اختيار مكتب دراسات عن طريق استشارة وانطلقت الدراسات يوم 2019/11/21.</p>	6 000	- تهيئة المنطقة الصناعية دقة ( 50 هك)
<p>* تم إعداد الدراسات الأولية (المسح الطبوغرافي، الدراسة المائية، دراسة المؤثرات على المحيط وملف التقسيمات)</p> <p>* قرار مجلس ادارة الشركة مرتبط بنتيجة دراسة الجدوى</p>	12000	- إحداث منطقة صناعية بمعمل السكر (20 هك)
<p>- تم إعداد الملف العقاري من طرف المصالح الجهوية وتوجيهه إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة لتغيير صبغة الأرض والتخصيص (مراسلة عدد 314 بتاريخ 2017/1/15).</p> <p>- تم تمكين وزارة الصحة من محضر تحويز وقتي بتاريخ 2017/6/8.</p> <p>- قامت مصالح وزارة التجهيز والإسكان بعقد جلسة عمل مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تم الاتفاق خلالها على تصنيف العقار المخصص لبناء المستشفى كمنطقة تجهيزات عمومية ضمن المراجعة الحالية لمثال التهيئة.</p> <p>- صادقت وزارة الصحة على البرنامج الوظيفي والفني خلال اللجنة الفنية للبنى التحتية المنعقدة بتاريخ 2018/6/12.</p> <p>- الأشكال لازال قائما بالنسبة لتمويل المشروع حيث تقرر خلال الجلسة التي انعقدت بمقر رئاسة الحكومة يوم 2019/8/1 دعوة وزارة التنمية للبحث عن ممول جديد عوضا عن الجانب البريطاني الذي اشترط التصرف في المستشفى وهو ما لا يسمح به القانون التونسي.</p>	182 000	- بناء مستشفى متعدد الاختصاصات بباجة
<p>تعهد الديوان بإنجاز أشغال الربط بالمحطة.</p>	2 200	ربط المنطقة الصناعية بمجاز الباب بمحطة تطهير مجاز الباب: مد حوالي 4 كلم من القنوات
<p>قامت الوكالة العقارية السياحية بالإعلان عن طلب عروض لدراسة انجاز مثال التهيئة التفصيلي والمؤثرات على المحيط للمحطة وحددت آخر أجل يوم 10 ماي 2019.</p> <p>تم فرز العروض وتعيين مكتب دراسات EPR . في طور الدراسة.</p>		الإذن بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة بتفعيل انجاز المنطقة الايكولوجية بشط الزوارع.

# المشاريع في مرحلة الدراسة

الملاحظات	الكلفة المحيئة (أ د)	القرارات
<p>- تمت الموافقة على قرار إشغال وقتي للعقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة لمدة 05 سنوات قابلة للتجديد وتم إرسال الملف إلى وزارة الشباب والرياضة حيث تم رصد 200 أ د كاعتماد للدراسات الفنية للمشروع.</p> <p>- تم زيارة المركز يوم 2018/1/31 بحضور لجنة فنية من الوزارة لتدارس مكونات البرنامج الوظيفي،</p> <p>- تم يوم 2018/2/24 القيام بالرفع الطوبوغرافي للعقار.</p> <p>- قامت الوزارة بموافاة الجهة بتاريخ 2018/11/12 بملف البرنامج الوظيفي للمشروع المنجز من طرف المصالح الفنية بالوزارة.</p> <p>- تم تكليف مكتب دراسات للقيام بالدراسة الجيوتقنية بتاريخ 2018/11/28.</p> <p>- في طور مراجعة كراس الشروط المتعلق بالمؤثرات على المحيط.</p> <p>- تم إرسال ملف مناظرة الهندسة المعمارية الى المصالح المركزية بالوزارة لإبداء الرأي و تمت الموافقة عليه.</p>	2 500	تأهيل مركز التخميم والاصطياف بالزوارع
<p>- تم إمضاء اتفاقية تفويض بين الوزارة ووكالة التهذيب والتجديد العمراني بتاريخ 2017/10/13 تتولى بموجبه الوكالة إنجاز المشروع كصاحب مشروع مفوض.</p> <p>- تم توجيه نسخة من الملف الخاص بتخصيص قطعة الأرض إلى الوكالة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 2017/9/6 لاعتماده لإتمام بقية الإجراءات حتى يتسنى الانطلاق في الانجاز في أحسن الآجال.</p> <p>- تم اعداد TPD وارساله الى وزارة الاشراف والوكالة.</p> <p>- تم رصد اعتماد قدره 1300 أ د ضمن ميزانية 2018.</p> <p>- تم اعداد الدراسة التمهيدية واحالتها الى مصالح الوزارة لإبداء الرأي بتاريخ 2019/5/14.</p> <p>- تم إجابة وكالة التهذيب والتجديد العمراني حول إبداء الرأي في إحالتها بتاريخ 2019/6/10.</p>	2 000	- بناء قاعة العاب فردية بمعتمدية عمدون (تم تعويضه بمركب شبابي وثقافي ورياضي)
<p>- تم اعادة طلب العروض للمرة الثانية بعد رفض المقاول التمسك بعرضه الأول واسناد الصفقة.</p> <p>- رفض المعهد الوطني للتراث الموافقة على انجاز المشروع بصيغته الحالية نظرا لتواجد البناية داخل حدود النسيج العمراني العتيق كما هو منصوص عليه في مثال التهيئة العمرانية لمدينة باجة لسنة 2008.</p> <p>- تم عقد جلسة عمل بمقر وزارة المالية وتم الاتفاق على إعادة الدراسة طبقا لشروط المعهد الوطني للتراث.</p>	1 753	- بناء مقر أمانة المال الجهوي وقباضة مالية



# المشاريع في مرحلة الدراسة

الملاحظات	الكلفة المحيئة (أد)	القرارات
<p>- في طور اعداد الدراسات للعناصر المبرمجة لسنة 2018 و2019.</p> <p>- تم الإعلان عن طلب العروض لمشروع تزويد منطقة الحمايمية-الحلايسية بعين سلطان من معتمدية باجة الشمالية بالماء الصالح للشرب عن طريق الهندسة الريفية (في انتظار فتح الاعتمادات لإتمام بقية الإجراءات) والاعداد لانطلاق الاشغال لتزويد منطقة عين أم زيد-عين قطارة بباجة الشمالية عن طريق الشركة.</p>	70 000	<p>مشاريع التنمية المندمجة بمعتمدية: مجاز الباب- باجة الجنوبية باجة الشمالية - تبرسق - قباط - تيبار - تبرسق</p>
<p>- تم اعداد المقترحات الجهوية لتدعيم مشروع التنمية المندمجة بعمدون ونفزة والمصادقة عليها من طرف المجلس الجهوي للتنمية.</p> <p>- تم اعداد الملفات الفنية لمختلف العناصر وارسالها الى المندوبية العامة للتنمية الجهوية لدراستها وعرضها للمصادقة من طرف لجنة القيادة الوطنية.</p>	غير محددة	<p>تعزيز برنامج التنمية المندمجة بمعتمديتي عمدون ونفزة بعد تقييم الأقساط المنجزة</p>
<p>-سيتم ترسيم اعتمادات المشروع بميزانية سنة 2021</p>	6000	<p>إعادة هيكلة مركز تكوين الفتاة الريفية بمجاز الباب</p>

## أهم القرارات والمشاريع المعن عنها خلال المجالس الوزارية المضيق

### 1- الشراكة بين القطاع العام والخاص

الملاحظات	تقدم الانجاز	الاجراءات المتخذة	الهيكل المعني بالتنفيذ	الكلفة	المشروع
نشر إعلان يدعو الراغبين في انجاز واستغلال مشروع تليفريك بكل من ولاية جندوبة وزغوان إلى تقديم عروضهم. حدد يوم 5 مارس 2020 آخر أجل لتقديم العروض. - بصدد الإعلان عن طلب عروض ثاني.		نشر ملف التعبير عن الرغبة في لزمة تركيز وإستغلال المصعد الآلي بعين دراهم.	وزارة الفلاحة/وزارة السياحة		- طلب عروض لإنجاز المصعد الآلي بجندوبة Téléphérique

### 2- السياحة والنقل

الملاحظات	تقدم الانجاز	الاجراءات المتخذة	الهيكل المعني بالتنفيذ	الكلفة	المشروع
مراسلة الوكالة العقارية السياحية حول ربط المنطقة بالشبكات المختلفة وذلك بتاريخ 2020/01/20	إعلان طلب العروض لإختيار مكتب دراسات لتحسين دراسة تهيئة المنطقة السياحية فج الأطلال	في انتظار تحويل الإعتمادات	وزارة السياحة والصناعات التقليدية	14 م د	- تحيين دراسات تهيئة المنطقة السياحية فج الأطلال بعين دراهم وإتمام إجراءات تخصيص العقار لفائدة الوكالة العقارية السياحية

تم استضافة بعض وكلاء الأسفار للنظر في إمكانية إدراج المطار ضمن المسالك السياحية الجوية	-	وزارتي النقل والسياحة	-	وضع خطة عملية لتنشيط مطار طبرقة
لم يرد أي مطلب تخصيص.	تم إختيار الموقع بمنطقة الروماني على مساحة 40 هك وبصدد إعداد دراسة الجدوى من طرف وزارة النقل أرض تابعة للرسم العقاري عدد 155026	وزارة النقل		- انطلاق دراسات انجاز المنطقة اللوجستية بالروماني
مشروع مرتبط بإنتراعات على مستوى سد سيدي البراق و مدينة طبرقة	*بصدد إعداد دراسة الجدوى من طرف مكتب الدراسات المكلف من طرف وزارة النقل Scet tunisie	وزارة النقل		إتمام الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لإعادة تشغيل الخط الحديدي رقم 2 الرابط بين ماطر وطبرقة

### 3- الصناعة والطاقة

الملاحظات	تقدم الانجاز	الاجراءات المتخذة	الهيكل المعني بالتنفيذ	الكلفة	المشروع
	- سيتم إعلان طلب العروض الخاص بالدراسات الفنية بعد المصادقة على ملف التهيئة التفصيلي من طرف المصالح المختصة	بصدد إدخال التعديلات اللازمة على مثال التهيئة التفصيلي من قبل مصالح الوكالة العقارية الصناعية	وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	15 م د	تهيئة منطقة صناعية بالروماني
	تم تكليف المقاول لإنجاز الأشغال بداية من تاريخ 15 جانفي 2020.	تم الإعلان عن طلب العروض لإنجاز أشغال تهيئة القسط الأول(20هك)		33 م د	- تهيئة منطقة صناعية الارتياح 2

	<p>*سيتم إعلان طلب العروض الخاص بأشغال التهيئة خلال شهر ديسمبر 2020 بعد المصادقة على ملف التقسيم من قبل المصالح المختصة</p>	<p>تم الحصول على موافقات الربط بالشبكات الخارجية من طرف (steg,sonede,telecom,onas)</p>		3,5 م د	<p>- تهيئة منطقة صناعية بن بشير</p>
	<p>- سيتم إعلان طلب العروض لإنجاز الدراسات بعد تغيير صبغة الأرض وإدراجها بميزانية الدولة (العنوان الثاني)</p>	<p>- في إنتظار إحالة العقار من أملاك الدولة لفائدة المجلس الجهوي ومنه لفائدة الوكالة العقارية الصناعية - بصدد إعداد ملف فني.</p>			<p>- إتمام إجراءات التفويت في عقار المنطقة الصناعية فرنانة لفائدة المجلس الجهوي لولاية جندوبة</p>
		-		10 م د	<p>- توسعة المحل الصناعي الكائن بالمنطقة الصناعية الارتياح1 بهدف إحداث 1500 موطن شغل جديد</p>

<p>*تم عقد جلسة عمل بمقر الولاية يوم 17 أكتوبر 2019 وتم الإتفاق على :</p> <p><b>1 القطب الصناعي والتكنولوجي بولاية جندوبة :</b></p> <p>تكوين شركة التصرف في القطب للقيام بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإحداث الشركة</p> <p><b>2 القطب التكنولوجي للشمال الغربي :</b></p> <p>إستحداث إجراءات إحداث القطب التكنولوجي للشمال الغربي و تخصيص الإعتمادات الضرورية لإنجازه</p>	<p>العقار عبارة عن قطعة أرض مشجرة زياتين تمسح 53 هك ببنى مازن ببلارجيا لم يرد أي مطلب تخصيص</p>				<p>- تفعيل القطب التكنولوجي لتنمية الغابات والموارد الإنشائية بولاية جندوبة</p>
		<p>بداية اشغال تزويد منطقة عين دراهم إنطلاقا من منطقة الحوايزية ببوش كنقطة إنطلاق وذلك منذ شهر جوان 2019(30%)</p>		20 م د	<p>- تزويد معتمديات ولاية جندوبة بالغاز الطبيعي: *معتمدية عين دراهم موفى شهر ماي 2019. * معتمديات جندوبة، بوسالم وطبرقة موفى شهر أكتوبر 2019</p>
		<p>تم وضع محول وقتي بكلفة 1 م.د ببلطة بوعوان في إنتظار تركيز محول دائم</p>		4 م د	<p>- بعث محول جهد عالي بمنطقة الروماني</p>

#### 4- في مجال الحد من الكوارث

الملاحظات	تقدم الانجاز	الاجراءات المتخذة	الهيكل المعني بالتنفيذ	الكلفة	المشروع
	سيتم النظر في القرار		وزارة الداخلية		- الانطلاق في إنجاز دراسة جدوى لإنجاز المركز الإقليمي لمجابهة الكوارث الطبيعية ببلاريجيا

#### 5- في المجال الصحي

الملاحظات	تقدم الانجاز	الاجراءات المتخذة	الهيكل المعني بالتنفيذ	الكلفة	المشروع
	وقع إنتداب عدد 04 أطباء توليد - طب نفسي- طب عام - طبيب أسنان فنيين سامين : 05 تبنيج بقاعة العمليات 05 قابلات 11 ممرض 01 فني سامي في العلاج الطبيعي 01 فني سامي فيالكتابة الطبية .		وزارة الصحة		- دعم المستشفى الجهوي بجندوبة
	بصدد تركيز المعدات	تم تركيز عدد 01 جهاز تنفس اصطناعي بتاريخ 2019 /05/05 جزئيا			- توفير معدات لبيت العمليات بالمستشفى الجهوي بجندوبة قبل موفى سنة 2019.

	<p>وقع إنتداب عدد 05 أطباء عدد 03 علاج أورام عدد 01 طب نفسي عدد 01 صيدلاني عدد 01 تقني فيزيائي عدد 06 تصوير طبي عدد 02 ممرض رئيس عدد 02 مساعد للصحة عدد 01 تغذية عدد 01 كتابة طبية عدد 03 تقنيين</p>	<p>- في إنتظار صدور الأمر الحكومي المتعلق بصبغة المركز</p>			<p>- تحويل صبغة المركز الإقليمي للأمراض السرطانية إلى معهد مختص ذي إستقلالية مالية وإدارية وتوفير الموارد البشرية اللازمة.</p>
	<p>من المنتظر: انطلاق الدراسات نهاية الثلاثي الأول 2020 (مدتها سنة) انطلاق الأشغال منتصف سنة 2021(مدة الانجاز 24 شهرا). <b>الكلفة المحبنة</b> <b>52,3 م.د.</b></p>	<p>إنطلاق الدراسات الفنية في شهر جانفي 2020.</p>		40,5 م د	<p>- انطلاق دراسات المستشفى الجهوي بغار الدماء .</p>
	<p>تم إفتتاحه يوم 24 جوان 2019 بعدد 02 أطباء - 04 فنيين سامين - 02 ممرضين</p>	<p>إنطلق العمل بالمركز</p>			<p>- فتح المركز الوسيط ببطلة بوعوان .</p>

## 6- في المجال الفلاحي

الملاحظات	تقدم الانجاز	الاجراءات المتخذة	الهيكل المعني بالتنفيذ	الكلفة	المشروع
تم تخصيص 500 أ.د بعنوان سنة 2020	برنامج سنة 2020 إعداد طلب عروض بخصوص 13400 هك جاري	برنامج سنة 2020 بصدد إعداد الخطوط المرجعية للدراسة وتم عقد جلستين مع الإدارة العامة للهندسة الريفية لمناقشة كراس الشروط	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	01 م د	- دراسة إعادة تهيئة المناطق السقوية على مساحة 25 ألف هك.
تم تخصيص 2 م.د بعنوان سنة 2020 لفائدة منطقة الجريف	برنامج 2019: ▪ إعداد ملف طلب العروض المتعلق بإنجاز أشغال تجفيف منطقة سوق السبت جاري ▪ برمجة جلسة عمل مع الأطراف المتدخلة بالنسبة للمنطقة السقوية الجريف لحل الإشكال المتعلق بنقطة التفريغ (Exutoire) برنامج 2020: إبرام صفقات الأشغال.	*برنامج 2019: إتمام الدراسة التنفيذية والتفصيلية للمشروع (نشر طلب العروض موفى شهر أوت 2019) *تم إعداد ملف طلب العروض المتعلق بالجزء الأول من المشروع والخاص بإنجاز أشغال تجفيف منطقة سوق السبت *برنامج 2020: إبرام صفقة الأشغال.		08 م د	- الشروع في دراسات تجفيف منطقة الجريف على مساحة 800 هك ومنطقة سوق السبت على مساحة 1000 هك .
	برنامج 2020 إعداد ملف طلب العروض	*برنامج 2020: بصدد التثبيت من الدراسة الأولية التي تم إعدادها من طرف مكتب دراسات تم ترسيم المبلغ ضمن ميزانية التنمية لسنة 2020. تم إعداد الخطوط المرجعية وجاري إعداد ملف طلب العروض.		450 أ.د	- دراسة تجفيف 6 آلاف هك بالمناطق السقوية وادي ملبز و غار الدماء .
تم تخصيص 3 م.د بعنوان سنة 2020	برنامج سنة 2020 (30 كلم) ▪ إعداد ملف طلب العروض جاري. ▪ برمجة جلسة لتحديد المسالك ذات الأولوية بالتنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية والمهنة *دراسة التهيئة منجزة على حوالي 43 كلم من المسالك *تم تحديد برنامج أول للتدخل على حوالي 20 كلم (من ضمن 43) من المسالك بالمناطق السقوية العمومية . *إعداد طلب العروض جاري.	*برنامج سنة 2020(30كلم) بصدد إعداد كراس الشروط للإعلان عن طلب العروض *برنامج سنة 2021(30كلم) بصدد التنسيق مع الإدارة العامة للهندسة الريفية لإتمام الدراسة للمسالك الغير مدرجة بالدراسة (حوالي 17كلم)		18 م د	- تهيئة وتعبيد مسالك فلاحية بالمناطق السقوية على طول 60 كلم .



الكلفة 3,56م د	*جندوبية + غار الدماء في طور إعداد الرسم التمهيدي المفصل (APD) وملف التنفيذ وملفات طلبات العروض (DAO) بعد أن تمت المصادقة على الرسم التمهيدي الموجز للدراسة (APS) *بوسالم في طور إعداد الرسم التمهيدي الموجز للدراسة (APS).	تعهدت الإدارة العامة للسود والأشغال المائية الكبرى بالتعاون مع البنك الألماني لإعادة الإعمار. بصدد مناقشة نتائج الدراسة الأولية مع لجنة القيادة للمصادقة ثم الإنطلاق في المرحلة الثانية للدراسة. بوسالم: في إنتظار تسجيل الصفقة والإنطلاق في عملية الرفع الطبوغرافي	3.56م.د	- إتمام دراسة حماية مدينتي بوسالم وجندوبية من الفيضانات.
الكلفة 5,2م د			5.2م.د.(بوسالم)	

## 7- مجالي التجهيز والإسكان

الملاحظات	تقدم الانجاز	الاجراءات المتخذة	الهيكل المعني بالتنفيذ	الكلفة	المشروع
	بصدد تحيين الدراسة الفنية من طرف المصالح المركزية لوزارة التجهيز والإسكان والترابية	تم اصدار أمر إنتزاع عدد 1279 بتاريخ 2015/09/11	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	40 م د	- إتمام الدراسات الفنية لمشروع الطريق الحزامية الشرفة الصوالة
	الجزء الرابط بين جندوبية بوسالم في طور الدراسة. برمجة جلسة عمل بالوزارة تجمع ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والبيئة وممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.	مبرمجة لسنة 2020 على مستوى المصالح المركزية لوزارة التجهيز والإسكان.			- إنجاز دراسة جدوى الطريق الرابطة بين غار الدماء وبيوش ووصلة طريق سريعة "بوسالم - غار الدماء"
تقرّر يوم 22جانفي 2020، خلال جلسة عمل عقدت بمقر ولاية جندوبية الشروع في *تحرير الحوزة العقارية. وتبلغ المسافة نحو 80 كلم، فيما تتأهز كلفة إنجاز هـ بـ2300 مليون دينار.	*الإعلان عن طلب عروض إنجاز الأشغال الجيوتقنية بتاريخ 12 نوفمبر 2019. - انطلاق في إعداد ملف الأشغال الخصوصية والبحث العقاري لاقتناء الأراضي اللازمة لتحرير حوزة المشروع منذ شهر جانفي 2020.	بصدد عرض الإتفاقية المبرمجة مع ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري على أنظار اللجنة العليا للصفقات		2300 م د	- الانطلاق في تحرير الحوزة العقارية لمشروع الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية
	في طور الدراسة على مستوى مركزي : بصدد اعداد ملف طلب العروض لـ 50.9 كلم كقسط أول. - في طور اعداد ملف طلب العروض بالنسبة للقسط الأول.	تم تحديد جملة المسالك وإحالتها إلى المصالح المركزية للإنطلاق في الدراسات		600 أ.د	- انجاز دراسة لتهيئة 120 كلم من المسالك الريفية ومعالجة الانزلاقات الأرضية بالجهة .

	في طور اعداد دراسة الجدوى من قبل الممول الخارجي على ان يتم القيام بالدراسات الفنية للمشاريع حال إنتهاء الممول الخارجي من دراسة الجدوى. في خصوص تهيئة كل من حي 02 مارس بوادي مليز والحي الشعبي عدد04 ببلاريجيا	في طور إعداد طلبات العروض للدراسات الفنية لعدد 03 مشاريع لبرنامج 2019		24 م د	- تهيئة 09 أحياء بولاية جندوبة / الزهوية وعزيز والجيش والبطاح و02 مارس والسعادة ميتيل بمعتمدية جندوبة والهادي خليل بمعتمدية بلطة بوعوان والأنس بجندوبة الشمالية والانطلاقة بمعتمدية طبرقة والنور بمعتمدية بوسالم وخمير بورقاد بمعتمدية عين دراهم بالإضافة إلى برمجة تهيئة كل من حي 02 مارس بوادي مليز والحي الشعبي عدد04 ببلاريجيا سنة 2020
--	--	---	--	--------	---

## 8- في المجال التجاري

الملاحظات	تقدم الانجاز	الاجراءات المتخذة	الهيكل المعني بالتنفيذ	الكلفة	المشروع
	- تم الانتهاء من المرحلة الأولى للدراسات. - في مرحلة اختيار الموقع	- تم عقد جلسة عمل بمقر الولاية بتاريخ 09 ماي 2019 . - تم تكليف مكتب الدراسات ACC من قبل وزارة التجارة لتشخيص وإختيار المنطقة	وزارة التجارة		- بعث منطقة تجارية للتبادل الحر بالجهة على ضوء نتائج الدراسة

المتابعة	حالة التنفيذ	القرار
<p>تم إحداث المعتمدية بمقتضى الأمر عدد 1103 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/08/23 .</p>		<p>إحداث معتمدية بالطويرف.</p>
<p>* تم فتح العروض بتاريخ 2018/09/03 * انطلقت الدراسة بتاريخ 2019/07/02 * بصدد انجاز الأشغال بنسبة 40%</p>	<p>* تم إعداد الخطوط المرجعية لدراسة الجدوى الخاصة بإحداث المناطق السقوية المقترح ريبها من مياه سد ملاق العلوي مع توفر مساحات للغرض في حدود حوالي 20000 هك . * أدرج تمويل الدراسة ضمن ميزانية التنمية لسنة 2018.</p>	<p>* في القطاع الفلاحي: مضاعفة مساحة الأراضي السقوية من 20000 إلى 40000 هكتار.</p>
<p>* انطلقت أشغال تهيئة 5,7 كم بالمنطقة السقوية سلامة بتاريخ 2019/01/08 ونسبة تقدم الأشغال 75%. * انطلقت أشغال تهيئة 5,8 كم بالمنطقة السقوية بصواري عبيدة 3 وعبيدة 11 في فيفري 2019 ونسبة تقدم الأشغال 90%. * انطلقت أشغال تهيئة 8 كم من المسالك الفلاحية داخل المناطق السقوية دوار تراكي بوعلودة-الدهماني ونسبة تقدم الأشغال 20%.</p>	<p>* تم انجاز دراسة فنية في الغرض (APS / APD/DAO). * أدرج القسط الأول بالمخطط 2016-2020 في حدود مبلغ 4 م د لتهيئة حوالي 17 كم والبقية 6 م د لتهيئة 33 كم لما بعد المخطط. تم فتح اعتماد ب 1,546 م د سنة 2018 قسط اول: لتهيئة 5,7 كم بالمنطقة السقوية سلامة قسط ثاني: لتهيئة 5,8 كم من المسالك بصواري عبيدة 3 وعبيدة 11 قسط ثالث: تهيئة 8 كم من المسالك الفلاحية داخل المناطق السقوية دوار تراكي بوعلودة-الدهماني.</p>	<p>* تهيئة 50 كلم من المسالك الفلاحية داخل المناطق السقوية.</p>

<p>* في 23 مارس 2018 انعقد مجلس إدارة شركة دراسات استغلال فسفاط سراورتان و أقر المشروع في الإعلان عن طلب العروض الدولي لاختيار الشريك الاستراتيجي.</p> <p>* في 27 مارس 2018 تم الإعلان عن طلب العروض الدولي لاختيار الشريك الاستراتيجي .</p> <p>*و تم التمديد في الإعلان إلى غاية 2018/10/31.</p> <p>* تم اقتناء قطعة الأرض من بلدية الدهماني بتاريخ 5 ماي 2017.</p> <p>* في 2018/07/04 انعقدت جلسة عمل بمقر الولاية و ذلك للنظر في ملف تسوية قطعة الأرض المعدة لبناء مخبر للتجارب لشركة دراسات استغلال فسفاط سراورتان حيث تبين انه هناك إشكال عقاري (معارضة مواطن في ما يخص ملكية الأرض) الملف في القضاء إلى حد هذا التاريخ.</p>	<p>* تم تركيز إدارة شركة دراسات استغلال فسفاط سراورتان وذلك بداية من شهر اكتوبر 2016.</p> <p>وفي شهر مارس 2017 تم انتداب 11 إطار لفائدة المشروع</p> <p>* تم الاتفاق على إتمام بقية الانتدابات عند تاريخ الانطلاق الفعلي في انجاز المشروع.</p> <p>* تم تخصيص أرض لبناء مخبر للبحوث و التجارب بمعتمدية الدهماني.</p>	<p>* قطاع الطاقة والمناجم:</p> <p>إنجاز المرحلة الأولى من مشروع سراورتان</p>
---	--	--

<p>* انتهت أشغال الربط بشبكة الغاز الطبيعي بمعتمدية ساقية يوسف: 100%</p> <p>* بلغت نسبة تقدم انجاز أشغال الربط بشبكة الغاز الطبيعي في:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- معتمدية تاجروين 80%</li> <li>- معتمدية الجريصة: 95%</li> </ul> <p>* بصدد الاعلان طلب العروض</p> <p>* لم تنطلق الأشغال إلى حد هذا التاريخ وبصدد استشارة العموم بخصوص المثال الموقعي لمسار مد وبناء انابيب الغاز الطبيعي بالنسبة لولاية الكاف ( معتمديات الكاف الشرقية والغربية والدهماني والقصور).</p>	<p>* ربط معتمدية الساقية بشبكة الغاز الطبيعي ( التزويد بالغاز الطبيعي عن طريق الشقيقة الجزائر)</p> <p>* ربط معتمديتي تاجروين والجريصة بشبكة الغاز الطبيعي (بكلفة 2 م.د) ( من نفس شبكة الغاز CIOK ).</p> <p>* بالنسبة لبقية المعتمديات :</p> <p>خط تزويد باجة- الدهماني بالغاز الطبيعي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- مرحلة أولى: مد أنبوب رئيسي على امتداد 120 كم تمويل المرحلة الأولى عن طريق الصندوق السعودي للتنمية FSD</li> <li>- مرحلة ثانية مد أنابيب فرعية على طول 140 كم تمويل المرحلة الثانية عن طريق البنك الافريقي للتنمية</li> <li>- الكلفة الجمالية في حدود 150 م.د</li> </ul>	<p>* تغطية كامل ولاية الكاف بالغاز الطبيعي .</p>
<p>* تمت المصادقة على مثال التقسيم للمنطقة الصناعية "الكاف الشرقية توسعه" بتاريخ 07 مارس 2018.</p> <p>* تم إعداد ملف الدراسة التفصيلية فيفري 2018 وتم تقديمه للمستلزمين العموميين للنظر فيه.</p> <p>* تم تنقيح الدراسة حسب ملاحظات الديوان الوطني للتطهير وتم إحالة الملف معدل بتاريخ 30 جانفي 2019 في انتظار المصادقة عليه.</p>	<p>* انجاز المنطقة الصناعية الكاف الشرقية 10هك (القسط الثاني)</p>	<p>* في قطاع الصناعة: مضاعفة مساحة المناطق الصناعية</p>

\* تم اختيار مقاولة للقيام بأشغال التهيئة الداخلية للمنطقة و من المؤمل أن تنطلق هذه الأشغال خلال شهر جويلية 2020.

\* في انتظار فض الإشكال المتعلق بالربط الخارجي بالشبكة العمومية للتطهير للقيام بأشغال التهيئة الخارجية.

\* انجاز المنطقة الصناعية بالسرس على مساحة 55 هكتار ( بكلفة 15 م.د.)

\* تم انجاز الدراسات في النصف الأول من سنة 2018 بالنسبة للمنطقة الصناعية السرس

\* تم المصادقة على الدراسة المرورية بتاريخ 12 جوان 2019.

\* تم تقديم ملف مثال التهيئة التفصيلي للمنطقة الصناعية خلال شهر أكتوبر 2019 وفي انتظار المصادقة عليه من طرف إدارة التعمير بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

\* إنجاز حوالي 15 ألف م<sup>2</sup> كفضاءات صناعية في المعتمديات التي ليست لها مناطق صناعية تم رصد الاعتمادات الخاصة بالقسط الأول والذي يمكن أن يشمل 4500 متر مربع

\* التهيئة الجزئية للمنطقة الصناعية محطة المحاميد بتاجروين ( 10 هكتارات من جملة 44 هكتار ) بكلفة 6.920 م د

\* ستقوم الوكالة بإعلان طلب عروض دراسات التهيئة خلال شهر جوان 2020.

#### التهيئة الخارجية:

\* تم إمضاء و إرسال الاتفاقيات الممضاة مع الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه لربط المنطقة الصناعية بالشبكات الخارجية للكهرباء و الغاز و المياه إلى وزارة الصناعة

#### التهيئة الداخلية:

\* تمت المصادقة على ملف طلب العروض (DAO) حيث تم اختيار المقاول و بصدد انجاز أشغال التهيئة الداخلية بنسبة 40 % و من المتوقع استكمالها موفى 2020.

<p>* انطلقت دراسة الطريق السيارة بتاريخ 2018/06/27 و لمدة 20 شهر من طرف مكتب الدراسات STUDI/EGIS .</p> <p>* الممول : الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي FADES</p> <p>* تم عقد جلسة عمل بمقر ولاية الكاف في 2018/07/19 بحضور مكتب الدراسات و جميع الهياكل المعنية لتقديم برنامج دراسة الطريق السيارة و تحديد مسار الطريق كما يلي: الكاف تونس عبر مجاز الباب.</p> <p>* تم اختيار شركة " AYDROSOL FONDATIONS" لانجاز الأشغال الجيوتقنية الخاصة بالمشروع منذ 17 فيفري 2020.</p>	<p>- فتح العروض المالية للدراسات يوم 2017/10/18 لاختيار مكتب دراسات.</p>	<p>* البنية الأساسية: إنجاز الطريق السيارة تونس - الكاف والانطلاق في إعداد الدراسة الفنية والدراسات المفصلة المتعلقة بها.</p>
<p>* تم انجاز 57 كلم بنسبة 100% .</p> <p>* 43.3 كلم في مرحلة تقييم العروض و عرضها على لجنة الصفقات (6 مسالك).</p> <p>* بقية المسالك في طور دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسة الفنية.</p>		<p>* تهيئة 400 كلم من المسالك الفلاحية والريفية.</p>



<p>* تمت تهيئة المعبر الحدودي بقلعة سنان بتكلفة جملية تقدر بـ 2224.3 أ.د سنة 2019.</p> <p>* تمت تهيئة المعبر الحدودي بالساقية بتكلفة جملية تقدر بـ 3000 أ.د سنة 2019.</p>		<p>* العناية بالمعبرين الحدوديين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان بالتنسيق مع الأطراف المعنية.</p>
<p>* تم اختيار مكتب دراسات وانطلق في إعداد المرحلة الأولى من الدراسة لاختيار الموقع الجغرافي.</p>	<p>* رصد اعتماد بقيمة 300 أ د بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 وذلك لإعداد الدراسة المخصصة لإنجاز المخطط المديرى لبعث مناطق حرة بالمناطق الحدودية و المتضمنة إحداث منطقتين بكل من ساقية سيدي يوسف و قلعة سنان في ضوء الدراسة التي تم الشروع في إنجازها للغرض.</p>	<p>* في القطاع التجاري: إنجاز منطقتين للتبادل الحر بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان في ضوء الدراسة التي تم الشروع في إنجازها للغرض.</p>
<p>* <b>القسط الأول:</b></p> <p>- بصدد بناء قسم استعجالي و مخبر التحاليل و قسم الأشعة(81%)</p> <p>- تمت الموافقة على توفير اعتمادات ملحقة الصفقة و استئنفت الأشغال فيفري 2020.</p> <p>* <b>القسط الثاني:</b></p> <p>- إحداث 5 قاعات عمليات و قسم إنعاش في مرحلة إعداد ملف طلب العروض.</p>	<p>* إنجاز الأقساط المبرمجة مرة واحدة</p>	<p>* في القطاع الصحي : تحويل المستشفى الجهوي بالكاف إلى مستشفى جامعي</p>

<p>- تم تزويد مركز الصحة الأساسية بمعتمدية الطويرف بسيارة اسعاف رباعية الدفع مجهزة</p> <p>- تم دعم مركز رعاية الأم و الطفل بساقية سيدي يوسف بمعدات طبية و مكتبية.</p>		<p>* تطوير وتدعيم أسطول النقل الطبي الاستعجالي خاصة في المناطق الحدودية.</p>
<p>* مشروع تطهير مدينتي ساقية سيدي يوسف وقلعة سنان (بتكلفة جمالية محينة تقدر ب 30م د) : في طور إعداد الدراسات الأولية واختيار مواقع محطات التطهير :ممول من طرف التعاون التونسي الايطالي(برنامج تحويل الدين الايطالي)</p> <p>* مشروع تطهير مدينتي نبر والقلعة الخصبة ( تدعيم شبكات و انجاز محطتي تطهير بكلفة محينة تقدر ب 25 م.د ) في طور إعداد الدراسات الأولية واختيار مواقع محطات التطهير: ممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية (BAD)</p>		<p>* في القطاع البيئي: إحداث شبكات ومحطات تطهير بكل من نبر وساقية سيدي يوسف وقلعة سنان والقلعة الخصبة لفائدة 20000 ساكن.</p>
<p>وضع خطط لانجاز مراكز تحويل :</p> <p>- في انتظار تحديد مواقع المراكز المبرمجة مع البلديات المعنية لانطلاق الدراسات البيئية والفنية ونشر طلب العروض.</p> <p>- تم عقد جلسة عمل بمقر الولاية بتاريخ 2018/05/31 و ذلك للنظر في مشاريع التصرف</p>	<p>* وحدة معالجة وتثمين النفايات :</p> <p>تم تحديد الموقع بمعتمدية بورويس من ولاية سليانة و في انتظار انطلاق الدراسات الأولية.</p> <p>* مواقع مراكز التحويل :</p> <p>تم حاليا برمجة عدد 10 مراكز تحويل بولاية الكاف.</p>	<p>* إنجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات وعدد من مراكز التحويل لفائدة البلديات والتجمعات السكنية الريفية.</p>

في النفايات المنزلية و المشابهة.  
- عقدت جلسة بتاريخ 5 ماي 2020 بولاية سليانة  
للمصادقة على إحداث مشروع وحدة لمعالجة وتثمين  
النفايات بمنطقة سيدي بوروبيس.  
- بصدد استكمال الإجراءات الخاصة بتخصيص  
قطعة الأرض التي ستقام عليها الوحدة.



تقدم إنجاز القرارات الوزارية  
\*\* 29 ديسمبر 2015 \*\*

# قطاع الفلاحة

الإجراءات المقترحة/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	مدى تقدم الإنجاز	حالة التنفيذ	نص القرار
	توفر الإعتمادات اللازمة	<p>- تم تحديد موقع المشروع وإعداد الخطوط المرجعية وملف طلب العروض.</p> <p>- تم إعداد بطاقة بيانات نموذجية لوزارة النقل لإحداث مطار للإستعمال المحدود وصور فضائية للمواقع التي تم الاختيار عليها</p> <p>- في انتظار تحديد الطرف المسؤول على الإنجاز والمتابعة واستغلال المشروع وتوفير التمويلات</p>	مشروع لم ينطلق بعد	<u>إحداث مسلك للمداواة بالطائرات</u>

الإجراءات المقترح/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	مدى تقدم الإنجاز	حالة التنفيذ	نص القرار
		انطلقت الحفريات بمنطقة فرنة ببرقوتزويد منطقة البرامة بعد أن تعذر القيام بالحفر في المنطقة المبرمجة لأسباب عقارية (100%) <u>بئر سلبية</u>	تم التنفيذ	- بئر عميقة استكشافية "عين زريق" بكلفة 150أ.د.
		1- تعهد هياكل الماء الصالح للشرب "سيدي عامر قسط 1" واللوزة الجديدة" بكلفة 1700 أ د (98%)	قيد التنفيذ	-الماء الصالح للشرب بكلفة 4.180 أ.د -2.800أ.د عن طريق الهندسة الريفية -1.380أ.د عن طريق الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.
		2- تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب "قماطة" و"فج عباد" بكلفة 1100 أ د (100%) و(80%)		



نص القرار	حالة التنفيذ	مدى تقدم الإنجاز	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	الإجراءات المقترح/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات
- المناطق السقوية وجهر الأودية بكلفة 3225 أ.د.	تم الانجاز	1- جهر وادي المالح بكلفة 300 أ.د (100%)		
		2- إعادة تهيئة المنطقة السقوية بالخروبة بكلفة 365 أ.د (الخبزينة) (85%)		
- أشغال المحافظة على المياه والتربة بكلفة 3172 أ.د.	قيد التنفيذ	1- المشاريع التي تنجز عن طريق المقاولات		
	45%	إنشاء بحيرة جبلية بكسرى (45%)		
	100%	إنجاز مصا طب ميكانيكية (350 هك) (100%)		
	85%	اصلاح مجاري الاودية بب زكري 500 هك (85%)		
	100%	2- المشاريع التي تنجز عن طريق الحضائر : برنامج سنوي يتم تنفيذه بنسق عادي		
- أشغال الغابات بكلفة 3630 أ.د.	100%	1- المشاريع التي تنجز عن طريق المقاولات		
	100%	<u>تشجير غابي (130 هك) بجبل المرقب</u>		
	100%	<u>تهيئة 02 منابت غابية</u>		
	100%	<u>صيانة 10 كلم من المسالك الغابية بالكريب (لشبيب ، المرقب)</u>		
	100%	2- المشاريع التي تنجز/ط الإدارة : برنامج سنوي يتم تنفيذه بنسق عادي		

الإجراءات المقترحة/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	مدى تقدم الإنجاز	حالة التنفيذ	نص القرار
				إنجاز المشاريع التالية خلال الفترة 2017-2020 بكلفة 113720م.د:
	اعتراض مواطنين	1-إحداث سد على وادي تاسة دراسة تنفيذية جاهزة تحيين دراسة الجدوى الاقتصادية تم عرض قرض التمويل على مجلس نواب الشعب وتمت المصادقة	قيد التنفيذ	- مشاريع المياه والري الفلاحي بكلفة 296250 أ.د. - إحداث سد على وادي تاسة و3 سدود تلية بمكثروكسرى و2 سدود تلية (الدماييم- حلوفة) والرفع من طاقة خزن سد سليانة بكلفة 179000 أ.د.
		2- الرفع من طاقة خزن سد سليانة بصدد إعداد الدراسات الأولية والتفصيلية والتنفيذية.		
	في انتظار توفر التمويل اللازم	3- إحداث 5 سدود تلية الدماييم (يورويس) 60% الحلوفة (يورويس) 95% الرصيف (جبل منصور – معتمدية بوعراة) - الدراسة التفصيلية جاهزة - بصدد البحث عن التمويل الخنقة (معتمدية مكثروكسرى) - الدراسة التفصيلية جاهزة - بصدد البحث عن التمويل وادي الأنصارين (سليانة الجنوبية) - في مرحلة الدراسة - في انتظار توفر التمويل اللازم		

الإجراءات المقترحة/المزمع اتخاذها	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	مدى تقدم الإنجاز	حالة التنفيذ	نص القرار
		1- إعادة تهيئة مناطق سقوية عمومية حول الآبار العميقة :	قيد التنفيذ	- المناطق السقوية بكلفة 87260 أ.د.
		الدراسة التنفيذية للمناطق السقوية جاهزة وسيتم الإنجاز عن طريق مختلف البرامج بما في ذلك profits		
		2- جهر الأودية وتجفيف المناطق المتغدقة		
		تم اعداد الدراسات الأولية الإجمالية ((APS بالنسبة لسهل الكريب وقرعة حميص (الكريب) و سهل الروحية في إطار مشروع (PAPS) ممول عن طريق الإتحاد الأوروبي. وفي مرحلة اعداد الدراسة التنفيذية بالنسبة لجهر وادي المحيريق ببوعرادة)		
		3- الدراسات المائية		
		مشاريع تندرج في إطار البرامج السنوية للمندوبية ويتم تنفيذها بنسق طبيعي		
		<b>برنامج 2017 :</b>		
		- إحداث 02 آبار عميقة إستكشافية "الفراشيش-العازيزية" بمعتمدية الروحية <b>انجز بنسبة 100 %</b> و"النمايرية" بمعتمدية سليانة الجنوبية <b>نسبة انجاز 90%</b>		
		- إحداث حفر 03 آبار مراقبة : "الدخانية 1 مكرر" و"برج المسعودي" و"السوالم" (معتمدية الكريب و معتمدية مكث).	100%	
		1- تزويد مناطق ريفية بالماء الصالح للشرب	قيد التنفيذ	الماء الصالح للشرب
		"المصليبي" (معتمدية مكث) 100 (%) و "الدريجة" (معتمدية برقو) 60 (%) و "بوعبد الله" (معتمدية كسرى) 98 (%).		بكلفة 25950 أ.د.
		2- إعادة تهيئة منظومات التزويد بالماء الصالح للشرب		
		"سيدي عامر- قسط 2" (معتمدية سليانة الجنوبية) بمبلغ 1105 أ د (98%)	98 (%)	
		بالنسبة لمنطقة "أم الزيد" (معتمدية قعفرور) 573 أ د انطلاق الاشغال بتاريخ 18 ديسمبر 2017 (50 %)	50 (%)	
		3- تزويد مدارس ابتدائية ريفية بالماء الصالح للشرب 100%	100%	

نص القرار	حالة التنفيذ	مدى تقدم الإنجاز	الإشكاليات	الإجراءات
بكلفة 60796 أ.د. الغابات والمراعي	قيد التنفيذ	· البرنامج الوطني للغابات (الخزينة): يتم تنفيذها بنسق طبيعي في إطار البرامج السنوية		
		· مشروع التصرف المندمج في المشاهد بالمناطق الأقل نموا بولايات الشمال والوسط الغربي (BM + خزينة) pgip: في مرحلة الإنجاز		
		· برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الهشة pact (AFD + الخزينة): في مرحلة الإنجاز		
		· مشروع التصرف المندمج للغابات مرحلة ثالثة (ICA + خزينة) ينجز بنسق عادي		
- المحافظة على المياه والتربة بكلفة 37646 أ.د.	قيد التنفيذ	1- تهيئة مصبات الأودية: يتم تنفيذها بنسق طبيعي في إطار البرامج السنوية للمندوبية		
		2- التعهد والصيانة: يتم تنفيذها بنسق طبيعي في إطار البرامج السنوية للمندوبية		
		3- بناء بحيرات جبلية: (14 بحيرة جبلية جاهزة و9 في مرحلة الدراسة)		
		4- منشآت تغذية المائدة يتم تنفيذها بنسق طبيعي في إطار البرامج السنوية للمندوبية. 20 منشأة قيد التنفيذ في إطار مشروع profits		
		5- غراسة الزيتون حول البحيرات: مشاريع تندرج في إطار الخطة الجهوية للنهوض بقطاع الزيتون وانطلق تنفيذها بالنسق المطلوب بداية من سنة 2016.		

الإجراءات	الإشكاليات	مدى تقدم الإنجاز	حالة التنفيذ	نص القرار
				المشاريع الفلاحية بكلفة 167050 أ.د.
		مشروع النهوض بمنظومات الإنتاج الفلاحي بولاية سليانة PROFITS	قيد التنفيذ	• مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بكلفة 74 م.د.
		في مرحلة المصادقة على المرحلة الثانية من الدراسة profdil	قيد التنفيذ	• مشروع تنمية شمال ولاية سليانة بكلفة 80000 أ.د.

# قطاع الشباب والرياضة

نص القرار	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	الإشكاليات	الإجراءات
* إعادة تعشيب الملعب الرئيسي بالمركب الرياضي بسليانة مع توفير الاعتمادات اللازمة	بلدية سليانة الإدارة الجهوية للتجهيز	• تهيئة وصيانة حجرات الملابس : الكلفة 258 أ.د. • إعادة تعشيب الملعب وتهيئة : الكلفة 809 أ.د.	* نسبة الانجاز 100% بالنسبة للتعشيب وحجرات الملابس		
* بناء مدارج بالملعب الرئيسي بسليانة	وزارة الشباب والرياضة	تمت الدراسة بكلفة أولية تقدر بـ 1200 دينار	تم الإعلان عن طلب العروض 28 جانفي 2020		
تهيئة الملعب البلدي العروسة	وزارة الشباب والرياضة	انطلقت الأشغال بالملعب البلدي بالعروسة بتاريخ 01/6/2019 (تهيئة الملعب البلدي بالعروسة (السور+حجرات ملابس+تهيئة الأرضية) تعشيب اصطناعي انطلقت الأشغال يوم 29/07/2019 بكلفة أشغال تقدر بـ 447 الف دينار	التهيئة انتهت بنسبة 100% التشعيب: توقفت الأشغال		
تهيئة الملعب البلدي ببوعرادة (حجرات ملابس- سياج داخلي و خارجي- تهيئة الأرضية)	وزارة الشباب والرياضة	انطلقت الأشغال بتاريخ 15/12/2018 بكلفة أشغال تقدر بـ 780 أ.د وبلغت الأشغال 35%	الأشغال 60%		

# المناطق الصناعية



الإجراءات المقترح/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	المتابعة	حالة التنفيذ	نص القرار
		<p>1. المنطقة الصناعية بوعرادة 2 (القسط الأول) المساحة الجمالية:(10 هك ) انتهت أشغال الطرقات معدى الأرصفة وتم تزويد المنطقة بالماء والكهرباء. تم إنجاز شبكة الهاتف و التنوير العمومي</p> <p>2. المنطقة الصناعية بوعرادة 2 (القسط الثاني) المساحة الجمالية:(12,5 هك ) قامت الوكالة بإعلان طلب عروض ثاني خلال شهر ديسمبر 2019.</p>		<p>المنطقة الصناعية بوعرادة 2</p>
		<p>المساحة الجمالية : (20 هك) قامت الوكالة بإعداد مثال الأشغال الطبوغرافية المختلفة TPD دراسات التهيئة بصدد الإنجاز. تم تغيير الصبغة</p> <p>تم الانطلاق في الدراسات خلال شهر جويلية 2018</p> <p>تم إعداد الدراسة البيئية ودراسة السلامة والدراسة و المائية وهي بصدد المصادقة</p> <p>تم تعديل مثال الأشغال الطبوغرافية المختلفة و بصدد إستلام الملف الطبوغرافي.</p> <p>تم قبول الدراسة الجيوتقنية</p>		<p>المنطقة الصناعية بالعروسة :17 هك</p>

الإجراءات	الإشكاليات	المتابعة	حالة التنفيذ	نص القرار
		<p>المساحة الجمالية 10هك تم تزويد المنطقة بالتيار الكهربائي ( شبكة داخلية و خارجية). بصدد تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب إنطلاق أشغال التهيئة التكميلية في 17 سبتمبر 2016 لمدة 6 أشهر وقد انتهت الأشغال بالكامل . شرعت الوكالة بالتفويت في المقاسم</p>		<p>المنطقة الصناعية بالكريب 10:هك</p>
		<p>المساحة الجمالية : (15 هك ) قامت الوكالة بإعداد مثال الأشغال الطبوغرافية المختلفة ((TPD الوكالة بصدد دراسة تزويد المنطقة بالتيار الكهربائي و الماء الصالح للشرب. تمت إحالة ملف التقسيم للبلدية بتاريخ 26/05/2016 وطلبت القيام بملف السلامة وذلك طبقا لقرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 سبتمبر 2013. تم إعداد ملف السلامة وقد تحصلت الوكالة على المصادقة في شهر ماي 2017. تم تقديم ملف التقسيم خلال شهر مارس وفي شهر سبتمبر 2017 وقد تم إعادة الدراسة لملف التقسيم لممر الطريق الحزامية لمدينة سليانة داخل المنطقة الصناعية. قامت الوكالة بإقتناء العقار. ستقوم الوكالة بإعلان طلب عروض أشغال التهيئة و من المؤمل أن تنطلق الأشغال خلال شهر جويلية 2020</p>		<p>المنطقة الصناعية سليانة 17:3هك</p>
		<p>لم يتم الى حد الان احداث تمثيلية جهوية للوكالة</p>		<p>احداث تمثيلية لـ AFI خلال سنة 2016</p>

# قطاع التربية والتعليم

الإجراءات	الإشكاليات	المتابعة	حالة التنفيذ	نص القرار
		162 مدرسة ابتدائية تم ربطها بالإنترنت 31 مدرسة ابتدائية غير مربوطة بالإنترنت مدرسة إعدادية واحدة غير مربوطة بالإنترنت المدرسة النموذجية في المجال الرقمي: المدرسة الابتدائية حي الجمهورية سليانة ومدرسة البلهوان		ربط كل المدارس بالإنترنت خلال سنة 2016 وإنجاز على الأقل مدرسة نموذجية في المجال الرقمي بالولاية
	توفر الإعتمادات لتزويد الخزانات التي تم بناءها بالمدراس الابتدائية	تم تزويد المدارس الابتدائية ريفية بالماء الصالح للشرب	100%	تزويد 123 مدرسة ابتدائية بالماء خلال سنة 2016-2017

# قطاع الطرق والجسور

نص القرار	حالة التنفيذ	المتابعة	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	الإجراءات المقترح/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات
مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين الفحص وسليانة.	طريق تونس - الفحص + مضاعفة ط.و رقم 4 من الفحص الى سليانة . قسط عدد 03 ن ك 28.2 إلى ن ك 43.65 (15.45كم)	بصدد الإنجاز		تاريخ انتهاء الأشغال مارس 2020
	الإذن الإداري لانطلاق الأشغال: 24 أكتوبر 2016، صاحب الصفقة: SORUBAT كلفة المشروع: 31.948 م.د، الآجال التعاقدية: 22 شهرا. <b>نسبة تقدم الأشغال: 87%</b>			
	قسط عدد 04 ن ك 43.65 إلى ن ك 65 (21.35كم) الإذن الإداري لانطلاق: 31 أكتوبر 2016، صاحب الصفقة: ETEP كلفة المشروع: 36.448 م.د، الآجال التعاقدية: 26 شهرا. <b>نسبة تقدم الأشغال: 95%</b>			
تهذيب الطريق المحلية 719 ن ك 0 الى ن ك 33.8 برقو بكلفة 33865 أد (تحيين دراسة تهيئة الطريق المحلية رقم 719 الرابطة بين برقو وعين بوسعدية )	أنطلاق الأشغال 15 جانفي 2018 الكلفة : 31.125 م.د. الآجال التعاقدية 30 شهرا نسبة تقدم الأشغال 62%	بصدد الإنجاز	نسق بطيء بسبب عدم خلاص المقاوله	التسريع في خلاص مستحقات المقاوله

نص القرار	حالة التنفيذ	المتابعة	الإشكاليات	الإجراءات
تهذيب الطريق المحلية رقم 714 برج المسعودي حدود ولاية جندوبية ( 13 كلم)	انطلاق الأشغال: 01 نوفمبر 2016، صاحب الصفقة: EBM الكلفة: 8.010 م.د. الآجال التعاقدية: 28 شهرا نسبة تقدم الأشغال: 98%	انطلقت الأشغال بنسبة 98%		
تهذيب الطريق الجهوية رقم 60	تاريخ الإذن الإداري لانطلاق الأشغال: 01 نوفمبر 2016، صاحب الصفقة: EBM الكلفة: 10.401 م.د، الآجال التعاقدية: 28 شهرا. نسبة تقدم الأشغال: 95%	انطلقت الأشغال بنسبة 95%	إشكاليات عقارية على طول 300 متر	التسريع في إصدار أمر الانتزاع
تهيئة وتعبيد 129.5 كلم من المسالك الريفية بولاية سليانة على 7 أقساط بكلفة 44.006 م.د	* أقساط عدد 41 و 44 و 45 و 46 - انطلاق الأشغال: 26 سبتمبر 2016 - كلفة المشروع: 24.959 م.د. - الآجال التعاقدية: بين 15 و 20 شهرا - نسبة تقدم الأشغال: 50 %، * أقساط عدد 40 و 42 و 43 - انطلاق الأشغال: 10 أكتوبر 2016 - كلفة المشروع: 19.047 م.د. - الآجال التعاقدية: بين 15 و 22 شهرا - نسبة تقدم الأشغال: 50 %،	انطلقت الأشغال وبلغت بنسبة 50 % قسط عدد 46 أنجز بنسبة 100% قسط 40 و 42 أشغال متوقفة بسبب عدم خلاص مستحقات المقاوله		بالنسبة للأقساط 41 و 43 و 44 تم فسخ الصفقة وإعلان طلب عروض للمرة الثانية لدى المصالح المركزية للوارة بصدد إعداد تقرير فرز العروض

# قطاع الصحة العمومية



الإجراءات المقترح/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	المتابعة	حالة التنفيذ	الهيكل المعني بالتنفيذ	القرار
<b>مشاريع منجزة</b>					
-	-	القبول النهائي: 01/11/2018	منجز و مستغل	وزارة الصحة – المجلس الجهوي بسليانة	<b>بناء العيادات الخارجية</b> بالمستشفى المحلي بكسرى
		القبول الوقتي: 28/05/2019	منجز و مستغل	وزارة الصحة – المجلس الجهوي بسليانة	<b>تهيئة جناح العمليات بقسم التوليد و بناء قاعة للعمليات القيصرية</b> بالمستشفى الجهوي بسليانة
		القبول النهائي: 01/11/2018	منجز و مستغل	وزارة الصحة – المجلس الجهوي بسليانة	<b>بناء قسم استعجالي</b> بالمستشفى المحلي ببرقو
		القبول الوقتي: 12/2018	منجز و مستغل	وزارة الصحة – المجلس الجهوي بسليانة	<b>بناء مركز صحة أساسية صنف 3</b> ببوعرادة
		القبول الوقتي: 17/05/2018	منجز و مستغل	وزارة الصحة – المجلس الجهوي بسليانة	<b>تجديد الشبكة الكهربائية</b> بالمستشفى المحلي بكسرى
		القبول الوقتي: 23/05/2017	منجز و مستغل	وزارة الصحة – المجلس الجهوي بسليانة	<b>تجديد الشبكة الكهربائية</b> بالمستشفى المحلي بالروحية

الإجراءات المقترحة/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	المتابعة	حالة التنفيذ	الهيكل المعني بالتنفيذ	القرار
<b>مشاريع في طور الانجاز / القبول الوقتي</b>					
		تم تعزيز الجهة بـ: 13 ممرض أول. 4 مساعدين صحيين 14 فني سامي للصحة	تم الإنجاز		*تعزيز القطاع الصحي بـ12 فني سامي للصحة و09 ممرضين و4 مساعدين صحيين مع موفي سنة 2015 في إطار الانتداب.
		- تم مراسلة وزارة الصحة بملفات طلب العروض لمختلف المشاريع وفي انتظار الرأي الفني قبل إعلان طلب العروض.	في طور الدراسات	وزارة الصحة – المجلس الجهوي بسليانة	تهيئة وتوسعة المستشفى الجهوي بسليانة بكلفة 13,500 م.د :
- التسريع في عملية الربط من قبل المقاول STEG للمناول لل التسريع في تجهيز محطة الضخ الداخلية للمستشفى من قبل مقاول مشروع تهيئة الطرقات ومختلف الشبكات الأولية	- عدم الربط بالشبكات الداخلية للمستشفى فيما يتعلق بالكهرباء وتصريف المياه المستعملة.	تقدم الأشغال (80%) - تم توفير الإعتمادات 4000 ألف دينار عدد01 بقيمة 226 أ.د. - تم القبول الوقتي للمحول الكهربائي و مكوناته المعني بتغذية بناية العيادات الخارجية في 27/01/2020. - في طور عملية الحفر تحت الطريق قصد تمرير السلك الكهربائي الرئيسي من قبل المقاول المناول للشركة التونسية للكهرباء والغاز.	بصدد الإنجاز-انطلاق الأشغال: 12/07/2017 -مدة الأشغال: 210 يوم	وزارة الصحة – المجلس الجهوي بسليانة	تهيئة الطرقات الخارجية ومختلف الشبكات الأولية وبناء المحلات الفنية بالمستشفى الجهوي بسليانة (المرحلة التمهيدية من المخطط المديرى للمستشفى الجهوي بسليانة- الخط التمويلى :توسعة المستشفى الجهوي بسليانة)
	- عدم الربط بالشبكات الداخلية للمستشفى فيما يتعلق بالكهرباء وتصريف المياه المستعملة.	تم القبول الوقتي للأشغال في 07/06/2019.	منجز غير مستغل	وزارة الصحة – المجلس الجهوي بسليانة	- بناء قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بسليانة. (ضمن المخطط المديرى للمستشفى الجهوي بسليانة- الخط التمويلى :توسعة المستشفى الجهوي بسليانة)

الإجراءات المقترح/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	المتابعة	حالة التنفيذ	الهيكل المعني بالتنفيذ	القرار
-	عدم توفر RADIATEURS EN FONTE في السوق حسب المفاضلة	تقدم الأشغال (85%) لم يتم الحسم فيما يتعلق بقسط السوائل – التسخين المركزي .	بصدد الإنجاز-انطلاق الأشغال: 16/03/2018 -مدة الأشغال: 210	وزارة الصحة – المجلس الجهوي بسليانة	<b>بناء مقر للعيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بقعفرور</b>
-	-	-	تم القبول الوفي في 27/11/2019.	وزارة الصحة – المجلس الجهوي بسليانة	<b>توسعة قسم الإستعجالي بالمستشفى المحلي بالروحية</b>
<b>مشاريع في طور الدراسات/ إعلان طلب العروض</b>					
-	-	انطلاق الدراسة: 03/05/2016 مرحلة الدراسة: DAO الاعتماد المفتوح: 500 أد الكلفة المحيطة: 1315 أد الاعتمادات الناقصة: 620 أد	في طور الدراسات	وزارة الصحة – المجلس الجهوي بسليانة	<b>بناء مغارة ومطبخ بالمستشفى الجهوي بسليانة</b>
-	-	انطلاق الدراسة: 20/08/2016 مرحلة الدراسة: DAO min الاعتماد المفتوح: 500 أد الكلفة المحيطة: 1315 أد الاعتمادات الناقصة: 815 أد	في طور الدراسات	وزارة الصحة – المجلس الجهوي بسليانة	<b>بناء قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بسليانة</b>
-	-	انطلاق الدراسة: 03/05/2016 مرحلة الدراسة: DAO الاعتماد المفتوح: 700 أد الكلفة المحيطة: 980 أد الاعتمادات الناقصة: 280 أد	في طور الدراسات	وزارة الصحة – المجلس الجهوي بسليانة	<b>بناء قسم للتخدير و الإنعاش بالمستشفى الجهوي بسليانة</b>

الإجراءات المقترح/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	المتابعة	حالة التنفيذ	الهيكل المعني بالتنفيذ	القرار
-	-	انطلاق الدراسة: 03/05/2016 مرحلة الدراسة: DAO الكلفة المحيطة: 1150 أد الاعتماد المفتوح: 1150 أد	في طور الدراسات	وزارة الصحة - المجلس الجهوي بسليانة	بناء جناح إقامة لأمراض المعدة و تهيئة الأقسام الاستشفائية بالمستشفى المحلي بقعفرور
-	-	انطلاق الدراسة: 2016 مرحلة الدراسة: DAO الاعتماد المفتوح: 8900 أد الكلفة المحيطة: 13500 أد الإعتمادات الناقصة: 4600 أد	في طور الدراسات	وزارة الصحة - المجلس الجهوي بسليانة	مشروع توسعة المستشفى الجهوي بسليانة
إدراج المشروع ضمن خط تمويلي منفصل	ضمن الخط التمويلي توسعة المستشفى الجهوي بسليانة	-انطلاق الدراسة: 03/05/2016 -مرحلة الدراسة: DAO الكلفة المحيطة: 1095 أد -الاعتماد المفتوح: -	في طور الدراسات	وزارة الصحة - المجلس الجهوي بسليانة	بناء مخبر تشريح الخلايا المرضية بالمستشفى الجهوي بسليانة
إدراج المشروع ضمن خط تمويلي منفصل	ضمن الخط التمويلي توسعة المستشفى الجهوي بسليانة	-انطلاق الدراسة: 03/05/2016 مرحلة الدراسة: DAO الكلفة المحيطة: 1100 أد الاعتماد المفتوح: -	في طور الدراسات	وزارة الصحة - المجلس الجهوي بسليانة	بناء مخزن للأدوية بالمستشفى الجهوي بسليانة
إدراج المشروع ضمن خط تمويلي منفصل	ضمن الخط التمويلي توسعة المستشفى الجهوي بسليانة - تم رصد اعتماد إضافي بقيمة 3300 أد في قانون المالية 2019 للخط التمويلي - توسعة المستشفى الجهوي بسليانة	-انطلاق الدراسة: 03/05/2016 مرحلة الدراسة: DAO الكلفة المحيطة: 3252 أد الاعتماد المفتوح: -	في طور الدراسات	وزارة الصحة - المجلس الجهوي بسليانة	بناء قطب لطب الأم و الطفل مع مصعد بالمستشفى الجهوي بسليانة

الإجراءات المقترح/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	المتابعة	حالة التنفيذ	الهيكل المعني بالتنفيذ	القرار
إدراج المشروع ضمن خطة تمويلي منفصل	ضمن الخط التمويلي توسعة المستشفى الجهوي بسليانة	انطلاق الدراسة: 03/05/2016 مرحلة الدراسة: DAO الكلفة المحيطة: 560 أذ الاعتماد المفتوح: - أذ	في طور الدراسات	وزارة الصحة - المجلس الجهوي بسليانة	<b>بناء بيت غسيل بالمستشفى المحلي بقعفور</b>
إدراج المشروع ضمن خطة تمويلي منفصل	ضمن الخط التمويلي توسعة المستشفى الجهوي بسليانة	انطلاق الدراسة: 03/05/2016 مرحلة الدراسة: DAO الكلفة المحيطة: 270 أذ الاعتماد المفتوح: - أذ	في طور الدراسات	وزارة الصحة - المجلس الجهوي بسليانة	<b>بناء مسكن وظيفي بالمستشفى الجهوي بسليانة</b>
إدراج المشروع ضمن خطة تمويلي منفصل	ضمن الخط التمويلي توسعة المستشفى الجهوي بسليانة	-انطلاق الدراسة: 20/08/2016 -مرحلة الدراسة: DAO الكلفة المحيطة: 1000 أذ -الاعتماد المفتوح: - أذ	في طور الدراسات	وزارة الصحة - المجلس الجهوي بسليانة	<b>بناء قسم لطب المجاري البولية بالمستشفى الجهوي بسليانة</b>
إدراج المشروع ضمن خطة تمويلي منفصل	ضمن الخط التمويلي توسعة المستشفى الجهوي بسليانة	-انطلاق الدراسة: 03/05/2016 مرحلة الدراسة: DAO الكلفة المحيطة: 671 أذ الاعتماد المفتوح: - أذ	في طور الدراسات	وزارة الصحة - المجلس الجهوي بسليانة	<b>بناء وحدة للعلاج الطبيعي بالمستشفى الجهوي بسليانة</b>
-	-	-انطلاق الدراسة: 2017 مرحلة الدراسة: APD الكلفة المحيطة: 475 أذ الاعتماد المفتوح: -400 أذ	في طور الدراسات	وزارة الصحة - المجلس الجهوي بسليانة	<b>تأهيل شبكة السوائل الطبية بالمستشفى الجهوي بسليانة</b>
-	-	-انطلاق الدراسة: 2017 مرحلة الدراسة: DAO الكلفة المحيطة: 810 أذ الاعتماد المفتوح: -أذ	في طور الدراسات	وزارة الصحة - المجلس الجهوي بسليانة	<b>تجهيز المركز الوسيط بسليانة بشبكة التسخين المركزي</b>

الإجراءات المقترح/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	المتابعة	حالة التنفيذ	الهيكل المعني بالتنفيذ	القرار
-	-	انطلاق الدراسة: ديسمبر 2019 مرحلة الدراسة: DAO الكلفة المحيطة: - أد الاعتماد المفتوح: -400 أد	في طور لانطلاق في الدراسات	وزارة الصحة - المجلس الجهوي بسليانة	صيانة مركز رعاية الأم و الطفل بالمستشفى المحلي بقعفور
-	-	-انطلاق الدراسة: 03/05/2019 -مرحلة الدراسة: APD -الكلفة المحيطة: -120 أد -الاعتماد المفتوح: 80 أد	في طور الدراسات	وزارة الصحة - المجلس الجهوي بسليانة	تركيز مولد كهربائي بالمستشفى المحلي ببوعرادة
-	-	-انطلاق الدراسة: 20/08/2016 -مرحلة الدراسة: DAO -الكلفة المحيطة: 300 أد -الاعتماد المفتوح: - 205 أد	في طور تحيين إعمادات التعهد و إمضاء الصفقة	وزارة الصحة - المجلس الجهوي بسليانة	صيانة الشبكة الكهربائية و معدات المحول و اقتناء مولد كهربائي بالمستشفى المحلي ببرقو
تم البحث عن قطعة ارض اخرى	عدم صلوحية قطعة الأرض التي انطلقت على أساسها الدراسات إشكال عقاري	-انطلاق الدراسة: 03/05/2016 -مرحلة الدراسة: DAO -الكلفة المحيطة: 250 أد -الاعتماد المفتوح: -200 أد	في طور الدراسات <b>الدراسات متوقفة</b>	وزارة الصحة - المجلس الجهوي بسليانة	إعادة بناء مركز الصحة الأساسية صنف 02 بالزواكرة معتمدية مكنر
-	-	-انطلاق الدراسة: 2017 -مرحلة الدراسة: APD -الكلفة المحيطة: 360 أد -الاعتماد المفتوح: -200 أد	في طور الدراسات	وزارة الصحة - المجلس الجهوي بسليانة	إعادة بناء مركز الصحة الأساسية صنف 02 بالفضول معتمدية كسرى
-	-	-انطلاق الدراسة: 27/01/2020	في طور الانجاز	وزارة الصحة - المجلس الجهوي بسليانة	صيانة و تهينة السياج الخارجي بالمستشفى المحلي بكسرى

## مشاريع وطنية

الإجراءات المقترح/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	المتابعة	حالة التنفيذ	الهيكل المعني بالتنفيذ	القرار
		<p><b>الكلفة المحيطة:</b> 52.3 مليون ديناراً بناء و تجهيز (جوان 2019). منها 37.8 مليون ديناراً بناء و 14.5 مليون ديناراً تجهيزات.</p> <p><b>الوضعية المحيطة:</b> - تم إعداد تقرير فرز العروض (المصممين) و عرضه على أنظار اللجنة العليا للصفقات بتاريخ 11 جوان 2019 و تمت المصادقة في 11 أوت 2019. - تم إعداد الملف المرجعي و كراس الشروط لاختيار ائتلاف تونسي كويتي في أكتوبر 2019 و تم إرساله للصندوق الممول في 17 أكتوبر 2019 من طرف وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة المشاريع الممولة بقروض و هبات خارجية التابعة لوزارة الصحة و هو حالياً في انتظار رأي الصندوق الممول.</p> <p><b>الأجال المحيطة:</b> - انطلاق الدراسات : مارس 2020 (تم تجاوز الأجل المحددة في محضر جلسة المجلس الجهوي للصحة والتي حددت بموفى سنة 2019). - الانتهاء من الدراسات و الإعلان عن طلب عروض الأشغال : موفى سنة 2020. - الانطلاق في الأشغال: خلال السداسي الثاني لسنة 2021. - الانتهاء من الأشغال: موفى سنة 2023 (الأجل المبدئية للأشغال 24 شهراً)</p>	الدراسات	<p>- الإشراف على المشروع: - وحدة التصرف حسب الأهداف .</p> <p>- الإدارة العامة للبنى التحتية - المديرية بوزارة التجهيز.</p>	<p><b>بناء مستشفى جهوي صنف ب بمكرر</b></p>
		<p><b>الوضعية المحيطة:</b> - تضمين المشروع ضمن مشروع تأهيل و تجهيز أقسام طبية بالمستشفيات الممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حيث يتكون هذا البرنامج من 17 قسم استعجالي و 04 أقسام علاجية و تطوير 02 مستشفيات جهوية بكل من قبلي و تطاوين، ويعتبر مشروعاً واحداً وفقاً لبنود الاتفاقية.</p> <p>- تم إعداد كمل الملف المرجعي لكل المكونات و تم إعداد الكراس المرجعي لاختيار المصممين التونسيين و كذلك نص طلب العروض بالتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز و الإسكان و تم طلب الرأي المسبق للصندوق الممول منذ 21/06/2019 .</p> <p>-تعمل كل من وزارة الصحة و وزارة التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي للتسريع لدى الصندوق الممول.</p> <p><b>الأجال المحيطة:</b> - انتهاء الدراسات: موفى شهر جانفي 2021. - انطلاق الأشغال: موفى سنة 2021.</p>	الدراسات	<p>- الإدارة العامة للبنى التحتية - المديرية بوزارة التجهيز.</p>	<p><b>تأهيل قسم الإستعجالي بمركز الصحة الأساسية بالعروسة</b></p>

نص القرار	حالة التنفيذ	المتابعة	الإشكاليات	الإجراءات
		تدعيم الجهة بالتجهيزات التالية:		
آلة ترقيم - Système de numérisation d'image الصور الطبية		- غير منجز		
آلة رقمية لتصوير 1 - Angiographenumérique الأوعية لأمراض العيون 1	تم الإنجاز	تم التسليم-		
1 - Appareil de désinfection des endoscopes آلة لتعقيم المناظير 1	تم الإنجاز	- تم التسليم		
مناظير (للشعب الهوائية 02 fibroscopes -2 bronchique + gastrique وللجهاز الهضمي)	تم الإنجاز	- تم التسليم		
مجهر لجراحة 01 - microscope opératoire 01 الأذن والأنف والحنجرة		- في طور الفرز		
02 آلي تصوير بالأشعة		- في طور الإعداد		
07 وحدات لطب الأسنان.		4 في طور التسليم و3 تم تسليمها لكل من مستشفى الروحية وسيدي بوروبيس ووحدة الطب المدرسي .		
آلة كشف بالصدى لأمراض النساء والتوليد		في طور الإعداد		
02 آلة لتصفية الدم.	تم الإنجاز	تم التسليم		
15 آلة تعقيم.	تم الإنجاز	تم التسليم		
دعم أسطول السيارات بـ 3 سيارات خفيفة و3 سيارات إسعاف و5 سيارات رباعية الدفع.	تم الإنجاز	تم التسليم		



# قطاع الثقافة

الإجراءات	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	المتابعة	حالة التنفيذ	القرار
في انتظار فتح الاعتماد المطلوب لدعوة المقول الانطلاق في الاشغال.	يتمثل الإشكال في عدم توفر الاعتماد المطلوب في حدود 448 لدعوة المقابلة للانطلاق في الأشغال (من طرف وزارة الثقافة)	تمت الدراسة الفنية وإعداد تقرير فرز العروض ,طلب عروض غير مجدي لعدم توفر الاعتماد تبعا لبطاقة اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات بتاريخ 08/05/2019.	تمت الدراسة الفنية وإعداد تقرير فرز العروض	انجاز مشروع صيانة وتهيئة المعلم الأثري وقرية "زامة" من ولاية سليانة مع توفير الاعتمادات الإضافية عن طريق ميزانية الدولة بكلفة 448 الف دينار
تسريع نسق الدراسات وتوفير الإعتمادات (ترسيم كلفة انجاز المتحف الأثري بسليانة على ميزانية 2020)	عدم توفر الإعتمادات ببطء في إعداد الدراسات الفنية الضرورية	تم استكمال الدراسات الفنية والعلمية بصدد الاعداد للمناظرة الوطنية في التصميم مع عمادة المهندسين	تم استكمال الدراسات الفنية والعلمية بصدد الاعداد للمناظرة الوطنية في التصميم مع عمادة المهندسين	انجاز مشروع المتحف الجهوي بسليانة بتكلفة 7 م د

الإجراءات	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	المتابعة	حالة التنفيذ	القرار
		بصدد إعداد أذن التزود للرفع الطبوغرافي والسبر الجيولوجي ومكتب المراقبة سيتم النظر في الدراسة التمهيدية الموجزة يوم 6/2/2020		إحداث مكتبة عمومية بالأخوات بكلفة 800 الف دينار
ترسيم المشروع ضمن ميزانية التنمية	تم اقتراح ترسيم المشروع ضمن ميزانية 2018 إلا أن وزارة المالية لم توافق عليه.	الكلفة التقديرية للمشروع 1000 أد	بصدد البحث عن قطعة أرض	بناء مكتبة معلوماتية بسليانة
توفير عقار	بصدد البحث عن قطعة ارض تكون وظيفية للمشروع	- أفادت وزارة الشؤون الثقافية بأنه تم اقتراح المشروع بمخطط التنمية 2016-2020 بكلفة 2000 أد		بناء دارثقافة بكسرى بكلفة 2 مليون دينار
	في انتظار الإعلان عن المناظرة المعمارية	أفادت وزارة الشؤون الثقافية بأنه تم اقتراح المشروع بمخطط التنمية 2016-2020 بكلفة 3000 أد	تم إحالة كراس قانون المناظرة المعمارية للمصادقة من قبل عمادة المهندسين بتاريخ 10/2019/ 7	إحداث مركز الفنون الركحية
		أفادت وزارة الشؤون الثقافية بأنه تم اقتراح المشروع بمخطط التنمية 2016/2020 بكلفة 1500 أد وبصدد معاينة الأرض المجاورة للمكتبة الجهوية	في انتظار اعداد الملف المرجعي للانطلاق في الدراسات.	إحداث معهد جهوي للموسيقى
	عدم توفر الإعتمادات	تم إعداد الملف العلمي والمالي الخاص بتهيئة المتحف مع العلم أن الأشغال تنجز من طرف المعهد الوطني للتراث.		دعيم وترميم متحف مكثر بكلفة 1750 دينار

# قطاع التهذيب والتجديد العمراني

نص القرار	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	الإجراءات المقترحة
مواصلة تهذيب وإدماج الأحياء السكنية التالية:					
حي ابن خلدون ببوعrada 11 م د	(وكالة التهذيب و التجديد العمراني)	*مشروع تهذيب حي ابن خلدون ببوعrada :- انتهت الأشغال بنسبة 100%			
حي الملعب و صيار بمكتر 3.9 م د	(وكالة التهذيب و التجديد العمراني)	*مشروع تهذيب احياء الملعب و صيار بمكتر انتهت الأشغال بنسبة 100% بنية أساسية تحسين سكن 95% قاعة رياضات وملعب حي في مرحلة الدراسات			
*مشروع تهذيب احياء الطيب المهيري والنزهة بسليانة : بنية أساسية وتحسين سكن انتهت الاشغال بنسبة 100% بناء فضاء صناعي في مرحلة الدراسة التمهيديّة الوقتية					
*مشروع تهذيب احياء الطيب المهيري والنزهة بسليانة : 6.338 م د					

نص القرار	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	الإشكاليات	الإجراءات
تهذيب 8 أحياء بكلفة 7.3 مليون دينار خلال سنوات 2017-2020 البرنامج الخصوصي للحد من التفاوت الجهوي	وزارة التجهيز و الاسكان (وكالة التهذيب و التجديد العمراني)	بخصوص المشاريع المبرمجة سنة 2016 6 احياء:			
		6 احياء بكلفة 3.85 م.د: حي الانس بالروحية: انتهت الأشغال 100%			
		تهذيب 600 مسكن بحي ابن خلدون بقرقوف لفائدة 3000 ساكن بكلفة 1600 دينار تم تعويضه بحي المنجي سليم 30% تقدم الأشغال			
		حي الزهور والبساتين بقعفور: انتهت الأشغال بنسبة 100%			
		حي النصر بالكريب بكلفة 500 ا.د: قررت البلدية انجاز المشروع بنفسها			
		حي المنجي سليم مكثري في مرحلة الفرز الفني لتعيين المقاول			
		حي ابن خلدون العروسة انتهت الأشغال 100%			
		حي الجامع بالعروسة: انتهت الأشغال 100%			
		120 مسكن فردي ببوعرادة			
		بناء 120 سكنا اجتماعيا ببوعرادة في اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بكلفة قدرها 6 م دينار خلال سنوات 2017-2020	وزارة التجهيز و الاسكان	تم إسناد الصفقة وانطلقت الأشغال بتاريخ 25 أكتوبر 2018	
تهذيب 16 حي بكلفة 35.2 مليون دينار خلال سنوات 2017-2023	وزارة التجهيز و الإسكان (وكالة التهذيب و التجديد العمراني)				

# الغاز الطبيعي

الإجراءات المقترحة/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	المتابعة	المعني بالتنفيذ	السنة	نص القرار
		انطلقت الاشغال لمد الأنبوب الرئيسي لتزويد معتمديات شمال الولاية	الشركة التونسية للكهرباء والغاز اقليم سليانة	2018	تزويد معتمديات: العروسة- قعفرور- بوعرادة -سليانة- الكريب بالغاز الطبيعي .
				2020	باقي المعتمديات
توفير الإعتمادات	عدم توفر إعتمادات	تمت الدراسات الاولية بكافة المعتمديات تم اجراء المعاينة الميدانية مع مصالح الفلاحة تم اعداد الصفحة في انتظار فتح الإعتمادات.	الشركة التونسية للكهرباء والغاز اقليم سليانة/ التنسيق مع المجلس الجهوي و مندوبية الفلاحة .		كهربة 279 بئرا سطحيا بكامل معتمديات الولاية مساهمة الشركة 1170 دينار مساهمة المجلس الجهوي 1596 دينار مساهمة المنتفعون 764 دينار



# قطاع النقل

نص القرار	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	الإجراءات المقترحة/المزمعاتخاذها لتجاوز الإشكاليات
إحداث شركة جهوية للنقل	وزارة النقل	تم الإنجاز	انعقدت الجلسة التأسيسية العامة واجتمع مجلس لادارة بتاريخ 30 اوت 2017 وتم تنصيب الرئيس المدير العام.		
إحداث خط حديدي يربط سليانة بالأخوات	وزارة النقل(الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية)	- مشروع مبرمج بمخطط التنمية 2016-2020.	تم الشروع في المرحلة الثانية التي تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية بتاريخ 28 ديسمبر 2017 وتم اسلام التقرير النهائي في 27 فيفري 2018 في انتظار المصادقة عليه	ارتفاع الكلفة للفرضيات الثلاث وعدم توفر الاعتماد	توفير الإعتمادات
مشروع بناء مركز مندمج للفحص الفني ورخص السياقة	وزارة النقل (الوكالة الفنية للنقل البري)	تم الإنجاز	يتكون المشروع من فضاء للفحص الفني وفضاء لرخص السياقة ومسكن وظيفي.		
بناء ورشة صيانة للحافلات بسليانة 1,7 مليون دينار	وزارة النقل(الشركة الجهوية للنقل بسليانة)		في مرحلة طلب العروض		

# قطاع الشؤون الاجتماعية

الإجراءات المقترحة/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات	الإشكاليات	المتابعة	حالة التنفيذ	المعني بالتنفيذ	نص القرار
		في انتظار تحويل الإعتمادات	توسعة المركز النموذجي لتعليم الكبار بسليانة وبناء مقر وحدة جهوية لتعليم الكبار في نفس البناية تم إبرام اتفاقية مع منظمة DVV الألمانية لتوسيع المركز بإعتمادات في حدود 60 الف دينار	وزارة الشؤون الاجتماعية التربية والمرأة والأسرة و الطفولة	إعداد برنامج خصوصي لرفع الأمية الاجتماعية وزارة التربية والمرأة والأسرة و الطفولة
	تم إحداث مراكز محلية متعددة المهارات بالشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة	إحداث مراكز نموذجية في 5 معتمديات (الكرب , بوعرادة, العروسة , سليانة, مكثر)			
	تم إبرام اتفاقية مع المندوبية الجهوية للمرأة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية	دراسة إمكانية إبرام اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الجهوي للمرأة والاتحاد الجهوي للفلاحين لمزيد استقطاب الدارسين			
	محدثة والمطلوب إعادة إحياء نشاطها وتم إحداث جمعيات محلية بكل من كسرى والروحية	إحداث جمعية جهوية موفى سنة 2018 إحداث جمعية محلية وتعميم التجربة على بقية المعتمديات موفى سنة 2018			
	يتم إسنادها سنويا بالتنسيق مع الإدارة العامة لمحو الأمية وتسرف عن طريق اللجنة الجهوية لتضامن الإجتماعي	إعداد منظومة الحوافز المالية والعينية على مستوى الجهة انطلاقا من هذه السنة الدراسية لمزيد استقطاب الدارسين			

# التطهير

الإجراءات المقترح/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	المتابعة	حالة التنفيذ	نص القرار
		<p>مشروع تحويل المياه المعالجة والمستعملة وتدعيم الشبكة بمدينة مكثرتم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 14/12/2018. وبكلفة 2200 دينار</p> <p>مشروع تحويل المياه المعالجة والمستعملة وتدعيم الشبكة بمدينة مكثرتم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 14/12/2018. وبكلفة 2200 دينار</p> <p>مشروع بناء وتجهيز محطات الضخ وتهذيب وتمديد الشبكة بمدينة مكثرتم انطلقت الأشغال بتاريخ 07/08/208 نسبة تقدم الإنجاز 35% بكلفة 4500 دينار</p> <p>إنجاز محطة تطهير بمكثرتم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 14/12/2018. بكلفة 5320 دينار</p>	<p>مشروع تحويل المياه المعالجة والمستعملة وتدعيم الشبكة بمدينة مكثرتم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 14/12/2018. وبكلفة 2200 دينار</p> <p>مشروع بناء وتجهيز محطات الضخ وتهذيب وتمديد الشبكة بمدينة مكثرتم انطلقت الأشغال بتاريخ 07/08/208 نسبة تقدم الإنجاز 35% بكلفة 4500 دينار</p> <p>إنجاز محطة تطهير بمكثرتم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 14/12/2018. بكلفة 5320 دينار</p>	<p>مشروع تطهير مدينة مكثرتم وذلك بإنجاز شبكة تحويل المياه المعالجة والمستعملة وتدعيم الشبكة وذلك بمد 13 كلم من القنوات وربط 200 مسكنا بالشبكة العمومية للتطهير بكلفة جملية تقدر بـ 2.5 مليون دينار.</p>
		<p>تم الإنتهاء من إعداد الدراسة الأولية وإختيار الموقع لإحداث محطة تطهير.</p>	<p>بصدد الدراسة</p>	<p>برنامج توسيع شبكات التطهير بمدينة الكريب وذلك بمد 12 كلم من القنوات وربط 927 مسكنا بالشبكة العمومية للتطهير بكلفة جملية تقدر بـ 2,9 مليون دينار والممول من طرف الوكالة اليابانية للتنمية . JICA</p>
		<p>إنجاز محطة تطهير بمكثرتم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 14/12/2018.</p>	<p>تم الإنجاز 100% بالنسبة الى محطة التطهير مكثرتم</p> <p>تم الإنجاز 100% بالنسبة الى محطة التطهير بوعرادة</p>	<p>إنجاز محطتي تطهير بكل من بوعرادة و مكثرتم بكلفة جملية تقدر بـ 10 مليون ديناراً.</p>

نص القرار	حالة التنفيذ	المتابعة	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	الإجراءات المقترحة/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات
الأشغال المستعجلة لتهديب محطة تطهير سليانة والممول من طرف الوكالة اليابانية للتنمية ( JICA )	بلغت الأشغال نسبة 10%	تم إمضاء الصفقة وقد إنطلقت الأشغال منذ شهر نوفمبر 2016 - مدة الأشغال 18 شهرا، مع العلم أن الأشغال تحتوي على : (تركيز وحدة تجفيف ميكانيكية + بناء وتجهيز محطة ضخ بمحطة التطهير بسليانة). بصدد القيام بإجراءات فسخ الصفقة.		
تأهيل محطة تطهير سليانة بكلفة تقدر بـ 8,2 مليون دينار في إطار برنامج تأهيل منشآت التطهير بـ 10 ولايات والممول من طرف الوكالة اليابانية للتنمية ( JICA ).	بصدد الإعلان عن طلب العروض.	بصدد الإعلان عن طلب العروض.		
تهديب شبكات التّطهير بمدن سليانة و الكريب و بوعرادة وذلك بمد 11 كلم من القنوات بكلفة تقدر بـ 1,8 مليون دينار والممول من طرف الوكالة اليابانية للتنمية ( JICA ).		تمت المصادقة على ملف فرز العروض لانتقاء مكتب دراسات ومن المنتظر الانطلاق في الدراسات خلال الثلاثي الثاني من سنة 2017 لمدة 18 شهرا أ		
تطهير (تبني) مدن الكريب برقو كسرى الروحية.		تطهير مدينة الكريب تم الإنتهاء من إعداد الدراسة الأولية واختيار الموقع. تطهير مدينة الروحية بصدد النظر في تحديد موقع محطة التطهير مع مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة. تطهير مدينة برقو تم الإنتهاء من إعداد الدراسة الأولية واختيار الموقع. تطهير مدينة كسرى سيتم تمويل المشروع في إطار برنامج تطهير 80 بلدية		

# التعليم العالي

نص القرار	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	الإجراءات المقترح/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات
بناء قسم الهندسة المدنية بكلفة 1300 الف دينار	الإدارة الجهوية للتجهيز بسليانة	انطلقت الأشغال بتاريخ 27/08/2018 وبلغت 90 %	انطلقت الأشغال بتاريخ 27/08/2018 وبلغت 90 %		
توسعة المبيت الجامعي بسليانة بكلفة 6,6 م د	وزارة التعليم العالي	انطلقت الأشغال بتاريخ 08/12/2018 وبلغت 50 %	تم إسناد الصفقة بكلفة 6,673 مليون دينار		

# العدل

نص القرار	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	الإجراءات المقترح/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات
إحداث محكمة استئناف بسليانة	الإدارة الجهوية للتجهيز بسليانة المجلس الجهوي بولاية سليانة	في انتظار صدور امر حكومي لإحداث محكمة استئناف بسليانة	صدر الامر الحكومي المتعلق بإحداث محكمة استئناف وتم كراء محل بمدينة سليانة وفتحت محكمة الإستئناف للعموم وانجز المشروع بنسبة 100 %	إدراج بناء محكمة إستئناف بميزانية وزارة العدل الجهة بصدد البحث عن عقار لبناء مقر للمحكمة بعدل أن تم تخصيص عقار يمسح 2000 م 2 بالحي الإداري كما تم اقتراح بناء المحكمة بعقار كائن على الطريق الجهوية رقم 73	



## أهم المشاريع المنجزة وبصدد الانجاز خلال الفترة 2016-2020.

- حفر 06 آبار عميقة.
- الشروع في تهيئة المنطقة السقوية بعين القرشية (100 هك).
- تجفيف المنطقة السقوية التوتة (177 هك).
- التشجير الغابي على مساحة 974 هك.
- الانطلاق في تنفيذ مشروع المحاور لتحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي.
- تزويد حوالي 7770 عائلة بالماء الصالح للشرب.
- تهيئة وتعبيد 168,1 كلم، تدعيم 10 كلم وصيانة 80 كلم من المسالك الريفية.

- بناء جسر على وادي لحمار بالطريق الجهوية 29 وجسر على وادي مجردة بالطريق الجهوية 131.

- حماية مدينة نفزة من الفيضانات وتهديب شبكة مياه السيلاان بمدينة باجة.

- تهذيب أحياء العرقوب (مجاز الباب)، الزياتين (تبرسق)، المنظر الجميل وعين الباردة (باجة الشمالية).

- اقتناء 16 حافلة نقل بين المدن، 36 حافلة مدرسية نقل حضري و22 حافلة مزدوجة نقل حضري.

- توسعة وصيانة عدد من المؤسسات التربوية.

- إعادة هيكلة مركز التدريب المهني بتيبار (القسط2)

- بناء وحدة لتأهيل المعاقين بباجة.

- تعويض آلة مفراس للمستشفى الجهوي بباجة.

- توسعة مركز الصحة الأساسية بوشتاتة وتركيز وحدتي أشعة وتحاليل  
طبية.

- تهيئة وتعشيب وتنوير ملاعب نفزة، تستور، عمدون ومجاز الباب.

- بناء مركب طفولة بزهره مدين وباجة الشمالية.

-بناء دار ثقافة بتستور.

- بناء مكتبة عمومية بسيدي إسماعيل.

- بناء فضاء تنشيط بالمركب الثقافي بباجة.

## جندوبة

### أهم المشاريع المنجزة والتي هي بصدد الإنجاز

القطاع	بيان المشروع	الكلفة (أ.د.)	سنة الإدراج في الميزانية	نسبة تقدم الإنجاز (%)
الماء الصالح للشرب	مشروع المحاور الكبرى لتحسين نسبة التزود بالريف	86000,000	2009	98%
	تزويد المعبر الحدودي بملولة بالماء الصالح للشرب	1700,000	2017	70%
	تزويد مركب سيدي عسكر بمعمدية طبرقة	9300,000	2015	74%
التنوير	ربط المنطقة الصناعية الإرتياح(1) بالتيار الكهربائي	1400,000	2012	100%
بناء الجسور	- أشغال إتمام بناء جسر مضاعف على وادي مجردة بالطريق الوطنية رقم 17 ن/ك 500+65	10687,171	2010	100%
	أشغال بناء جسر على وادي مجردة GP 17 (القديمة)، القنطرة الكحلة مع تدعيم الطريق إلى حدود المحول قسط عدد 03 السكة الحديدية	7221,251	2014	47%
	أشغال بناء جسر بالطريق الوطنية 17 ن ك 66+187 - على السكة الحديدية قسط عدد 4	8246,727	2014	58%
	المسالك الريفية			
	تهينة 91.7 كلم من المسالك الريفية بولاية جندوبة برنامج 2015 (9 اقساط)	17 936,772		100%

70%	2013	6 274 ,736	إنجاز أشغال بناء مسبح مغطى بجنودبة.	الشباب والرياضة
100%	2014	1200,000	تهيئة المركب الرياضي الدولي بعين دراهم	
%50	2016	2000,000	بناء قاعة متعددة الاختصاصات بطبرقة	
100%	2013	3000,000	بناء قاعة للرياضة الجماعية ببوسالم	
100 %	2013	75 000,000	بناء وحدة للمعالجة بالأشعة بالمستشفى الجهوي بجنودبة	الصحة
100%	2012	1 800,000	تهذيب الشبكة الرئيسية للتطهير بمدينة جنودبة	مشاريع ديوان التطهير
52%	2017	900,000	أشغال تطهير 03 أحياء	
50%	2016	1 457,000	تطهير قرية ورغش بغار الدماء	
60%	2015	4372,012	أشغال بناء منطقة حرفية	الصناعات التقليدية
100%	2015	5 100,000	تهذيب محطة الضخ بالريابنة	مشاريع الزراعة
80%	2016	6 001,000	تهيئة مسالك فلاحية (4 اقساط)	



## أهم المشاريع المنجزة و بصد الانجاز بالقطاع العام:

### ❖ البنية التحتية :

- مشروع الربط بشبكة الغاز الطبيعي:
  - \* معتمدية تاجروين: 80%
  - \* معتمدية الجريصة: 95%
  - \* معتمدية ساقية يوسف: 95%
- المنطقة الصناعية وادي الرمل بنسبة 100% سنة 2018.
- تهذيب الطريق الجهوية 60 على طول 16 كلم بتكلفة 11 م.د.
- تشيئة الطريق الوطنية رقم 5 على طول 5 كلم بتكلفة 12.5 م.د.
- تهيئة وتعبيد 19 مسلك ريفي بطول 140 كلم

### - البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي:

- \* الانتهاء من انجاز 50 مسكن بمعتمدية ساقية سيدي يوسف .
- \* الانتهاء من انجاز 78 مسكنا بالشريشي من معتمدية الكاف الشرقية.
- \* الانتهاء من انجاز 27 مسكنا بمعتمدية تاجروين.

## ❖ الفلاحة:

- بصدد انجاز المنطقة السقوية أولاد بوغانم-المحجوبة حول سد سراط  
بنسبة تقدر بـ93%

ومن المتوقع بلوغ 100% موفى 2020

- الانتهاء من بناء سد على واد سراط و بصدد انجاز سد ملاق  
العلوي 20%.

- إعادة تهيئة المنطقة السقوية بنبر على مساحة 363 هك.

- تم كهرة 140 بئر بقلعة سنان من بين 924 بئر سطحي خلال  
سنة 2019.

- تزويد 06 تجمعات سكنية بالماء الصالح للشرب (5840 منتفع) بكل من  
المناطق التالية دوار سراط- الحمائزية بالقلعة الخصبة والغواري سيدي  
بركات -الدهماني والقل بساقية سيدي يوسف والقواصدية-القرائدية  
بالدهماني وسركونة الناظور بالكاف الشرقية وأولاد زيد الحمائزية- أولاد  
صالح- أولاد مباركة والوسلاتية بالقصور بتكلفة جمالية تقدر بـ7.850  
م.د

- تزويد 21 مؤسسة تربية متواجدة بالوسط الريفي .

- احداث 5 بحيرات جبلية على اودية زندانة وفج التمر والقطار وعين  
شرشارة وعين الشقاقة بتكلفة جمالية تقدر بـ3340أ.د.



## ❖ قطاع الثقافة:

- بصدد بناء دار ثقافة بالكاف الغربية بتكلفة تقدر بـ 1885,1 م.د (نسبة 75%)
- بصدد إحداث دار ثقافة بالطويرف بكلفة تتاهز بـ 1.949 م.د (نسبة 75%)

## ❖ قطاع الصحة:

- بناء مستشفى محلي بقلعة سنان مؤسسة في مرحلة التصنيف ( قسط اول : 1600 ا.د، قسط ثاني: 800 ا.د)
- بناء مستشفى محلي بنبر ( قسط وظيفي ) بتكلفة تقدر بـ 2604,9 أ.د
- تم تهيئة وتوسعة المستشفى المحلي بالقصور بتكلفة جملة تقدر بـ 1258 ا.د
- بصدد تطوير المستشفى الجهوي بالكاف القسط الأول ( بناء قسم المخابر وبناء قسم جديد للأشعة وبناء قسم استعجالي جديد) بتكلفة جمالية تقدر بـ 4999,4 ا.د ( 86 %).
- بصدد تطوير المستشفى المحلي بتاجروين بتكلفة جمالية تقدر بـ 3025,9 ا.د ( 95 %).
- بصدد بناء مستشفى محلي بساقية سيدي يوسف بتكلفة جمالية تقدر بـ 2235,9 ا.د ( 67 %)

- تم بناء قسم لتصفية الدم و قسم لأمراض الكلى بالمستشفى الجهوي  
(1000.أ.د)

- تم بناء مركز جهوى للطب المدرسي والجامعي بالكاف 650 : أد

## أهم المشاريع المنجزة بصدد الانجاز خلال الفترة (2016-2019)

❖ انطلاق مشروع تزويد الجهة بالغاز الطبيعي: العروسة، قعفرور، بوعرادة، سليانة، الكريب وبورويس

❖ إحداث الشركة الجهوي للنقل بسليانة

❖ تطوير ومضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 على طول 36,8 كلم وتدعيم الطريق الجهوية 73 على طول 26 كلم وتهذيب الطريق الوطنية رقم 623 على طول 38 كلم الرابطة بين سليانة وبوعرادة وتهذيب الطريق الجهوية رقم 80 على طول 15,5 كلم.

❖ تهيئة وتعبيد 129,5 كلم من المسالك الريفية بكلفة 44.006 م.د.

❖ إحداث وحدة لمعالجة النفايات الطبية بمعتمدية الكريب وربط المستشفى الجهوي بشبكة التطهير وإحداث محطة تطهير وشبكة تحويل المياه المعالجة والمستعملة بمدينة مكثر وتدعيم الشبكة بمد 13 كلم من القنوات وربط 200 مسكنا بالشبكة العمومية للتطهير.

❖ بناء مركز وسيط بسليانة وبناء قسم استعجالي جديد بالمستشفى المحلي ببرقو وبناء العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بكسرى والمحلي بقعفرور وبناء قاعة للعمليات القيصرية وتوسعة قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بسليانة.

❖ تزويد 618 عائلة بالماء الصالح للشرب عن طريق الشركة والمنطقة الصناعية بالكربو 123 مدرسة ابتدائية بالماء الصالح للشرب والانطلاق في إنجاز مشروع تحسين تزويد مدينة سليانة لفائدة 100 ألف ساكن.

❖ حفر 7 آبار عميقة إستكشافية منها 4 إيجابية (بو عبد الله ، عين مضجة ، صدقة 8 والذواودة) و3 سلبية (فرنة عوضا عن عين زريق 2 ، البازة والجميلات) وانطلاق مشروع حفر 7 آبار عميقة إستكشافية بالروحية وسليانة الجنوبية وسليانة الشمالية وسيدي بورويس.

❖ إحداث 3 آبار عميقة للماء الصالح للشرب بكدية الشوشة3، عين جنوة والمساحلة أولاد زيتون

❖ حفر 03 آبار مراقبة( الدخانية 1 مكرر، برج المسعودي والسوالم : الكريب و مكثر) وانطلاق حفر 02 آبار مراقبة الحبابسة 1 و الحبابسة 2.

❖ احداث المنطقة السقوية "الضرارية" و"اولاد بلال".

❖ بناء المدرسة الإعدادية النموذجية والمعهد النموذجي والمدرسة الإعدادية بالمنصورة.

❖ بناء 123 مسكن إجتماعي وإزالة 145 مسكن بدائي ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي.

❖ بناء مركب الطفولة ببرقو والقسط الأول من مركب الطفولة الروحية وقعفرور.

❖ إحداث قاعة الجمباز وتهيئة الملعب الفرعي بالمركب الرياضي بسليانة وإحداث دور الشباب بكل من العروسة وسليانة الجنوبية

❖ التشجير الغابي على مساحة 2000 هكتار والغراسات الرعوية على مساحة 300 هكتار  
هكوغراسة وفتح وصيانة 317 كم من الطرائد الوقائية من الحرائق وتجديد 300 هكتار  
من غابات الصنوبر الحلبي.

❖ إحداث وتهيئة حديقة وطنية بجبل السرج بسليانة الجنوبية

## شمال غربي: أهم المشاريع المرسمة بالمخطط ولم تدرج ضمن الميزانية

المشروع	الكلفة م د
إحداث سد على وادي تاسة	148
الرفع من طاقة خزن سد سليانة	5
إحداث 3 مناطق سقوية حول السدود التلية (150هك)	2.5
إعادة تهيئة مناطق سقوية عمومية (قعفور-العروسة-الرميل)	30
إحداث طريق حزامية لمدينة الكريب	20
إحداث طريق حزامية لمدينة سليانة	10
تدعيم الطريق الوطنية رقم 18 ن ك 0 إلى ن ك 30.5	10
- بناء جسر على الطريق الوطنية رقم 18 ن ك 1.3 على وادي الرمل	4.5
- بناء جسر على الطريق الوطنية رقم 18 ن ك 2.7 على وادي منصور	3.5
- تدعيم القسط الثاني من الطريق الجهوية رقم 73 من مدينة سليانة - حدود ولاية قيروان بكلفة 11 م.د	11

إحداث محطة تطهير وتدعيم الشبكة بمدينة الكريب	7.3
إحداث محطة تطهير بالروحية	4.8
إحداث محطة تطهير ببرقو	5.1

2.6	إحداث محطة تطهير بكسرى
15	إحداث منطقة صناعية ببرقو
6	إحداث منطقة صناعية بالعروسة
0.5	إعادة تهيئة المنطقة الصناعية قعفرور
15	بناء محلات صناعية على مساحة 15000 م <sup>2</sup>

المشروع	الكلفة م د
مد خط سكة حديدية لخوات- سليانة المدينة	280
مشروع تغير مسار السكة	215

المشروع	الكلفة م د
مشروع تهذيب حي النور والمنجي سليم ببلدية سليانة	5
مشروع تهذيب حي 9 أفريل ببلدية سيدي بورويس	2.2
مشروع تهذيب حي أبو القاسم الشابي ببلدية برقو	3.7

4.6	مشروع تهذيب حي الملاسين ببلدية بوعراة
2.4	مشروع تهذيب حي البحيرة وجنان الرمان ببلدية كسرى
2.1	مشروع تهذيب حي الملعب ببلدية العروسة
2.6	مشروع تعذيب حي التحرير والهادي خفشة ببلدية الروحية
1.7	مشروع تهذيب حي النسيم ببلدية قعفور

الكلفة م د	المشروع
52	بناء مستشفى جهوي صنف ب بمكثز



سليانة لجلسة 29 ديسمبر 2015 القرارات الوزارية

الإجراءات المقترحة/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	مدى تقدم الإنجاز	حالة التنفيذ	نص القرار
	توفر الإعتمادات اللازمة	تم تحديد موقع المشروع وإعداد الخطوط المرجعية وملف طلب العروض. تم إعداد بطاقة بيانات نموذجية لوزارة النقل لإحداث مطار للإستعمال المحدود وصور فضائية للمواقع التي تم الاختيار عليها في انتظار تحديد الطرف المسؤول على الإنجاز والمتابعة واستغلال المشروع وتوفير التمويلات	مشروع لم ينطلق بعد	<u>إحداث مسلك للمداواة بالطائرات خلال سنة 2016.</u>

## قطاع المناطق الصناعية

نص القرار	حالة التنفيذ	المتابعة	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	الإجراءات المقترحة/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات
المنطقة الصناعية بوعرادة 2		1. المنطقة الصناعية بوعرادة 2 ( القسط الأول) المساحة الجمالية:(10 هك ) انتهت أشغال الطرقات معدى الأرصفة وتم تزويد المنطقة بالماء والكهرباء. تم إنجاز شبكة الهاتف و التنوير العمومي 2. المنطقة الصناعية بوعرادة 2 (القسط الثاني) المساحة الجمالية:(12,5 هك )		الاسراع في الانجاز
المنطقة الصناعية سليانة 3:17هك		المساحة الجمالية : ( 15 هك ) قامت الوكالة بإعداد مثال الأشغال الطبوغرافية المختلفة ((TPD الوكالة بصدد دراسة تزويد المنطقة بالتيار الكهربائي و الماء الصالح للشرب. الدراسات المائية بصدد التنقيح بعد رد وزارة الفلاحة ( إدارة التخطيط و الموازنات المائية) التي تعتبر ضرورية للقيام بدراسات المؤثرات على المحيط.		الاسراع في الانجاز

		تمت إحالة ملف التقسيم للبلدية بتاريخ 2016/05/26 وطلبت القيام بملف السلامة وذلك طبقا لقرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 سبتمبر 2013. تم إعداد ملف السلامة وقد تحصلت الوكالة على المصادقة في شهر ماي 2017. تم تقديم ملف التقسيم خلال شهر مارس وفي شهر سبتمبر 2017 وقد تم إعادة الدراسة لملف التقسيم لمرور الطريق الحزامية لمدينة سليانة داخل المنطقة الصناعية. قامت الوكالة بإقتناء العقار.		
الاسراع في الانجاز		لم يتم إلى حد الآن إحداث تمثيلية جهوية للوكالة		إحداث تمثيلية لـ AFI خلال سنة 2016

### قطاع التربية والتعليم

نص القرار	حالة التنفيذ	المتابعة	الإشكاليات	الاجراءات
تزويد 123 مدرسة ابتدائية بالماء خلال سنة 2016-2017	100%	تم تزويد المدارس الابتدائية ريفية بالماء الصالح للشرب	توفر الإعتمادات لتزويد الخزانات التي تم بناءها بالمدارس الإبتدائية	

قطاع الطرقات والجسور

نص القرار	حالة التنفيذ	المتابعة	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	إجراءات المقترح/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات
تهذيب الطريق المحلية 719 ن ك 0 الى ن ك 33.8 برقو بكلفة 33865 أد (تحيين دراسة تهيئة الطريق المحلية رقم 719 الرابطة بين برقو وعين بوسعدية )	أنطلاق الأشغال 15 جانفي 2018 الكلفة : 31.125 م.د. الآجال التعاقدية 30 شهرا نسبة تقدم الأشغال 62%	بصدد الإنجاز	نسق بطيء بسبب عدم خلاص المقاوله	التسريع في خلاص مستحقات المقاوله

تهذيب الطريق الجهوية رقم 60	تاريخ الإذن الإداري لانطلاق الأشغال: 01 نوفمبر 2016، صاحب الصففة: EBM الكلفة: 10.401 م.د، الآجال التعاقدية: 28 شهرا. نسبة تقدم الأشغال: 95%	انطلقت الأشغال بنسبة 95%	إشكاليات عقارية على طول 300 متر	التسريع في اصدار امر الانتزاع
تهيئة وتعبيد 129.5 كلم من المسالك الريفية بولاية سليانة على 7 اقساط بكلفة 44.006 م.د	* أقساط عدد 41 و 44 و 45 و 46 - انطلاق الأشغال: 26 سبتمبر 2016 - كلفة المشروع: 24.959 م.د	انطلقت الأشغال وبلغت بنسبة 50 % قسط عدد 46 أنجز بنسبة 100% قسط 40 و 42 أشغال متوقفة بسبب عدم خلاص مستحقات المقاوله	بالنسبة للأقساط 41 و 43 و 44 تم فسخ الصففة وإعلان طلب عروض للمرة الثانية لدى المصالح المركزية للوزارة بصدد إعداد تقرير فرز العروض	

		قسط عدد 06 ن ك 46 إلى ن ك 63.80 (17.80كم)	
		قسط عدد 6 متوقف بسبب إعتراض مواطنين على طول 1,8 كلم	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- الإذن الإداري لانطلاق الأشغال: 15 ديسمبر 2016،</li> <li>- كلفة المشروع: 13.930 م.د،</li> <li>- الآجال التعاقدية: 19 شهرا.</li> <li>نسبة تقدم الأشغال: 95%</li> </ul>	

## قطاع الثقة

الإجراءات	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	المتابعة	حالة التنفيذ	القرار
المطلوب لدعوة المقول الانطلاق في الاشغال.	يتمثل الإشكال في عدم توفر الاعتماد المطلوب في حدود 448 لدعوة المقاول للانطلاق في الأشغال (من طرف وزارة الثقافة)	تمت الدراسة الفنية وإعداد تقرير فرز العروض، طلب عروض غير مجدي لعدم توفر الاعتماد تبعا لبطاقة اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات بتاريخ 2019/05/08.	تمت الدراسة الفنية وإعداد تقرير فرز العروض	انجاز مشروع صيانة وتهيئة المعلم الأثري وقرية "زامة" من ولاية سليانة مع توفير الاعتمادات الإضافية عن طريق ميزانية الدولة بكلفة 448 الف دينار
تسريع نسق الدراسات وتوفير الإعتمادات (ترسيم كلفة انجاز المتحف الأثري بسليانة على ميزانية 2020)	عدم توفر الإعتمادات ببطء في إعداد الدراسات الفنية الضرورية	تم استكمال الدراسات الفنية والعلمية بصدد الإعداد للمناظرة الوطنية في التصميم مع عمادة المهندسين	تم استكمال الدراسات الفنية والعلمية بصدد الإعداد للمناظرة الوطنية في التصميم	انجاز مشروع المتحف الجهوي بسليانة بتكلفة 7 م د

ترسيم المشروع ضمن ميزانية التنمية	تم اقتراح ترسيم المشروع ضمن ميزانية 2018 إلا أن وزارة المالية لم توافق عليه.	الكلفة التقديرية للمشروع 1000 أد	بصدد البحث عن قطعة أرض	بناء مكتبة معلوماتية بسليانة
توفير عقار	بصدد البحث عن قطعة ارض تكون وظيفية للمشروع	- أفادت وزارة الشؤون الثقافية بأنه تم اقتراح المشروع بمخطط التنمية 2016-2020 بكلفة 2000 أد		بناء دار ثقافة بكسرى بكلفة 2 مليون دينار
	. في انتظار الإعلان عن المناظرة المعمارية	أفادت وزارة الشؤون الثقافية بأنه تم اقتراح المشروع بمخطط التنمية 2016-2020 بكلفة 3000 أد	تم إحالة كراس قانون المناظرة المعمارية للمصادقة من قبل عمادة المهندسين بتاريخ 2019/10/ 7	إحداث مركز الفنون الركحية
		أفادت وزارة الشؤون الثقافية بأنه تم اقتراح المشروع بمخطط التنمية 2016/2020 بكلفة 1500 أد وبصدد معاينة الأرض المجاورة للمكتبة الجهوية	في انتظار اعداد الملف المرجعي للانطلاق في الدراسات،	إحداث معهد جهوي للموسيقى
توفير الإعتمادات المطلوبة	عدم توفر الإعتمادات	تم إعداد الملف العلمي والمالي الخاص بتهيئة المتحف مع العلم أن الأشغال تنجز من طرف المعهد الوطني للتراث.		دعيم وترميم متحف مكثر بكلفة 1750 دينار

## الغاز الطبيعي

نص القرار	السنة	المعني بالتنفيذ	المتابعة	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	الإجراءات المقترح/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات
تزويد معتمديات: العروسة- قعفرور- بوعراة - سليانة- الكريب بالغاز الطبيعي .	2018	الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم سليانة	انطلقت الأشغال لمد الأنبوب الرئيسي لتزويد معتمديات شمال الولاية		
باقي المعتمديات	2020				
كهيرة 279 بئرا سطحيا بكامل معتمديات الولاية		الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم سليانة/ التنسيق مع المجلس الجهوي ومندوبية الفلاحة	تمت الدراسات الأولية بكافة المعتمديات		
مساهمة الشركة 1170 دينار			تم إجراء المعاينة الميدانية مع مصالح الفلاحة	عدم توفر إتمادات	توفير الإتمادات
مساهمة المجلس الجهوي 1596 دينار			تم إعداد الصفقة		
مساهمة المنتفعون 764 دينار			في انتظار فتح الإتمادات		

## قطاع النقل

نص القرار	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	الإجراءات المقترحة/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات
إحداث خط حديدي يربط سليانة بالأخوات	وزارة النقل(الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية)	- مشروع مرمج بمخطط التنمية 2016-2020.	تم الشروع في المرحلة الثانية التي تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية بتاريخ 28 ديسمبر 2017 وتم اسلام التقرير النهائي في 27 فيفري 2018 في انتظار المصادقة عليه	ارتفاع الكلفة للفرضيات الثلاث وعدم توفر الإعتماد	توفير الإعتمادات
بناء ورشة صيانة للحافلات بسليانة 1,7 مليون دينار	وزارة النقل(الشركة الجهوية للنقل بسليانة )	.	في مرحلة طلب العروض		



		في انتظار تحويل الإتمادات	توسعة المركز النموذجي لتعليم الكبار بسليانة وبناء مقر وحدة جهوية لتعليم الكبار في نفس البناية تم إبرام اتفاقية مع منظمة DVW الألمانية لتوسيع المركز بإتمادات في حدود 60 الف دينار	وزارة الشؤون الاجتماعية التربية وزارة المرأة والأسرة و الطفولة	إعداد برنامج خصوصي لرفع الأمية بولاية سليانة
		تم إحداث مراكز محلية متعددة المهارات بالشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة	إحداث مراكز نموذجية في 5 معتمديات (الكريب , بوعرادة, العروسة , سليانة, مكث)		
		تم إبرام اتفاقية مع المندوبية الجهوية للمرأة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية	دراسة إمكانية إبرام اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الجهوي للمرأة والاتحاد الجهوي للفلاحين لمزيد استقطاب الدارسين		
		محدثة والمطلوب إعادة إحياء نشاطها وتم إحداث جمعيات محلية بكل من كسرى والروحية	إحداث جمعية جهوية موفى سنة 2018 إحداث جمعية محلية وتعميم التجربة على بقية المعتمديات موفى سنة 2018		
		يتم إسنادها سنويا بالتنسيق مع الإدارة العامة لمحو الأمية وتسرف عن طريق اللجنة الجهوية لتضامن الإجتماعي	إعداد منظومة الحوافز المالية والعينية على مستوى الجهة انطلاقا من هذه السنة الدراسية لمزيد استقطاب الدارسين		

## التطهير

الإجراءات المقترحة/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	المتابعة	حالة التنفيذ	نص القرار
		تم الإنتهاء من إعداد الدراسة الأولية واختيار الموقع لإحداث محطة تطهير.	بصدد الدراسة	برنامج توسيع شبكات التطهير بمدينة الكريب وذلك بمد 12 كلم من القنوات وربط 927 مسكنا بالشبكة العموميّة للتطهير بكلفة جملية تقدر بـ 2,9 مليون دينار والممول من طرف الوكالة اليابانية للتنمية JICA .
		تم إمضاء الصفقة وقد إنطلقت الأشغال منذ شهر نوفمبر 2016 – مدة الأشغال 18 شهرا، مع العلم أن الأشغال تحتوي على : (تركيز وحدة تجفيف ميكانيكية + بناء وتجهيز محطة ضخ بمحطة التطهير بسليانة). بصدد القيام بإجراءات فسخ الصفقة.	بلغت الأشغال نسبة 10%	الأشغال المستعجلة لتهديب محطة تطهير سليانة والممول من طرف الوكالة اليابانية للتنمية ( JICA )
		بصدد الإعلان عن طلب العروض.	بصدد الإعلان عن طلب العروض.	تأهيل محطة تطهير سليانة بكلفة تقدر بـ 8,2 مليون دينار في إطار برنامج تأهيل منشآت التطهير بـ 10 ولايات والممول من طرف الوكالة اليابانية للتنمية (JICA).

العدل

الإجراءات المقترح/المزمع اتخاذها لتجاوز الإشكاليات	الإشكاليات في صورة عدم التنفيذ	المتابعة	حالة التنفيذ	المعني بالتنفيذ	نص القرار
	<p>إدراج بناء محكمة إستئناف بميزانية وزارة العدل الجهة بصدد البحث عن عقار لبناء مقر للمحكمة بعدل أن تم تخصيص عقار يسمح 2000 م 2 بالحي الإداري كما تم اقتراح بناء المحكمة بعقار كائن على الطريق الجهوية رقم 73</p>	<p>صدر الامر الحكومي المتعلق بإحداث محكمة استئناف وتم كراء محل بمدينة سليانة وفتحت محكمة الإستئناف للعموم وانجز المشروع بنسبة 100 %</p>	<p>في انتظار صدور امر حكومي لإحداث محكمة استئناف بسليانة</p>	<p>الادارة الجهوية للتجهيز بسليانة المجلس الجهوي بولاية سليانة</p>	<p>إحداث محكمة استئناف بسليانة</p>



الجمهورية التونسية  
وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي  
ديوان تنمية الوسط الغربي



# الموضع التنموي بإقليم الوسط الغربي

لجنة التنمية الجهوية

بمجلس نواب الشعب 15 جوان 2020

## تقديم ديوان تنمية الوسط الغربي المهام و المشمولات

أحدث ديوان تنمية الوسط الغربي بمقتضى القانون عدد 84 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 **كمؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية** خاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالتنمية والإستثمار والتعاون الدولي، مكلف بالمهام التالية:

□ **جمع المعلومات اللازمة و القيام** بالدراسات الضرورية و **اقتراح** التدابير اللازمة التي من شأنها أن تمكن من تحديد السياسات في ميدان التنمية بصفة عامة و إختيار برامج الإستثمار العمومي ودفع الإستثمار الخاص بمناطق التدخل ومتابعة و تقييم نتائج هذه السياسات .

□ **مساعدة** السلط الجهوية على إستنباط و إعداد و تنفيذ مخططات و برامج التنمية بكل ولاية و معاضدتها في ميدان التنسيق بين مختلف المتدخلين و **متابعة** إنجاز و **تقييم** المخططات والبرامج.

□ **العمل على** تحقيق التنسيق بين المخططات و البرامج في مناطق التدخل .

□ - **إعداد** برامج و خطط عمل متكاملة للنهوض و لتنمية المناطق ذات الإشكاليات الخصوصية **و العمل على** إنجازها و ذلك بالتعاون مع الهياكل الوطنية و الجهوية المختصة .

## ديوان تنمية الوسط الغربي المهام و المشمولات

□ **المساهمة** في إعداد برامج وخطط العمل الهادفة إلى دفع و تنشيط الإستثمار الخاص بالجهات المعنية و **متابعة** مراحل إنجازها ، و ذلك **بالتعاون مع** الهياكل الفنية و المصالح الجهوية المختصة و الجماعات العمومية المحلية .

□ **دعم** عمل الهياكل الجهوية المختصة والجماعات العمومية المحلية في ميدان النهوض بالإستثمار الخاص بمناطق التدخل

كما يقوم الديوان أيضا بأهم المهام التالية:

❖ **تشخيص** فرص و برامج التعاون الدولي و تنفيذ مبادرات لترويج التراب الجهوي والتعريف بالمزايا التفاضلية لمناطق التدخل.

❖ **الإشراف** على الشباك الموحد ( بمقره الإجتماعي بالقصرين) الذي يتولى تقديم الخدمات الإدارية اللازمة لبعث المؤسسات المتكون أساسا من ممثلي الهياكل المتدخلة في ذلك.

❖ **تسيير مركز الأعمال** ذو المصلحة العمومية الإقتصادية الذي يضطلع بخدمات الإحاطة والمرافقة للباعثين .

# لمحة موجزة عن أهم أنشطة ديوان تنمية الوسط الغربي

## 1/ الدراسات:

دراسة إقتصادية حول منظومة السياحة البديلة بولايات إقليم الوسط الغربي

□ دراسة حول قطاع النسيج بولاية القصرين

□ دراسة حول التشخيص الإقتصادي الإجتماعي والتضامني بولايات القصرين وسيدي بوزيد.

□ دراسة حول التنظيم والحركية المجالية لدعم وتمويل الإقتصاد الإجتماعي والتضامني بولايتي القصرين

وسيدي بوزيد

□ دراسة حول مخطط النهوض وتثمين النباتات الطبية والعطرية بولاية القصرين في مجال الصناعات

الكيميائية (بالتعاون مع المركز الفني للكيمياء).

□ دراسة حول مخطط النهوض وتثمين التين الشوكي بولاية القصرين في مجال الصناعات الكيميائية .

□ دراسة حول مخطط النهوض وتثمين التين الشوكي بولاية القصرين في مجال الصناعات الغذائية.

□ دراسة حول المواد الإنشائية بولايات الوسط الغربي.

# لمحة موجزة عن أهم أنشطة ديوان تنمية الوسط الغربي

1/ الإستثمار الخاص:

نشاط سنة 2019 :

- الإحاطة والمرافقة وتوجيه الباعثين وإنجاز دراسات الجدوى الإقتصادية للمشاريع
- متابعة المؤسسة في مختلف مراحلها.
- المشاركة في تنظيم ومواكبة الندوات واللقاءات والجلسات ذات الإهتمام بالإستثمار والشراكة

جدول ملخص لتدخلات الديوان لسنة 2019

النشاط	العدد	كلفة الإستثمار
إستقبال الباعثين وإرشادهم	1548 باعثا	
دراسات الجدوى الاقتصادية المنجزة	120 دراسة	32.9م د
مشاريع بصدد الدراسة	66 مشروع	
الشباك الموحد	1063 منتفع	
تدخلات صندوق اعتماد الانطلاق	498 مشروعا	18242 أ.د



# لمحة موجزة عن أهم أنشطة ديوان تنمية الوسط الغربي

## 1/ التخطيط والإحصاء:


- إعداد تقارير ثلاثية حول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية 2011-2020
- تقييم سنوي لإنجازات المخطط التنموي 2016-2020
- المشاركة في إعداد المخطط الخماسي الجديد للفترة 2021-2025
- متابعة تطور الوضع التنموي بالإقليم : تقييم الوضع التنموي بالجهات.
- مسك قاعدة معطيات اقتصادية و جهوية محينة سنويا وذلك في إطار تطوير نظام المعلومات الجهوية:
- تحيين وثائق الولاية في أرقام
- مواصلة أشغال تركيز منظومتي المعلومات الجهوية ومؤشرات التنمية الجهوية ( SIR و SIDR )
- مواكبة أعمال المجلس الأعلى للإحصاء لتأهيل المنظومة الإحصائية الوطنية

# لمحة موجزة عن أهم أنشطة ديوان تنمية الوسط الغربي

## 1/ التقييم والمساندة:

- تنشيط الجهات والتعريف بإمكانياتها
- متابعة وتقييم المشاريع والبرامج الخصوصية
- التعاون الدولي اللامركزي: تصويبه نحو معاضدة و مساندة التدخل الوطني في مجال النهوض بالتنمية الجهوية
- إنجاز الدراسات التنموية ، الندوات والتظاهرات

# تقديم الإقليم

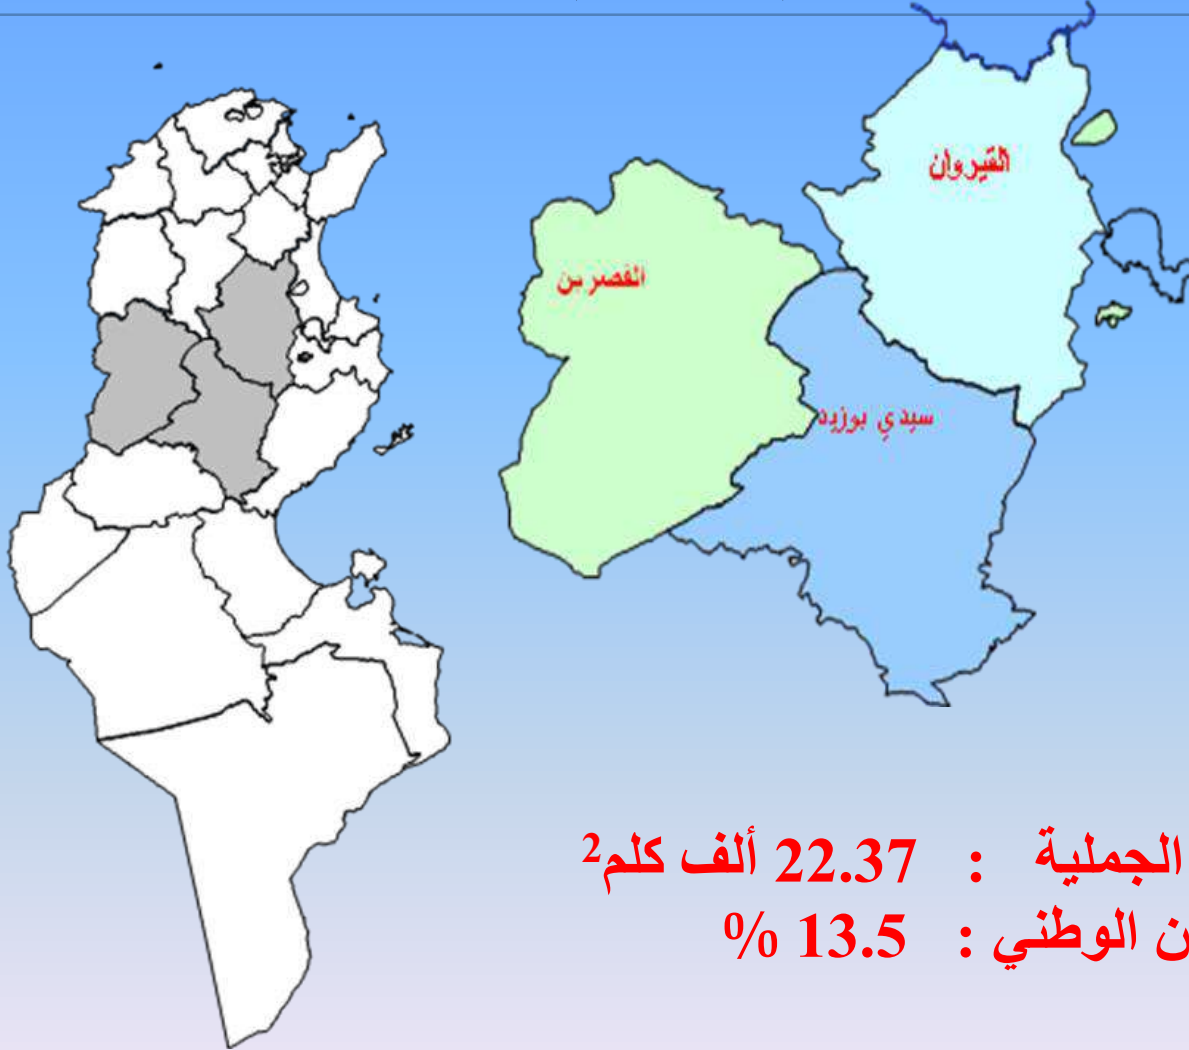

- المساحة الجمالية : 22.37 ألف كلم<sup>2</sup>
- النسبة عن الوطني : 13.5 %

# المعطيات الديمغرافية

- العدد الجملي للسكان (2018) : **1.48** مليون نسمة (**13%** من سكان البلاد)
- نسبة عدد السكان بالوسط الريفي: **66.9%** (**29.8%** على المستوى الوطني)
- نسبة السكان الناشطون: **41.2%**
- نسبة الأمية: **31.3%**
- صافي هجرة سلبي: **-10793** حسب إحصاء 2014 مقابل **-7885** حسب إحصاء 2004

منطقة مغادرة



# الموارد المتاحة

## الفلاحة:

- مساحة الأراضي الفلاحية : **2.052 مليون هك**
- منها : **154.1 ألف هك** سقوي (7.5%)
- الموارد المائية المعبأة : **864.7 م.م3**
- المساحة الغابية : **525.5 ألف هك**
- أهم المنتوجات :
  - الخضروات خاصة منها الخضر الفصلية
  - الزياتين
  - الغلال (التفاح ، المشمش، الفزدق...)
  - التين الشوكي
  - الزيوت النباتية

# الموارد المتاحة

## الصناعة

- عدد المؤسسات (10 فما فوق) : **265** ( 5.2 % من مجموع المؤسسات بالبلاد)
- عدد المؤسسات المصدرة : **65** (32 بالقيروان 20 بالقصرين و13 بسيدي بوزيد)
- المواد الإنشائية (رخام ، كلس أبيض، الطين، رمل... )
- المناطق الصناعية:

14	:	العدد	-
250.5	:	المساحة المهيأة	-
هك			
710	:	المقاسم	-
28	:	نسب الاستغلال	-
%			

# الموارد المتاحة

## السياحة

- عدد الوحدات : **18 وحدة** (2.8 % من العدد على المستوى الوطني)
- عدد الأسرة : **1406** (0.6 % من العدد على المستوى الوطني)
- الإمكانيات:

■ المواقع الأثرية : **19 موقعا**

■ المحميات الطبيعية : **04**

■ عديد المواقع للمياه الجيوحرارية: **10** (أهمها بولعابة بالقصرين  
وسيدي معمر وجبل طرزة بالقيروان وعين هداج وعين شريشيرة وحمام الهرية بسيدي  
بوزيد)

■ الموروث التراثي : **35%** من الموروث الوطني

# الواقع التتموي بالإقليم

- نقاط القوة
- نقاط الضعف



# نقاط القوة

- الموقع الجغرافي الوسيط والانفتاح على القطر الجزائري.
- المساحات الشاسعة من الأراضي المحترثة
- أهمية و تنوع المنتج الفلاحي القابل للتصنيع الغذائي وتصدر العديد منه ويحتل مواقع متميزة على المستوى الوطني.
- قطاع صناعي قابل للتطور نتيجة المخزون والإمكانات الهامة التي يوفرها الإقليم سواء منها الفلاحية أو الطبيعية.
- المخزون الهام من المواد الانشائية (حوالي 40 موقعا)

# نقاط القوة

✚ الموروث التاريخي و الحضاري و الامكانيات الطبيعية و الايكولوجية القابلة للاستغلال في مجال السياحة البديلة.

✚ موارد بشرية شابة توفر خزان من اليد العاملة الكفأة ( نسبة السكان النشيطون: 41.2 % من مجموع السكان بالإقليم )

✚ أهمية التبادلات التجارية مع القطر الجزائري القادرة على إحداث حركية تجارية و إقتصادية هامة بالإقليم إذا ما وقعت هيكلتها وتنظيمها .

# نقاط الضعف

✚بنية أساسية متواضعة .

✚نسيج اقتصادي هش ومحدود (غير قادر على إستيعاب العدد الهام من العاطلين الذين تفوق نسبتهم المعدل الوطني وخاصة منهم أصحاب الشهادات العليا).

✚مؤشرات تنموية دون المعدلات الوطنية.

✚ضعف الإدماج المجالي بين مختلف مكونات الجهة الكبرى مما يطرح إشكالية هوية الإقليم

✚وجود فوارق في المستوى التنموي بين ولايات الإقليم و بين المعتمديات داخل كل ولاية .

✚غياب مخابر البحث و الأقطاب التكنولوجية و الصناعية.

✚ضعف الرؤية التسويقية للإقليم.

# نقاط الضعف

➤ ضعف تثمين المقومات التنموية المتوفرة بالإقليم

➤ أهمية نسبة سكان الوسط الريفي (66.9 % مقابل 32 % على المستوى الوطني) مع

تشتت سكاني مرتفع.

➤ ضعف قدرات الهياكل الجهوية والمحلية (بشرية ومادية) محدودة غير موازية



بالنسق المؤمل لقيادة جوارية ولتأطير عملية التنمية وهو ما يفسر التأخير المسجل في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية.

➤ ضعف جاذبية الجهة وذلك سواء للسكان (صافي هجرة سلبي بـ 10793 خلال العشرية


2004-2014) وكذلك المستثمرين الخواص وهو ما يحرم الجهة من رافعة أساسية للتنمية.

# مؤشر التنمية الجهوية بالإقليم

## مؤشر التنمية الجهوية

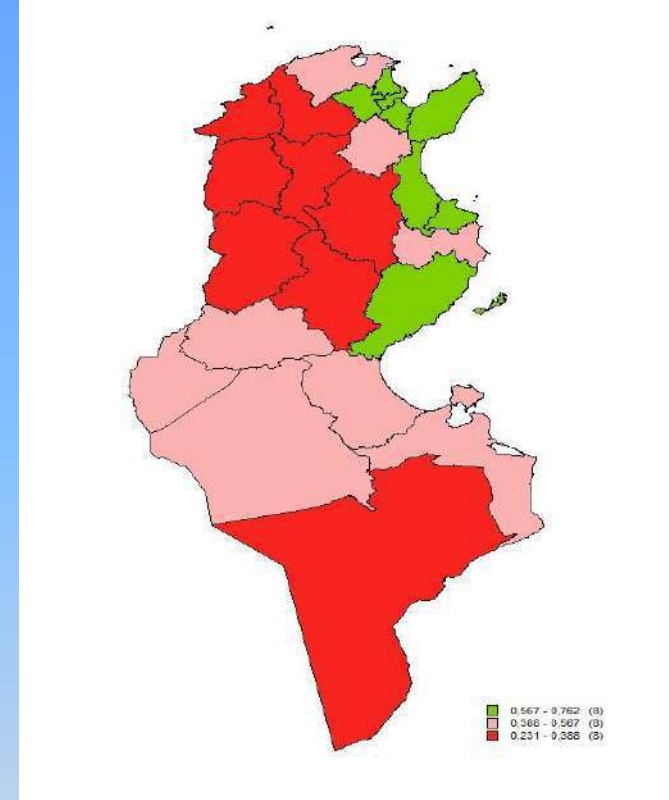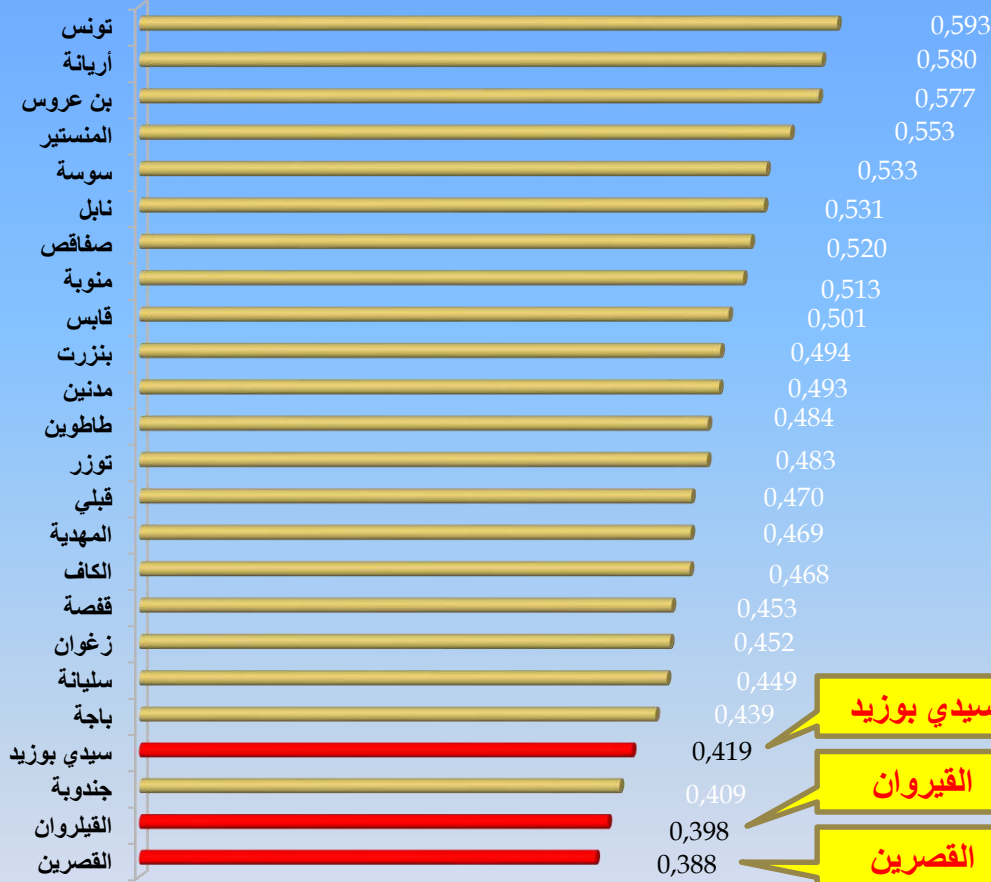


## حسب المعتمديات



أحسن قيمة للمؤشر بمعتمديات الإقليم لم تتجاوز 0.49  
مقابل 0.74 لأحسن معتمدية على المستوى الوطني




# مؤشر جاذبية الجهات للإستثمار

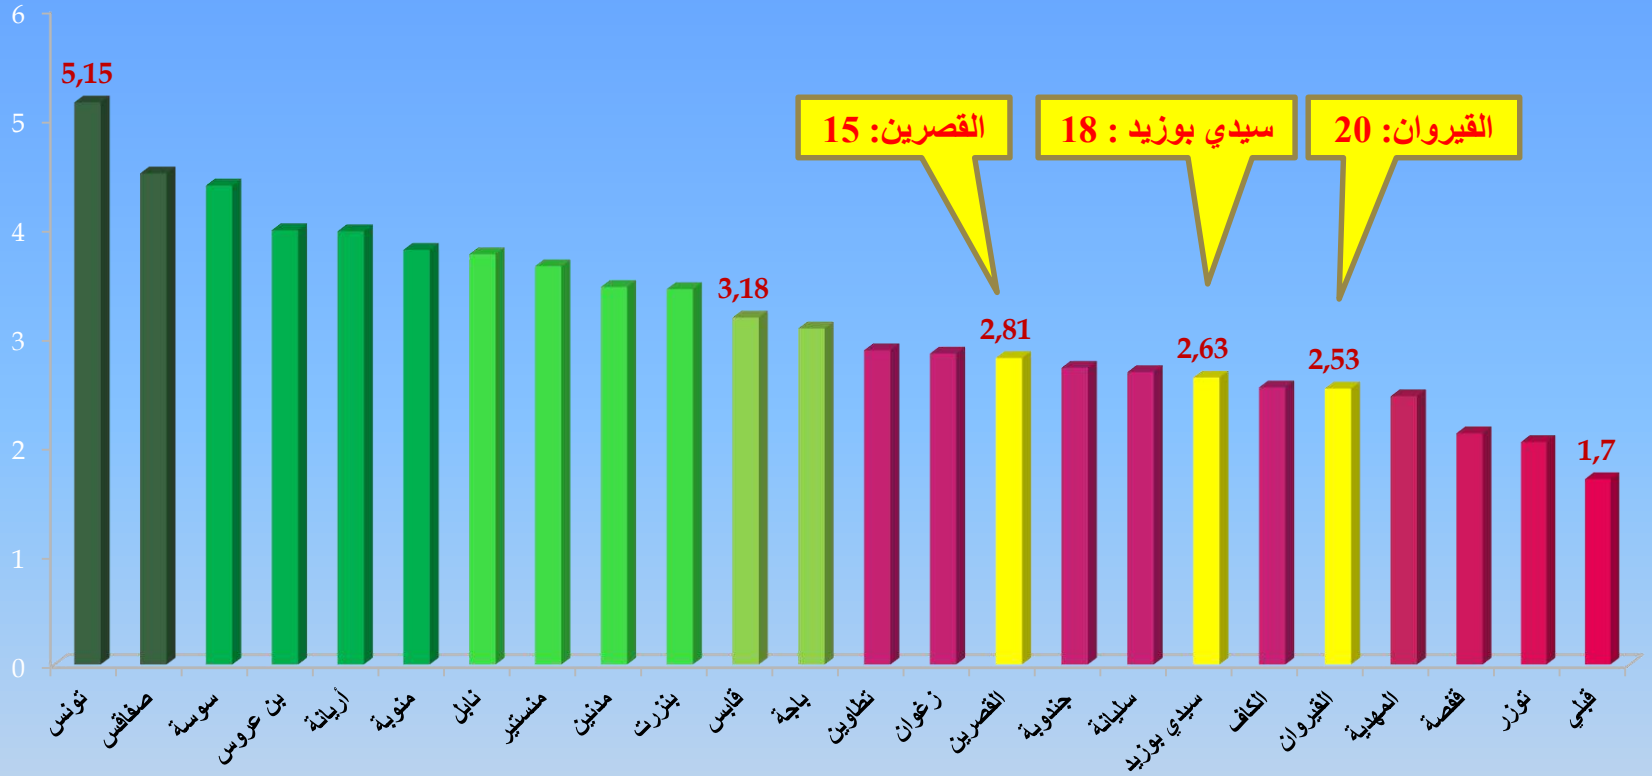


- يشمل المؤشر 9 مقاييس حسب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: المؤسسات والحوكمة , البنية التحتية, الصحة , التعليم , اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات , الاندماج المالي, سوق الشغل, ديناميكية الأعمال ,الابتكار والتجديد.
- ولايات الإقليم دون المعدل الوطني (3,18)

# الرتبة في الاستثمار للفرد الواحد حسب الولاية

الرتبة في الإستثمار العمومي للفرد الواحد  
للفترة 2019-2016

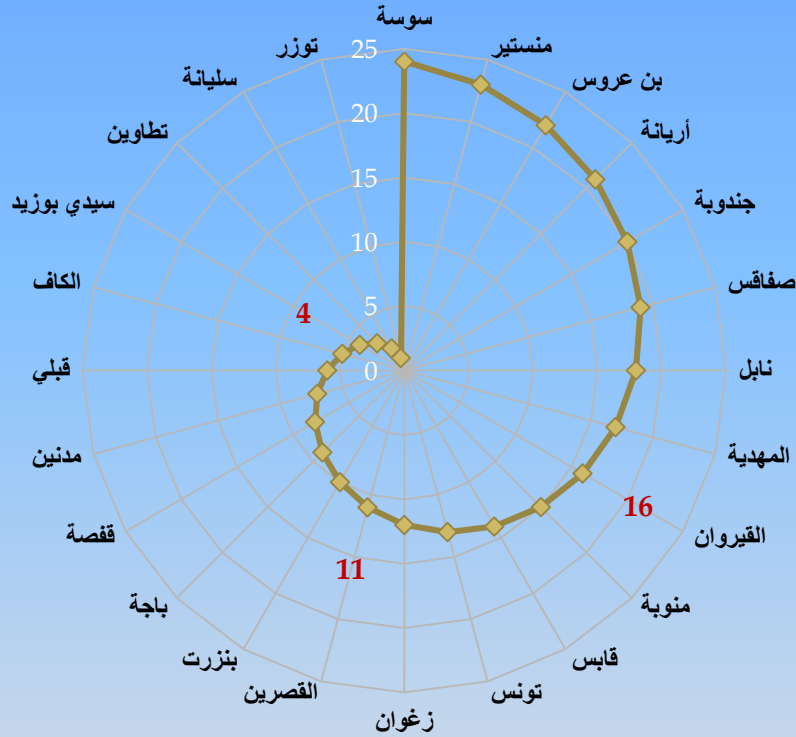

الرتبة في الاستثمار العمومي للفرد الواحد  
للفترة (2010-1992)

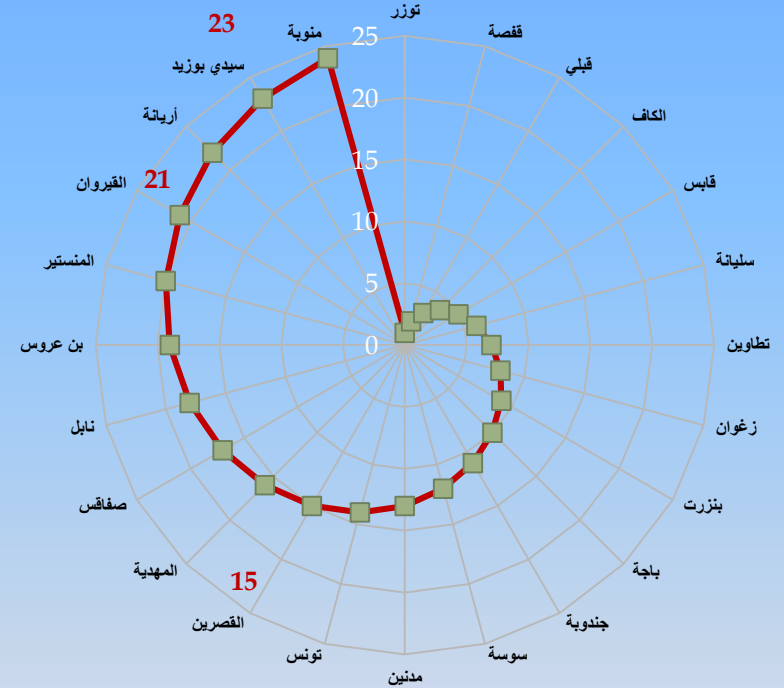


رتبة ولايات الإقليم: تقدمت بالقطاع العام بنسب هامة خلال المخطط الحالي : \* القيروان من 16 إلى 21

\* القصرين من 11 إلى 15

\* سيدي بوزيد من 4 إلى 23

# أهمية الاستثمار العمومي خلال المخطط ( 2016-2020 ) حسب الولاية

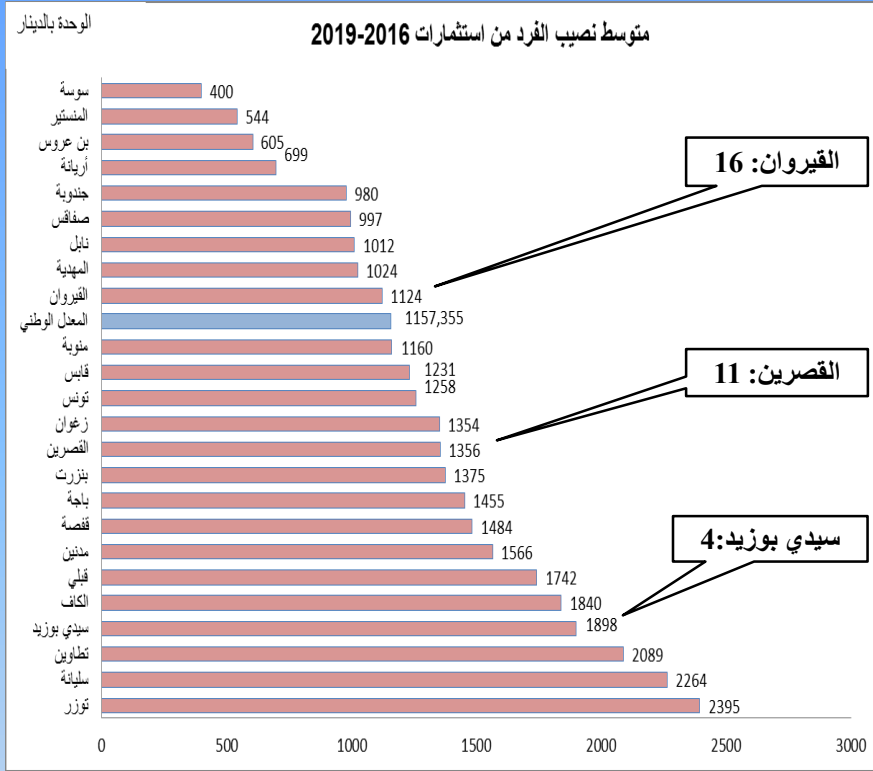

تجسيم مبدأ التمييز الإيجابي:

تم التركيز على توجيه الاستثمارات نحو الولايات ذات المؤشر التنموي الأضعف. من ذلك ولايات الإقليم حيث أصبحت ترتب ضمن كوكبة الولايات الأولى من حيث أهمية الإستثمار المبرمج بالمخطط التنموي للفترة 2016-




2020

(القيروان ترتيب 2 , القصرين ترتيب 3 , سيدي بوزيد ترتيب 6)



# حجم الإستثمار العمومي المبرمج في المخطط 2020-2016 والمنجز للفترة 2016-2019 (م د)

مجموع القطاعين			الإستثمار الخاص			الإستثمار العمومي			
نسبة الإنجاز	المنجز 2019-2016	المبرمج 2020-2016	نسبة الإنجاز	مجموع لاستثمارات الخاصة المنجزة خلال الفترة 2019-2016	المجموع العام للاستثمارات الخاصة المبرمجة في المخطط 2020-2016	نسبة الإنجاز	المجموع العام للاستثمارات المنجزة في الفترة 2019-2016	المجموع العام للاستثمارات المبرمجة في المخطط 2020-2016	
39,92	1102,536	2762	39,60%	507,056	1282	40,24	595,48	1480	القصرين
55,43	1538,576	2775,909	50,67%	722,627	1426,02	60,45	815,949	1349,889	سيدي بوزيد
51,09	1410,718	2761,005	73,50%	769,337	1046,62	37,41	641,381	1714,385	القيروان
48,82	4051,83	8298,914	53,20%	1999,02	3754,64	45,17	2052,81	4544,274	المجموع العام

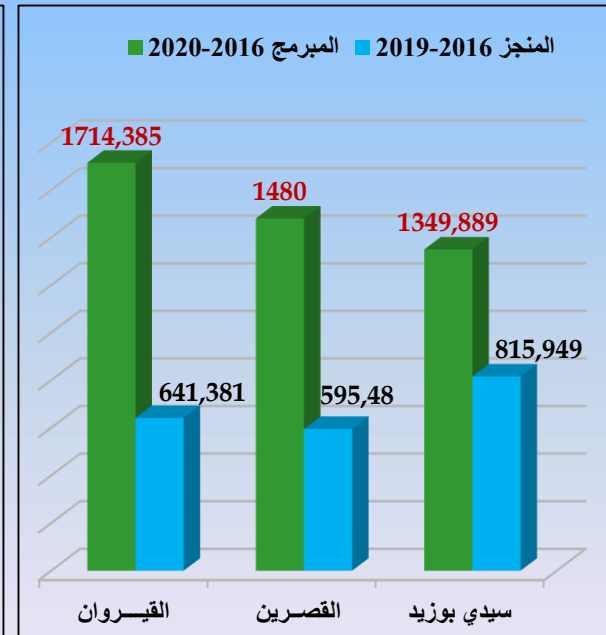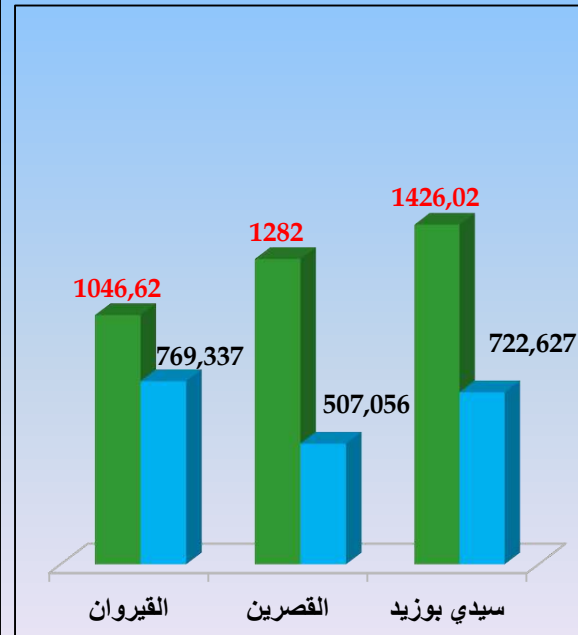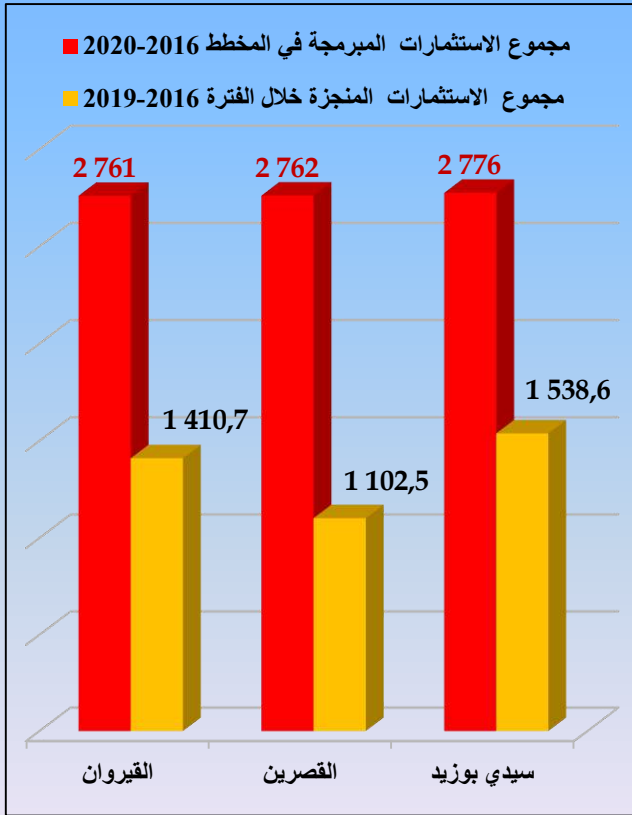

مجموع القطاع العام والخاص

القطاع الخاص

القطاع العام

# تقدم إنجاز المشاريع العمومية بالمخطط 2020-2016 للفترة 2019-2016

النسبة العامة لتقدم إنجاز المشاريع العمومية بالمخطط التنموي 2020-2016: **45.17%**

يعود ضعف هذه النسبة إلى عديد الإشكاليات على غرار:

- ✓ ارتفاع كلفة المشاريع خاصة على إثر الانزلاق المتواصل للدينار من جهة وعدم جاهزية الدراسات الفنية من جهة أخرى،
- ✓ عزوف المقاولات عن المشاركة في طلبات العروض لبعض المشاريع،
- ✓ تراجع قدرة المقاولات على الإيفاء بالتزاماتها وهشاشة وضعيتها المالية،
- ✓ ضعف قدرة المؤسسات والهيكل العمومية على تنفيذ المشاريع في آجالها ونقص الموارد البشرية بولايات الإقليم،
- ✓ طول إجراءات اعداد المشاريع (مرحلة إعداد الدراسات والتحوّز العقاري والمصادقات).
- ✓ تأخر في فتح الاعتمادات تعهدا ودفعها مما أدى إلى فسخ عديد الصفقات.
- ✓ تعطل وتأخر إنجاز العديد من المشاريع بسبب إعتراضات المواطنين.

# تقدم إنجاز المشاريع العمومية 2011-2020 - جانفي 2020

## الوسط الغربي

النسبة من العدد	النسبة من الكلفة	الكلفة (م د)	العدد	مراحل الإنجاز
72	49	2393,3	4165	مشاريع أنجزت
10	17	810,3	589	مشاريع بصدد الإنجاز
8	8	411,9	477	مشاريع بصدد طلب العروض
6	17	829,8	343	مشاريع بصدد الدراسة
1	2	107,2	62	مشاريع تواجه صعوبات
2	9	431,5	139	مشاريع لم تنطلق
100	100	4984	5775	المجموع


## المشاريع المتعطلة

الكلفة	العدد	الولاية
30.5	13	القيروان
43.7	19	سيدي بوزيد
33	30	القصرين
107.2	62	المجموع

# توزيع المشاريع العمومية حسب الاستثمار وتقدم الإنجاز للفترة 2011-2019

حجم الاستثمار : 4984 م د

عدد المشاريع : 5775 مشروع

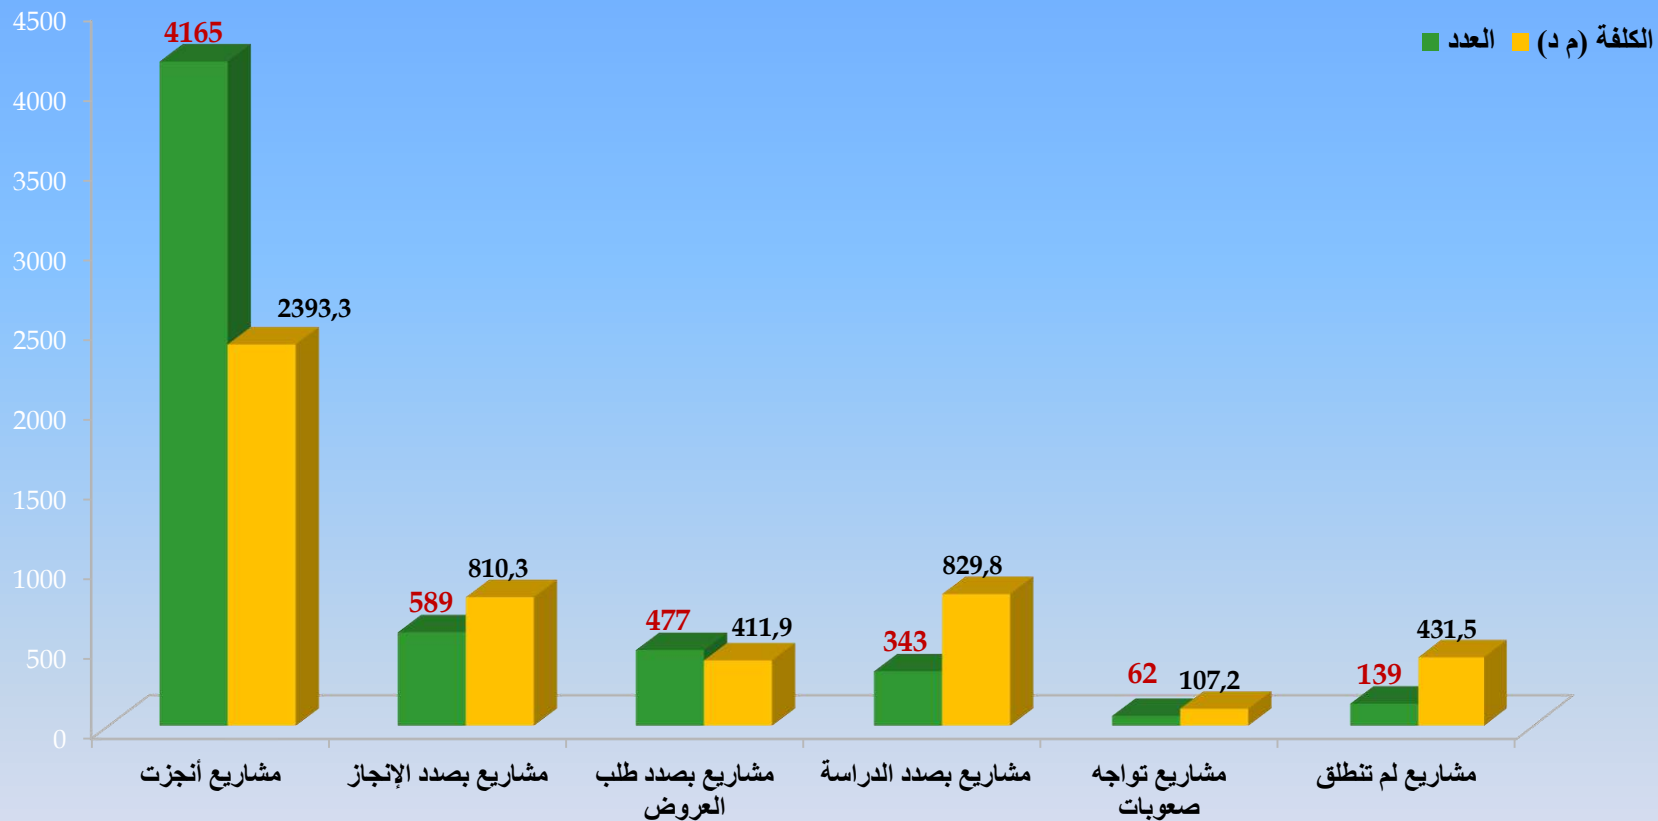

90 % من جملة المشاريع

6 %

1 %

2 %

متابعة المشاريع العمومية

بولاية القصرين


# تقدم انجاز الإستثمارات العمومية للفترة 2011-2019:

## 1524 م د

النسبة من العدد	النسبة من الكلفة	الكلفة ( م د )	العدد	مراحل الإنجاز
76	53	811	1735	مشاريع أنجزت
7	17	266	170	مشاريع بصدد الإنجاز
8	13	198	188	مشاريع بصدد طلب العروض
6	13	194	130	مشاريع بصدد الدراسة
1	2	33	30	مشاريع تواجه صعوبات
1	1	21	21	مشاريع لم تنطلق
100	100	1524	2274	المجموع

# المخطط الجهوي للتنمية 2020-2016

المرسم للفترة 2019-2016 بالنسبة للمبرمج	الاستثمارات المرسمة 2016-2019 (أد)	الإستثمارات المبرمجة بالمخطط (أد)	القطاع
29,68	138656	467094	الزراعة
		14200	النقل
54,40	192741	354325	التجهيز والإسكان
5,16	5974	115781	وزارة الشؤون المحلية
83,61	35536	42500	البيئة والتنمية المستدامة
56,00	16800	30000	الصناعة والطاقة والمناجم
17,78	800	4500	السياحة والصناعات التقليدية
6,27	162	2583	تكنولوجيا الاتصال
17,82	4298	24125	المرأة والأسرة والطفولة
17,36	7397	42600	الشباب والرياضة
26,85	1571	5850	الثقافة
177,55	94100	53000	الصحة
		2300	الشؤون الاجتماعية
3,88	7984	205708	التربية
43,80	600	1370	التعليم العالي
	772		التكوين المهني
33,24	32207	96900	وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
13,84	2000	14450	العدل
		2736	المالية
36,59	541598	1480022	المجموع

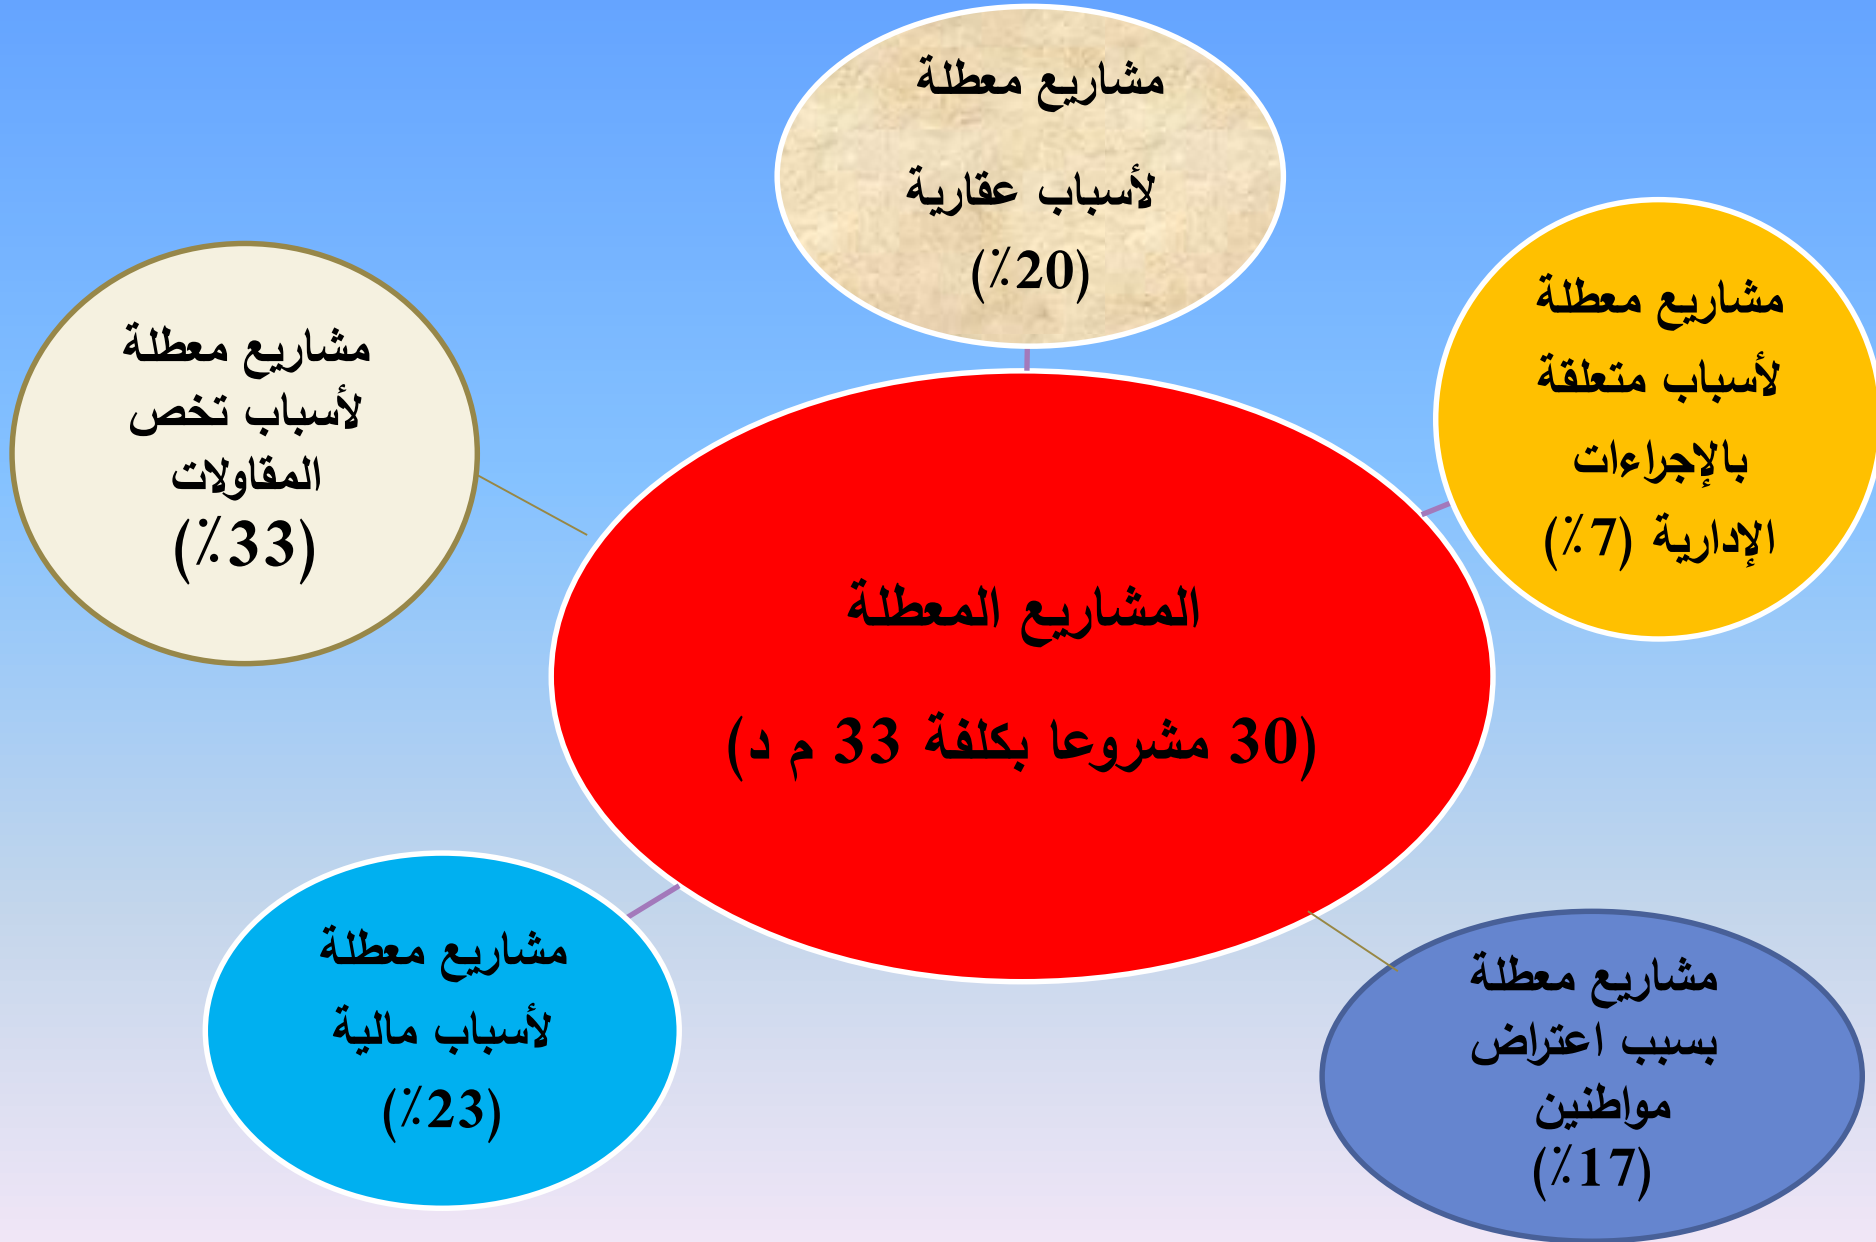



# المشاريع المعطلة

ع/ر	المشروع	المكان	الكلفة الاصلية	الكلفة المحينة	سنة الادراج	نسبة الانجاز %	طبيعة الاشكال	ملاحظات
<b>قطاع الفلاحة</b>								
1	احداث بئر عميقة للشرب بالمكيمن	حيدرة	462	192	2012 ت	95	اعتراض مواطنين	اشغال متوقفة نظرا لوجود شغب من قبل المواطنين
1	احداث 02 ابار استكشافية لوبيرة وشاكر (قسط1)	فوسانة /تالة	500	450	2016	لم ينطلق	مالي	عدم توفر اعتمادات
1	احداث بئر استكشافية لبييمة	حاسي الفريد	150	150				
1	ماء صالح للشرب (هندسة ريفية) منطقة السماعلية (البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2016)	العيون	500	500	2016	80	اعتراض مواطنين	اعتراض مواطنين
1	ماء صالح للشرب (هندسة ريفية) منطقة القرين (البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2016)	العيون	700	700	2016	95	اعتراض مواطنين	اعتراض مواطنين
5	<b>المجموع</b>		<b>2312</b>	<b>1992</b>				
<b>قطاع التجهيز</b>								
1	معد ولجة عقيل-مدرسة البعازة(5كلم) PRD	سببية قسط 2	1018	1018	2015	90	مقاولات	اشغال متوقفة
1	انجاز جسر بالطريق الجهوية 84 ن ك 11,1 على وادي الرمل	القصرين	4127	4127	2016	35	عقاري	أشغال متوقفة مع وجود اشكال عقاري (عدم تحرير حوزة الطريق)
1	البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2016 قسط عدد6 (إضافي)مسلك الصخيرات-المدرسة الابتدائية السراقية (7,4 كلم)	فريانة	1388	1388	2016	62	مقاولات	اشغال متوقفة
1	البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2016 (إضافي) قسط9: المسلك الرابط بين مسلك الاجرد ودوار العوينات (3,3 كلم)	حيدرة	1403	1403	2016	55	مقاولات	اشغال متوقفة دون موجب
1	البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2016 (إضافي) قسط9: المسلك الرابط بين دوار الخلايفية ودوار البراهمية (2,6 كلم)							
1	قسط 1: تدعيم المسلك الرابط بين ط/ج 71 و هنتشير العسل ومسلك اولاد خليفة الرابط بين ط/ج 840 و ط/و 13	سيبيلة- فوسانة 8,7 كلم	739	739	2017	85	مقاولات	اشغال متوقفة
6	<b>المجموع</b>		<b>8675</b>	<b>8675</b>				

## المشاريع المعطلة

ع/ر	المشروع	المكان	الكلفة الاصلية	الكلفة المحينة	سنة الادراج	نسبة الانجاز %	طبيعة الاشكال	ملاحظات
<b>قطاع التربية</b>								
1	معهد القصرين مدينة الجديدة	القصرين ش	2750	2797	2013	لم ينطلق	اجرائي	انتصاب السوق الاسبوعية
1	المدرسة الابتدائية حي النور	القصرين ش	150	150	2013	لم ينطلق	عقاري	اشكال عقاري (عدم توفر رصيد عقاري)
2	<b>المجموع</b>		<b>2900</b>	<b>2947</b>				
<b>قطاع البيئة</b>								
1	انجاز مصبات مراقبة و مراكز التحويل بولايات سيدي بوزيد و قفصة و القصرين	قسط القصرين	7000	13500	2012	لم ينطلق	مالي	مشروع بحاجة للبحث عن تمويل
1	المنتزه الحضري بوادي درب -الحي الولمبي	القصرين الشمالية	791	1191	2010	37	مقاولات	بطء في الانجاز
2	<b>المجموع</b>		<b>7791</b>	<b>14691</b>				
<b>قطاع الصحة</b>								
1	بناء بنك الدم وتهيئة قسم المخبر	القصرين	750	374	2009	لم ينطلق	مقاولات	تم تركيز الحضيرة وفي انتظار انطلاق الاشغال
1	بناء مركز الصحة الأساسية صنف 03 بالعرق فريانة	فريانة	175	175	2011	لم ينطلق	عقاري	البحث عن قطعة ارض جديدة
1	تهيئة وتوسعة مركز الصحة الأساسية بجديان وتحويله الى صنف 4	جديان	150	350	2012	90	مقاولات	(تلكأ مقولة)
3	<b>المجموع</b>		<b>1075</b>	<b>899</b>				

# المشاريع المعطلة

ع/ر	المشروع	المكان	الكلفة الاصلية	الكلفة المحينة سنة الادراج	نسبة الانجاز %	طبيعة الاشكال	ملاحظات
<b>التنوير الريفي (البرنامج الجهوي للتنمية)</b>							
1	تنوير منطقة الفرش (60 عائلة)	القصيرين الجنوبية	590	590	60	اعتراض مواطنين	اعتراض مواطنين حول مسار الخط
1	<b>المجموع</b>		<b>590</b>	<b>590</b>			
<b>الماء الصالح للشرب</b>							
1	تزويد مجموعة أولاد داود/الزنايدية/السرادكية/السيببات/القمايزية(550 عا نثة) بالماء الصالح للشرب	سببية	1328	1328	99	اعتراض مواطنين	اعتراض مواطنين حول مسار الخط
1	<b>المجموع</b>		<b>1328</b>	<b>1328</b>			
<b>قطاع الثقافة</b>							
1	تركيز شبكة التكييف بالمركب الثقافي(قسط كهرباء وقسط سوائل)	القصيرين	310	590	5	مالي	بالنسبة لقسط السوائل اتوقفت الاشغال نظرا لعدم تطابق الاسعار وقسط الكهرباء بصدد امضاء الصفقة
1	مكتبة عمومية	خمودة	500	500	لم ينطلق	عقاري	تمت مراسلة مصالح الولاية قصد توفير قطعة ارض
1	بناء قاعة عروض	ماجل بلعباس	500	600	92	مقولة	اشغال متوقفة نظرا لتلكا المقولة
1	تهيئة مكتبة عمومية	فريانة	113	113	لم ينطلق	مالي	اعتمادات
4	<b>المجموع</b>		<b>1423</b>	<b>1803</b>			

# المشاريع المعطلة

ع/ر	المشروع	المكان	الكلفة الاصلية	الكلفة المحيئة	سنة الادراج	نسبة الانجاز %	طبيعة الاشكال	ملاحظات
<b>قطاع الشؤون الاجتماعية</b>								
1	بناء الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالعيون	العيون	200	200	2012	98	مالي	في انتظار ادخال الماء الصالح للشرب والكهرباء
1	<b>المجموع</b>		<b>200</b>	<b>200</b>				
<b>التهديب العمراني</b>								
1	فضاء صناعي	تالة	1000	1000	2014	لم ينطلق	اجرائي	في انتظار رخصة البناء (أرض ذات صبغة فلاحية)
1	البرنامج الخصوصي لتهديب الاحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي	العيون	2000	2000	2017	لم ينطلق	مالي	اعتمادات غير متوفرة
2	<b>المجموع</b>		<b>3000</b>	<b>3000</b>				
<b>قطاع الشباب والرياضة</b>								
1	احداث حديقة رياضة بسيدي سهيل (ملاعب رياضية وحجرات ملابس)	تالة	500	500	2013	لم ينطلق	عقاري	موقع العقار غير صالح للبناء
1	<b>المجموع</b>		<b>500</b>	<b>500</b>				
<b>قطاع التطهير</b>								
1	تهديب جزء من القناة المؤدية لمحطة التطهير بالقصرين (هندسة مدنية)	القصرين	2600	1557	2016	75	عقاري	معطل جزئيا (200 مخ) لعدم فتح حرمة الطريق المحاذية لديوان الاراضي الدولية
1	<b>المجموع</b>		<b>2600</b>	<b>1557</b>				
<b>الداخلية</b>								
1	تهيئة قصر بلدية القصرين (المستودع البلدي)	القصرين	412	412	2016	80	مقاوله	اشغال متوقفة دون موجب
1	<b>المجموع</b>		<b>412</b>	<b>412</b>				

# أهم المشاريع المهيكلية

الملاحظات	المصدر	الكلفة (م د)	المشروع
في طور انجاز البحث العقاري وتحديد المسار المقترح	مبرمج بالمخطط	1200	الطريق السريعة الرابطة القصرين - قفصة - سيدي بوزيد - بولاية صفاقس وقابس والطريق السيارة 1 (الأروقة)
* قسط عدد 1: تونس جلما بطول 186 كلم بصدد فتح الحوزة ونسبة تقدم انجاز 15% * قسط عدد 2: التوصيلة جلما القصرين : في طور انجاز البحث العقاري	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012	1200	الطريق السيارة تونس - سيدي بوزيد - القصرين - قفصة
* بصدد فض الإشكال العقاري على طول 4 كلم ( ملف الانتزاع) * بصدد تحيين الدراسات الخاصة بإتمام المشروع	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 14 افريل 2015	4	انجاز شبكة التنوير العمومي بالطريق الحزامية على طول 13 كلم وإتمام الجزء المتبقي على طول 4 كلم
* بصدد فض الاشكاليات والاعتداءات على مسار الشبكة بولاية القيروان	مقترح جهوي بالمخطط	371	إعادة فتح الخط الحديدي سوسة - القصرين

# أهم المشاريع المهيكلية

الملاحظات	المصدر	الكلفة (م د)	المشروع
* في طور الدراسة	مقترح جهوي بالمخطط	258	تجديد وتحديث خط السكة الحديدية بين تونس والقصرين
بصدد إعداد الدراسة الجيوتقنية	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017 + مدرج بالمخطط	45	انجاز سد بولعابة
دراسة جاهزة	مدرج ضمن اقتراحات المخطط للفترة 2016-2020	241,2	مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لشمال الولاية
دراسات جاهزة وبطء في التنفيذ	قرار مجلس وزاري بتاريخ 14/04/2015 ومجلس وزاري بتاريخ 31/10/2015	45	تهيئة وتعبيد 180 كم من المسالك الفلاحية لفك عزلة مناطق الإنتاج
دراسة منجزة وشملت 13 ألف هك تتطلب تسريع الإجراءات مع الجهات المتدخلة لفائدة الباعثين الشبان	قرار مجلس وزاري بتاريخ 08 مارس 2017		إيجاد حلول عملية لمشكلة الأراضي الدولية بالجهة (13 ألف هك)

# أهم المشاريع المهيكلّة

الملاحظات	المصدر	الكلفة (م د)	المشروع
4 سدود تلية في طور الدراسة وفي انتظار البحث عن التمويل للدراسات والتنفيذ	مجلس وزاري بتاريخ 31 أكتوبر 2015	50	إحداث 9 سدود تلية
دراسات جاهزة وفي انتظار البحث عن التمويل	مجلس وزاري بتاريخ 31 أكتوبر 2015	6,4	إحداث 10 بحيرات جبلية
تم مناقشة التمويل مع البنك الإسلامي للتنمية وفي انتظار عرض اتفاقية القرض على مجلس نواب الشعب	مجلس وزاري بتاريخ 31 أكتوبر 2015	219	مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لجنوب الولاية
تم إعداد دراسة لتحديد أماكن الآبار المزمع ربطها بالتيار الكهربائي ثلاثي الأطوار من طرف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين ومد الشركة التونسية للكهرباء والغاز بهذه الدراسة في انتظار التنفيذ	تمت المصادقة على هذه الإعتمادات خلال زيارة السيد رئيس الحكومة بتاريخ 31/10/2015	56	كهربة الآبار السطحية والعميقة بالتيار الكهربائي ثلاثي الأطوار

# أهم المشاريع المهيكلة

الملاحظات	المصدر	الكلفة (م د)	المشروع
<p>-المستشفى الجهوي بسببيلة: بصدد الإنجاز(93%)</p> <p>-المستشفى الجهوي بتالة : تم فتح الظروف يوم 08 نوفمبر 2019 وتمت مراسلة الجهة الممولة (نقص في الاعتمادات(12 م د))</p> <p>-المستشفى الجهوي بسببيلة : بصدد الدراسة</p> <p>-المستشفى الجهوي بفريانة : طلب تعهد في بقية الاعتمادات(7 م د)</p>	<p>مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017</p>		<p>إحداث مستشفيات جهوية بكل من سببيلة وتالة وسببيلة وتحويل مستشفى فريانة إلى مستشفى جهوي</p>
<p>بصدد الإنجاز</p>	<p>مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 أفريل 2015</p>		<p>بناء سبعة أقسام بالمستشفى الجهوي بالقصرين(قسم إستعجالي وقسم أمراض المعدة وقسم المجاري البولية وقسم تشريح الخلايا ومحلات للصيانة الفنية والبيوطبية وقسم الأمراض الصدرية وقسم الانعاش والتخدير )</p>
<p>تم تعيين مكتب دراسات للقيام بدراسة أولية للخصوصيات الفنية للمشروع وتأثيره على تلوث المياه والترية والهواء بتاريخ 10 ديسمبر 2019</p>	<p>مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012</p>	30	<p>الإسراع في إنجاز مشروع المركب الرياضي للتربصات بالشعاعبي</p>



# أهم المشاريع المهيكلية

الملاحظات	المصدر	الكلفة (م د)	المشروع
تم استكمال جميع الدراسات وحاليا المشروع متوقف على التمويل	مبرمج بالمخطط	13,5	إنجاز مشروع المصب المراقب ومراكز التحويل
تواترت العديد من الدراسات منذ 1995، كما تم إعداد دراسة جديدة تخص ملف طلب عروض في نوفمبر الفارط وحاليا المشروع متوقف على التمويل	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012	100	مشروع استصلاح التلوث وإزالة الزئبق لموقع معمل عجين الحلفاء
بطء في الأشغال (37 %)	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012	1,1	إنجاز المنتزه الحضري بوادي الدرب
تم توجيه مشروع الأمر في صيغته النهائية إلى مصالح رئاسة الحكومة بتاريخ 13 مارس 2013. تم إرجاع مشروع الأمر من رئاسة الحكومة بعد أن تم إدماج قطاع البيئة مع وزارة التجهيز سابقا	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012		إحداث إدارة جهوية للبيئة

# أهم المشاريع المهيكلية

الملاحظات	المصدر	الكلفة (م د)	المشروع
بصدد إعداد المرحلة الثانية من الدراسة	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012		إحداث منطقة تبادل حر بتلابت
* تم الانطلاق في انجاز المشروع بنسب متفاوتة بإستثناء بلدية العيون (في انتظار توفر الاعتمادات)	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 14 افريل 2015	7	تهذيب 14 حي ضمن برنامج الحد من التفاوت الجهوي
تم فتح الإعتمادات بتاريخ 02/05/2019 . تم إعداد قوائم تضم 321 منتفع بقيمة 1.250 م د	زيارة السيد رئيس الحكومة بتاريخ 5 جانفي 2019	1,2	برنامج إضافي لتحسين السكن : 250 مسكن بمعدل 5 أ.د لكل مسكن بكل من بوشبكة ، تالة ، حيدرة ، فوسانة ، العيون ، حاسي الفريد، جدليان
عدد المساكن: 1237 نسبة تقدم الأشغال الجمالية : 82% عدد المساكن الجاهزة او بصدد الانجاز: 967 الكلفة الجمالية: 27.105 م د في انتظار توفر بقية الإعتمادات 1.750 م د	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 اكتوبر 2015	25	برنامج ازالة المساكن البدائية

# أهم المشاريع المهيكلية

المشروع	الكلفة (م د)	المصدر	الملاحظات و المشاغل
إدراج تهذيب 8 أحياء في إطار الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية	42.9	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 14 أفريل 2015	<p>تم إدراج 05 أحياء بـ 5 بلديات بكلفة حوالي 52 م.د ضمن الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية (حي السلام بفوسانة، حي الزهور بسببية، حي السرور بسببيلة، حي قرية بوزقام ببوزقام، حي النور بالقصرين)</p> <p>- يتم إنجاز المشاريع على أقساط خلال الفترة (2019-2024)</p> <p>• قسط 1 (2019-2021) يضم حي السلام بفوسانة وقد تم الإعلان على طلب لقبول ترشحات التعبير عن الرغبة في المشاركة لإختيار مكتب دراسات وحدد آخر أجل لقبول العروض يوم 13 جانفي 2020 .</p> <p>• قسط 2 (2020-2022) يضم حي الزهور بسببية وحي السرور بسببيلة .</p> <p>• قسط 3 (2021-2023) يضم قرية بوزقام .</p> <p>• قسط 4 (2022-2024) يضم حي النور بالقصرين.</p>

متابعة المشاريع العمومية

بولاية القيروان

## مسيرة التنمية من خلال تقييم المخطط 2016-2020

كثفة المشاريع المبرمجة أء	الوزارة	كثفة المشاريع المبرمجة أء	الوزارة
3458	وزارة المالية	418153	وزارة التجهيز والإسكان والتهبئة الترابية
14590	وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي	244068	وزارة الفلاحة والموارد المائية
12550	وزارة الشباب والرياضة	31256	وزارة النقل
44620	وزارة الصناعة	237000	وزارة التنمية والاستثمار
43000	وزارة الثقافة والمحافظة على التراث	138805	وزارة التربية
63636	وزارة العدل	42653	وزارة البيئة والتنمية المستدامة
26442	وزارة السياحة والصناعات التقليدية	238800	وزارة الصحة
46722	وزارة المرأة والأسرة والطفولة	5500	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
1050	وزارة الشؤون الاجتماعية	102082	وزارة الشؤون المحلية

- المجموع العام للمشاريع الجديدة التي تم إدراجها بالمخطط : 1714385 أء
- مجموع الاستثمارات خلال المخطط: 1275703 أء
- مجموع كثفة المشاريع المتواصلة: 405686 أء

## الاستثمارات التي تم إدراجها بميزانية الدولة

المجموع	2019	2018	2017	2016	
<b>407584</b>	93688	85464	69118	159314	كلفة المشاريع المبرمجة (أد)
<b>173630</b>	2525	7726	25179	138200	كلفة المشاريع المنجزة (أد)
<b>43%</b>	2.7%	9.0%	36.4%	86.7%	نسبة الانجاز

نسبة تنزيل بالميزانية

**%31.95**

من الاستثمارات

المبرمجة

خلال المخطط

**أد 1275703**

# متابعة مشاريع القطاع العام حسب مراحل الانجاز

2019-2011

الاستثمارات (م.د)		عدد المشاريع		مراحل الانجاز
النسبة %	المبلغ (م د)	النسبة %	العدد	
63.3	810975	77.6	1106	مشاريع انتهت
21	268736	8.8	126	مشاريع بصدد الإنجاز
4.8	61187	6.8	97	مشاريع بصدد الإعلان عن طلب العروض
8.2	105127	6.1	87	مشاريع بصدد الدراسة
2.6	33100	0.7	10	مشاريع لم تنطلق
100	1279125	100	1426	المجموع
2.4	30532	0.9	13	منها مشاريع تلاقي صعوبات

# متابعة انجاز القرارات الحكومية 30 نوفمبر 2017

المحور	منجز	بصدد الانجاز	بصدد طلب العروض	بصدد الدراسات	معطل	لم ينطلق	مجموع
إجراءات عاجلة	1	7	1	5	0	0	14
الارتقاء بمؤشرات التنمية	2	6	8	8	0	3	27
جعل القيروان قطبا اقتصاديا	0	4	1	4	1	1	11
تحسين البنية التحتية	7	6	3	4	1	2	23
جعل القيروان قطبا سياحيا و ترفيهيا وثقافيا ودينيا	2	5	2	2	0	2	13
<b>المجموع</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>88</b>
<b>النسبة %</b>	<b>13.6</b>	<b>31.8</b>	<b>17.0</b>	<b>26.1</b>	<b>2.3</b>	<b>9.1</b>	<b>100</b>



# أهم أسباب تعطل تنفيذ المشاريع

- نقص في الموارد البشرية للإدارات الفنية مما انجر عنه نقص في متابعة الانجاز وبطء في إعداد البرامج الوظيفية
- عدم دخول بعض المشاريع المنجزة حيز الاستغلال لعدة أسباب منها عدم توفر الإطار البشري أو الربط بالشبكات...
- اعتراض المواطنين
- اشكاليات تتعلق بالوضعية العقارية

- ضعف جاهزية بعض المشاريع المرسمة من حيث الدراسات المسبقة
- مركزية القرار الإداري وغياب بعض التمثيليات الجهوية لبعض الإدارات
- تأخر في فتح الاعتمادات تعهدا ودفعا مما أدى إلى فسخ عديد الصفقات
- عزوف المقاولين بسبب عدم خلاص مستحققاتهم

# أمثلة لمشاريع مدرجة ولم يقع تنزيلها

الطريق المحلية رقم 804



الطريق الجهوية رقم 46



## المشاريع المعطلة بولاية القيروان إلى غاية أفريل 2020 حسب وضعية متابعة المشاريع

المشروع	الكلفة (أد)	الاشكاليات
<b>أسباب عقارية</b>		
<b>التكوين المهني و التشغيل</b>		
إحداث وحدة للتدريب المهني بالعلاء (بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات) (2011)	800	تم تقديم طلب إلى الولاية بتاريخ 19 أفريل 2019 بهدف تسوية الوضعية القانونية لقطعة الأرض الكائنة بمعتمدية العلاء والتي تمت المصادقة على التفويت فيها خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الجهوي بالقيروان لسنة 2013 لفائدة الوكالة التونسية للتكوين المهني، إلا أنه تم الاعلام عبر مراسلة الولاية عدد 3556 بتاريخ 02 ماي 2019 بتعذر تسوية الوضعية القانونية حيث لا يوجد ما يثبت انجرار الملكية ، كما أن المجلس الجهوي لا يملك قطعة أخرى بمعتمدية العلاء يمكن اقتراحها كبديل.
<b>التنمية المندمجة</b>		
احداث سوق يومية للخضر و الغلال بالقيروان الجنوبية (2019)	2370	إعتراض المعهد الوطني للتراث على تخصيص العقار لفائدة المشروع
<b>أسباب اجرائية</b>		
<b>الشباب و الرياضة</b>		
توسعة المدارج بمركب حمدة العواني (2009)	1517	تم إيقاف الأشغال بقرار من القضاء منذ سنة و تمت مراسلة 75% البلدية في العديد من المرات وعقد جلسات في الغرض لايجاد الحلول المناسبة
إتمام تهيئة الملعب البلدي علي الزواوي بالقيروان (قسط 2012) (إعادة تعشيب اصطناعي للملعب الفرعي 2)	508	تم فسخ الصفقة بتاريخ 05/12/2018 لم يتم إتمام إجراءات الإعلان عن طلب العروض من طرف بلدية القيروان رغم المراسلات العديدة

## المشاريع المعطلة بولاية القيروان إلى غاية أفريل 2020 حسب وضعية متابعة المشاريع

المشروع	الكلفة (أد)	الاشكاليات
<b>الصحة</b>		
اعادة بناء مركز الصحة الأساسية النباش (2012)	195	في انتظار المصادقة على الدراسات
<b>المالية</b>		
بناء مقر الإدارة الجهوية للديوانة ومقر الحرس الديواني بالقيروان (2013)	17241	خلال جلسة اللجنة الداخلية للبيانات المدنية تم اقتراح تعديل البرنامج الوظيفي من طرف صاحب المشروع لذلك تم توقيف اجراءات تعيين المصممين لحين المد ببرنامج جديد
<b>اعتراض مواطنين</b>		
<b>البرنامج الجهوي للتنمية 2016</b>		
تزويد الأقرعين (الوسلاتية) (2016)	296	معطل بسبب اعتراض مواطنين من منطقة أولاد 30% بامر, بصدد فسخ الصفقة بالتراضي
<b>الطفولة</b>		
احداث نادي أطفال بحفوز (2016)	524	أشغال متوقفة, تم التنبيه على المقاول

## المشاريع المعطلة بولاية القيروان إلى غاية أفريل 2020 حسب وضعية متابعة المشاريع

المشروع	الكلفة (أد)	الاشكاليات
<b>الماء الصالح للشرب عن طريق الشركة</b>		
تزويد دار الجمعية بالسبيخة (2016)	707 4	توقف أشغال وضع قنوات الجلب بسبب اعتراض مجموعة من متساكني قريميط من معتمدية النفيضة ولاية سوسة (شبكة التوزيع: 100%, بناء الخزان: 100%, شبكة الجلب: 70%)
<b>بطء مقاولين</b>		
<b>الصحة</b>		
بناء قسم إستعجالي بالمستشفى المحلي بالسبيخة (2012)	650	بصدد إعداد ملف الصفقة من طرف المصالح الفنية لإدارة التجهيز لاستكمال الأشغال المتبقية ( 2%)
<b>التعليم العالي</b>		
توسعة المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان (بناء مقر إدارة المعهد)	542	الأشغال متوقفة منذ ما يقارب 3 أشهر بدون أي مبرر ونسبة الإنجاز تقدر بـ 95%

## المشاريع المعطلة بولاية القيروان إلى غاية أفريل 2020 حسب وضعية متابعة المشاريع

الاشكاليات	الكلفة (أد)	المشروع
		<b>الشباب و الرياضة</b>
<p>تم فسخ الصفقة منذ 2014 و تم الإعلان عن طلب 65% العروض عديد المرات, تمت مراسلة البلدية للنظر في امكانية تجزء الأشغال الى أقساط للضغط على تكلفة الانجاز و لم يتم الى حد الآن أي تقدم في الغرض</p>	690	تهيئة المركب الشبابي بالقيروان (2011)
<p>65%: تم فسخ الصفقة بتاريخ 03/01/2017 و بصدد حصر الكميات المنجزة, لم يتم إتمام إجراءات الإعلان عن طلب العروض من طرف بلدية القيروان</p>	492	مواصلة تهيئة ملعب علي زاوي ( قسط عدد 3 ) (2014/ 2011)

# المشاريع المهيكلية بولاية القيروان

- توسعة المنطقة الصناعية بالسبيخة (ضرورة إدراج محطة للضغط العالي ومحطة تطهير خاصة بالمنطقة الصناعية)
- القطب الفلاحي
- المشروع الترفيهي التجاري ببرك الأغالبة
- المنطقة السياحية
- المسلك السياحي: القيروان عين جلولة الوسلاتية
- المحطة الاستشفائية بجل طرزة
- جلب فائض مياه الشمال

- المستشفى الجامعي
- المستشفيات الجهوية بكل من حفوز والحاجب وسيدي عمر بوحجلة
- المدرسة الوطنية للمهندسين
- الطريق السيارة تونس جلمة
- مضاعفة الطريق الوطنية عدد 2 بين النفيضة والقيروان
- مد خط السكة الحديدية بين النفيضة والقيروان
- المنطقة اللوجستية بالمتبسة

# إشكالية التنمية بولاية القيروان متعددة الأبعاد

## الحكومة

- نقص في الموارد البشرية المكلفة بانجاز المشاريع العمومية
- غياب التمثيليات الجهوية لبعض الإدارات يعد سببا وراء بطء الانجاز
- تعطيل بعض المشاريع من قبل المواطنين وعدم خلاص المقاولين ساهم في فسخ صفقات مما انجر عنه ارتفاع كلفة المشاريع
- عدم تنزيل عدة مشاريع مدرجة بالمخطط في الميزانيات

القطاعية

## البعد الاجتماعي

- مؤشرات تنمية البشرية متدنية
- نسبة بطالة مرتفعة
- وطلبات شغل إضافية تتجاوز 5400 سنويا
- أعلى نسبة أمية وأكثر من 3000 منقطع عن الدراسة في مرحلتي الإعدادي والثانوي
- تفاقم ظاهرة الهجرة والنزوح
- تفاقم ظاهرة الانتحار

## البعد الاقتصادي

- ضعف تنوع النشاط الاقتصادي ومقومات تنموية غير مثمرة
- هيمنة القطاع الفلاحي واستنزاف للموارد المائية
- قطاع صناعي جنيني لم يساعد على تثمين المنتجات الفلاحية
- سياحة عبور وعدم استغلال المخزون التاريخي والحضاري والثقافي



# متابعة المشاريع العمومية

بولاية سيدي بوزيد

## تقدم إنجاز المشاريع العمومية 2011-2019

النسبة		الكلفة (م د)	العدد	مراحل الإنجاز
من الكلفة	من العدد			
37,4%	65,4%	838,530	1386	مشاريع منجزة
13,3%	15,2%	297,484	323	مشاريع بصدد الإنجاز
6,8%	8,4%	152,773	177	مشاريع بصدد إعداد أو طلب العروض
37,4%	6,0%	838,006	128	مشاريع بصدد الدراسة
5,1%	5,0%	114,293	105	مشاريع لم تنطلق
100,00%	100,00%	2241,085	2119	المجموع
1,9%	0,9%	43,700	19	منها مشاريع معطلة أو تواجه صعوبات

\* المشاريع المنجزة وبصدد الإنجاز: 80.6 % (1687 مشروعا)

\* مشاريع بصدد إعداد وطلب العروض أو بصدد الدراسة: 14.4 % (311 مشروعا بكلفة 991

م.د.

## تقدم إنجاز المشاريع العمومية المدرجة بالمخطط لسنوات 2019-2016

النسبة من <u>الكلفة</u>	النسبة من <u>العدد</u>	الكلفة (م د)	العدد	مراحل الإنجاز
12,63%	33,33%	156,375	244	مشاريع أنجزت
15,69%	28,01%	194,281	205	مشاريع بصدد الإنجاز
9,90%	20,22%	122,601	148	مشاريع بصدد إعداد أو طلب العروض
54,59%	9,56%	675,782	70	مشاريع بصدد الدراسة
1,08%	1,09%	13,312	8	مشاريع تواجه صعوبات
6,10%	7,79%	75,560	57	مشاريع لم تنطلق
100,00%	100,00%	1237,911	732	المجموع

المشاريع الكبرى (المهيكلة)  
والمدرجة بالمخطط التنموي  
**2020-2016**

## أهم المشاريع الكبرى (المهيكلّة) المدرجة بالمخطط 2016-2020

تقدم الإنجاز	المشروع	القطاع
بصدد إعداد الخطوط المرجعية الخاصة بالدراسة ( تن ترسيم إعتماذ قدره 100 أ.د. بميزانية التنمية لسنة 2018 )	تنمية المناطق الجبلية: إنجاز مشروع مندمج لتنمية المناطق الجبلية	الفلاحة والموارد المائية
بصدد الإنجاز بصدد الإنجاز	إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس- القيروان- سيدي بوزيد- القصيرين و قفصة إنجاز الطريق السريعة سيدي بوزيد – صفاقس: ط وطنية رقم 13 (السبالة – س ب الشرقية - اولاد حفوز) تهيئة شبكة الطرقات المرقمة: 121 كلم تدعيم شبكة الطرقات المرقمة: 207.6 كلم	التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مشروع غير مدرج بالميزانيات السابقة	دراسة جدوى إحداث سكة حديدية بين الفائص والمزونة	النقل
- تم ابرام عقود التشغيل لفائدة 164 عامل والإنتلاق في إستغلال المنجم بداية من شهر ماي 2019 و المشروع معطل - بصدد الإنجاز وبلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 65%. حيث كان من المنتظر انطلاق تزويد مدينتي جلمة وسيدي بوزيد بالغاز الطبيعي بداية من شهر جانفي 2020.	إستغلال منجم الفسفاط بالمكناسي تزويد الولاية بالغاز الطبيعي	الطاقة والمناجم

## أهم المشاريع الكبرى (المهيكله) المدرجة بالمخطط 2016-2020

القطاع	المشروع	تقدم الإنجاز
الصناعة	<p>إقتناء معمل البلاستيك بالمزونة وإعادة تهيئته</p> <p>تهيئة المنطقة الصناعية بسيدي علي بن عون (12 هك)</p> <p>تهيئة المنطقة الصناعية بئر الحفي (21 هك)</p> <p>تهيئة المنطقة الصناعية بأم العظام (50 هك)</p> <p>تهيئة المنطقة الصناعية بجلمة (15 هك)</p> <p>بناء محلات صناعية 15000 م<sup>2</sup></p>	<p>- إنتظار إنتصاب مستثمر له قدرة تشغيلية عالية (بصدد التنسيق مع أصحاب نوايا الإستثمار والتواصل معهم لضبط مواعيد لمعاينة مكونات المركب).</p> <p>- تم إعداد مثال الأشغال المختلفة من قبل ديوان قيس الأراضي على مساحة 13 هك على ملك الخواص وبصدد إعداد إجراءات اقتناء العقار والقيام بإجراءات تغيير صبغة الأرض. وبرمجة المشروع في الدراسات خلال سنة 2018. / إنطلاق الأشغال مبرمج لسنة 2021</p> <p>- تم إدراج تهيئة المنطقة الصناعية على حساب ميزانية التنمية لسنة 2016 غير أنه لم يقع إدراج العقار ضمن المدخرات الصناعية طبقا للفصل الأول من القانون عدد 47/2013 والقوانين المنقحة له وإصدارها بالرائد الرسمي / إنطلاق الأشغال مبرمج لسنة 2021.</p> <p>- تم إمضاء الصفقات الخاصة بربط المنطقة بمختلف الشبكات الخارجية بكلفة جملية تقدر بـ 4.4 م.د. وأفاد السيد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن المصالح المركزية للشركة بصدد القيام بالدراسات المتعلقة بأشغال الربط بشبكة الماء الصالح للشرب،/ تم إختيار المقاوله والإذن بإنطلاق الأشغال بتاريخ 18 جوان 2020.</p> <p>- تم إمضاء الصفقات الخاصة بربط المنطقة بمختلف الشبكات الخارجية بكلفة جملية تقدر بـ 2.3 م.د. /</p> <p>- تم تغيير صبغة الأرض وتم تحويز الوكالة بالعقار بتاريخ 16 ماي 2019 / تم إصدار إذن بداية الأشغال بتاريخ 14 فيفري 2019 ونسبة تقدم الأشغال تقدر بـ 14%</p> <p>- لم يقع بعد ترسيم إتمادات هذا العنصر في أي ميزانيات سابقة.</p>
البيئة	<p>انجاز مركز سياحة ايكولوجية ببئر الحفي</p> <p>دراسة وإنجاز مشروع لدعم السياحة الإيكولوجية</p> <p>بالحديقة الوطنية بجبل مغيلة</p>	<p>-الدراسة جاهزة و في انتظار حل الإشكال العقاري (معارضة مواطن على قطعة الأرض التي تم إختيارها) لبرمجة الإنجاز( وقع إعادة برمجته في المخطط 2016-2020 ) المقترح: إن لم يحل المشكل نقترح تغيير الموقع.</p> <p>-- المشروع لم ينطلق بعد، نظرا لأن حديقة مغيلة منطقة عسكرية مغلقة يقترح تحويل المشروع إلى محمية ربحانة بالرقاب.</p>
التجارة	<p>إحداث سوق إنتاج كبرى بأم العظام بسيدي بوزيد الغربية</p>	<p>-- تم تحويز الشركة بالعقار على مساحة 20 هك بموجب محضر التحويز المصادق عليه من قبل اللجنة الجهوية بتاريخ 26/07/2018 - تمت الموافقة المبدئية على الترفيع في الرصيد العقاري للشركة بـ 50 هك على أن يتم التنسيق في الغرض مع السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.</p> <p>-- تخصيص 2 م.د لفض إشكالية اقتناء العقار الذي سيقام عليه سوق الانتاج بالوسط وذلك للترفيع في مساهمة المجلس الجهوي في رأس مال الشركة المحدثة للغرض</p>

## أهم المشاريع الكبرى (المهيكلت) المدرجة بالمخطط 2016-2020

القطاع	المشروع	تقدم الإنجاز
الصحة	تطوير المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد إلى مستشفى جامعي إحداث مستشفى جهوي بجملة	- بناء وتهيئة بكلفة 218 م,د منها 185 م,د بواسطة قرض خارجي من AFD و التجهيز بكلفة 55,7 م,د منها 49,7 م,د بواسطة قرض خارجي من AFD - تم تبني تمويل المشروع من قبل البنك الكوتي للتنمية ضمن 04 مستشفيات جهوية وقد تم إمضاء اتفاقية التمويل بتاريخ 16/11/2017 وتم ترسيم الاعتمادات بميزانية 2018 (37800أد بناء و 14500أد تجهيزات) // من المتوقع انطلاق الدراسات نهاية الثلاثي الأول لسنة 2020(مدة الدراسات 12 شهرا- إجراءات التعاقد لإختيار المقاوله 06 أشهر-الأشغال 24 شهرا). - تمت المصادقة على قائمة مكاتب الدراسات التونسية خلال شهر فيفري 2020 وضبط رزنامة الإنجاز
الشؤون الإجتماعية	إحداث ضبعة فلاحية إدماجية لفائدة الأشخاص المعوقين القادرين على العمل	تم تخصيص قطعة ارض تمسح حوالي 19 هك ولم يقع إدراج المشروع ضمن الميزانيات السابقة
التكوين المهني والتشغيل	إحداث مركز تكوين وتدريب مهني بمعتمدية الرقاب	تم إعداد الرفع التوبوغرافي لقطعة الأرض ( TPD) وبصدد إعداد المثل الحي لتوزيع التجهيزات
التربية والتعليم	إحداث مدرسة إعدادية بمنطقة الرضاع بالرقاب إحداث مدرسة إعدادية بمنطقة الحنية 102 بأولاد حفوز	- بصدد تسوية الوضعية العقارية - في إنتظار مراجعة الخارطة التربوية بالجهة لإتخاذ قرار الإحداث من عدمه
الثقافة والمحافظة على التراث	بناء متحف الثورة إحداث مركز ثقافي فني ومعلوماتي بمدينة سيدي بوزيد	في انتظار إستكمال التسوية العقارية في انتظار توفير قطعة ارض وهناك مقترح بصدد الدرس لإعادة إستغلال مقر دار الثقافة القديم على مساحة 4500 م 2.
العدل	إحداث محكمة إستئناف بسيدي بوزيد بناء وحدة سجنية جديدة بسيدي بوزيد	في انتظار تحيين الدراسات في حدود الإعتمادات المرصودة 1.1 م. د. بصدد اعداد دراسة المؤثرات المائية للقطعة المزمع انجاز المشروع عليها
التنمية المندمجة	إنجاز مشروع تنمية مندمجة بمعتمدية السعيدة	- بصدد الإنجاز

مشاريع معطلة  
لأسباب عقارية  
(8 مشاريع بكلفة 11.2 م.د.)

المشاريع المعطلة  
(19 مشروعاً بكلفة 43.7 م.د.)

مشاريع معطلة لأسباب  
- إجرائية : 4 بكلفة 5.4 م.د.  
- مالية : 4 بكلفة 25.8 م.د.

مشاريع معطلة لأسباب  
اجتماعية : 3 بكلفة 1.2 م.د.



# العراقيل و الصعوبات التي حالت دون السير الطبيعي لإنجاز بعض

## المشاريع العمومية:

تتمثل أهم الأسباب المعيقة لإنجاز المشاريع العمومية في العناصر التالية:

◀ عدم توفر مدخرات عقارية ببعض المعتمديات حال دون الانطلاق في إنجاز العديد من المشاريع

◀ طول إجراءات تغيير صبغة الأراضي، وتخصيص العقارات المناسبة للمشاريع العمومية

تخلي بعض المقاولات عن تعهداتها إما لأسباب تخصها أو بتعلة انتهاء صلوحية العروض

والمطالبة بتحيين الأسعار نظرا لطول إجراءات فتح الاعتمادات المحالة تعهدا ودفعا خاصة

المتعلقة بالمشاريع العمومية ذات الصبغة الجهوية.

◀ طول مراحل إعداد الدراسات الفنية وإجراءات القيام بالصفقات العمومية،

◀ محدودية المقاولات بالجهة وخاصة الكبرى منها و المختصة.

◀ ضعف نسبة التأطير ونقص وسائل العمل بأغلب الإدارات الجهوية.

◀ اعتراض المواطنين على انجاز بعض المشاريع (خاصة مشاريع الحفريات وشبكات الربط ...)

## المقترحات لتجاوز الصعوبات لإنجاز المشاريع العمومية:

- العمل على إدراج كلفة اقتناء العقارات ضمن مكونات المشاريع العمومية المزمع انجازها
- تفويض إتمام إجراءات تغيير صبغة العقارات إلى اللجنة الجهوية وكأحد ادني فيما يتعلق بالعقارات المزمع تخصيصها لفائدة المشاريع العمومية.
- عدم برمجة إي مشروع إلا بعد توفير العقار المزمع انجاز المشروع عليه وضرورة إرفاق ملف اقتراح البرمجة بملف عقاري.
- دعوة البلديات للعمل على تكوين رصيد عقاري لاستعاب المشاريع العمومية مستقبلا
- تشكوجل المشاريع صعوبات تتعلق بطول إجراءات فتح إعتمادات التعهد والدفع مما إنجر عنه عزوف المقاولات عن في الصفقات والتخلي عن إنجاز المشاريع
- والمقترح فتح إعتمادات الدفع على ثلاثة أقساط وحسب تقدم إنجاز المشاريع (عوضا عن اعتماد كشوفات الخلاص).
- تدعيم الإدارات الجهوية الفنية بالمعدات اللوجستية والإمكانيات البشرية اللازمة لمتابعة تنفيذ المشاريع العمومية في جميع مراحل الانجاز.
- إضفاء أكثر مرونة لأمرى الصرف بالمجالس الجهوية للتصرف الوقتي في الاعتمادات المحالة تفاديا لتعطل بعض المشاريع العمومية ذات الصبغة الجهوية خاصة فيما يتعلق باعتمادات الدفع.

جدول بياني في قائمة أهم المشاريع المعطلة أو  
التي تشكو صعوبات في التنفيذ

# جدول في أهم المشاريع العمومية المعطلة أو التي تشكو صعوبات

الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المشروع		متابعة المشروع			المعتمدية	مكونات المشروع	المشروع	القطاع
الإجراءات المقترحة لتجاوز الصعوبات (إن وجدت)	توضيح الصعوبات	نسبة الإنجاز	الكلفة (أ.د)	سنة الإدراج بالميزانية				
المقترح: دعوة مصالح وزارة الصحة لتوفير الاعتمادات و مراجعة الكلفة بناء على البرنامج الوظيفي في حدود واحد مليون دينار	تم برمجة هذا القسط مع مشاريع بناء قسم استعجالي وقسم للتوليد وقسم لطب الاطفال ووحدة لتصفية الدم الا أنه لعدم توفر الاعتمادات لم يتم ارجاء انجازه وقد تم اقتراحه في المخطط الحالي (ضرورة توفير الاعتمادات) وتعيين الكلفة	معطل منذ سنة 2014	600	2012	الرقاب	تهيئة وتوسعة المصالح العامة	مستشفى الرقاب: تهيئة وتوسعة المصالح العامة	الصحة
اقتراح ادراج كلفة اقتناء العقار ضمن الكلفة الجمالية للمشروع	لم يتم توفير عقار على ملك الدولة و بصدد البحث عن عقار وقد تم رصد اعتمادات لفائدة الدراسات ضمن ميزانية سنة 2017	لم ينطلق	960	2017	جلمة	المساحة 2م446	بناء مركب طفولة جلمة	المرأة والأسرة والطفولة
	في طور البحث عن عقار يستوعب للمشروع	لم ينطلق	880	2018	السعيدة	المساحة 450 م2	بناء نادي أطفال السعيدة	

# جدول في أهم المشاريع العمومية المعطلة أو التي تشكو صعوبات

الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المشروع		متابعة المشروع			المعتمدة	مكونات المشروع	المشروع	القطاع
الإجراءات المقترحة لتجاوز الصعوبات (إن وجدت)	توضيح الصعوبات	نسبة الإنجاز	الكلفة (أ.د)	سنة الإدراج بالميزانية				
المقترح: مشروع ذو أهمية على الصعيد الجهوي يجب التسريع في توفير التمويلات من طرف الوزارة	في إطار البحث عن تمويل وجاري التنسيق بين وزارة الشؤون المحلية ووزارة الفلاحة	لم ينطلق منذ سنة 2016	5000	2012	سيدي بوزيد الشرقية	تهيئة العين و تثمينها في الري -انجاز بحيرة جبلية -استصلاح الأراضي بأشغال -المحافظة على المياه و التربة.-تهيئة منتزه عائلي حول العين -انجاز مقهى -انجاز نقطة لعرض و بيع المنتج الجهوي و الصناعات التقليدية.	التصرف في المستديم في الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر بعين رباو " فائض "	البيئة
المقترح إن لم يحل المشكل تغيير موقع المشروع	الدراسة جاهزة و في انتظار حل الإشكال العقاري (معارضة مواطن على قطعة الأرض التي تم إختيارها) لبرمجة الإنجاز( وقع إعادة برمجته في المخطط 2016-2020 )	لم ينطلق منذ سنة 2016	1000	2013	بئر الحفي	عدد 4 محلات تجارية وقاعة عرض ومقهى ومطعم سياحي وحديقة بيئية	محطة للسياحة الإيكولوجية	

# جدول في أهم المشاريع العمومية المعطلة أو التي تشكو صعوبات

الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المشروع		متابعة المشروع			المعتمدة	مكونات المشروع	المشروع	القطاع
الإجراءات المقترحة لتجاوز الصعوبات (إن وجدت)	توضيح الصعوبات	نسبة الإنجاز	الكلفة (أ.د.)	سنة الإدراج بالميزانية				
المقترح: التسريع في نسق الإجراءات و الإنطلاق في الإنجاز في أقرب الآجال	* نظرا لتغيير المصب المراقب بمركز معالجة طلبت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بتوسعة المساحة المخصصة من 17 هك إلى 30 هك وقد قامت اللجنة بالزيارات الميدانية و حدد موقع التوسعة و حظيت بالموافقة, * حاليا وجود موافقة مبدئية للتمويل من البنك الأوربي للتنمية, - الطلب ملح نظرا لتفاقم الوضع البيئي	لم ينطلق منذ سنة 2013	18000	2013	سيدي بوزيد الشرقية	مركز المعالجة+10 مراكز تحويل	مركز المعالجة+10 مراكز تحويل	البيئة
الإسراع بتخصيص قطعة الأرض لفائدة الديوان	تمت مراسلة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتاريخ 12 أفريل 2016 للتخصيص بإنجاز المحطة على قطعة الأرض التابعة لملك الدولة الخاص.	لم ينطلق	2400	2015	منزل بوزيان		انجاز محطة تطهير ومنظومة تحويل	التطهير

## جدول في أهم المشاريع العمومية المعطلة أو التي تشكو صعوبات

الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المشروع		متابعة المشروع			المعتمدية	مكونات المشروع	المشروع	القطاع
الإجراءات المقترحة لتجاوز الصعوبات (إن وجدت)	توضيح الصعوبات	نسبة الإنجاز	الكلفة (أ.د.)	سنة الإدراج بالميزانية				
تفعيل طلب شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي في الحصول على قرض على خزينة الدولة	عدم وجود التمويل الكافي	لم ينطلق (قرار وزاري لسنة 2015)	2231	2016	سيدي بوزيد الغربية	تخصيص مقاسم لمشاريع داعمة للإستثمار	إقتناء وتهيئة قطعة أرض (5 هك)	المركب الصناعي والتكنولوجي
تكثيف ومعاوضة الجهود الجهوية و الوطنية لدعم الحملة الترويجية لاستغلال المعمل لإنتصاب مستثمر له قدرة تشغيلية عالية.	عدم وجود مستثمر جدي	تم إقتناء المركب	3445	2016	المزونة		إقتناء وتهيئة واستغلال مركب البلاستيك بالمزونة	
تم مراسلة الديوان قصد التنسيق مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية قصد اتمام اجراءات التفويت والانطلاق في الدراسات الفنية للمشروع وإن تعذر ذلك فالمقترح تحويل مكان المشروع إلى مدينة سيدي بوزيد،	تم توفير عقار على ملك فرع الاتحاد التونسي . لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا ببئر الحفي تمسح حوالي 2م	تم توفير عقار على ملك فرع الاتحاد التونسي . لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا ببئر الحفي تمسح حوالي 2500 م	1200	2012	بئر الحفي	عدد 15 ورشة انتاج . رواق لعرض المنتج . قاعة متعددة الاختصاصات . عدد02 مكاتب ادارية . متحف . قاعة استقبال و استراحة . مخزن . عدد03 وحدات صحية . مأوى سيارات	بناء قرية حرفية	الصناعات التقليدية

## جدول في أهم المشاريع العمومية المعطلة أو التي تشكو صعوبات

الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المشروع		متابعة المشروع			المعتمدية	مكونات المشروع	المشروع	القطاع
الإجراءات المقترحة لتجاوز الصعوبات (إن وجدت)	توضيح الصعوبات	نسبة الإنجاز	الكلفة (أ.د.)	سنة الإدراج بالميزانية				
في طور البحث عن عقار بديل	إشكال عقاري بين وزارة المالية والبلدية والمطلوب إيجاد عقار بديل يمسح 800 م <sup>2</sup> لانجاز المشروع	معطل	976	2018	منزل بوزيان	بناء قباضة مالية ومكتب مراقبة الأداءات وعدد 02 مساكن وظيفية	بناء مجمع المالية بمنزل بوزيان	المالية
المقترح إدراج كلفة اقتناء العقار ضمن مكونات المشروع	في إطار البحث عن قطعة أرض وتخصيصها لفائدة وزارة المالية	معطل	500	2016	جلمة		إحداث قباضة مالية	
	في إطار البحث عن قطعة أرض وتخصيصها لفائدة وزارة المالية	معطل	320	2016	أولاد حفوز		إحداث قباضة مالية	
في انتظار اتمام التسوية العقارية للعقار البديل بين المصالح المركزية لوزارتي المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية	الدراسة متوقفة على مستوى الدراسات التمهيديّة المفصلة و المنقحة للأقساط الفنية :مقترح تغيير موقع المشروع حسب محضر الجلسة بتاريخ 26 أفريل 2018	معطل	4000	2017	سيدي بوزيد		بناء مستودع للحجز بسيدي بوزيد	



## جدول في أهم المشاريع العمومية المعطلة أو التي تشكو صعوبات

الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المشروع		متابعة المشروع			المعتمدية	مكونات المشروع	المشروع	القطاع
الإجراءات المقترحة لتجاوز الصعوبات (إن وجدت)	توضيح الصعوبات	نسبة الإنجاز	الكلفة (أ.د.)	سنة الإدراج بالميزانية				
العمل على اصدار قرار احداث الشركة خاصة وانه تم ادراج المشروع ضمن المخطط التنموي 2016-20120		لم ينطلق		مخطط			إحداث شركة جهوية للنقل	النقل
دعوة الشركة للتسريع في الانطلاق في الدراسات	تأخير كبير في الانطلاق في الدراسات وبرمجة الانجاز من الإدارة العامة بقفصة ووزارة النقل	لم تنطلق منذ سنة 2013	1000	2013	سيدي بوزيد الغربية	تعبيد/بناء/تجهيز	تهيئة الورشة	الشركة الجهوية للنقل القوافل
دعوة الوزارة للإسراع باقتناء العقار	تأخر في اقتناء العقار	لم ينطلق		2015	سيدي بوزيد الغربية	شراء/تسييج	تخصيص قطعة أرض لربوض الحافلات	

## جدول في أهم المشاريع العمومية المعطلة أو التي تشكو صعوبات

الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المشروع		متابعة المشروع			المعتمدة	مكونات المشروع	المشروع	القطاع
الإجراءات المقترحة لتجاوز الصعوبات (إن وجدت)	توضيح الصعوبات	نسبة الإنجاز	الكلفة (أ.د.)	سنة الإدراج بالميزانية				
العمل على تفعيل القرار	تم اقرار احداث الإدارة الجهوية بسيدي بوزيد ضمن مراجعة الأمر المتعلق بالمصالح الخارجية لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الذي ينص ضمن فصله الثاني على احداث إدارة جهوية للبيئة والتنمية المستدامة بكل ولاية. تم اعداد مشروع الأمر وتوجيهه الى مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة للقيام بالإجراءات اللازمة في الغرض.			قرار وزاري بتاريخ 21 أكتوبر 2015	سيدي بوزيد الغربية		إحداث إدارة جهوية للبيئة والتنمية المستدامة.	التمثيلات الجهوية
المطلوب العمل على تفعيل القرار وتعيين مهندس مختص بالإدارة الجهوية للتجهيز	النظر في السبل الكفيلة لإحداث تمثيلية لإدارة المياه العمرانية بولاية سيدي بوزيد من خلال إطار في الجهة في المجال المعني.			قرار وزاري بتاريخ 21 أكتوبر 2015	سيدي بوزيد الغربية		إحداث إدارة جهوية للمياه العمرانية	

متابعة قرارات وتوصيات المجلس  
الوزاري الممتاز المنعقد بمقر ولاية سيدي  
بوزيد بتاريخ 21 أكتوبر 2015  
حول مسيرة التنمية بالولاية  
(64 قرارا)

## توزيع القرارات حسب القطاعات وحالة التنفيذ

حالة الانجاز	عدد القرارات	القطاع
* عدد 02 قرارات تم انجازهما • عدد 04 قرارات في التنفيذ • عدد 01 قرار معطل (منجم الفسفاط بالمكناسي)	07	الصناعة والطاقة والمناجم
في التنفيذ	01	التجارة
* عدد 02 قرارات تم انجازهما • عدد 05 قرارات في التنفيذ • عدد 01 قرار لم تنطلق (إنجاز دراسات إحداث السدود الجبلية بريحانة من معتمدية الرقاب والقصبية من معتمدية منزل بوزيان والرمل من معتمدية جلماة).	08	الزراعة
* عدد 04 قرارات تم انجازها * عدد 03 قرارات في التنفيذ	07	الصحة
في التنفيذ	01	التعليم العالي
تم الإنجاز	01	الثقافة
تم الانجاز	01	الشؤون الاجتماعية
تم الانجاز	01	البنائات العمومية

حالة الانجاز	عدد القرارات	القطاع
عدد 04 قرارات في التنفيذ عدد 03 قرارات معطلة (تدعيم الشبّكة ومنظومة تحويل المياه بمدينة الرقاب، تطهير الأحياء الشعبية بالرقاب، مشروع التصرف المستديم في الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر بعين رباو "فائض")	07	البيئة والتنمية المستدامة
في التنفيذ	06	البنية الاساسية
تم الانجاز	01	الاتصالات
لم ينطلق (دراسة جدوى إحداث سكة حديدية بين الفائض والمزونة)	01	النقل
عدد 02 قرارات تم إنجازهم عدد 08 قرارات في التنفيذ عدد 02 معطل (إحداث نادي أطفال بالسعيدة، ونادي أطفال بجلمة) عدد 02 قرارات تم الغاءها	14	الطفولة والمرأة والاسرة
في التنفيذ	01	التكوين المهني والتشغيل
تم الإنجاز	01	السياحة
عدد 03 قرارات تم انجازهم عدد 01 قرار في التنفيذ (إقرار مدينة سيدي بوزيد كمقر للمجلس الأعلى للجماعات المحلية ) تم إقتراح عدد 03 قطع أراضي وفي إنتظار إختيار القطعة المناسبة). عدد 02 قرارات لم تفعل (إحداث إدارة جهوية للبيئة والتنمية المستدامة، إحداث إدارة جهوية للمياه العمرانية)	06	المرافق العمومية
عدد 18 قرار تم إنجازهم و عدد 34 قرار في التنفيذ و 02 قرارات تم إلغائها عدد 06 قرارات معطلة و 02 قرارات لم تفعل و 02 قرارات لم تنطلق	64	المجموع

متابعة قرارات وتوصيات المجلس الوزاري  
المضيق المنعقد بمقر رئاسة الحكومة .

بتاريخ 06 أوت 2019

حول الوضع التنموي بالولاية

(95 قرارا)

# توزيع قرارات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 06 أوت 2019 حسب القطاعات وحالة التنفيذ

المحور	منجز	بصدد الانجاز	بصدد طلب العروض	بصدد الدراسة	معطل	لم ينطلق	المجموع
تقريب الخدمات الإدارية من المواطن	0	1	0	0	0	1	2
مجال البنية التحتية والتجديد العمراني	1	4	2	3	0	1	11
المجال الصناعي	1	2	0	0	0	0	3
المجال العقاري	1	0	0	0	0	2	3
الزراعة والموارد المائية	1	3	5	4	0	3	16
المجال الصحي	8	2	0	3	0	9	22
مجال الشؤون المحلية والبيئة	6	0	0	0	0	3	9
مجال النقل	0	1	0	0	0	0	1
مجال التكوين المهني	0	0	0	1	0	1	2
تمويل مشاريع صغيرة بجهة سيدي بوزيد لخلق مواطن شغل	1	0	0	0	0	0	1
مجال التربية والتعليم العالي	1	0	0	1	0	1	3
المجال العدلي	0	0	0	2	0	0	2
مجال الداخلية	0	0	0	1	0	1	2
المجال الإجتماعي	1	0	0	1	0	0	2
المجال المالي	1	0	0	0	0	0	1
المجال الثقافي	2	1	0	0	0	1	4
مجال الشباب والرياضة	2	0	0	0	0	3	5
مجال الأسرة والمرأة والطفولة	3	0	0	1	0	2	6
<b>المجموع</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>95</b>
النسبة %	30.5	14.7	7.4	17.9	0	29.5	100

مع الشكر



**المشاريع المدرجة بالمخطط التنموي 2016-2020 بولاية سيدي بوزيد  
والغير مدرجة بميزانيات التنمية 2016-2020**

الملاحظات	الكلفة المبرمجة بالمخطط	المحتوى المادي المبرمج	بيان المشاريع
<b>الفلاحة والموارد المائية</b>			
لم يتم ترسيمها بالميزانيات السابقة	-	3	دراسة وإحداث 3 سدود جبلية (القصبة منزل بوزيان ربحانة الرقاب والرمل جلمة) (قرار مجلس وزاري 21 أكتوبر 2015)
مبرمجة بمقترحات 2021	4700		إعادة تهيئة المنطقة السقوية الحاجب 7 (247هك)
ضمن البرنامج المقترح لسنة 2021	700		إعادة تهيئة المنطقة السقوية سيدي السايح 1 (هك)
لم يتم ترسيمها بالميزانيات السابقة	-		اعادة تهيئة المنطقة السقوية الفالطة بالسبالة
مبرمجة بمقترحات سنة 2021	3000	13 كم	مسالك فلاحية داخل المناطق السقوية
تم ترسيم إعتمادات بقيمة 500 أ.د. خلال سنة 2017 للقيام بالدراسات اللازمة وبصدد الدراسة (قسط اول 201 كلم) بكلفة 180 أ د	36000	300 كلم	انجاز مشروع خاص بالمسالك الريفية يمكن من ربط جميع المناطق السقوية بالطرق المعبدة وفك عزلة بعض المناطق (300 كلم) (قرار وزاري)
لم يتم برمجتها بالميزانيات السابقة	9800	32 بئر	آبار الري
لم يتم برمجتها بالميزانيات السابقة	-	9 مشاريع	تزويد الريف بالماء الصالح للشرب
لم يتم برمجتها بالميزانيات السابقة	-	14 مشروع	تعهد هياكل الماء الصالح للشرب
( تم ترسيم إعتماده قدره 100 أ.د بميزانية التنمية لسنة 2018 للدراسة ) وبصدد إعداد الخطوط المرجعية الخاصة بالدراسة	30000	1	مشروع مندمج لتنمية المناطق الجبلية
<b>التربية والتعليم</b>			
في انتظار تحديد الأولويات			بناء مدرسة ابتدائية بالاحواز سيدي بوزيد الشرقية
في انتظار التسوية العقارية			بناء مدرسة ابتدائية طريق المكناسي بالرقاب المدينة
أجلت لسنة 2022			بناء مدرسة ابتدائية سيدي بوزيد الغربية(حي التقاسيم)
في انتظار التسوية العقارية			بناء مدرسة ابتدائية ببئر الحفي المدينة
لم يقع الى حد الآن البت في انجازها			احداث اعدادية بمنطقة الحمامة جلمة
في انتظار توفير قطعة أرض			احداث معهد ثانوي بسوق الجديد
<b>الطرق والجسور والمسالك</b>			
مبرمج لسنة 2021	14500	25 كلم	تهذيب الطريق المحلية رقم 889 من ن ك 25 الى ن ك 37 الهيشيرة - بئر الحفي ( معتمدية بئر الحفي)
مبرمج لسنة 2021	8500	18 كلم	تهذيب الطريق المحلية رقم 891 من ن ك 15 الى ن ك 33 الرقاب - حدود ولاية صفاقس ( معتمدية الرقاب)
مبرمج لسنة 2021	17500	29,5 كلم	تهذيب الطريق المحلية رقم 892 الرميلية - منزل بوزيان ( المكناسي ومنزل بوزيان)
مبرمج لسنة 2021	12000	14,5 كلم	تهذيب الطريق المحلية رقم 917 من ن ك 24,3 الى ن ك 38,450 بين مدينة بئر علي وحدود ولاية سيدي بوزيد
مبرمج لسنة 2021	15000	30 كلم	تدعيم الطريق المحلية رقم 903 من الرقاب الى قرية الرنرز مرورا بالسعيدة (الرقاب والسعيدة)
مبرمج للتثنية في إطار مشروع الطريق السريعة سيدي بوزيد المكناسي	13500	38 كلم	تدعيم الطريق الجهوية رقم 83 من مدينة السوق الجديد الى المكناسي (السوق الجديد والمكناسي)
مبرمج لسنة 2021	13500	28 كلم	تدعيم الطريق المحلية رقم 903 من الرقاب الى المكناسي (الرقاب)

والمكناسي)			
ميرمج إلى مابعد سنة 2021	13000	37 كلم	تدعيم الطريق المحلية رقم 889 من ن ك 0 الى ن ك 25 الهيشيرية - بئر الحفي (السوق الجديد وبئر الحفي)
ميرمج لسنة 2021	9000	جسر	بناء جسر على وادي الناظور ( الطرق المحلية رقم 892 ، ن ك 16 ) ( منزل بوزيان)
ميرمج لسنة 2021	3000	4 كلم	مدخل مدينة جلمة بالطريق الوطنية رقم 3 (معمدية جلمة)
تم تحديد المقاوله وفي انتظار توفير الإعتمادات	2500	3 كلم	مدخل مدينة السوق الجديد بالطريق الجهوية رقم 83 (معمدية السوق الجديد)
بصدد الدراسة	25000	9,5 كلم	الطريق الحزامية الجنوبية لمدينة سيدي بوزيد
حماية المدن من الفيضانات			
لم يقع برمجة الإنجاز	1000		حماية قرية المبروكه (المكناسي) من الفيضانات
السكن			
في طور اعداد ملف طلب العروض	1570	35 مسكن إجتماعي	بناء 36 مسكن اجتماعي بحي الجديد بالمزونة
لم يقع برمجة الإنجاز		بناء 75 مسكن	تهيئة 75 مقسم بحي النوامر ببلدية سيدي بوزيد
البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي			
التهديب والتجديد العمراني			
بصدد البحث عن التمويل	5050	طرقات (12 كم) - تطهير (5 كم) - تنوير عمومي (300 نقطة انارة) - تحسين 200 مسكن	تهذيب حي التحرير ببلدية سيدي علي بن عون
	5950	طرقات (10 كم) - تنوير عمومي (200 نقطة انارة) - فضاء متعدد الإختصاصات - فضاء صناعي - تحسين 200 مسكن	تهذيب حي الشهداء ببلدية المزونة
	3250	طرقات (10 كم) - تنوير عمومي (200 نقطة انارة) - تحسين 150 مسكن	تهذيب حي الهيشيرية ببلدية سيدي بوزيد الغربية
	5700	طرقات (12 كم) - تصريف مياه الأمطار (1,5 كم) - تنوير عمومي (300 نقطة انارة) - فضاء متعدد الإختصاصات - تحسين 200 مسكن	تهذيب حي النجاح ببلدية المكناسي
قطاع الصحة			
تم برمجة هذا المشروع مع مشاريع بناء قسم استعجالي وقسم للتوليد وقسم لطب الاطفال و وحدة لتنصيف الدم الا أنه لقله الاعتمادات لم يتم انجاز هذا المشروع .تم اقتراحه في المخطط الحالي (ضرورة توفير الاعتمادات)وتحيين الكلفة بناء على البرنامج الوظيفي في حدود واحد مليون دينار	600		تهيئة وتوسعة المصالح العامة بمستشفى الرقاب
لم يتم ترسيمها بالميزانيات السابقة			بناء عيادات خارجية بمستشفى الرقاب
			بناء قسم مخبر وأشعة بمستشفى الرقاب
			بناء قسم مخبر وأشعة بمستشفى المكناسي

			بناء قسم جراحة العظام بمستشفى الرقاب (احداث)
			بناء قسم لجراحة العظام بالمكناسي
			تطوير مستشفى (بن عون/ بئر الحفي) الى مستشفى جهوي صنف ب
لم يتم ترسيمها بالميزانيات السابقة			تطوير 5 مراكز صحة أساسية الى صنف 4 بأهم التجمعات السكانية
			توسعة الادارة الجهوية (ادارة النهوض بالصحة و التفقدية الطبية)
			بناء مخازن للادوية بالمستشفيات(10)
			بناء فضاءات للارشيف بالمؤسسات الصحية(12)
			بناء ادارة لمجمع الصحة و مسكن وظيفي
			تطوير مدرسة علوم التمريض الى مركز للتكوين المستمر
			توسعة الدائرة الصحية ببئر الحفي
			بناء مركز وطني لمقاومة الادمان بسيدي بوزيد
			توسعة مستشفى المزونة و تطويره
			توسعة مستشفى أولاد حفوز
			تطوير مركز الصحة الاساسية بسوق الجديد
	<b>قطاع الشؤون الإجتماعية</b>		
تم تخصيص 100 أ.د ضمن ميزانية سنة 2019 للمشروع(المشروع ينفذ مركزيا)	10000	مكاتب و فضاءات ادارية	إحداث ضيعة فلاحية ادماجية لفائدة الاشخاص المعوقين القادرين على العمل
<b>قطاع التكوين المهني</b>			
تم تخصيص قطعة أرض تمشح 2 هك وبصدد إنجاز دراسة فنية لتحديد الإختصاصات المزمع إحداثها بالمركز	15000		إحداث مركز تكوين وتدريب مهني بالرقاب
<b>قطاع الشباب والرياضة</b>			
لم يقع إدراجه بالميزانيات السابقة	150	تهيئة الملعب	تهيئة دار الشباب بالرقاب
<b>قطاع الثقافة</b>			
في انتظار توفير قطعة ارض	1500	2000 م م	بناء مركز ثقافي فني ومعلوماتي بمدينة سيدي بوزيد (مكتبة نموذجية رقمية متعددة الاختصاصات والوسائط ، مقر المعهد الجهوي للموسيقى وقاعة عروض ومقر المندوبية )
لم يقع ترسيم هاته المشاريع ضمن الميزانيات السابقة 2016-2020	600	500 م م	توسعة المكتبة العمومية منزل بوزيان
	2000	3000 م م	بناء دار ثقافة السوق الجديد
	800	1000 م م	بناء مكتبة عمومية بنعون
	600	500 م م	توسعة المكتبة العمومية بئر الحفي
	2100	1000 م م	احداث قاعة عروض بالمكناسي ونوادي اختصاص
	2100	1000 م م	احداث قاعة عروض بالمزونة ونوادي اختصاص
	2100	1000 م م	احداث قاعة عروض بجملة ونوادي اختصاص
	2100	1000 م م	احداث قاعة عروض بالرقاب ونوادي اختصاص
	600	500 م م	توسعة المكتبة العمومية جلمة
	600	500 م م	توسعة المكتبة العمومية الرقاب
	600	500 م م	توسعة المكتبة العمومية أولاد حفوز
	800	1000 م م	احداث مكتبة عمومية بالسعيدة
	800	1000 م م	بناء عمومية بالهيشرية
	600	200 م م	توسعة المكتبة الجهوية سيدي بوزيد
	2000	3000 م م	بناء دار ثقافة السعيدة

	600	500 م م	توسعة المكتبة العمومية السبالة
	1000	700 م م	احداث رواق الفنون بسيدي بوزيد
	800	1000 م م	احداث مكتبة عمومية بالحنية 102 اولاد حفوز
	500		ترميم بعض المعالم بجهة سيدي بوزيد حسب الأولوية
<b>قطاع المرأة والأسرة والطفولة</b>			
تم بعث فريقين الأول بمعتمدية منزل بوزيان ورصد له اعتماد قدره 15 أ.د. والثاني فريق بمدينة سيدي بوزيد ورصد له اعتماد قدره 16 أ.د. ضمن ميزانية سنة 2019	200		إحداث وتجهيز 2 فرق متنقلة للمسنين
<b>قطاع النقل</b>			
لم يقع ادراجهما ضمن الميزانيات السابقة			إحداث شركة جهوية للنقل بسيدي بوزيد
		60 كلم	دراسة جدوى إحداث سكة حديدية بين الفانض والمزونة



الجمهورية التونسية

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الوسط الغربي

الإدارة الجهوية للتنمية بالقيروان

أهم المشاريع المعطلة وأسباب التعطيل بولاية القيروان

## المشاريع المعطلة بولاية القيروان إلى غاية أفريل 2020 حسب وضعية متابعة المشاريع

الإشكاليات	الكلفة (أد)	المشروع
<b>أسباب عقارية</b>		
		<b>التكوين المهني و التشغيل</b>
تم تقديم طلب إلى الولاية بتاريخ 19 أفريل 2019 بهدف تسوية الوضعية القانونية لقطعة الأرض الكائنة بمعمودية العلا والتي تمت المصادقة على التفويت فيها خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الجهوي بالقيروان لسنة 2013 لفائدة الوكالة التونسية للتكوين المهني، إلا أنه تم الاعلام عبر مراسلة الولاية عدد 3556 بتاريخ 02 ماي 2019 بتعذر تسوية الوضعية القانونية حيث لا يوجد ما يثبت انجرار الملكية ، كما أن المجلس الجهوي لا يملك قطعة أخرى بمعمودية العلا يمكن اقتراحها كبديل.	800	إحداث وحدة للتدريب المهني بالعلاء (بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات) (2011)
		<b>التنمية المندمجة</b>
إعتراض المعهد الوطني للتراث على تخصيص العقار لفائدة المشروع	2370	احداث سوق يومية للخضر و الغلال بالقيروان الجنوبية (2019)
	<b>3170</b>	<b>المجموع</b>
<b>أسباب اجرائية</b>		
		<b>الشباب و الرياضة</b>
إيقاف الأشغال بقرار من القضاء منذ سنة و تم 75% المرات وعقد تمت مراسلة البلدية في العديد من جلسات في الغرض لايجاد الحلول المناسبة	1517	توسعة المدارج بمركب حمدة العواني (2009)
تم فسخ الصفقة بتاريخ 2018/12/05. لم يتم إتمام إجراءات الإعلان عن طلب العروض من طرف بلدية القيروان رغم المراسلات العديدة	508	إتمام تهيئة الملعب البلدي علي الزواوي بالقيروان (قسط 2012) (إعادة تعشيب اصطناعي للملعب الفرعي 2)

		<b>الصحة</b>
اعادة بناء مركز الصحة الأساسية النبش (2012)	195	في انتظار المصادقة على الدراسات
		<b>المالية</b>
بناء مقر الإدارة الجهوية للديوانة ومقر الحرس الديواني بالقيروان(2013)	17241	خلال جلسة اللجنة الداخلية للبيانات المدنية تم اقتراح تعديل البرنامج الوظيفي من طرف صاحب المشروع لذلك تم توقيف اجراءات تعيين المصممين لحين المد ببرنامج جديد
	19461	<b>المجموع</b>
<b>اعتراض مواطنين</b>		
		<b>PRD2016</b>
تزويد الأفرعين (الوسلاتية) (2016)	296	بسبب اعتراض مواطنين من منطقة أولاد معطل 30% بامر,بصدد فسخ الصفقة بالتراضي
		<b>الطفولة</b>
احداث نادي أطفال بحفوز (2016)	524	أشغال متوقفة, تم التنبيه على المقاول
		<b>الماء الصالح للشرب عن طريق الشركة</b>
تزويد دار الجمعية بالسيخة (2016)	707 4	توقف أشغال وضع قنوات الجلب بسبب اعتراض مجموعة من متساكني قريميط من معتمدية النفيضة ولاية سوسة (شبكة التوزيع:100%,بناء الخزان:100%,شبكة الجلب:70%)
	5527	<b>المجموع</b>
<b>بطء مقاولين</b>		
		<b>الصحة</b>
بناء قسم إستعجالي بالمستشفى المحلي بالسيخة (2012)	650	بصدد إعداد ملف الصفقة من طرف المصالح الفنيّة لإدارة التجهيز لاستكمال الأشغال المتبقية ( 2%)
		<b>التعليم العالي</b>

الأشغال متوقفة منذ ما يقارب 3 أشهر بدون أي مبرر ونسبة الإنجاز تقدر بـ 95%	542	توسعة المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان (بناء مقر إدارة المعهد)
		<b>الشباب و الرياضة</b>
فسخ الصفقة منذ 2014 و تم الإعلان عن طلب تم 65% البلدية للنظر في امكانية العروض عديد المرات, تمت مراسلة يتم تجزء الأشغال الى أقساط للضغط على تكلفة الانجاز و لم الى حد الآن أي تقدم في الغرض	690	تهيئة المركب الشبابي بالقيروان (2011)
65%: تم فسخ الصفقة بتاريخ 2017/01/03 و بصدد حصر الكميات المنجزة, لم يتم إتمام إجراءات الإعلان عن طلب العروض من طرف بلدية القيروان	492	مواصلت تهيئة ملعب علي زاوي ( قسط عدد 3) (2011/ 2014)
	2374	المجموع
	30532	المجموع: 13 مشروع بكلفة

## أهم أسباب تعطل المشاريع بولاية القيروان

- ضعف جاهزية بعض المشاريع المرسمة من حيث الدراسات المسبقة
- مركزية القرار الإداري وغياب بعض التمثيليات الجهوية لبعض الإدارات
- تأخر في فتح الاعتمادات تعهدا ودفعا مما أدى إلى فسخ عديد الصفقات
- عزوف المقاولين بسبب عدم خلاص مستحققاتهم
- نقص في الموارد البشرية للإدارات الفنية مما انجر عنه نقص في متابعة الانجاز وبطء في إعداد البرامج الوظيفية
- عدم دخول بعض المشاريع المنجزة حيز الاستغلال لعدة أسباب منها عدم توفر الإطار البشري أو الربط بالشبكات...
- اعتراض المواطنين
- إشكاليات تتعلق بالوضعية العقارية



## أهم المشاريع المهيكلية والتي لم ينطلق إنجازها وهي من المشاغل الهامة لمتساكني ولاية القيروان

لقد وقع ترسيم العديد من المشاريع المهيكلية بالمخطط الخماسي 2016-2020 إلا أنه تأخر الانطلاق في إنجازها ولا زالت محل مطالبة من قبل المواطنين والمجتمع المدني حيث كانت سبب العديد من الوقفات الإحتجاجية بالولاية، ويتمثل أهمها ما يلي:

الملاحظات	الكلفة المبرمجة	المشروع
هبة سعودية	200 م د	المستشفى الجامعي
	45 م د	المستشفى الجهوي بحفوز
	35 م د	المستشفى الجهوي بحاجب العيون
تم رصد 700 أ د للدراسات	7 م د	المدرسة الوطنية للمهندسين
مشروع وطني	تحددها الدراسات	الطريق السيارة تونس جلمة
مشروع وطني	تحددها الدراسات	السكة الحديدية النفيضة القيروان
لم يقع برمجة محطة للتطهير ومحطة للضغط العالي	23 م د	توسعة المنطقة الصناعية السبيخة
قرار حكومي	20 م د	المسلك السياحي القيروان عين جلولة الوسلاتية
مدرج بالمخطط	7 م د	تهيئة الطريق الجهوية رقم 46
	4 م د	تهيئة الطريق المحلية رقم 804
مشروع وطني	تحددها الدراسات	احداث منطوق سياحية
مشروع وطني	تحددها الدراسات	جلب فائض مياه الشمال
قرار حكومي	تحددها الدراسات	مشروع ترفيهي تجاري ببرك الأغالبية
قرار حكومي	تحددها الدراسات	احداث قطب فلاحي
مشروع وطني	تحددها الدراسات	احداث منطقة لوجستية بالمتبسة

• الطريق المحلية رقم 804



الطريق الجهوية رقم 46





**متابعة القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري بتاريخ 2017/11/30**

**حول مسيرة التنمية بولاية القيروان**

**إلى موفى ماي 2020**

ملاحظات	نص المتابعة ماي 2020	آجال التنفيذ	نص القرار
			<b>الاجراءات العاجلة</b>
الهدف من الخطة هو التخفيض من نسبة الأمية على الأقل بنسبة 1% في السنة	<p>- تم إعداد خطة جهوية بالتنسيق مع إدارة البرنامج الوطني</p> <p>- انطلاق جزئي : تم إحداث عدد 62 مركزا لتعليم الكبار بالتنسيق مع أطراف الشراكة</p>	خلال سنة 2018	<p>1- وضع خطة عاجلة لمعالجة ظاهرة ارتفاع نسبة الأمية بالولاية بين مختلف الوزارات المعنية و خاصة وزارات المرأة و الأسرة و الطفولة و الشؤون الاجتماعية و التربية و توفير كل الإمكانيات المادية و البشرية اللازمة لتحسين المؤشرات و الانطلاق الفوري في تنفيذها</p>
تم الانجاز	<p>تم فتح الإعتمادات التالية :</p> <p>*قطاع الصحة : 2.365م د</p> <p>*قطاع التربية : 2.380م د</p>	(ديسمبر 2017 وجانفي 2018)	<p>2-فتح اعتمادات فورية لتسريع كافة المشاريع الراجعة بالنظر لكل الوزارات و خاصة قطاعي الصحة و التربية على قسطين (ديسمبر 2017 و جانفي 2018)</p>

<p>قسط1:بصدد الانجاز</p> <p>قسط2:بصدد تسجيل الصفقة</p> <p>قسط3:تم طلب فتح الاعتماد من طرف وزارة التربية</p>	<p>-تمت البرمجة على 3 أقساط:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● قسط1: 5 مؤسسات اعدادية و ثانوية بكلفة 3 م د انطلقت الأشغال في جوان 2018 , تقدم الانجاز: أشغال بنسب متفاوتة بين 45 و 80%</li> <li>● قسط 2: 3 مؤسسات اعدادية(الوسلاتية, بوحجلة و عين جلولة) بكلفة 2,365م (د) : بصدد تسجيل الصفقة</li> <li>● 5 مدارس ابتدائية(عين دباب السيخة, الدخيلة, المعرفة, نصر الله المركز و الصعانيين) في انتظار فتح الاعتمادات بكلفة 3.225.م.د</li> </ul>	<p>الإنطلاق في ذلك خلال شهر مارس 2018(وزارة التربية)</p>	<p>3-رصد اعتماد قدره 14 م د لتعهد المؤسسات التربوية و صيانتها و الانطلاق في ذلك خلال شهر مارس 2018</p>
	<p>تم طلب العروض وبصدد الفرز الفني</p>		<p>4-رصد اعتماد فوري (حوالي 1.5 م د) لفائدة المجلس الجهوي عن طريق البرنامج الجهوي للتنمية لتجهيز مراكز الفتاة الريفية (وزارة التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي)</p>
<p>في انتظار إبرام اتفاقية مع ديوان قيس الأراضي</p>	<p>تم إحداث وحدة التصرف حسب الأهداف صلب الوزارة بموجب الأمر عدد 504 بتاريخ 2018/6/7 لضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة.</p> <p>بصدد إحصاء المساكن ب 136تجمع سكني بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء</p>		<p>5-الانطلاق الفوري في تسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة على أراض دولية عن حسن نية و البالغ عددها 112 تجمعا سكنيا.</p>

	<p>تم تمكين الشبيبة الرياضية القيروانية من منحة إستثنائية قدرها 100 ألف دينار في انتظار تسديد منح بقية الجمعيات الرياضية بالجهة.</p>		<p>6-إسناد منح استثنائية للجمعيات الرياضية بالقيروان (وزارة شؤون الشباب و الرياضة)</p>
	<p>قرار السيد والي القيروان بتاريخ 12 أكتوبر 2018 حول الاعلان عن كراء عقارات دولية فلاحية خارج إطار برنامج اعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية المنصوص عليها وذلك عن طريق المراكنة لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا وغيرهم :حاليا بصدد <u>فرز مطالب الترشيحات حسب شروط المنشور عدد06 بتاريخ 2018/07/16</u></p>		<p>7-إقرار مبدأ وضع أراضي فلاحية دولية غير مسجلة وخارج نطاق الهيكل و عرضها للكراء لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا و غيرهم مع عقد مجلس وزاري في الغرض خلال الأيام القادمة (وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري ووزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية)</p>
	<p>تم إسناد الصفقة و تسليم التجهيزات على أقساط</p>		<p>8-الانطلاق الفوري في انجاز برنامج الاستثمار البلدي, يشمل المعدات و التجهيزات, البنية الأساسية والمشاريع الاقتصادية و التجهيزات الجماعية بالبلديات الجديدة و تقديم دعم عاجل و فوري للبلديات المحدثة و بعض الدوائر البلدية</p>

			لاقتناء معدات نظافة بكلفة جمالية تقدر ب 10 م د (وزارة الشؤون المحلية و البيئة).
في انتظار فتح الاعتمادات	تمت إحالة ملف الدراسات إلى مصالح وزارة الشؤون الدينية بتاريخ 2018/9/20 لفتح الاعتمادات		9-الانطلاق الفوري في الدراسات لتعهد و صيانة جامع عقبة ابن نافع باعتماد قدره 8 م د و ترميم جامع الباي و مسجد الأنصار و جامع الجبلي و بقية مساجد المدينة العتيقة باعتماد قدره 2 م د(وزارة الشؤون الدينية)
	في انتظار ضبط الخطة الإضافية بمقتضى قرار صادر عن السيد وزير الشؤون الاجتماعية		10-الترفيغ في حصة ولاية القيروان من المنح المسندة لفائدة العائلات المعوزة (وزارة الشؤون الاجتماعية)
	تم امضاء التحويل الوقتي لقطعة ارض تمسح 14.5هك لفائدة المجلس الجهوي بالقيروان بتاريخ 2018/9/19 في طور استكمال الدراسات الأولية من قبل مصالح الإدارة الفنية		11-إطلاق دراسة لبعث قطب تجميحي للخضر و الغلال (وزارة التجارة).
	تم تخصيص 02هك بفضاء الفسقية لإحداث مسرح الهواء الطلق ومركز الفنون الدرامية		12-تخصيص اعتماد لانطلاق الدراسات لبعث

	<p>والركحية ومتحف خلال المجلس الجهوي للثقافة المنعقد ليوم 2018/10/06 باشراف السيد وزير الشؤون الثقافية.</p> <p>أبدى المعهد الوطني للتراث موافقته على بعث مشروع للهواء الطلق بفضاء فسقية. وفي انتظار تقديم الدراسات الأولية للمشروع</p> <p>قام المعهد الوطني للتراث بتقديم نسخ رقمية من الخارطة الهندسية مع نسخة رقمية من الأشغال الخاصة والمختلفة TPD مع نسخ من مثال التهيئة العمرانية الخاصة بفضاء فسقيات الأغالبة منذ بداية سنة 2019 بناء على وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية لإعداد مشروع مناظرة أفكار كما قدم المعهد بناء على طلب الوكالة ملاحظاته بشأن مناظرة الأفكار الخاصة بتهيئة فسقية الأغالبة منذ منتصف فيفري 2019 وانتظار الإعلان عن المناظرة بشكلها النهائي من قبل الوكالة.</p>		<p>مسرح للهواء الطلق بفضاء فسقية الأغالبة (وزارة الشؤون الثقافية)</p>
<p>تم الإستلام الوقتي لتهيئة مدخل المنطقة الصناعية بتاريخ 12 سبتمبر 2018</p>	<p>تم اصدار الاذن ببدء اشغال تهيئة المنطقة الصناعية السبيخة 2 على مساحة 100 هك بتاريخ 2018/10/16, بصدد الانجاز: 35%</p> <p>الأشغال بصدد الانجاز لتتواصل على امتداد سنتين, تمت عملية التفويت في المقاسم للمستثمرين الراغبين في الانتصاب والذي دخل جزء منهم في طور الإنتاج</p>	<p>قبل شهر سبتمبر 2018</p>	<p>14-الانطلاق الفوري في انجاز 20 هك بالمنطقة الصناعية السبيخة 2 و انطلاق الأشغال على بقية المساحة قبل شهر سبتمبر 2018.</p>



			<u>الارتقاء بمؤشرات التنمية إلى المستوى الوطني</u>
تنفيذ البرنامج من طرف المندوبية العامة على امتداد 5 سنوات انطلاقا من سنة 2018	تم إمضاء العقود من طرف السادة الولاة والسيد وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي بتاريخ 17 أفريل 2018. تم إعداد رزنامة لتنفيذ البرنامج من طرف المندوبية العامة على امتداد 5 سنوات انطلاقا من سنة 2018		15-انجاز مشاريع التنمية المندمجة بكل من العلاء , الوسلاتية,بوحجلة,الشراردة,الشبيكة, حفوز,السيخة,القيروان الجنوبية,القيروان الشمالية,عين جلولة,منزل مهيري بكلفة جمالية تقدر ب 110 م د(وزارة التنمية والاستثمار و التعاون الدولي ) و تنطلق الأشغال خلال النصف الثاني من سنة 2018
بصدد الانجاز	بصدد الانجاز الكلفة المحينة: 11 م د	تنطلق الأشغال خلال الثلاثي الأول من سنة 2018	16-انجاز محطة تطهير بالسيخة بكلفة 9 م د (وزارة الشؤون المحلية و البيئة) و تنطلق الأشغال خلال الثلاثي الأول من سنة 2018

<p>إنطلاق الأشغال خلال سنة 2020</p>	<p>بصدد إعداد ملفات طلب العروض, تم برمجة المشروع في إطار حماية المتوسط</p>	<p>تنطلق الأشغال خلال الثلاثي الأول من سنة 2018</p>	<p>17-انجاز مشروع تهذيب الشبكة بحي الجامع بالقيروان و أحياء حشاد ونهج الضاحية و شارع الطيب المهيري بكلفة 2 م د و تنطلق الأشغال الثلاثية الثانية من سنة 2018 (وزارة الشؤون المحلية والبيئة).</p>
<p>سيتم الإعلان عن طلب العروض حال المصادقة على دراسة المؤثرات علي المحيط</p>	<p>بصدد القيام بالدراسات التنفيذية و دراسة المؤثرات على المحيط لمدينتي منزل المهيري و نصرالله</p>	<p>تنطلق الأشغال خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018</p>	<p>18-تطهير مدن منزل مهيري و نصر الله و العلاء و يتضمن انجاز محطتي تطهير وتدعيم الشبكة بكلفة 8 م د (وزارة الشؤون المحلية و البيئة ) و تنطلق الأشغال الثلاثي الثاني من سنة 2018</p>
<p>بلدية الباطن : تم إعداد ملف طلب العروض وبصدد توفير العقار لمحطة الضخ من قبل بلدية القيروان و سيتم الإعلان عن طلب العروض خلال شهر ديسمبر 2019 بلديات العلم و الدلوسي : إنطلاق الرفع الطبوغرافي و إعداد ملف طلب العروض خلال شهر جوان 2019 لتتطلق الأشغال أواخر 2020</p>	<p>بصدد إعداد ملفات طلب العروض</p>	<p>تنطلق الأشغال قبل موفى سنة 2018</p>	<p>19-انجاز مشروع تطهير البلديات الريفية بالباطن و العلم و الدلوسي, يتضمن مد 26 كم من القنوات لفائدة 900 ساكن بكلفة 3.6 م د على أن تنطلق الأشغال قبل موفى سنة 2018(وزارة الشؤون المحلية و البيئة)</p>

<p>تم تعيين مكتب الدراسات في فيفري 2020</p> <p>-المدة التعاقدية للدراسات 12 شهرا</p> <p>-انطلاق الأشغال موفى شهر أوت 2021</p> <p>باعتبار اجراءات التعاقد مع المقاوله ( مدة الانجاز 36 شهرا)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تمت تسوية الوضعية العقارية للأرض</li> <li>• تم إمضاء كراس الشروط</li> <li>• تمت المصادقة على إحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة المشروع</li> <li>• تمت المصادقة على العقد المزمع إبرامه مع مكتب الدراسات السعودي 'الدار الدولية للهندسة' من طرف الهيئة العليا للطلب العمومي..</li> </ul>	<p>الإنطلاق في الدراسات فورا والشروع في الإنجاز قبل موفى سنة 2018</p>	<p>20-الحرص على انجاز المستشفى الجامعي بكلفة 200 م د و الانطلاق في الدراسات فورا و الشروع في الانجاز قبل موفى سنة 2018</p>
<p>البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع: انطلاق الدراسات منتصف 2020 ) مدتها التعاقدية 12 شهرا</p> <p>انطلاق الأشغال : نهاية سنة 2022 بعد استكمال إجراءات طلب العروض والتعاقد</p>	<p>تم تحديد مكان المشروع و تم إعداد الدراسات الأولية ( المسح الجيولوجي و TPD ) تم تسجيل عقد اقتناء الأرض. تم إمضاء اتفاقية التمويل بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية .</p> <p>وقع الإعلان عن مناظرة الهندسة المعمارية بتاريخ 2019/01/07</p>	<p>الانطلاق في الدراسات فورا والشروع في الإنجاز قبل موفى سنة 2018</p>	<p>21-انجاز المستشفى الجهوي بحفوز بكلفة 45 م د و الانطلاق في الدراسات فورا و الشروع في الانجاز قبل موفى سنة 2018</p>

مع المقابولة (مدة الانجاز 24 شهرا)			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• المستشفى الجهوي : تم اعداد البرنامج الوظيفي و الكلفة الجمالية للمشروع وتم مد الوزارة بالملف (تم تحيين الكلفة 35 م د) تم تخصيص 700 أد للدراسات بميزانية سنة 2019.</li> <li>• وحدة تصفية الدم: تم اعداد البرنامج الوظيفي و الكلفة الجمالية للمشروع من طرف الادارة الجهوية للصحة بالقيروان وتم ارسال الملف لوزارة الاشراف للدراسة. تم ادراج المشروع بميزانية 2020</li> </ul>	الإنطلاق في الدراسات خلال سنة 2018	22-انجاز مستشفى جهوي بحاجب العيون بكلفة 15 م د و بناء و تجهيز قسم تصفية الدم بتكلفة 1.3 م د و الانطلاق في الدراسات خلال سنة 2018
تم الانجاز	تم تركيب آلة القسطرة وبصدد الاستغلال	خلال شهر جانفي 2018	23-تركيب آلة القسطرة الطبية خلال شهر جانفي 2018 بكلفة 1.6 م د

تم الانجاز	تم تسليم و تركيب آلة التصوير بالرنين المغناطيسي بصدد الاستغلال	خلال الثلاثي الأول لسنة 2018	24-اقتناء آلة تصوير بالرنين المغناطيسي خلال الثلاثي الأول لسنة 2018 بكلفة 3.3 م د
	- بالنسبة للآبار: تم إسناد الصفقات. - بالنسبة لاقتناء القنوات من الحديد المصبوب: تم إسناد الصفقة إلى المزود جندار. - بالنسبة لاقتناء القنوات من الخرسانة سابقة الإجهاد: تم إسناد الصفقة إلى المزود <b>BONNA Béton</b> . بالنسبة لأشغال وضع القنوات: من المتوقع نشر طلب العروض خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020	ستمتد الأشغال من نوفمبر 2018 إلى نوفمبر 2019	25-انجاز مشروع تدعيم مناطق جنوب الولاية بالماء الصالح للشرب عبر انجاز محور لجلب المياه لتحسين تزويد مناطق جهينة الجنوبية, مركب الدخيلة, بئر الجديد و مركب المشربات و إحداث 6 آبار عميقة و تجهيزها. و سينتفع بالمشروع أكثر من 15 ألف ساكن بكلفة 29.8 م د و ستتمد الأشغال من نوفمبر 2018 إلى نوفمبر 2019
سيقع التمويل عن طريق البنك الافريقي للتنمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>مشروع تهذيب سيدي مسعود (معمدية السبيخة) (2935أد) انطلاق</li> <li>الأشغال 2019/01/29، نسبة تقدم الاشغال قسط 1: 98%، قسط 2: 70%</li> <li>مشروع تهذيب منطقة بئر مسكين (معمدية بوحجلة قسط عدد 1 بصدد الانجاز:</li> </ul>	ستمتد الأشغال من السداسي الثاني لسنة	26-تهذيب مشاريع الماء الصالح للشرب بكلفة 17.250 م د و ستتمد الأشغال من السداسي

	<p>70% قسط2: 25%, قسط3: تمت الموافقة عن إعادة الإعلان عن طلب العروض وبصدد اعلان طلب عروض ثان.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مشروع تهذيب هندي العمري (معتمدية الوسالاتية): نسبة تقدم الانجاز 98% (في انتظار الكهرباء و إعادة التيار الكهربائي لتجربة الشبكة).</li> <li>• مشروع تهذيب منطقة جليل (معتمدية حفوز): نسبة تقدم الانجاز 45% : الأشغال متوقفة, في انتظار مصادقة الصوناد على الأمثلة التنفيذية</li> </ul>	<p>2018 إلى السداسي الثاني لسنة 2019</p>	<p>الثاني لسنة 2018 إلى السداسي الثاني لسنة 2019</p>
	<p>في طور البحث عن تمويل</p>	<p>انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018</p>	<p>27-انجاز مشروع تحسين تزويد مدينة الوسالاتية بالماء الصالح للشرب بكلفة 3.1 م د مع انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018</p>
	<p>في طور البحث عن تمويل</p>	<p>انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018</p>	<p>28-انجاز مشروع تحسين تزويد مدينة العلاء بالماء الصالح للشرب بكلفة 1.8 م د مع انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018</p>

	في طور البحث عن تمويل	انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018	29- انجاز مشروع تحسين تزويد مدينة عين جلولة بالماء الصالح للشرب بكلفة 1.3 م د مع انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018
	تمّ نشر طلب العروض بتاريخ 2019/08/19 وفتحها بتاريخ 20 / 9 / 2019 و تم إرسال ملف تقييم العروض إلى اللجنة العليا للصفقات	انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018	30- تزويد مركب المزهدية بالماء الصالح للشرب بكلفة 4.5م د مع انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018 (تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية) (عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه)
	تم الانتهاء من أشغال البئر العميقة -إقتناء القنوات: تمّ نشر طلب العروض الخاص وتمّ إسناد الصفقة لمقاوله "جندار". الأشغال : من المتوقع نشر طلب العروض خلال شهر فيفري 2020 . من المنتظر الانطلاق في الأشغال خلال الثلاثية الثانية لسنة 2020	انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018	31- تزويد المنطقة الصناعية بالسيخة 2 بالماء الصالح للشرب بكلفة 10.248 م د مع انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018 (الوكالة العقارية الصناعية) (عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه).

<p>التمويل عن طريق الوكالة الفرنسية للتنمية(القرض الرابع)</p>	<p>– تم نشر طلب العروض عدد 2019/162 بتاريخ 2019/11/15 على منظومة TUNEPS و حدد آخر اجل لقبول العروض بتاريخ 2019/12/17 وهو حاليا في مرحلة تقييم العروض.</p>	<p>انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018</p>	<p>32-تزويد مركب الحوامد بحيرة العود بالماء الصالح للشرب بكلفة 1.905 م د مع انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018 (الوكالة الفرنسية للتنمية) (عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه)</p>
<p>التمويل عن طريق ميزانية الدولة, الميزانية التكميلية</p>	<p>تم نشر طلب العروض خلال شهر ديسمبر 2019 تحت عدد 2019/137 وتم تحديد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ 2020/02/05</p>	<p>انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018</p>	<p>33-تزويد عين الكدية الشوافعية (خيط الوادي) من معتمدية حفوز بالماء الصالح للشرب بكلفة 1.905 م د , مع انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018 (عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه)</p>
<p>التمويل عن طريق ميزانية الدولة, الميزانية التكميلية</p>	<p>تم نشر طلب العروض خلال شهر ديسمبر 2019 تحت عدد 2019/137 وتم تحديد آخر أجل لقبول العروض بتاريخ 2020/02/05</p>	<p>انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018</p>	<p>34-تزويد الجبيلات ,هنشير كامي (خيط الوادي)من معتمدية حفوز بالماء الصالح للشرب بكلفة 1.680 م د, مع انطلاق الأشغال خلال</p>



			السداسي الثاني لسنة 2018
التمويل عن طريق ميزانية الدولة, الميزانية التكميلية	في طور تحيين الدراسة	انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018	35-تزويد العinizات و الروابحية (الغوية) من معتمدية الحاجب بالماء الصالح للشرب بكلفة 1.880 م د (350عائلة منتفعة) مع انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018 (عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه)
	بصدد إعداد الأشغال المختلفة لاقتناء قطع الأرض اللازمة لمد القنوات وبناء محطة التزويد	خلال السداسي الأول من سنة 2018	36-تزويد معتمدية حاجب العيون بالغاز الطبيعي بكلفة 5.218 م د, خلال السداسي الأول من سنة 2018
	بلغت نسبة الإنجاز :		37-تسليم 451 مسكنا اجتماعيا صنف فردي و جماعي بتكلفة تقدر ب 31 م د (وزارة التجهيز و الاسكان و التهيئة الترابية) وتتوزع المساكن كمايلي: <ul style="list-style-type: none"> <li>• حي المنار : 331 مسكنا بكلفة 19 م</li> </ul>
	*المنار: 95%		
	*السيخة: 98%		
	*الوسلاتية: 95%		

	بصدد تحيين قائمة المنتفعين		د <ul style="list-style-type: none"> <li>• السبيخة: 72 مسكنا بكلفة 4 م د - شهر جوان 2018</li> <li>• الوسالاتية: 48 مسكنا بكلفة 8 م د - شهر جوان 2018</li> </ul>
	بصدد مصادقة اللجنة الفنية الداخلية للوكالة على الدراسات الفنية	انطلاق الأشغال خلال شهر ماي 2018	38-مشروع انجاز تقسيم جديد بالمنصورة بمعمدية القيروان الجنوبية (قرابة 87 هك) يوفر حوالي 1660 من بينها 1010 مساكن فردية بكلفة 50 م د مع انطلاق الأشغال خلال شهر ماي 2018 (مشروع تابع للوكالة العقارية للسكنى)
بصدد الانجاز	انطلقت الأشغال بتاريخ 22 جانفي 2018, نسبة تقدم الأشغال: 80%	انطلاق الأشغال خلال شهر جانفي 2018	39-انجاز أشغال تقسيم الهدى بمعمدية بوحنجلة على مساحة 17 هك بكلفة 6.1 م د مع انطلاق الأشغال خلال شهر جانفي 2018

بصدد الانجاز	انطلقت الأشغال بتاريخ 15 جانفي 2018 , نسبة تقدم الأشغال: 80%	انطلاق الأشغال خلال شهر جانفي 2018	40-انجاز أشغال تهيئة التقسيم القديم للوكالة العقارية للسكنى بمعمودية بوحجلة (إعادة تهيئة الطرقات و الشبكات في إطار العناية بظروف عيش متساكني هذا التقسيم ) بكلفة 1.2 م د مع انطلاق الأشغال خلال شهر جانفي 2018
	بصدد إبداء الرأي من قبل المصالح المركزية للوكالة تم تخصيص 6مقاسم وبلغت نسبة الإنجاز لأشغال التهيئة 30 بالمائة		41-تخصيص مقاسم إضافية لفائدة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بولاية القيروان لتوفير 100 مسكن و 6 مقاسم صنف سكن جماعي بتقسيم الهدى ببوحجلة
			<u>جعل القيروان قطبا اقتصاديا يرتكز على الفلاحة و الصناعات التحويلية و الصناعات التقليدية</u>
بصدد الدراسة	تم تقديم المرحلة الأولى من الدراسة بتاريخ 26 أفريل 2017 و تنظيم ورشات عمل للمصادقة عليها بتاريخ 20 جويلية 2017 ومن ثم المرور الى المرحلة الثانية من الدراسة. انطلقت المرحلة الثانية من الدراسة بتاريخ 18 ديسمبر 2017 وحددت مدتها بستة عشر شهر	الانتهاء من الدراسة خلال	42-مواصلة دراسة تحويل فائض المياه و ربط منظومات تحويل المياه من الشمال إلى الوسط

	<p>انطلاق أشغال ربط سد سيدي سعد بسد بالهوارب للتمكين من استيعاب مياه الشمال بكلفة تقا ب 26 مليون دينار</p> <p>سيتم المصادقة على الدراسات خلال الثلاثي الثاني لسنة 2019 وانطلاق الأشغال موفى سنة 2019</p>	<p>سنة 2018 وانطلاق الأشغال موفى سنة 2019</p>	<p>التونسي بكلفة 4.5 م د مع الانتهاء من الدراسة خلال سنة 2018 و انطلاق الأشغال موفى سنة 2019</p>
	<p>آبار الاستكشاف:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• زغدود (الوسلاتية) (م ص ش) (158أد): 100% جوان 2019</li> <li>• بودبوس 3 (السييخة) (ري) (158أد): بصدد الانجاز: 70%</li> </ul> <p>آبار الاستغلال:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• منزل المهيري 3 (ري) (378أد): 100% ديسمبر 2019</li> <li>• السلايمية أولاد هلال (164أد) (م ص ش): تم القبول الوقتي 12ل/ث - 1.2 غ/ل.</li> <li>• أولاد عمر (العلاء) (م ص ش) (264أد): بصدد الحفر (إذن إداري ببداية الأشغال 2019/08/19)</li> </ul> <p>آبار التعويض:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الخشم مكرر (م ص ش) (حفوز) (258أد): بصدد اكساء البئر: 60%</li> <li>• هندي الزيتونة 2 (م ص ش) (السييخة) (109أد): مارس 2019 100% تم القبول الوقتي 9 ل/ث - 1,8 غ/ل</li> <li>• الأدواز مكرر (ري) (بوحجلة) (272أد): مارس 2019 100% تم القبول الوقتي 2 ل/ث - 3,5 غ/ل</li> </ul>	<p>انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018</p>	<p>43-إحداث آبار عميقة للاستغلال و التعويض و الاستكشاف بكلفة 2.45 م د مع انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018</p>

	<p>• هنشير الوحيشي مكرر (ري) (الشبيكة) (211أد): في انتظار انطلاق الاشغال</p>		
	<p>تسلم المقاول الإذن الإداري بتاريخ 2019/03/15 , بلغت نسبة تقدم الأشغال: 45%</p>	<p>انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018</p>	<p><b>44-إحداث المنطقة السقوية العبات بكلفة 1.55 مليون دينار وتنطلق الأشغال خلال السداسي الثاني من سنة 2018</b></p>
	<p>تمت مهمة التقييم من الخبير المكلف من طرف البنك الألماني لإعادة الاعمار (KFW) بتاريخ 15 ماي 2018. حددت المهمة التكميلية من طرف الخبير وقام الخبير الجيوتقني المكلف من طرف البنك الألماني لاعادة الاعمار (KFW) بالمهمة التكميلية بتاريخ 26 جوان 2018. تمت صياغة الخطوط المرجعية المحينة من طرف الخبير المكلف واعداد ملف الانتقاء الأولي. بصدد استكمال الدراسات لرفع خزن السد الى 150 م3</p>	<p>انطلاق الدراسات سنة 2018 وانطلاق الأشغال بداية سنة 2019</p>	<p><b>45- مشروع دعم طاقة خزن سد سيدي سعد وتدعيم حائط مفرغ الفيضانات بكلفة 46 مليون دينار وتنطلق الدراسات سنة 2018 وتنطلق الأشغال في بداية سنة 2019</b></p>
	<p>تم قبول المرحلة النهائية من الدراسة لمخطط التنمية المحلية لـ 3 مناطق: بحيرة الكحل بالحاجب و سد القري بالوسلاتية وبحيرة القصعة بالوسلاتية - بصدد استكمال ملفات طلب العروض لـ 3 سدود.</p>	<p>انطلاق الأشغال خلال شهر مارس 2018</p>	<p><b>46- مشروع التنمية الريفية حول البحيرات الجبلية الذي يهدف إلى التصرف المندمج في الموارد الطبيعية بحاجب العيون والوسلاتية بكلفة 20 مليون دينار وتنطلق الأشغال خلال شهر مارس 2018</b></p>

	<p>تم امضاء الاتفاقية مع الممول انطلاق الدراسة: في طور القيام بعملية تشخيص مناطق التدخل وإعداد مخططات التنمية. سيتم الانجاز على 5 سنوات إلى حدود 2022.</p>	<p>انطلاق الأشغال خلال شهر جوان 2018</p>	<p>47-مشروع التأقلم مع المتغيرات المناخية بمعمدية العلا وتنطلق الأشغال خلال شهر جوان 2018 (وزارة الفلاحة والموارد المائية).</p>
<p>بصدد الانجاز</p>	<p>انطلقت أشغال القسط الأول لتهيئة المنطقة الصناعية بتاريخ 13 فيفري 2019 لتتواصل على امتداد سنة, بلغت نسبة الانجاز: %35(كلفة القسط الأول 958أد),تم إمضاء صفقة تزويد المنطقة الصناعية بالشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب بتاريخ 21 أكتوبر 2016 وبكلفة 1.9 م.د, تم إمضاء صفقة تزويد المنطقة الصناعية بالشبكة الخارجية للتيار الكهربائي بتاريخ 01 أوت 2016 و بكلفة 589 ألف دينار .</p>	<p>خلال السداسي الثاني لسنة 2018</p>	<p>48-الانطلاق في انجاز المنطقة الصناعية بالوسلاتية بكلفة 10 م د خلال السداسي الثاني لسنة 2018 (وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى و المتوسطة )</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تم إعداد مثال الأشغال الطبوغرافية</li> <li>• تم اقتناء العقار بتاريخ 2 فيفري 2017</li> <li>• انطلاق الدراسات رهين برمجة المشروع خلال المخطط التنموي القادم 2021 2025/</li> </ul>	<p>انطلاق الدراسات خلال سنة 2018</p>	<p>49-انطلاق الدراسات لتهيئة المنطقة الصناعية بنصر الله خلال سنة 2018 (وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة)</p>

	<p>❖ الجهة المنفذة: الوكالة التونسية للتكوين المهني</p> <p>❖ تقدم الأشغال :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• بالنسبة للعناصر المادية (البناءات والتجهيزات):</li> </ul> <p>-تم الانتهاء من أشغال الدراسة الجيو-تقنية <i>étude géotechnique</i></p> <p>-تم إيداع ملف رخصة البناء لدى بلدية القيروان.</p> <p>-تمت المصادقة على مشروع السوائل (plan fluide)</p> <p>- مشروع الوقاية في طور المصادقة.</p> <p>-تمت المصادقة على ملف تصاميم البناءات</p> <p>- ملف المعدات والتجهيزات في طور الإعداد وهو مرتبط بأشغال البدء في البناءات</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• بالنسبة للعناصر اللامادية (تكوين المكونين وبرامج التكوين): تم الانتهاء من اعداد ملف تكوين المكونين والمصادقة عليه والتحضير لإيداع طلب العروض.</li> </ul>	<p>إنجاز الدراسات</p> <p>خلال سنة</p> <p>2018</p> <p>والإنطلاق في</p> <p>الإنجاز سنة</p> <p>2019</p>	<p>50- إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بالقيروان مع بناء مبيت بكلفة جمالية تقدر بحوالي 19.12 مليون دينار مع انجاز الدراسات خلال سنة 2018 وتنطلق الأشغال خلال سنة 2019 (وزارة التكوين المهني و التشغيل)</p>
--	--	--	---

<p>في انتظار تسوية ملكية العقار</p>	<p>تم تقديم طلب إلى الولاية بتاريخ 19 أبريل 2019 بهدف تسوية الوضعية القانونية لقطعة الأرض الكائنة بمعتمدية العلا والتي تمت المصادقة على التفويت فيها خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الجهوي بالقيروان لسنة 2013 لفائدة الوكالة التونسية للتكوين المهني، إلا أنه تم الاعلام عبر مراسلة الولاية عدد 3556 بتاريخ 02 ماي 2019 بتعذر تسوية الوضعية القانونية حيث لا يوجد ما يثبت انجرار الملكية ، كما أن المجلس الجهوي لا يملك قطعة أخرى بمعتمدية العلا يمكن اقتراحها كبديل.</p>	<p>انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018</p>	<p>51- تطوير مركز التكوين و التدريب المهني بالعلاء بكلفة 800 أد مع انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018(وزارة التكوين المهني و التشغيل)</p>
	<p>تم قبول جل أقساط التجهيزات والمعدات من جملة 28 قسطا. -تم اعداد ملف تقني ومادي لإعادة تقسيم الفضاءات البيداغوجية وتهيئتها في انتظار رصد الاعتمادات</p>	<p>انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018</p>	<p>52- تهيئة و تجهيز مركز التكوين و التدريب المهني القيروان بكلفة 1.230 م د مع انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018 (وزارة التكوين المهني و التشغيل)</p>



			<u>تحسين البنية التحتية ودعم التمثيلية الجهوية :</u>
تم الانجاز	تم فتح الإدارة الجهوية للعدل في 01 فيفري 2018	جانفي 2018	53-فتح الإدارة الجهوية للعدل بداية من شهر جانفي 2018
	في طور الإنجاز	خلال السداسي الأول لسنة 2018	54-إحداث إدارة جهوية لصندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية خلال السداسي الأول لسنة 2018 (وزارة الشؤون المحلية و البيئة)
في انتظار المصادقة على التنظيم الهيكل للتمثيلات الجهوية للشركة من قبل الإدارة العامة للشركة وصدور أمر الإحداث.	تقدم إنجاز بناء المقر الجديد للشركة : 100 %	موفى سنة 2017	55-فتح إدارة جهوية للشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه مع موفى سنة 2017(وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري)
	• <u>حاجب العيون</u> :إنطلق العمل بدار الخدمات يوم 2018/06/27	خلال السداسي الأول لسنة	56- إحداث دور خدمات الضمان الاجتماعي بكل من نصر الله وحاجب العيون والسيخة خلال

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>السليخة</u> : حدد موفى شهر أكتوبر 2018 كموعدا لتسلم أشغال تهيئة وصيانة المقر</li> <li>• <u>نصر الله</u> : تم إحالة الإعتمادات اللازمة على البلدية وبصدد الشروع في تهيئة المقر</li> </ul>	2018	السداسي الأول من سنة 2018 (وزارة الشؤون الاجتماعية).
بصدد الانجاز	انطلقت الأشغال بتاريخ 29/ 03/ 2019: و تقدر نسبة تقدم الإنجاز ب: 82 %		57- بناء وحدة محلية للنهوض الاجتماعي خلال السداسي الثاني لسنة 2018 بمعتمدية منزل المهيري (وزارة الشؤون الاجتماعية)
تم الانجاز	تم الإستلام الوقتي للمشروع (مطعم صبرة) بداية ماي 2017 و الأغالبة بداية فيفري 2018	بداية السداسي الثاني من السنة الجامعية 2018/2017	58- فتح المطاعم الجامعيين مع بداية السداسي الثاني من السنة الجامعية 2017 - 2018 (وزارة التعليم العالي و البحث العلمي)
تم القبول الوقتي للمشروع و قد تم تدشين المعهد من قبل وزير التعليم العالي يوم 7 سبتمبر 2019	تقدم الأشغال: 100% ديسمبر 2018		59- انطلاق الدراسة بمعهد ISSAT (المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا) خلال العودة الجامعية 2018 - 2019 (وزارة التعليم العالي و البحث العلمي)

	<p>في طور إعداد تقرير تقييم العروض لملف الدعوة للمناظرة عن طريق الملفات لتعيين المصممين</p>	<p>الدراسات سنة 2018 وانطلاق الأشغال 2019</p>	<p>60-إعادة تهيئة محكمة الناحية بحفوز باعتمادات 1.4 م د انجاز الدراسات سنة 2018 و انطلاق الأشغال سنة 2019 (وزارة العدل)</p>
	<p>في طور إعداد تقرير تقييم العروض لملف الدعوة للمناظرة عن طريق الملفات لتعيين المصممين</p>	<p>الدراسات سنة 2018 وانطلاق الأشغال 2019</p>	<p>61-الإعلان عن هدم و إعادة بناء محكمة الناحية ببوحجلة بكلفة 3.5 م د, و سيتم انجاز الدراسات سنة 2018 وانطلاق الأشغال سنة 2019 (وزارة العدل)</p>
			<p>62-تخصيص اعتماد قدره 6.2 م د لتدعيم قدرات المصالح الأمنية (وزارة الداخلية)</p>
<p>تم القبول الوقتي للأشغال, في انتظار الربط بالشبكات مع الإشارة أنه قد تم مراسلة الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء و الغاز.</p>	<p>انطلقت الأشغال بتاريخ 23 / 06 / 2018 , بلغت نسبة تقدم الأشغال : 100%</p>	<p>طلب العروض خلال السداسي الأول لسنة 2018 و انطلاق</p>	<p>63-انجاز نادي الأطفال بالعيثة بكلفة 680 أد (وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة), طلب العروض خلال السداسي الأول لسنة 2018 و انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018</p>

		الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018	
	تم إحالة نص طلب العروض للولاية بتاريخ 2020/01/23 للنشر	الإعلان عن طلب العروض خلال السداسي الأول لسنة 2018 وانطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018	<b>64- بناء مركب وفضاء للطفولة المبكرة برياض سحنون بالقيروان المدينة بكلفة 1.1 م د, الإعلان عن طلب العروض خلال السداسي الأول لسنة 2018 وتنطلق الأشغال خلال السداسي الثاني من سنة 2018(وزارة المرأة والأسرة و الطفولة)</b>
	في طور عرض الدراسة التمهيدية المفصلة المنقحة على أنظار اللجنة الفنية	انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018	<b>65- تهيئة مركز المسنين بالقيروان بكلفة 500أد , انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018 (وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة)</b>
تم الانجاز	تم القبول الوفي بتاريخ 2019/ 06/ 20	خلال السداسي الثاني لسنة	<b>66- الانطلاق في أشغال الطريق الجهوية رقم 73 الرابطة بين معتمدية نصر الله إلى حدود ولاية</b>

		2018	سيدي بوزيد بكلفة 8 م د وتنطلق الأشغال خلال السداسي الثاني من سنة 2018 (وزارة التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية)
	تم الشروع في الأشغال خلال شهر أكتوبر 2019	البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2018	67-رصد اعتماد يقدر ب 15 م د لتهيئة المسالك الريفية على ميزانية وزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية و البرنامج الجهوي للتنمية خلال سنة 2018 (وزارة التجهيز و الاسكان و التهيئة الترابية)
	في طور الدراسات	الإعلان عن طلب العروض سنة 2018 وانطلاق الأشغال سنة 2019	68-بناء جسر على وادي الفايز بالطريق الجهوية رقم 99 بكلفة 3.5 م د , الاعلان عن طلب العروض سنة 2018 و انطلاق الأشغال سنة 2019 (وزارة التجهيز و الاسكان و التهيئة الترابية)
	بلغت نسبة تدعيم المسلك 100% بكلفة 1142أد	ابتداء من سنة	69- إدراج المسلك الرابط بين العلاء و مكتر

		2018	بطول 36 كم ضمن الطرقات المرقمة و الشروع في تهيئته و صيانتته ابتداء من سنة 2018 بقيمة 1م د (وزارة التجهيز و الاسكان و التهيئة الترابية)
	<p>- تم تسليم 18 حافلة وفق البرنامج التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 23 / 08 / 2017 : 6 حافلات</li> <li>● 26 / 10 / 2018 : 2 حافلات</li> <li>● 28 / 12 / 2018 : 3 حافلات</li> <li>● 20 / 02 / 2019 : 5 حافلات</li> <li>● 05 / 07 / 2019 : 2 حافلات</li> </ul>	موفى سنة 2017 وسنة 2018	70- تسليم 25 حافلة بكلفة 8 م د لتدعيم أسطول الشركة الجهوية للنقل بالقيروان, مع موفى سنة 2017 و سنة 2018 (وزارة النقل)
	<p>- تم تسجيل الصفقة بكلفة محينة 4830 أ.د</p> <p>-تم إمضاء العقد مع المقاول و تسجيله بالقباضة المالية بتاريخ 27 / 03 / 2018 و قامت الشركة الجهوية للنقل بالقيروان بالاتصال بالبنوك للحصول عل خط ائتمان لبدء الأشغال غي أن بنك الأمان وافق شرط حصوله على ضمان الدولة.</p>	خلال السداسي الأول لسنة 2018	71- تهيئة ورشة عصرية بالشركة الجهوية للنقل بكلفة 3.6 م د , خلال السداسي الأول لسنة 2018 (وزارة النقل)

تم الانجاز	انطلقت الأشغال في 20 / 06 / 2018, بلغت نسبة الانجاز: 100 %	طلب العروض موفى 2017 والأشغال السداسي الأول من سنة 2018	72-إصلاح و تهذيب محطة النقل البري بالقيروان بكلفة 300أد, طلب العروض موفى 2017 , الأشغال: السداسي الأول لسنة 2018(وزارة النقل)
الأشغال مبرمجة خلال السداسي الأول لسنة 2020	تم تعيين مصممين و بصدد طلب العروض.	انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018	73-انجاز المركب البريدي بالقيروان بكلفة 5.2 م د ,مع انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني لسنة 2018 (وزارة تكنولوجيا الاتصال و الاقتصاد الرقمي)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● مكتب بريد الشواشي: التنسيق مع المصالح المركزية المعنية للاسراع بإتمام إجراءات اقتناء العقار الراجع بالنظر للمجلس الجهوي لولاية القيروان</li> <li>● الشوايحية: في انتظار استكمال اقتناء قطعة أرض من أملاك الدولة و المتواجدة بجانب مقر بلدية الشوايحية</li> <li>● عين البيضاء: بصدد استكمال الإجراءات العقارية لنقل ملكية أرض متحصّل عليها في شكل هبة و الإنجاز مبرمج خلال سنة 2019</li> </ul>	قبل موفى سنة 2018	74-احداث 3 مكاتب بريد بالبلديات الجديدة التالية : الشواشي, الشوايحية, عين البيضاء قبل موفى سنة 2018 باعتماد قدره 500 أد (وزارة تكنولوجيا الاتصال و الاقتصاد الرقمي )

	<p>طريق الوسالاتية 100% عين مسطور 100% بازينة 100% قصر لمسة 80% زغدود 95 % قمبورة 70 % القليعة 70 % الأبيرة 80 % وادي القصب 80%</p>	<p>قبل موفى سنة 2018</p>	<p>75-تغطية المناطق البيضاء بمعتمدية الوسالاتية عمادة جبل السرح ,زغدود,وادي القصب بشبكة الاتصالات قبل موفى سنة 2018 (وزارة تكنولوجيا الاتصال و الاقتصاد الرقمي)</p>
			<p><u>جعل القيروان قطبا سياحيا و ترفيهيا و</u> <u>ثقافيا و دينيا:</u></p>
	<p>• تم عقد عدد 03 جلسات عمل بالجهة بالتنسيق مع جميع الأطراف المتداخلة من إدارات عمومية، مهنيين، مجتمع مدني، جمعيات و هياكل</p>		<p>76-تكليف وزارة السياحة و الصناعات التقليدية</p>



	<p>وطنية ناشطين في المجال السياحي مفصلة كآتي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• جلسة عمل بتاريخ 06 فيفري 2018</li> <li>• جلسة عمل بتاريخ 12 فيفري 2018</li> <li>• جلسة عمل بتاريخ 15 فيفري 2018</li> </ul> <p>تم عقد إدراج ولاية القيروان ضمن البوابة الإلكترونية للديوان الوطني للسياحة للترويج للمخزون الثقافي والتاريخي للمنطقة.</p>		<p>ياعداد برنامج ترويجي لولاية القيروان كوجهة ثقافية سياحية دينية (وزارة السياحة و الصناعات التقليدية)</p>
<p>في مرحلة انتداب خبير لإعداد الخطوط المرجعية و كراس الشروط المتعلقة بانجاز الدراسات اللازمة.</p>	<p>- تم إعداد المواصفات التقنية الخاصة بمؤهلات الخبير في مجال السياحة الايكولوجية الذي سيقع تكليفه من طرف وكالة التعاون الألماني لإعداد الخطوط المرجعية و كراس الشروط الخاصة باختيار مكتب دراسات حيث تم إطلاق طلب استشارة خلال شهر أكتوبر 2019 لكن لم يشارك فيها أي طرف و بالتالي سيقع إعادة إطلاق طلب الاستشارة مرة ثانية.</p>	<p>موفى سنة 2018 لإنجاز الدراسة - بداية سنة 2019 الشروع في تنفيذ مخرجات الدراسة</p>	<p>77-إقرار اعتمادات تكميلية قدرها 1 م د خلال سنة 2018 تخصص لانجاز الدراسات اللازمة لمشروع تهيئة و إحياء مكونات المسلك السياحي بالقيروان عبر الوسلاية (آثار جلولة , قصر اللمسة, المغاور) و الانطلاق في الانجاز الفعلي خلال سنة 2019 بكلفة 20 م د (وزارة السياحة والصناعات التقليدية)</p>

	بصدد إنجاز الدراسات من قبل المعهد الوطني للتراث لتهيئة وترميم معالم المدينة العتيقة بالقيروان		78- الانطلاق الفوري في الدراسات لتهيئة و ترميم المدينة العتيقة باعتماد يقدر ب 25 م د (وزارة الشؤون الثقافية).
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● دار الثقافة بوحجلة: (هدم و اعادة بناء) تمت المصادقة على تقرير تقييم العروض بالنسبة للتسجيل للمشاركة في المناظرة المعمارية وحدد آخر أجل لإرجاع عروض الدراسة الأولية للمناظرة ليوم 2020/01/16</li> <li>● دت حفوز: تم اختيار المقاول وبلغت الصفقة قيمة 594301.600 د. يوم 28 أكتوبر 2019 تحصل المقاول على الإذن بالأشغال للانطلاق في المشروع, بصدد الانجاز</li> <li>● دت العلا: لم يرد أي رد من الوزارة.</li> </ul>	السداسي الثاني من سنة 2018	79- تهيئة دور الثقافة بكل من بوحجلة والعلاء و حفوز خلال السداسي الثاني من سنة 2018 بكلفة 2 م د (وزارة الشؤون الثقافية).
	<p>قيمة الصفقة 2397115.056</p> <p>تم استئناف الأشغال بداية من 2020/02/27</p>	خلال السداسي الثاني لسنة 2018	80- بناء دار الثقافة بمنزل المهيري خلال السداسي الثاني من سنة 2018 بكلفة 2.3 م د (وزارة الشؤون الثقافية)
	تم تغيير موقع قطعة الأرض المقترحة بسبب وجود انحدار كبير بالقطعة الأولى و تم مد الإدارة الجهوية للتجهيز بمثال الأشغال الخاصة والمختلفة وسيتم موافاتها بأذون التزود.	الدراسات خلال السداسي الثاني من سنة 2018	81- إحداث ملعب بلدي بمنزل المهيري بكلفة 1.7 م د ,الدراسات خلال السداسي الثاني لسنة

		والأشغال 2019	<b>2018 و الأشغال سنة 2019(وزارة شؤون الشباب و الرياضة)</b>
	بصدد الانجاز: 80%,	انطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني من سنة 2018	<b>82-تعشيب الملعب البلدي بعين جلولة بكلفة 600 أ د , انطلاق الأشغال خلال الثلاثي الأول لسنة 2018 و بداية الأشغال السداسي الثاني لسنة 2018 (وزارة شؤون الشباب و الرياضة).</b>
التاريخ المؤمل لانتهاء الأشغال موفى سنة 2020	في طور اعداد ملفات طلب العروض الاولية والمصادقة على الملفات من طرف مكتب المراقبة	365يوم	<b>83-إحداث قاعة للألعاب الفردية بالعلاء بكلفة 800 أ د , الدراسات خلال الثلاثي الأول لسنة 2018 و بداية الأشغال السداسي الثاني لسنة 2018 (وزارة شؤون الشباب و الرياضة).</b>
	بصدد تركيز الحضيرة	365يوم	<b>84-إتمام تهيئة دار الشباب شارع فاس بالقيروان بكلفة 600 أ د , بداية الأشغال خلال الثلاثي</b>

			الثاني لسنة 2018 (وزارة شؤون الشباب و الرياضة)
التاريخ المؤمل لانتهاؤ الأشغال الثلاثي الأول لسنة 2021	انطلقت الأشغال بتاريخ 23 / 01 / 2020	365 يوم	85- صيانة المسيح البلدي بالقبيرون و برمجة الاعتمادات الإضافية اللازمة و المقدرة ب 800 أ د , مع انطلاق الأشغال خلال الثلاثي الثاني لسنة 2018 (وزارة شؤون الشباب و الرياضة)
	تمت مراسلة التجهيز في عديد المناسبات قصد تعيين مكاتب دراسات نظرا لصيغة المشروع الا أنه لم يتم ذلك إلى حد التاريخ	365 يوم	86- تأهيل المسيح البلدي بنصر الله بكلفة 5.1 م د , انطلاق الدراسات خلال الثلاثي الأول لسنة 2018 و انطلاق الأشغال مع موفى الثلاثي الثاني من سنة 2019 (وزارة شؤون الشباب و الرياضة)

	<p>تم فتح الاعتمادات لصيانة المعالم التالية:  جامع نصر اله المركز وجامع أبو بكر الصديق بعين جلولة, جامع الحمد بقرادة , الهداية بالوسلاتية  وهندي الزيتونة بالسيخة: تم الانجاز ,تم القبول المؤقتي</p>	<p>انطلاق الأشغال  مع بداية سنة  <b>2018</b></p>	<p>87-رصد اعتماد قدره 500أد لصيانة المعالم  الدينية بمختلف معتمديات الولاية , مع انطلاق  الأشغال مع بداية سنة 2018(وزارة الشؤون  الدينية)</p>
	<p>بصدد الانجاز بكلفة 123 أد</p>	<p>انطلاق الأشغال  في بداية سنة  <b>2018</b></p>	<p>88-تخصيص اعتماد قدره 100أد لتعهد مقام  الولي الصالح أبي زمعة البلوي 'سيدي الصحي'  مع انطلاق الأشغال مع بداية سنة 2018 (وزارة  الشؤون الدينية)</p>



## جدول متابعة القرارات الوزارية بولاية القصيرين

- مجلس وزاري بتاريخ 26 سبتمبر 2012
- مجلس وزاري مضيق بتاريخ 14 افريل 2015
- مجلس وزاري بتاريخ 31 اكتوبر 2015
- مجلس وزاري بتاريخ 08 مارس 2017

تاريخ القرار	المشروع	المعني بالتنفيذ	الإشكال	الحلول المقترحة
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012	تكوين لجنة فنية من وزارات الصناعة والداخلية والعدل وأملاك الدولة لدراسة وضعية المقاطع المستغلة عشوائيا واقتراح حلول عملية حالة بحالة	وزارة الصناعة، وزارة الداخلية، وزارة أملاك الدولة، المعهد الوطني للتراث، وزارة البيئة، وزارة التجهيز	بطء الإجراءات في تفعيل عمل وقرارات اللجنة	التسريع في عمل اللجنة الوطنية مع تشريك الجهة في مناقشة معالجة ملفات وضعية المقاطع المستغلة
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012	جعل تالة قطبا تحويليا لقطاع الرخام	وزارة الصناعة، وزارة المالية، وزارة أملاك دولة، وزارة التجهيز، وكالة التعاون الفني الألماني	عدم إقرار تالة قطبا وطنيا لقطاع الرخام إلى الآن	الإسراع بتفعيل الخطة المتكاملة المعدة بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني من أجل تفعيل القرار
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012	إحداث منطقة تبادل حر في "تلايت"	رئاسة الحكومة، وزارة التجارة، وزارة النقل، وزارة المالية، وزارة التجهيز	عدم انطلاق انجاز منطقة تبادل حر بالجهة رغم تخصيص العقار ووضع على ذمة المشروع من طرف الجهة وانجاز مثال الإشغال المختلفة	الاعلان الرسمي لانجاز منطقة تبادل حر في "تلايت"
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012	الشروع في دراسة إحداث مركب بحث وتنمية بولاية القصرين يضم محطة بحوث للتوصيف والمحافظة وتثمين المنتجات التي تتميز بها الجهة مثل الحلفاء والنباتات الطبيعية والعطرية والهندي... ومركز فني لتثمين المواد الطبيعية المذكورة مع البدء في التنفيذ قبل موفى سنة 2013	رئاسة الحكومة، وزارة الفلاحة	عدم تفعيل القرار	هناك دراسة جاهزة في خصوص الهندي والحلفاء والنباتات العطرية بين مندوبية الفلاحة وديوان تنمية الوسط الغربي والمائدة المستديرة الاقتصادية السويسرية و giz وكالة التعاون الفني منذ المنتصف الثاني لسنة 2015 لكن بالنسبة لإحداث مركز بحوث في الغرض والمركز الفني لتثمين الموارد فهما في انتظار قرار الإحداث من وزارة الفلاحة ورئاسة الحكومة
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012	التسريع في إنجاز المشروع الخاص بإعادة تفعيل خط السكة الحديدية بين ولاية القصرين ومنطقة الساحل	رئاسة الحكومة، وزارة النقل	تم إعداد دراسة فرضية أولية لمرور السكة حول سد سيدي سعد وقد وعد رئيس الحكومة بأن يكون هذا المشروع جاهزا للاستغلال على أقصى تقدير سنة 2020	
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012		رئاسة الحكومة، وزارة التجهيز	عدم تنفيذ القرار	القسط ذا الأولوية هو القسط الرابط بين القصرين

وجلمة في اتجاه القبارون وعليه ندعو الى ان يكون انطلاق الاشغال من القصرين في اتجاه تونس			تسريع الدراسات المتعلقة بمسار الطريق السيارة الرابطة بين تونس و ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة	26 سبتمبر 2012
فوسانة : تسريع اجراءات الانتزاع بالاعتماد المكتوب بتاريخ 13 ديسمبر 2016 الموجه لكتابة املاك الدولة سببية وجدليان : تسريع اجراءات الانتزاع بالاعتماد المكتوب بتاريخ 17 فيفري 2017 الموجه لكتابة املاك الدولة	بطئ تنفيذ القرار	وزارة البيئة	الإذن بإحداث محطات تطهير بكل من تالة وفوسانة وسببية خلال سنة 2013	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012
. الدراسة موجودة منذ سنة 2009 لكن إشكالية التمويل هي العائق لحد الآن علما وان كلفة المشروع تقدر بـ 50 مليار كما نفيدكم ان النواة المحدثة بكلفة مليار لا تفي بالغرض لان التلوث وصل المياه الجوفية وقد وعد السيد وزير البيئة خلال جلسة مع إطارات ونواب الجهة ومكونات المجتمع المدني بإيجاد خط تمويل للمشروع ان امكن ذلك قريبا رفقة مكونات المجتمع المدني	عدم تنفيذ القرار	وزارة البيئة	تحديد المنطقة المعنية بالتلوث بالزئبق في القصرين وعزلها	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012
تدعيم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بالاطار البشري والمعدات لتنفيذ القرار	عدم التفعيل	وزارة الفلاحة، وزارة الصناعة	التنسيق بين وزارتي الفلاحة والصناعة لإيصال الكهرباء ثلاثي الأطوار إلى المستثمرين في القطاع الفلاحي	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012
تحويل المستشفى الجهوي لمستشفى جامعي	بطئ التنفيذ	وزارة الصحة	فتح أقسام جامعية جديدة في مستشفى القصرين	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012
. المستشفى الجهوي بسببلة انطلقت الاشغال -المستشفى الجهوي بتالة : تسريع مرحلة المناظرة المعمارية الوطنية . المستشفى الجهوي بفريانة : التسريع في مرحلة التاهيل -المستشفى الجهوي بسببية : التسريع في اجراءات طلب العروض	بطئ التنفيذ	وزارة الصحة	إحداث مستشفيات جهوية بكل من تالة و فريانة وسببلة و سببية	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012



التسريع في احداث اللجنة الجهوية لمتابعة احداث المسلك السياحي الثقافي	بطئ التنفيذ		اعتماد القصرين كتجربة نموذجية لإحداث مسلك سياحي ثقافي ودراسة إمكانية تحويلها إلى قطب سياحي في إطار توجه استشرافي طول المدى	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012
الاسراع في مراجعة مثال الأشغال الخاصة وتكفل المجلس الجهوي بالمبلغ المالي	بطئ التنفيذ	وزارة السياحة و الداخلية و الثقافة	إعلان مدينة سبيطلة كممنطقة سياحية ودراسة إدراج حيدرة كبلدية سياحية	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012
التسريع في الدراسات والالتزام بمبلغ 900أد المخصص في قسط أول وطلب إضافة قسط ثاني لاستكمال المشروع	الأشغال متوقفة	وزارة البيئة	إستكمال إنجاز المنتزه الحضري بوادي الدرب بالقصرين	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012
تم تجاوز الاشكال العقاري بشراء قطعة ارض تمسح 13 هك بمبلغ 174 أد لتصبح المساحة الجمالية 33 هك	في انتظار البرنامج الوظيفي من طرف مصالح وزارة الشباب و الرياضة	وزارة الشباب و الرياضة	الإسراع بإنجاز مشروع المركب الرياضي للتربصات بالشعائبي وتذليل العوائق المعطلة للمشروع	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012
وضع قطعة ارض على ذمة المشروع مع تخصيص اعتمادات للبناء	عدم بناء مقر الإدارة الجهوية إلى حد الآن	وزارة المالية	إحداث إدارة جهوية للديوانة بالقصرين الخدمات	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012
التسريع في تفعيل القرار	عدم تفعيل القرار	وزارة الصناعة	إحداث إدارة جهوية للوكالة العقارية الصناعية بالقصرين	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012
وضع قطعة ارض على ذمة المشروع مع تخصيص اعتمادات للبناء	انطلق المشروع في فضاء على وجه الكراء منذ سنة 2014	وزارة العدل	إحداث محكمة استئناف بالقصرين	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012
التسريع في الاشغال	بطئ في الانجاز	وزارة العدل	إحداث محكمة ناحية بالقصرين	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012
التسريع في الاشغال	بطئ في الانجاز	وزارة العدل	إحداث محكمة عقارية بالقصرين	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012
التسريع في تفعيل القرار	عدم تفعيل القرار	وزارة البيئة	. إحداث إدارة جهوية للبيئة بولاية القصرين	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012
	تم تفعيل القرار	وزارة تكنولوجيايات الاتصال	تعزيز الإدارة الجهوية للبريد وتفعيل دورها لمزيد تقرب الخدمات من للمواطنين بمختلف جهات الولاية	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 26 سبتمبر 2012
التسريع في تعيين خبير أملاك الدولة لوضع القيمة الشرائية لقطعة الأرض المقترحة وموافاة المجلس	إشكال إجرائي	وزارة الصحة	احداث مركز صحة اساسية صنف " 3 " الحردوب بفريانة	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 14 افريل 2015

الجهوي بذلك				
تحريير النصف الثاني من رأس المال	بصدد الانجاز	وزارة الصناعة والطاقة والمناجم	ربط المنطقة الصناعية ببسيطة بالشبكات الداخلية والخارجية ( 20 هك )	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 14 افريل 2015
	أبرمت اتفاقية بين وزارة المالية والوكالة العقارية الصناعية بكلفة 10 م د	وزارة المالية	دعوة وزارة المالية الى اسناد قرض من خزينة الدولة الى الوكالة العقارية الصناعية بمبلغ 10 م د في اطار اتفاقية تبرم معها للغرض لتمكينها من الاكتتاب في رأس مال المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين حتى يتمكن هذا الاخير من انجاز اشغال التهيئة الداخلية للمنطقتين الصناعيتين بكل من سبيطة وتالة ، على ان يتم استرجاع مبلغ القرض من الارباح الراجعة للوكالة من نشاط المركب الصناعي والتكنولوجي	
	تم ابرام العقد وامضانه من قبل الطرفين المتعاقدين	وزارة البيئة والتنمية المستدامة	انجاز محطة التطهير بحاسي الفريد	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 14 افريل 2015
	اعداد مثال الاشغال المختلفة	وزارة المرأة والأسرة والطفولة	بناء مركب الطفولة بحاسي الفريد	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 14 افريل 2015
برمجة محطة تطهير خاصة بالمنطقة الصناعية بكلفة 5.5 م د	-التنوير والغاز والماء : بصدد الانجاز -التطهير لم ينطلق	وزارة الصناعة والطاقة والمناجم	دعوة وزارة الصناعة والطاخم والمناجم الى الاسراع في اجراءات ربط المنطقة الصناعية بتالة بالشبكات الخارجية ( 41,27 هك ) ومتابعة اشغال التهيئة الداخلية في ضوء الاتفاقية التي ستبرم بين وزارة المالية والوكالة الصناعية	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 14 افريل 2015
	في طور إمضاء عقد الدراسات	وزارة التكوين المهني والتشغيل	اعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بتالة	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 14 افريل 2015
	15 %	وزارة المرأة والأسرة والطفولة	دعوة وزارة المرأة والاسرة والطفولة الى التنسيق مع وزارة المالية بخصوص امكانية توفير الاعتمادات الاضافية لبناء مقر المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والاسرة بالقصرين	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 14 افريل 2015

	في طور إمضاء عقد الدراسات	وزارة التكوين المهني والتشغيل	دعوة وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية الى اتمام اجراءات اقتناء الارض الخاصة باحداث مركز تكوين الفتاة الريفية بتالة	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 14 افريل 2015
	في مرحلة طلب العروض	وزارة الصحة	إعداد الدراسات الخاصة ببناء سبعة أقسام بالمستشفى الجهوي بالقصرين ( قسم إستعجالي و قسم أمراض المعدة و قسم المجاري البولية و قسم تشريح الخلايا و محلات للصيانة الفنية و البيوطبية و قسم الأمراض الصدرية و قسم الأنعاش و التخدير )	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015
فريانة: معاينة مقترح قطعة ارض في تصرف وزارة الفلاحة عين السلسلة: تعيين خبير أملاك الدولة للقيام بإجراءات الاختبار	فريانة: الفضاء مستغل من طرف وزارة الداخلية رغم حصول المقاتل على إذن الانطلاق للإصلاح ولا وجود لعقار بديل إلى حد تاريخ اليوم عين السلسلة : إشكال إجرائي	وزارة الشباب والرياضة	إحداث دار الشباب بفريانة بكلفة 697 أد تهيئة مركز التخميم و الاصطياف عين السلسلة بكلفة 700 أد	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015
	سببيلة: تمت معاينة محل ومراسلة رئاسة الحكومة قصد ابرام عقد كراء فريانة : بصدد البحث عن مقر	رئاسة الحكومة	فتح دور الخدمات الاجتماعية بكل من فريانة وسببيلة خلال سنة 2016	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015
	في طور الانجاز	وزارة التجهيز	تهيئة الطريق الحزامية الصغرى بمدينة القصرين على طول 5,5 كم	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015
	في مرحلة فرز العروض	وزارة البيئة	تهذيب محطة التطهير بالقصرين بكلفة جمالية تقدر بـ23 م د خلال الفترة 2016.2018 على أن تنطلق الأشغال في جويلية 2016 لمدة 24 شهر	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015
	انطلقت الدراسات	وزارة البيئة	توسيع وتهذيب شبكة التطهير بسببيلة والقصرين 49 كلم من القنوات وربط 550 مسكنا وتهذيب 30 كلم من القنوات بكلفة جمالية تقدر بـ15,6 م د مع الانطلاق في الدراسات خلال شهر جويلية 2016 لمدة 18 شهر	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015

الاسراع في تفعيل المشروع	لم يتم تفعيل الدراسة	وزارة الصحة	تنفيذ الدراسات المتعلقة باحداث المدينة الاستشفائية ببولعابة على مساحة 60هـ بكلفة 10 م د بعنوان البنية الأساسية	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015
			مراجعة حوكمة المركز الجهوي للعمل عن بعد واسناد مهمة التصرف فيه للمجلس الجهوي	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015
	بصدد إعداد الملف الأولي لطلب العروض	وزارة المرأة والطفولة	بناء مركب الطفولة بحي الزهور بالقصرين بكلفة 900 أ د	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015
	في مرحلة الإعلان عن طلب العروض	وزارة المرأة والطفولة	تجهيز وتهيئة فضاء الطفولة المبكرة بمركب الطفولة بسببيلة بكلفة 320 الف دينار	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015
	مكرر	وزارة المرأة والطفولة	تجهيز وتهيئة فضاء الطفولة المبكرة نادي اطفال بسببيلة بكلفة 180 الف دينار	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015
	في مرحلة الإعلان عن طلب العروض	وزارة المرأة والطفولة	تجهيز وتهيئة فضاء الطفولة المبكرة نادي اطفال بماجل بلعباس بكلفة 180 الف دينار	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015
	تقدم انجاز أشغال بناء المقر 80 بالمائة	وزارة الفلاحة	بناء مقر القليم الشركة الوطنية للاستغلال و توزيع المياه بكلفة 700 اد	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015
	تم إسناد الصفقة	وزارة الفلاحة	إحداث 10 آبار استكشافية	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015
	-تزويد منطقة البكايرية من معتمدية جدليان بالماء الصالح للشرب لفائدة 243 ساكن :الدراسة منجزة و تم الإعلان عن طلب العروض عدد 51 /2016 بتاريخ 12/10/2016 و هي في طور فتح الاعتمادات من طرف BAD -إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة فج حديد من معتمدية حاسي الفريد لفائدة 3484 ساكن : الدراسة منجزة و تم الإعلان عن طلب العروض عدد 52/2016 بتاريخ 12/10/2016 وهو في طور فتح الاعتمادات من طرف BAD -دعم الموارد المائية لمدينة القصرين وتحسين تزويد	وزارة الفلاحة	انجاز مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب عن طريق الهندسة الريفية وعن طريق الشركة الوطنية للاستغلال و توزيع المياه	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015

<p>المنطقة العليا لفائدة 120000 ساكن بكلفة 800 أ.د: إنجاز بئر عميقة جديدة في طور الاستغلال / 02- ابار عميقة تم اسناد الصفقة وهي في طور الامضاء والتسجيل</p> <p>-دعم الموارد المائية بفوسانة لفائدة 11500 ساكن بكلفة 450 أ.د: تم الإنطلاق في الأشغال من قبل المقاول المكلفة</p> <p>- تحسين تزويد مدينة سبيطلة لفائدة 35000 ساكن بكلفة 400 أ.د: تم الانجاز، في طور الاستغلال</p> <p>-دعم الموارد المائية لمدينة سبيبة-جدليان-الروحية لفائدة 30000 ساكن بكلفة 300 أ.د: تم تركيز الحضيرة</p> <p>-دعم الموارد المائية وتعويض البئر بودرياس1 لفائدة 5000 ساكن بكلفة 500 أ.د: وقع استغلال بئر على ذمة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتخطي حاجيات ذروة صائفة 2016 وتم تشييب البئر الموجودة التابعة للشركة</p>				
	<p>05/01/2017 تم اعادة طلب العروض تبعا لتوصيات اللجنة الوطنية لمتابعة الصفقات العمومية وهي في طور عرض ملف تقييم العروض على اللجنة الجهوية للصفقات</p>	<p>وزارة الفلاحة</p>	<p>احداث منطقة سقوية زلفان هندي الدولة على مساحة 200 هـ</p>	<p>مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015</p>
	<p>-إعادة تهيئة المنطقة السقوية هنشير الغرس الله وهي في طور التعهد بكلفة 235 الف دينار ومشروع هنشير الجمل : تم اسناد الصفقة في طور التعهد بكلفة 216 الف دينار</p> <p>-مشروع إحداث شبكة الصرف والتجفيف للمركب الفلاحي بوادي الدرب نسبة تقدم الانجاز 60 بالمائة</p>	<p>وزارة الفلاحة</p>	<p>اعادة تهيئة 2 مناطق سقوية على مساحة 110 هـ 'هنشير الجمل فوسانة و هنشير غرس اللة قصرين الجنوبية ' و مواصلة انجاز شبكة نز بالمنطقة السقوية اولاد علي</p>	<p>مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015</p>
	<p>-تزود بالعدادات للمناطق السقوية بوصفة 1 و 2 بتكلفة 100 أ.د تقدم الانجاز 85 بالمائة</p>	<p>وزارة الفلاحة</p>	<p>تعميم العدادات بالمناطق السقوية بوصفة 2 و بئر شعبان 2</p>	<p>مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015</p>

	-بئر شعبان 2 : في طور التعهد			
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015	تهينة 28,5 كم من المسالك الفلاحية خمودة الحسانية * عين هدية 1 تالة القرعة سببلة	وزارة الفلاحة	-قسط 1 : 19.5 كم نسبة تقدم الانجاز 80 بالمائة -قسط 2: 9 كلم في طور اسناد الصفقة	
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015	تجهيز و كهربة 10 ابار عميقة و صيانة محطات ضخ	وزارة الفلاحة	-تجهيز 13 بئر عميقة نسبة الانجاز 100 بالمائة -اعادة تجهيز 07 محطات ضخ : نسبة الانجاز 100 بالمائة	
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015	اشغال تهينة 600 من الغابات و الحلفاء	وزارة الفلاحة	خلال 2016 / 200 هك تشجير غابي	
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015	تهينة مصبات و الاودية و تعهد و صيانة اشغال المحافظة على المياه و التربة	وزارة الفلاحة	-إنطلاق الأشغال المنجزة عن طريق الحضائر تم انجاز الاشغال المطلوبة بنسبة 100 بالمائة	
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015	احداث 10 منشآت تغذية الماندة	وزارة الفلاحة	نسبة الانجاز 100 بالمائة	
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015	انجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لولاية الكاف و القصرين	وزارة الفلاحة	جل العناصر تم انجازها	
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015	احداث 25 بئر استكشافي و 10 استغلال ضمن المخطط الخماسي 2016-2020	وزارة الفلاحة	-طلب عروض عدد 2016/45: تم اسناد الصفقة -ميزانية 2017 : احداث 04 حفریات للاستكشاف وبئرين عميقتين للماء الصالح للشرب (فتح العروض 2017/3/10)	

<p>* عن طريق الهندسة الريفية</p> <p>-خلال 2016 تم الاعلان طلب العروض لتزويد منطقة البكاكية من معتمدية جدليان بالماء الصالح للشرب لفائدة 243 ساكن و إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة فج حديد من معتمدية حاسي فريد لفائدة 3484 ساكن (في طور فتح الاعتمادات من قبل BAD )</p> <p>-تزويد منطقة السلطنية فوسانة 250 ساكن بوبرياس عين عمارة فوسانة لفائدة 400 ساكن (في طور فتح الاعتمادات من قبل BAD)</p> <p>-عين زيان 400 ساكن سببية:(في طور فتح الاعتمادات من قبل BAD)</p> <p>-خلال سنة 2017 سيتم تزويد المناطق التالية: وادي الحطب 4000 ساكن سببية، ام جنيب 600 ساكن القصرين الجنوبية، الشهبان 400 ساكن جدليان، الخرايفية 750 ساكن سببية (في طور اعداد كراس الشروط)</p> <p>* عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه:</p> <p>-القصرين 02 ابار عميقة تنطلق اشغال انجازها 2017/3/15</p> <p>-فوسانة 01 بئر عميقة تمت انطلاق الاشغال 2017/02/15</p> <p>-بو درياس تم تشييب بئرين عميقتين وكهربية واحدة منهما</p>	<p>وزارة الفلاحة</p>	<p>اتجاز مشاريع تزويد بالماء الصالح للشرب ضمن المخطط الخماسي 2016-2020</p>	<p>مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015</p>
<p>-خلال سنة 2016 تم الاعلان عن طلب العروض لاحداث 200 هك بزلفان هندي الدولة تالة(قرار 47)</p> <p>-برنامج 2017 احداث 02 مناطق سقوية - سيدي عمر سببية ((في طور اعداد كراس الشروط)</p> <p>-العوابدية ماجل بلعباس (في طور اعداد كراس</p>	<p>وزارة الفلاحة</p>	<p>احداث 16 منطقة سقوية على مساحة 980 هك ضمن المخطط الخماسي 2016-2020</p>	<p>مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015</p>

	(الشروط) -اتمام انجاز المنطقة السقوية الطايفية اولاد مرزوق 300هك زلفان هندي الدولة 200هك			
	-خلال 2016 تم التدخل بالمناطق التالية (قرار 48): هنشير الجمل فوسانة، هنشير غرس الله القصرين الجنوبية، توشة العيون، كدية موسى بوصفة القصرين الجنوبية -برنامج 2017: بئر شعبان تالة، فم الضفى حيدرة، الناصرية الماجل، سيدي سهيل تالة، عقلة احمد الماجل	وزارة الفلاحة	اعادة تهيئة 9 مناطق سقوية على مساحة 840 هك	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015
	- برنامج 2016 / 28.5 كلم (قرار عدد50) -برنامج 2017 / 13 كلم تم الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 2017/2/22	وزارة الفلاحة	تهيئة وتعبيد 40 كلم من المسالك الفلاحية لفك عزلة 10 مناطق سقوية في اطار البرنامج الوطني بكلفة 9250 ا د	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015
	انطلقت الدراسة بداية جانفي 2017	وزارة الفلاحة	تهيئة وتعبيد 180 كلم من المسالك الفلاحية لفك عزلة 33 منطقة سقوية ومناطق انتاج	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015
	-خلال 2016 تم تجهيز وكهربية 13 ابار عميقة -برنامج 2017 تجهيز وكهربية 05 ابار عميقة	وزارة الفلاحة	كهربية وتجهيز 80 بئر عميقة منجزة وصيانة محطات ضخ بكلفة 12 م د	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015
	*خلال 2016: - إنجاز وحدات تغذية المائدة وإصلاح مجاري ونشر مياه بقيمة 350 ا.د. - إنجاز مصاطب ميكانيكية بقيمة 447 أ.د. *برنامج 2017: -تهيئة المصببات 5270 هك. التهيئة الفلاحية وصيانة المنشآت 6300هك احدث منشآت 175 وحدة	وزارة الفلاحة	اشغال المحافظة على المياه والتربة	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015
	-خلال 2016 : 03 بحيرات ودراسة 12 بحيرة -خلال 2017 : بداية انجاز 03 بحيرات	وزارة الفلاحة	احداث 10 بحيرات جبلية	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015
	دراسة السد التلي وادي المالح معتمدية جدليان	وزارة الفلاحة	احداث 9 سدود تلية	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015
	- برنامج 2016: 200هك تشجير غابي -برنامج 2017: 550هك تحسين مرعى	وزارة الفلاحة	اشغال الغابات والحلفاء	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015



مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015	مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لولايتي الكاف والقصرين بكلفة 8850 ا د	وزارة الفلاحة	-2016/11/23 : تم الادراج بالمخطط. تمويل البنك الاسلامي للتنمية
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015	مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لجنوب بولاية القصرين المرحلة 2	وزارة الفلاحة	- 2016/11/23 : تم الادراج بالمخطط -المشروع في مرحلة البحث عن التمويل
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015	بناء و مواصلة بناء مركز إقامة بدار الشباب بسيطة	وزارة الشباب و الرياضة	أنجز
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015	مواصلة تأهيل المركب الشبابي بالقصرين	وزارة الشباب و الرياضة	بصد الانجاز
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015	بناء دار شباب بجدليان	وزارة الشباب و الرياضة	أنجز
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015	مواصلة تهيئة مركز اقامة بحيرة	وزارة الشباب و الرياضة	طلب العروض القسط الثاني
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالقصرين	وزارة الشباب و الرياضة	بصد الانجاز
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015	تهيئة و مواصلة الملعب البلدي بتالة ( GC+التعشيب والتنوير )	وزارة الشباب و الرياضة	بصد الانجاز
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015	تهيئة الملعب البلدي بسيطة	وزارة الشباب و الرياضة	قبول وفتي
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015	إعادة بناء و مواصلة تهيئة الملعب البلدي بماجل بلعباس	وزارة الشباب و الرياضة	15 %
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015	دراسة إحداث ملعب بلدي بحيرة	وزارة الشباب و الرياضة	بصد الدراسة
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015	بناء قاعة للرياضات الجماعية بسيطة	وزارة الشباب و الرياضة	بصد الانجاز
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015	تهيئة الملعب البلدي بجدليان ومواصلة تهيئة	وزارة الشباب و الرياضة	قسط التعشيب : بصد التفاوض المباشر
مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 افريل 2015	إحداث مضمار إصطناعي بالقصرين	وزارة الشباب و الرياضة	بصد الدراسة
مجلس وزاري مضيق بتاريخ	احداث مسبح مغطى	وزارة الشباب و الرياضة	بصد المصادقة على الصفحة

				31 أفريل 2015
	بصدد تسجيل الصفقة	وزارة الشباب و الرياضة	إحداث قاعة للألعاب الفردية بفريانة	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 أفريل 2015
	بصدد الانجاز	وزارة الشباب و الرياضة	تهيئة الملعب البلدي بسيبية	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 أفريل 2015
	تم تحويل الاعتماد لفائدة تعشيب الملعب البلدي	وزارة الشباب و الرياضة	تعشيب الملعب الفرعي بالمركب الرياضي	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 31 أفريل 2015
	تكليف بنك أعمال بإعداد برنامج عملي يتضمن مخططا دقيقا ومفصلا لإنقاذ الشركة حفاظا على دورها التنموي والاجتماعي بالولاية	وزارة الصناعة والتجارة	تفعيل الدراسة حول شركة عجين الحلفاء والنظر في الحلول الممكنة لإعادة هيكلتها	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017
	-إمكانية تسوية 21 وضعية مقترح : اصدار قانون خاص باستغلال المقاطع	-اشكالية في التمويل -التراخيص -القانون المنظم لاستغلال المقاطع	إيجاد حلول لمشاكل مقاطع الرخام غير المرخص لها بولاية القصرين ووضع حد لمسألة تهريب الرخام	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017
	تحرير بقية رأس مال الشركة	لم يقع تحرير بقية رأس مال الشركة من طرف بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للبنك	إيجاد الحلول للوضعية المالية التي تواجهها شركة التنمية بالقصرين "SODEK"	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017
	يستوجب تحويل المستشفى الجهوي بالقصرين حد أدنى من الأقسام الجامعية علما وانه يتوفر حاليا بالمستشفى الجهوي بالقصرين 05 أطباء جامعيين في اختصاصات متعددة وقسم جامعي واحد ( جراحة العظام والمفاصل) وتم برمجة تطوير ثلاثة أقسام جامعية ( أمراض النساء والتوليد، الجراحة العامة، طب العيون) قبل نهاية سنة 2017 <u>العنصر البشري:</u> تم تدعيم الجهة خلال سنتي 2016/2017 ب: - 3 أطباء اختصاص (إنعاش وتخدير، تشريح الخلايا المرضية وأمراض الكلى) - 20 طبيب عام و 21 فني سامي و 09	وزارة الصحة	تحويل المستشفى الجهوي بالقصرين إلى مستشفى جامعي	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017

<p>ممرضيين و04 مساعد للصحة و542  عملة الآلية 16 (مساعدى صحة،  عملة وإداريين)  <b>البناءات والتجهيزات الطبية:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تم الانتهاء من بناء قسم امراض القلب  والامراض النفسية بالمستشفى الجهوي  بالقصرين</li> <li>- تم الشروع في انجاز قسم تشريح  الخلايا المرضية ومحلات للصيانة  البيوطبية وتقدر نسبة تقدم الانجاز  بـ20 %</li> <li>- تم تنزيل الاعتمادات في قانون المالية  لسنة 2017 ويصدر تحيين الملف  الأولي لطلب العروض لبناء أقسام  الاستعجالي وجراحة المجاري البولية  والمعدة والامراض الصدرية والتخدير  والانعاش بالمستشفى الجهوي  بالقصرين</li> <li>- تمت برمجة تدعيم المستشفى بآلة  للتصوير بالرنين المغناطيسي ووحدة  لقاعة القسطرة بقسم أمراض القلب،  ومن المؤمل:</li> <li>- الانتهاء من أشغال بناء قاعات خاصة  لتركيز المعدات ( في مرحلة فرز  العروض) قبل نهاية سنة 2017</li> <li>- إتمام تركيب التجهيزات خلال النصف  الأول من سنة 2018</li> </ul> <p><b>الاعتمادات:</b>  تم تحويل اعتمادات للجهة بقيمة 4515 أ.د الى</p>				
--	--	--	--	--

<p>غاية 29 مارس 2017، علما وأن كامل الاعتمادات المرصودة الى الجهة سنة 2016 بلغت 5946 أ.د.</p>				
<p>1- قام الديوان الوطني للمياه المعدنية باعداد دراسة تهيئة مدينة استشفائية بمنطقة حمام بولعابة على مساحة 60 هك وتمت المصادقة عليها من قبل المجلس الجهوي للولاية، ويتكون المشروع من محطة استشفائية ومرافق تجارية وترفيهية ووحدات فندقية ومناطق مخصصة للتجهيزات والسكن، بكلفة 10 م.د لانجاز مكونات البنية الاساسية ( حسب تقديرات سنة 2010)، ويستهدف 200 ألف حريف سنويا و1500 ساكن.</p> <p>الا ان هذا المشروع لاقى صعوبات لتجسيده وذلك لعدم:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الحصول على الامتياز من الدولة لانجاز مكونات البنية الاساسية الخارجية للمشروع ( كلفة 3 م.د سنة 2010).</li> <li>- توفر مستثمر لانجاز التهيئة الداخلية للمنطقة وانجاز المشروع.</li> </ul> <p>2- تم انجاز مشروع محطة استشفائية مندمجة ببولعابة من قبل احد الخواص، على مساحة 2 هك وبكلفة 2 م د، دخلت حيز الاستغلال شهر أكتوبر 2016.</p> <p>3- تحصل احد الخواص خلال شهر جانفي 2017 على الموافقة المبدئية من مصالح الديوان الوطني للمياه المعدنية لانجاز وحدة استشفائية مندمجة بمنطقة حمام بولعابة على مساحة 2.04 هك</p>		<p>وزارة الصحة</p>	<p>إحداث قرية استشفائية ببولعابة</p>	<p>مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017</p>

<p>بكلفة 1.12 م.د وفي انتظار الاجراءات وانطلاق المشروع</p>				
<p>من خلال المؤشرات والاحصائيات حول قطاع طب الاسنان والمتمثلة في:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- عدد اطباء الاسنان المباشرين 3850 طبيب(3200 بالقطاع الخاص و650 بالقطاع العام) بمعدل 3.5 طبيب اسنان لكل 10000 ساكن.</li> <li>- عدد اطباء الاسنان المعطلين عن العمل 1000 طبيب.</li> <li>- غلق 180 عيادة لطب الاسنان بالقطاع الخاص خلال سنتي 2016/2017</li> <li>- معدل 270 طالب سنويا يتم تسجيلهم بالسنة الاولى بكلية طب الاسنان رغم ان الحاجيات على المستوى الوطني لا تتجاوز 130 طالب سنويا، كما ان كلية طب الاسنان بالمنستير قامت بتوجيه مكتوب للمطالبة بتقليص عدد تسجيل الطلبة بتبين عدم الجدوى من انجاز كلية ثانية لطب الاسنان على المستوى الوطني.</li> </ul>	<p>تم سابقا وعد الجهة بإحداث كلية لطب الأسنان</p>	<p>وزارة الصحة/رئاسة الحكومة</p>	<p>توضيح موقف الحكومة من مشروع بعث كلية لطب الأسنان بالجهة</p>	<p>مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017</p>
<p>التسريع في استكمال الدراسات</p>	<p>مشروع يخص الإدارة العامة للسدود تم الإذن للإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهيكل المهنية بتخصيص إعتمادات الدراسة خلال جلسة مع السيد كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 14 مارس 2017 وإعطاء الإذن للإدارة العامة للسدود للانطلاق في الدراسة المشروع متوقف في طور الدراسة الجيوتقنية + APS</p>	<p>وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري</p>	<p>انجاز سد بولعابة باعتبار أنه مبرمج بالمخطط</p>	<p>مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017</p>

دعوة الشركة الوطنية الى تحيين الدراسة وتشريك الجهة في تحديد المسار وإيفاد مكتب الدراسات المعني لزيارة الجهة	عدم التجاوب مع مقترحات الجهة في خصوص تغيير المسار الحالي الذي يشق وسط المدينة	وزارة النقل	النظر في امكانية تغيير مسار السكة الحديدية الموجودة في وسط مدينة القصرين	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017
تفعيل نص قانون المالية القاضي بإحداث خط تمويل للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى في إطار منظومة اقتصادية و رصد قروض موسمية.	عدم تمتيع الجهة على غرار بقية الجهات بنصيب من المبالغ المخصصة لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة	وزارة المالية/ وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي	تمتيع ولاية القصرين بقسط من المبالغ المخصصة لتمويل إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة (قانون المالية 2017)	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017
التسريع بإقرار بعث ديوان المناطق الحدودية بالقصرين	تم وعد الجهة سابقا بإحداث هذا الديوان	وزارة الدفاع الوطني	بعث ديوان المناطق الحدودية على غرار ديوان تنمية رجم معتوق	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017
التسريع في إقرار إنجاز دار المعلمين العليا بمدينة سبيطلة	تعطل تفعيل القرار	وزارة التعليم العالي	إنجاز مشروع دار المعلمين العليا بمعتمدية سبيطلة	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017
-المستشفى الجهوي بتالة :تسريع مرحلة المناظرة المعمارية الوطنية -المستشفى الجهوي بفريانة : التسريع في مرحلة التاهيل -المستشفى الجهوي بسببية : التسريع في اجراءات طلب العروض	بطئ التنفيذ	وزارة الصحة العمومية	احداث مستشفيات جهوية بكل من تالة وسببية وتحويل فريانة الى جهوي وتحويل مستشفى القصرين الى جامعي	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017
خصم ديون صغار الفلاحين بالجهة على غرار القرارات المماثلة لولايتي توزر وقبلي	عدم التفعيل	وزارة الفلاحة .ورئاسة الحكومة	إقرار إجراء خاص لتخفيض في ديون الفلاحين	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017
إقرار قسط القصرين جلمة من الطريق السيارة و برمجته قسط ذو أولية وانطلاق الأشغال من القصرين في اتجاه تونس	عدم إقرار قسط القصرين جلمة ضمن المخطط الخماسي	وزارة التجهيز ووزارة النقل	التسريع في إنجاز المشاريع الكبرى بالجهة الطريق السيارة	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017
إقرار مشروع نموذجي متكامل خاص بمدينة تالة	عدم تنفيذ مقترح الجهة في خصوص احداث مشروع نموذجي بتالة المحددة وقفة دراسات سابقة	وزارة التجهيز	برمجة تدخلات مشاريع وكالة التهذيب لفائدة تالة	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017
حث وزارة الدفاع على اعطاء الموافقة على تغيير مقر الحالي للثكنة العسكرية	في انتظار موافقة وزارة الدفاع	وزارة الدفاع الوطني	تغيير مقر الثكنة العسكرية	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017
حث وزارة التربية على التفاوض مع وزارة المالية لتمويل المشاريع على حساب خزينة الدولة	تعطل 7 مشاريع مدارس اعدادية ومعاهد	وزارة التربية	معالجة مشاكل الاكتظاظ التي تعاني منها المؤسسات التربوية بالجهة	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017
احداث شعب علمية جديدة تراعي الخصوصية الاقتصادية للجهة	عدم تشريك المؤسسات الجامعية بالجهة في برمجة احداث شعب علمية جديدة	وزارة التعليم العالي	بعث شعب خاصة بالنسيج الاقتصادي بالجهة	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017

التسريع في طلب رصد الميزانية اللازمة لإعلان طلب العروض وإنجاز المشروع	عدم اقرار الميزانية اللازمة للمشروع رغم تخصيص العقار من قبل الجهة و القيام ب TPD	وزارة الشباب والرياضة	الشروع في إنجاز المركز الدولي للتريصات بالشعاني	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017
اقرار لجنة قيادة على مستوى الجهة لتحديد البرنامج الوظيفي للمشروع والنطلاق في انجازه	عدم تحويل وزارة الثقافة للقسط الخاص بها ضمن المشروع 300 اد و عدم وضع التصورات الممكنة للمشروع	وزارة الشؤون الثقافية	احداث مرافق ثقافية بالولاية	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017
تكفل المجلس الجهوي بخلص ثمن ال TPD	تعطل إنجاز ال TPD من قبل مصالح مندوبية السياحة	وزارة السياحة والجهة	تغيير صبغة الارض المخصصة لانجاز المنطقة السياحية بسببلة	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017
التسوية النهائية لكافة عملة الحضائر والآليات بالجهة	الملف محل متابعة	وزارة الشؤون الاجتماعية و رئاسة الحكومة	تسوية وضعية عملة الحضائر و الالية 20 والقضاء على كل اشكال العمل الهش	مجلس وزاري مضيق بتاريخ 08 مارس 2017

# قائمة المشاريع العمومية المبرمجة والتي لم ينطلق إنجازها

خلال الفترة 2011-2020 بولاية القصرين

قائمة في المشاريع المقررة خلال الفترة 2011-2015 والتي لم ينطلق إنجازها بعد:

قطاع التطهير						
العدد	بيان المشروع	مكان المشروع	الكلفة الأصلية (أد)	الكلفة المحينة (أد)	سنة الأدرج في الميزانية	الملاحظات
1	أشغال تطهير مدينة فوسانة	فوسانة	2000	2000	2010	نشر طلب العروض مرتبط بإنجاز محطة التطهير
1	أشغال تطهير منطقة حاسي فريد: شبكة ومحطة تطهير	حاسي فريد	1600	1600	2011	مرتبط بإنجاز محطة التطهير
1	تطهير مدينة تالة (شبكة)	تالة	2100	7000	2010	نشر طلب العروض مرتبط بإنجاز محطة التطهير
1	تطهير مدينة فريانة (شبكة)	فريانة	3000	3000	2010	نشر طلب العروض مرتبط بإنجاز محطة التطهير
قطاع التعليم العالي						
1	المبيت الجامعي القصرين	القصرين ش	4600	4600	2013	مشاريع تتابع على مستوى مركزي
1	بناء مركز ثقافي جامعي	القصرين ش	1600	1600	2013	
قطاع التربية						
1	احداث مدرسة ابتدائية بالهرية	ماجل بلعباس	200	200	2015	تم ارجاءها لحين توفر اعتمادات
1	بناء سياج بالمدرسة الابتدائية هنشير القصعة	القصرين ج	60	60	2015	اجل لسنة 2020
1	بناء سياج بالمدرسة الابتدائية أولاد نصر الله	فوسانة	80	80	2015	اجل لسنة 2020
1	تعهد وصيانة المدرسة الإبتدائية الجروالة الجنوبية	سبيطلة	150	150	2015	اجل لسنة 2020
1	صيانة مبيت إعدادية سيدي سهيل	تالة	100	100	2015	اجل لسنة 2020
قطاع الفلاحة						
1	احداث حفرة عميقة تعويضية بولعابة	ق ش	54	54	2015	تم تاجيل الحفر
1	احداث حفرة عميقة تعويضية عين الكيس	فريانة	70	70	2015	تم تاجيل الحفر
<b>13</b>	<b>المجموع</b>		<b>15614</b>	<b>20514</b>		



قائمة في المشاريع المبرمجة خلال الفترة 2016-2019 من المخطط التنموي 2016-2020 والتي لم ينطلق في إنجازها بعد (إلى حدود جوان 2020)

قطاع التربية						
لم ينطلق إنجازها	2016	250	250	حيدرة	صيانة وتهيئة المدرسة الابتدائية حيدرة 1	1
لم ينطلق إنجازها	2016	150	150	حيدرة	صيانة وتهيئة المدرسة الابتدائية عين دفلة	1
لم ينطلق إنجازها	2016	150	150	فريانة	صيانة وتهيئة المدرسة الابتدائية الهادي العجلاني	1
لم ينطلق إنجازها	2016	150	150		صيانة وتهيئة المدرسة الابتدائية المغرب العربي	1
لم ينطلق إنجازها	2016	150	150	سببية	صيانة وتهيئة المدرسة الابتدائية عقبة	1
لم ينطلق إنجازها	2016	250	250		صيانة وتهيئة المدرسة الابتدائية المحافضية	1
قطاع الصحة						
ارجي لسنة 2020 كقسط ثاني	2017	1978	2000	فريانة	بناء عيادات خارجية بالمستشفى المحلي	1
قطاع الفلاحة						
		<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>تزويد منطقة الزاطلي بالماء الصالح للشرب (BAD)</b>		
اتم ادراج المنطقة ضمن مشروع حاسي الفريد و الق الجنوبية	2019	2500	2500	حاسي الفريد	اشغال الهندسة المدنية	1
	2019				تجهيزات	
	2019				الربط بشبكة الكهرباء	
		<b>5578</b>	<b>5600</b>	<b>المجموع</b>		<b>8</b>
		<b>26092</b>	<b>21214</b>	<b>المجموع 2019 وما قبل</b>		<b>21</b>



الجمهورية التونسية  
وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي  
ديوان تنمية الجنوب

# جلسة لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب

## الوضع التنموي بإقليم الجنوب



مجلس نواب الشعب 19 جوان 2020

# المحتوى

تقديم ديوان تنمية الجنوب

إقليم الجنوب في أرقام

إشكالية التنمية بإقليم الجنوب

الوضع التنموي بإقليم الجنوب

تقديم ديوان تنمية الجنوب

# تقديم ديوان تنمية الجنوب

## الإحداث ومناطق التدخل

مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية ، تخضع لإشراف وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، أحدثت بمقتضى الفصلين 71 و72 من قانون المالية لسنة 1984، قبل أن يتم مراجعة مشمولاتها وإعادة هيكلتها وفق القانون عدد 83 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994.

يغطي ميدان تدخل الديوان، ولايات تطاوين ومدنين وقابس وقبلي وتوزر وقفصة.

# تقديم ديوان تنمية الجنوب

## المهام والمشمولات

- جمع كل المعلومات اللازمة والقيام بالدراسات الضرورية واقتراح التدابير التي من شأنها أن تمكن من تحديد السياسات في ميدان التنمية بصفة عامة واختيار برامج الاستثمار العمومي وودفع الاستثمار الخاص بمناطق تدخل الديوان ومتابعة وتقييم نتائج هذه السياسات،
- مساعدة السلط الجهوية على استنباط وإعداد وتنفيذ مخططات وبرامج التنمية بكل ولاية ومعاضدتها في ميدان التنسيق بين مختلف المتدخلين ومتابعة إنجاز وتقييم المخططات والبرامج،
- العمل على تحقيق التناسق بين المخططات والبرامج في مناطق تدخل الديوان،

# تقديم ديوان تنمية الجنوب

## المهام والمشمولات

- إعداد برامج وخطط عمل متكاملة للنهوض ولتنمية المناطق ذات الإشكاليات الخصوصية أو التي تعرف صعوبات تنموية والعمل على إنجازها وذلك بالتعاون مع الهياكل الوطنية والجهوية المختصة،
- لمساهمة في إعداد برامج وخطط العمل الهادفة إلى دفع وتنشيط الإستثمار الخاص بالجهات المعنية ومتابعة مراحل إنجازها، وذلك بالتعاون مع الهياكل الفنية والمصالح الجهوية المختصة والجماعات العمومية المحلية،
- دعم عمل الهياكل الجهوية المختصة والجماعات العمومية المحلية في ميدان النهوض بالاستثمار الخاص بمناطق التدخل.

# تقديم ديوان تنمية الجنوب

## الموارد البشرية

يبلغ عدد الإطارات والأعوان 116 شخصا منهم 63 إطارا:

الإطارات أعوان التسيير أعوان التنفيذ المجموع نسبة التأطير %

56,6

53

11

12

30

المقر  
الاجتماعي

52,4

63

15

15

33

الإدارات  
الجهوية

54,3

116

26

27

63

المجموع



# تقديم ديوان تنمية الجنوب

## ميزانية الديوان

قدرت ميزانية الديوان المصادقة عليها لسنة 2020 بـ 4403 أ د:

التطور 2020/2019 %	2020	2019	2018	
2,2	4103	4015	4054	نفقات التصرف (أد)
30,4	300	230	150	نفقات التنمية (أد)
3,7	4403	4245	4204	المجموع (أد)

# تقديم ديوان تنمية الجنوب

## نشاط الديوان سنة 2019

- استقطاب 2859 باعث،
- انجاز 2456 عملية إحاطة وتوجيه،
- إعداد 355 دراسة مشروع بكلفة 111 م د و 2428 موطن شغل،
- تم تمويل 145 مشروعاً بكلفة 30 م د و 915 موطن شغل والتوصل إلى انجاز 102 مشروع بكلفة 13 م د و 554 موطن شغل،
- انتفاع 578 باعث بتمويلات آلية اعتماد الانطلاق 1 بقيمة تمويل ذاتي يناهز 3,8 م د،
- تسجيل 6165 خدمة ارشاد و 2603 خدمة إدارية من طرف الشباك الموحد للديوان،

# تقديم ديوان تنمية الجنوب

## نشاط الديوان سنة 2019

### 1. التقارير الشهرية

— متابعة المشاريع العمومية المعطلة.

### 2. التقارير الثلاثية

— متابعة المشاريع والبرامج العمومية السنوية،

— متابعة البرنامج الجهوي للتنمية،

— متابعة القرارات الخاصة بالمجالس الوزارية الجهوية،

— متابعة الوضع التنموي بالولاية والظرف الاقتصادي.

### 3. التقارير السنوية

— تقارير حول متابعة إنجازات المخطط التنموي للفترة 2016-2019

لولايات الجنوب وحوصلة على مستوى الإقليم،

— النشريات الإحصائية "الولاية في أرقام" لسنة 2018،

— التقرير السنوي حول التنمية لسنة

2018 لولايي توزر ومدنين وبصدد

إعداد تقارير تطاوين، قابس، قبلي وقفصة،

— تقرير حول تطور الاستثمار الخاص بالإقليم.

# تقديم ديوان تنمية الجنوب

## نشاط الديوان سنة 2019

### 4. متابعة مشاريع التعاون الدولي

- مشروع الحد من الفقر من خلال تثمين منظومة تربية الماشية بولاية تطاوين،
- مشروع المبادرة الجهوية لمساندة التنمية الإقتصادية المستدامة بولايات قابس،  
مدنين وقفصة IRADA،
- مشروع دعم الحوكمة البيئية المحلية للأنشطة الصناعية بقابس،
- مشروع بعث المؤسسات الصغيرة بولايتي مدين وتطاوين في إطار التعاون مع  
برنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS،

# إقليم الجنوب في أرقام

# الإقليم في أرقام

المؤشرات	الوحدة	تطاوين	مدنين	قابس	قبلي	توزر	قفصة	إقليم الجنوب	تونس
المساحة	كلم <sup>2</sup>	38 889	9 167	7 166	22 454	5 593	7 807	91 076	163 610
النسبة من الوطني	%	24	6	4	14	3	5	56	100
عدد البلديات	بلدية	7	10	16	9	6	13	61	350
عدد السكان (2019)	ألف ساكن	151,3	516,8	402,9	169,4	115,2	353,0	1 708,6	11 732,9
النسبة من الوطني	%	1,3	4,4	3,4	1,4	1,0	3,0	14,6	100
نسبة الفقر (2015)	%	15,0	21,7	15,9	18,5	14,7	18,0	-	15,2
نسبة الأمية (2018)	%	18,2	17,3	16,5	14,8	14,5	21,5	-	18,1

# الإقليم في أرقام

تونس	إقليم الجنوب	قفصة	توزر	قبلي	قابس	مدنين	تطاوين	الوحدة	المؤشرات
3497,8	411,2	78,3	29,9	46,6	92,6	128,3	35,4	ألف مشغل	الشيطنون المشغلون (2018)
14,5	15,4	20,3	21,4	34,4	13,3	7,3	9,1	%	الزراعة والصيد البحري
1,1	2,7	7,6	1,5	0,7	2,0	0,9	3,8	%	المناجم والطاقة
18,5	7,6	4,8	4,8	6,3	12,9	6,9	6,4	%	الصناعات المعملية
14,0	19,9	18,7	12,1	11,1	23,3	23,3	19,9	%	البناء والأشغال العامة
51,9	54,3	48,6	60,2	47,5	48,5	61,4	60,6	%	الخدمات
15,3	-	25,5	24,8	23,5	24,3	18,7	28,7	%	النسبة العامة للبطالة (2019)


# الإقليم في أرقام

المؤشرات	الوحدة	تطاوين	مدنين	قابس	قبلي	توزر	قفصة	إقليم الجنوب	تونس
المناطق الصناعية	عدد	2	4	2	2	1	3	14	188
المساحة (هك)	هك	24	93,5	336	43,5	20	47	564	5889,3
نسبة الإستغلال	%	66,7	16,0	23,8	18,4	35,0	74,5	28,5	-
المؤسسات الصناعية ذات 10 مواطن شغل قارة فأكثر	مؤسسة (ماي 2020)	16	89	105	21	54	84	369	5328
المؤسسات الصناعية ذات 10 مواطن شغل قارة فأكثر المصدرة كليا	مؤسسة (ماي 2020)	0	6	25	12	36	30	109	2350
الاستثمار الأجنبي المباشر المنجز 2019									
العدد	مشروع	0	5	15	0	4	3	27	603
قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر	مليون دينار	0	2,1	156,7	0	120,0	15,8	294,7	1569,7
مواطن الشغل	مواطن شغل	0	7	136	0	250	2	395	14353
مؤشر التنمية الجهوية 2018 (المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية)	-	0,484 (الرتبة 12)	0,493 (الرتبة 11)	0,501 (الرتبة 9)	0,470 (الرتبة 14)	0,483 (الرتبة 13)	0,453 (الرتبة 17)	-	0,486
مؤشر جاذبية المجال 2018 (المعهد العربي لرؤساء المؤسسات)	-	2,88 (الرتبة 13)	3,46 (الرتبة 9)	3,18 (الرتبة 11)	1,70 (الرتبة 24)	2,04 (الرتبة 23)	2,12 (الرتبة 22)	-	3,18



# الإقليم في أرقام

## مؤشر التنمية الجهوية لسنة 2018

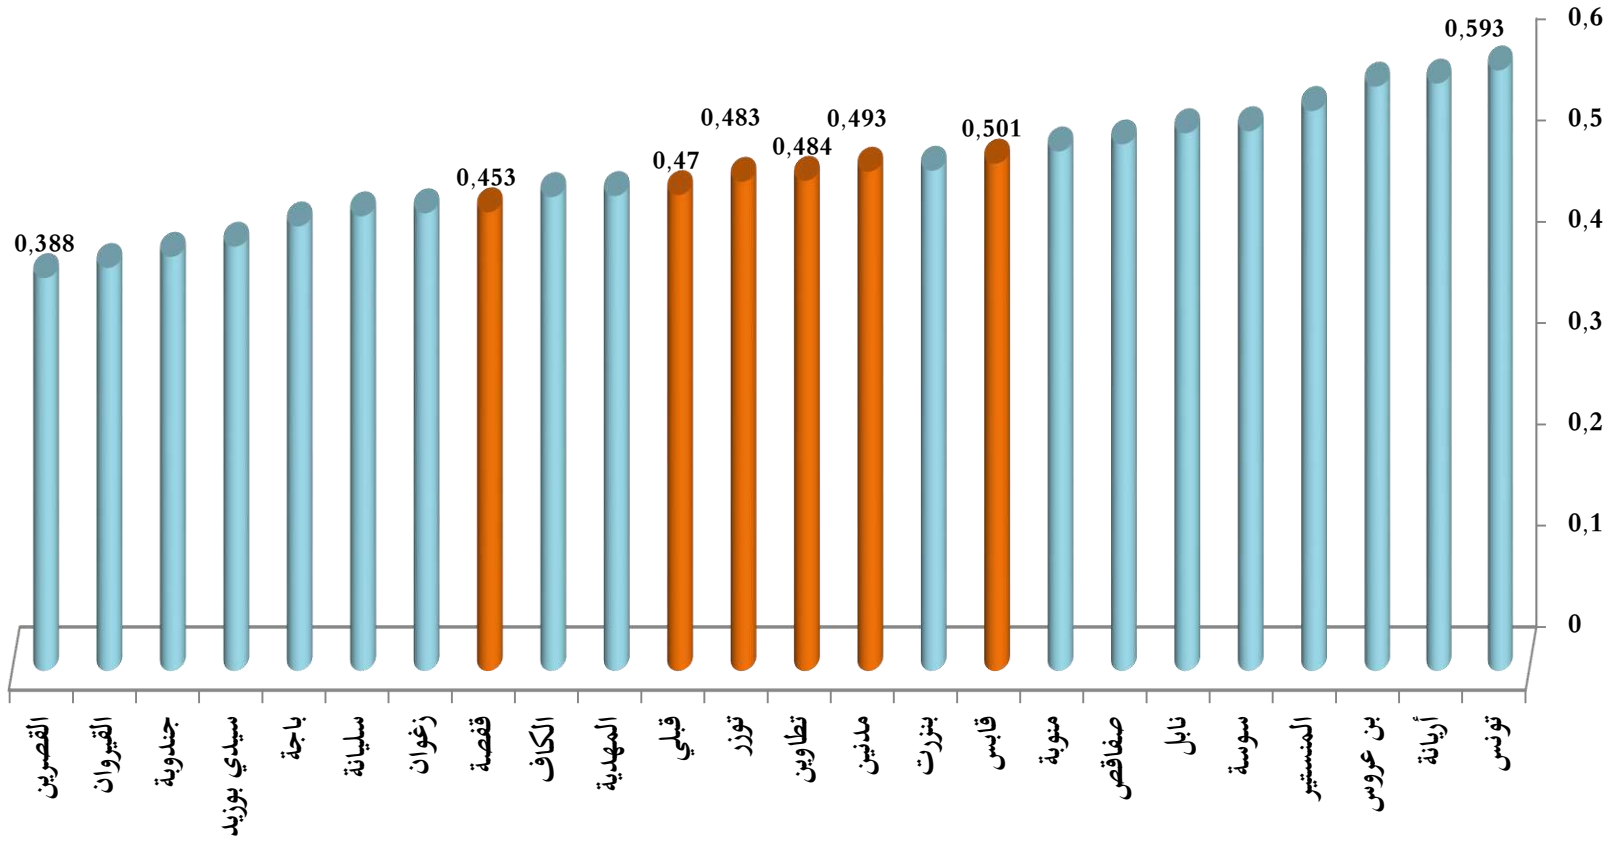

# الإقليم في أرقام

## مؤشر التنمية الجهوية لسنة 2018

تتوزع معتمديات الإقليم حسب مؤشر التنمية الجهوية لسنة 2018 حسب المجموعات (المجموعة 1 : الأكثر نمواً والمجموعة 4 : الأقل نمواً) إلى معتمديتين (2) ضمن المجموعة الأولى، 18 معتمدية ضمن المجموعة الثانية، 22 معتمدية ضمن المجموعة الثالثة و6 معتمديات ضمن المجموعة الرابعة.

المجموعة 4	المجموعة 3	المجموعة 2	المجموعة 1	الولاية
0	5	2	0	تطاوين
0	3	6	0	مدنين
0	3	5	2	قابس
2	1	3	0	قبلي
0	3	2	0	توزر
4	7	0	0	قفصة
6	22	18	2	الجنوب
10	18	42	64	الولايات الساحلية
58	47	22	3	ولايات التنمية الجهوية
68	65	64	67	المستوى الوطني

إشكالية التنمية بإقليم الجنوب

# إشكاليات التنمية بالإقليم

- عدم تنوع القاعدة الإقتصادية وضعف الإستثمار الخاص،
- حدة الإشكاليات العقاريّة والبيئيّة،
- ضعف البنية الأساسية واللوجستيّة
- ضعف مؤشّرات التنمية البشرية والإجتماعيّة
- ضعف اعتماد قواعد الحوكمة الرشيدة والإصلاحات

الوضع التتموي بإقليم الجنوب

# الوضع التنموي بإقليم الجنوب

## 1. الرؤية الإستراتيجية

تحقيق التنمية المستدامة للجنوب بمشاركة الجميع بما يضمن الحد من البطالة وتوفير الشغل والرفع من تنافسية قطاعات الإنتاج وإرساء اقتصاد مجدد مثمنا للموارد والإمكانيات المتاحة ومستقطبا للاستثمار المحلي والخارجي ومشعا على محيطه الإقليمي والوطني والدولي.

# الوضع التنموي بإقليم الجنوب

## 2. متابعة تنفيذ المخطط الجهوي للتنمية 2016-2020

— بلغت الاستثمارات المدرجة بالمخطط التنموي 2016 - 2020 حوالي 10898,7 مليون دينار.

— قُدرت الاستثمارات الجمالية المنجزة خلال الفترة 2016-2019 بـ 5088,2 مليون دينار وبذلك بلغت نسبة الإنجاز 47% من جملة الاستثمارات المبرمجة بالمخطط (48% للقطاع العام و45% للقطاع الخاص).

نسبة الإنجاز %	الاستثمارات المنجزة 2016 - 2019 (م د)	تكلفة المخطط 2016-2020 (م د)	
48	2 556,609	5 307,159	القطاع العام
45	2 531,600	5 591,600	القطاع الخاص
47	5 088,209	10 898,759	المجموع

# الوضع التنموي بإقليم الجنوب

## 2. متابعة تنفيذ المخطط الجهوي للتنمية 2016-2020

– قدرت الاستثمارات العمومية المنجزة خلال الفترة 2016-2019 بـ 2556,6 مليون دينار وهو ما يمثل نسبة 48% من تقديرات 2016-2020 والمقدرة بـ 5307,2 م د.

نسبة الإنجاز (%)	الاستثمارات المنجزة خلال الفترة 2016-2019 (م د)	الاستثمارات المبرمجة خلال الفترة 2016-2020 (م د)	
46	312,357	676,990	تطاوين
55	751,060	1360,292	مدنين
39	460,793	1182,477	قابس
50	273,527	545,462	قبلي
50	258,401	512,281	توزر
49	500,471	1029,657	قفصة
<b>48</b>	<b>2556,609</b>	<b>5307,159</b>	<b>إقليم الجنوب</b>
45	12710,772	28165,144	المستوى الوطني



# الوضع التنموي بإقليم الجنوب

## 2. متابعة تنفيذ المخطط الجهوي للتنمية 2016-2020

نسبة الانجاز المالي للإستثمار العمومي 2016-2019 (%)



# الوضع التنموي بإقليم الجنوب

## 2. متابعة تنفيذ المخطط الجهوي للتنمية 2016-2020

يعود ضعف النسبة العامة لتقدم الإنجاز (48%) إلى عديد الإشكاليات على غرار:

- ارتفاع كلفة المشاريع خاصة على إثر الانزلاق المتواصل للدينار من جهة وعدم جاهزية الدراسات الفنية من جهة أخرى،
- ضعف الرصيد العقاري وطول وتشعب إجراءات تحويل ملكية وصبغة الأراضي،
- ضعف قدرة المؤسسات والهياكل العمومية على تنفيذ المشاريع في آجالها وقلّة الموارد البشرية،
- طول إجراءات اعداد المشاريع : مرحلة إعداد الدراسات وإجراءات القيام بالصفقات العمومية (فسخ الصفقات، إعداد صفقات جديدة، ...)،
- قلة المقاولات وعزوف البعض منها عن المشاركة في طلبات العروض لبعض المشاريع،
- نقص وتأخر في رصد اعتمادات بعض المشاريع،
- تراجع قدرة المقاولات على الإيفاء بالتزاماتها وهشاشة وضعيتها المالية.

# الوضع التنموي بإقليم الجنوب

## 2. متابعة تنفيذ المخطط الجهوي للتنمية 2016-2020

— قدرت الاستثمارات الخاصة المنجزة خلال الفترة 2016-2019 بـ 2531,6 مليون دينار وهو ما يمثل نسبة 45% من تقديرات 2016-2020 والمقدرة بـ 5591,6 م د.

نسبة الإنجاز (%)	الاستثمارات المنجزة خلال الفترة 2016-2019 (م د)	الاستثمارات المبرمجة خلال الفترة 2016-2020 (م د)	
31	375,8	1 223,4	تطاوين
43	858,4	2 000,0	مدنين
52	549,8	1 058,6	قابس
94	253,2	268,5	قبلي
71	207,1	291,0	توزر
38	287,3	750,0	قفصة
<b>45</b>	<b>2 531,6</b>	<b>5 591,6</b>	<b>إقليم الجنوب</b>

# الوضع التنموي بإقليم الجنوب

## 3. متابعة تنفيذ المشاريع العمومية

بلغ العدد الجملي للمشاريع العمومية بالإقليم المدرجة بميزانية 2019 وما قبلها 7325 مشروعا بكلفة جمالية قدرها 6588 مليون دينار

الكلفة		عدد المشاريع		مراحل الإنجاز
%	مليون دينار	%	العدد	
53,3	3 514,4	72,5	5 307	مشاريع أنجزت
25,8	1 698,4	13,9	1 016	مشاريع بصدد الانجاز
9,1	600,7	4,3	312	مشاريع بصدد طلب العروض
9,8	644,5	8,8	644	مشاريع بصدد الدراسة
2,0	130,0	0,6	46	مشاريع لم تنطلق
100,0	6 588	100,0	7 325	المجموع

# الوضع التنموي بإقليم الجنوب

## 4. متابعة تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية

تتوزع اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية حسب الولايات كالتالي (ألف دينار):

فترة 2016-2019		فترة 2011-2015		الولاية
الدفع	التعهد	الدفع	التعهد	
25 372,1	36 492,4	60 777,5	74 357,8	قفصة
12 232,2	11 694,9	23 782,5	27 385,4	توزر
25 487,0	20 346,4	31 348,3	41 744,0	قبلي
37 629,5	21 678,0	31 793,8	54 817,1	تطاوين
56 980,2	46 321,0	43 326,0	76 867,4	مدنين
40 573,1	32 134,1	40 063,8	67 284,7	قابس
<b>198 274,0</b>	<b>168 666,8</b>	<b>231 091,9</b>	<b>342 456,3</b>	<b>الجنوب</b>

وتتمثل أهم إنجازات البرنامج في انجاز وتهيئة ما يزيد عن 1200 كلم من الطرقات والمسالك، تزويد قرابة 21 ألف عائلة بالماء الصالح للشرب وتوفير النور الكهربائي لحوالي 5,9 ألف عائلة، تحسين 19,8 ألف مسكن وتوفير منح في إطار دعم موارد الرزق لفائدة ما يزيد عن 25 ألف منتفع.

# الوضع التنموي بإقليم الجنوب

## 5. متابعة تنفيذ برنامج التنمية المندمجة

انتفعت مختلف معتمديات إقليم الجنوب بتدخلات برنامج التنمية المندمجة من الجيل الأول والثاني والبالغ عددها 24 معتمدية. كما تم الانطلاق في انجاز الجيل الثالث من هذا البرنامج، حيث تم تمتيع الإقليم بـ 30 مشروعا للتنمية المندمجة ببقية المعتمديات بكلفة جمالية قدرها 436 مليون دينار. وتبلغ بذلك تغطية عدد مشاريع التنمية المندمجة للمعتمديات نسبة 100% مقابل 70% على المستوى الوطني.

نسبة تغطية عدد المشاريع للمعتمديات	عدد المشاريع				عدد المعتمديات	الولاية
	المجموع	القسط 3	القسط 2	القسط 1		
100%	8	4	1	3	8	تطاوين
100%	9	6	0	3	9	مدنين
100%	11	8	0	3	11	قابس
100%	7	5	1	1	7	قبلي
100%	6	4	0	2	6	توزر
100%	13	3	6	4	13	قفصة
<b>100%</b>	<b>54</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>54</b>	<b>الجنوب</b>
70%	191	101	36	54	274	المستوى الوطني

# الوضع التنموي بإقليم الجنوب

## 6. متابعة تنفيذ برنامج مقاومة الإرهاب

شمل هذا البرنامج معتمديات أم العرائس، سيدي بوبكر والرديف من ولاية قفصة، حزوة وتمغزة من ولاية توزر، رجيم معتوق والفوار من ولاية قبلي، ذهيبة ورمادة من ولاية تطاوين وبنقردان من ولاية مدينين بكلفة قدرها 14 مليون دينار.

الولاية	المعتمدية الحدودية	الاعتمادات المفتوحة تعهدا (ألف دينار)	الكلفة النهائية المحيطة لمشاريع البرنامج (ألف دينار)	الاعتمادات المطلوبة للفتح دفعا حسب ملفات لجنة الصفقات (ألف دينار)	الاعتمادات المفتوحة دفعا (ألف دينار)	
قفصة	أم العرائس	3 000	2 828	2 828	2 828	
	الرديف					
	سيدي بوبكر					
توزر	حزوة	3 000	2 994	2 994	2 994	
	تمغزة					
قبلي	رجيم معتوق	3 330	933 1	933 1	3 154	
	الفوار					
تطاوين	الذهيبة	3 000	3 000	3 000	3 000	
	رمادة					
مدينين	بنقردان	1 500	1 447	1 447	1 447	
إقليم الجنوب					13 423	13 462
المستوى الوطني					34 597	34 636

# الوضع التنموي بإقليم الجنوب

## 7. متابعة الإستثمار الخاص

### ❖ القطاع الصناعي

تتوفر بالإقليم 14 منطقة صناعية تمتد على مساحة جمالية تقدر بـ 565 هك منها 521,5 هك مهياً، وتم خلال الفترة 2016-2019 :

✓ بناء فضائين صناعيين صناعيين بالعقيلة 2 من ولاية قفصة (1600م<sup>2</sup>)،

✓ بناء فضاء صناعي (1000م<sup>2</sup>) بالعقيلة 1 من ولاية قفصة (مشروع متواصل)،

✓ تهيئة القسط الثاني من المنطقة الصناعية تاجرة بولاية مدين (10 هك)،

✓ تهيئة المنطقة الصناعية بين قردان من ولاية مدين (15,5 هك)،

يضم الإقليم 369 مؤسسة صناعية مشغلة لـ 10 مواطن شغل أو أكثر منها 109 مؤسسة مصدرة كليا.

توفر هذه المؤسسات ما يقارب الـ 25 ألف مواطن شغل وتتركز خاصة في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة

44 %، قطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 19% وقطاع النسيج بنسبة 11%،



# الوضع التنموي بإقليم الجنوب

❖ تطور الاستثمارات في القطاع الصناعي

تشجيعات التنمية الجهوية

المنح المسندة

الإستثمارات  
المصادق عليها

المشاريع المصرح بها

13,6 م.د

58,8 م.د

422 مشروعا  
509 م.د

سنة 2016

8,6 م د

35,3 م.د

393 مشروعا  
456 م د

سنة 2017

10 م د

39,8 م.د

398 مشروعا  
424 م د

سنة 2018

28,4 م د

107,6 م.د

465 مشروعا  
416 م د

سنة 2019

# الوضع التنموي بإقليم الجنوب

## 7. متابعة الإستثمار الخاص ❖ تطور الاستثمارات في القطاع الفلاحي

المنح المسندة	المشاريع المصادق عليها صنفي أ وب	
19,2 م د	930 مشروعا 99 م.د 1117 موطن شغل	سنة 2016
33,7 م د	1129 مشروعا 153,9 م د 1416 موطن شغل	سنة 2017
47,3 م د	1452 مشروعا 148,7 م د 1934 موطن شغل	سنة 2018
38,8 م د	1122 مشروعا 115,6 م د 1234 موطن شغل	سنة 2019

# الوضع التنموي بإقليم الجنوب

## 7. متابعة الإستثمار الخاص

### القطاع الصناعي:

— إنجاز 55,2% من عدد المشاريع المصرح بها بين سنتي 2015-2018، 28,7% من حجم الإستثمارات و 14,8% من مواطن الشغل المرتقبة،


— تسجيل تطور حجم المنح المسندة في إطار منح التنمية الجهوية بـ 109% (28,4 م.د سنة 2019 مقابل 13,6 م.د سنة 2016) نظرا للتشجيعات التي أقرتها الدولة ضمن قانون الإستثمار الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2017 وهو ما أضفى ديناميكية على إحداث المؤسسات والتوجه نحو الإنتصاب للحساب الخاص،

### القطاع الفلاحي:

— تسجيل تطور في حجم الإستثمار المصادق عليه بـ 102% في الفترة الممتدة بين 2016 و 2019 وتطور في حجم المنح المسندة بـ 17%. كما عرفت العمليات الإستثمارية الصغرى نسقا تصاعديا نظرا للإمتيازات الممنوحة للعمليات الفردية كالمكننة والإقتصاد في مياه الري...

# الوضع التنموي بإقليم الجنوب

## 8. تأثيرات جائحة كورونا على الاستثمار العام

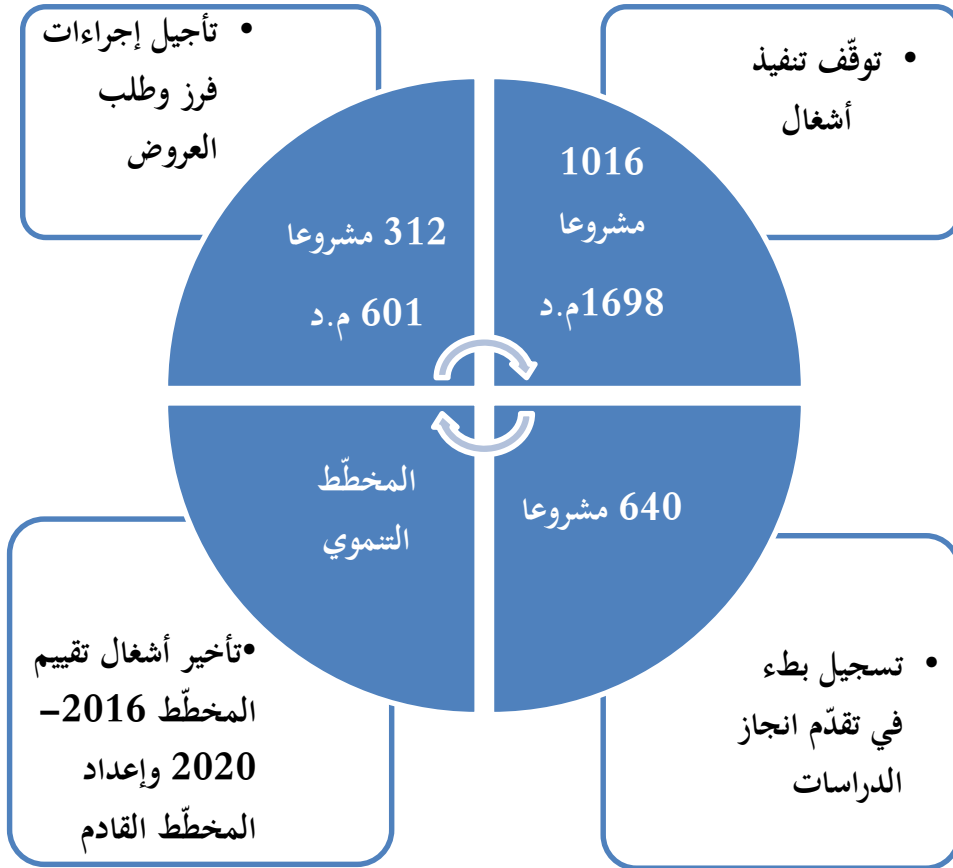

# الوضع التنموي بإقليم الجنوب

## 8. تأثيرات جائحة كورونا على الاستثمار الخاص



32%

نسبة التراجع في  
عدد المشاريع  
المصرّح بها في  
قطاع الصناعة  
خلال الأربعة  
أشهر الأولى  
لسنة 2020  
مقارنة بنفس  
الفترة من سنة  
2019

34%

نسبة تطور  
حجم الاستثمار  
المصرّح به  
في قطاع  
الصناعات  
المعملية خلال  
الأربعة أشهر  
الأولى لسنة  
2020 مقارنة  
بنفس الفترة  
من سنة  
2019

41,8.%

نسبة تراجع  
في حجم  
الاستثمار  
المصرّح به  
في القطاع  
الفلاحي خلال  
الأربعة أشهر  
الأولى لسنة  
2020 مقارنة  
بنفس الفترة من  
سنة 2019

# الوضع التنموي بإقليم الجنوب

## 8. تأثيرات جائحة كورونا على الاستثمار الخاص




توقف نشاط 85559 مؤسسة اقتصادية

واستثناء بعض المؤسسات على غرار وحدات الصناعات الكيماوية بقباس واستخراج الفسفاط بقفصة

تعليق نشاط جميع مراكب الصيد البحري نظرا لطبيعة العمل في فضاء ضيق ومغلق لا يمكن من تفادي العدوى والزام مراكب الصيد الساحلي على ألا تتجاوز رحلة الصيد اليوم الواحد من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

توقف نشاط 5542 مؤسسة في قطاع البناء والأشغال العمومية

توقفت نشاط 4633 وحدة سياحية (ايواء وتنشيط وخدمات) نتج عنه إحالة أكثر من 20700 ناشط مشتغل على البطالة الفنية، مما سيؤدي إلى تراجع كبير في المؤشرات السياحية وارتفاع مديونية القطاع،



# الوضع التنموي بإقليم الجنوب

## 8. تأثيرات جائحة كورونا على الاستثمار الخاص


تأثر القطاع التجاري بالجائحة باستثناء تجارة المواد الغذائية بالتفصيل والجملة والمغازات الكبرى وتجارة الخضر والغلّال والصيدليات وغيرها مما له علاقة بإعاشة المواطنين



توقف نشاط 12494 وحدة في قطاع خدمات النقل وخاصة النقل البحري بقابس وجرجيس والجوي بمطاري جربة جرجيس وتوزر،

تواصل نشاط القطاع الفلاحي بالمستغلات الفلاحية السقوية المنتجة للخضروات والغلّال والمستغلات المطرية إلا أن قطاع تربية الماشية شهد عدم تمكن المربين من ترويج رؤوس الماشية بحكم غلق أسواق الدواب والحد من التنقلات مما نتج عنه ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء

ارتفاع في أسعار أغلب المواد الاستهلاكية خاصة اللحوم البيضاء والخضر والغلّال والبيض في علاقة مع تزايد الطلب وارتباط الجهة بالتزويد من مناطق أخرى بالجمهورية التونسية



# الوضع التنموي بإقليم الجنوب

## 8. تأثيرات جائحة كورونا على الوضع الاجتماعي



عدد السكان المتأثرين بصفة كبرى من الجائحة بسبب تأثر أرباب العائلات الذي يشتغلون في القطاع الخاص الغير المنظم والقطاع الموازي والقطاعات التي توقفت كلياً عن النشاط كالسياحة وخدمات رياض الأطفال والمقاهي والبناء والأشغال العامة

460 ألف ساكن



قدّمتها اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي للحد من تداعيات الأزمة الصحية على العائلات المعوزة

30000 مساعدة عينية



50571 عائلة

معوزة



ومنفعة ببطاقة العلاج المجاني ولا يتوفر لديها دخل قار تمتعت بمساعدة نقدية استثنائية بقيمة 50 دينار كإجراء إضافي للمنحة القارة والمقدّرة بـ 180 دينار

83271 عائلة محدودة الدخل



ومنفعة ببطاقة علاج بالتعريف المنخفضة تمتعت بمنحة 200 دينار لكل عائلة. كما تم قبول حوالي 8000 شخص تقدم بمطلب للانتفاع بمنحة المساعدة الاجتماعية والمقدّرة بـ 200 دينار





ديوان تنمية الجنوب

الهاتف: (216) 75.640.363

الفاكس: (216) 75.641.747


E-mail: [odsud@mdci.gov.tn](mailto:odsud@mdci.gov.tn)

Site web: [www.ods.nat.tn](http://www.ods.nat.tn)



الجمهورية التونسية  
وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي  
ديوان تنمية الجنوب

# متابعة الوضع التنموي بولاية توزر

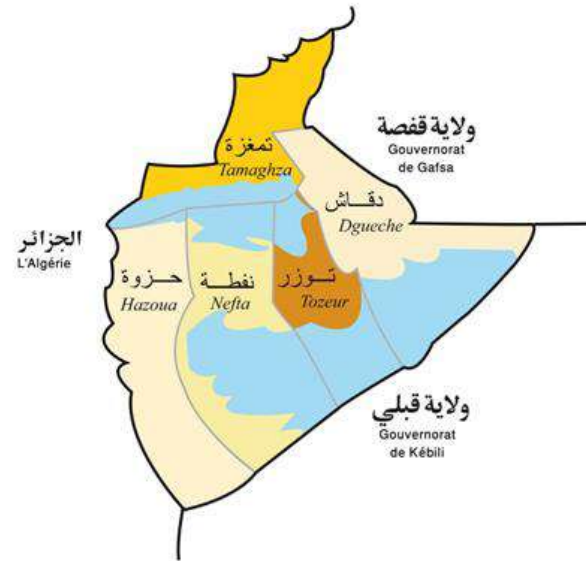

جوان 2020

# ولاية توزر في أرقام

المستوى الوطني	إقليم الجنوب	ولاية توزر	المؤشر
163 610	91 076	5 593	المساحة (كلم2)
11 732,9	1 708,6	115,2	عدد السكان (ألف ساكن)
274	54	6	المعتمديات
350	61	6	البلديات
2085	386	36	العمادات
3497,8	411,2	29,9	النشيطون المشتغلون (ألف مشتغل)
15,3	-	24,8	النسبة العامة للبطالة (2019)
0,486	-	0,483 (الرتبة 13)	مؤشر التنمية الجهوية

# خصوصيات وميزات ولاية توزر

## الموارد الطبيعية

تزر ولاية توزر بطاقات مائية جوفية هامة (222 مليون م<sup>3</sup> في السنة).

مراعي شاسعة (55% من المساحة الجمالية للولاية).

مواد إنشائية، معدنية ومنجمية قابلة للتصنيع (طين، رمال وأملاح،...).

طاقة شمسية (أكثر من 3200 ساعة شمس سنويا)

وخاصيات طبيعية على غرار الواحات الجبلية والشطوط.

## الخصائص الديمغرافية

- تضم ولاية توزر 0.98 % من مجموع سكان البلاد و 14,7 % من سكان إقليم الجنوب.
- تمركز 84 % من السكان ب 3 معتمديات.

تعتبر الجهة منفذا يربط باقي البلاد بالصحراء وبالقطر الجزائري على طول شريط حدودي 202 كلم (عبر معبرين اثنين).

## الميزات التفاضلية:

فلاحة واحية ذات ثلاث طوابق.

زراعات جيوحرارية.

صناعات غذائية مرتكزة على وحدات لتكليف التمور.

تربية الأبل.

قطب سياحي صحراوي.

## الخصائص الطبيعية

- شطوط شاسعة في وسط الولاية ومرتفعات بشمالها؛
- المناخ قارّي صحراوي وجاف؛
- الأمطار لا يتجاوز المعدل السنوي 100.4 مم؛
- تنتمي ولاية توزر إلى منطقة شبه صحراوية وتمثّل تلاقيا لمجالين الأطلسي في الشمال والصحراوي في الجنوب.

## الخصائص الحضارية

### تراث وموروث حضاري عريق:

- طابع معماري متميز؛
- موروث ثقافي متجذّر؛
- صناعات تقليدية عريقة؛
- تراث زاخر ومكتسبات طبيعية على غرار منطقتي الشبيكة وميداس بتمغزة.

## الخصائص العقارية

1 أراضي دولية: (97%) 315.335 هـك.

2 أراضي إشتراكية : (02%) 6.816 هـك.

3 أراضي خاصة : (01%) 3.910 هـك.

## الخصائص الاقتصادية

طاقات بشرية ذات فتوة عالية.	(58,8%) من عدد السكان ضمن الفئة العمرية 19-55 سنة.
إنتاج من التمور بمعدل 55الف طن سنويا.	إلى جانب الزراعات الجيوحرارية والزراعات البيئية والعلفية.
106مؤسسة صناعية بمختلف الأصناف في كل القطاعات.	منها 77 مؤسسة في قطاع الصناعات الغذائية و 09مؤسسات في قطاع النسيج.
قطب للسياحة الصحراوية.	نسيج خدماتي متواضع.

# إشكاليات التنمية بولاية توزر

أحادية الاقتصاد الجهوي باعتبار ارتكازه أساسا على إنتاج التمور (مصدر الأساسي للدخل لحوالي 80% من السكان).

هشاشة النسيج الاقتصادي

توفّر عديد الوسائط (برّي، حديدي وجوي) مع إشكاليات عديدة في الاستغلال

التّرابط مع المحيط

تمركز أغلب الأنشطة الاقتصادية بالجهة بمركز الولاية مدينة توزر ويرجع ذلك إلى حداثة بعض المعتمديات والبلديات (حزوة، تمغزة، حامة الجريد) نقص المناطق الصناعية المهمة التي تمكّن من استقطاب الاستثمارات

التمركز الجغرافي للأنشطة الاقتصادية

رغم أهميته لم يساعد القطاع الفلاحي على خلق وتطوير أنشطة صناعية وخدمية مرتبطة به علي غرار الصناعات التحويلية والخدمات الفلاحية. كما أن القطاع السياحي لم يرتقي من سياحة داخل الواحات الى السياحة الواحية.

ضعف الاندماج الاقتصادي

# الوضع التنموي بولاية توزر

## 1. الرؤية الإستراتيجية

- تتمحور الرؤية الإستراتيجية على الفلاحة الواحية والجوحرارية التي تعتمد الطاقة المتجددة وتستقطب المستثمرين في السياحة البديلة وتثبت الشباب في أرضه وفق مشروع ثقافي يحقق الانتماء للجهة ويستمد جذوره من المخزون التراثي والأدبي. توزر- الجريد الذي يحقق التميز والرفاه الاجتماعي للرجال والنساء بفضل الاستثمار الخاص في الاقتصاد الأخضر والتضامني والابتكار في مجالات مُجددة تُثمن الموارد الإنشائية والبشرية وتجعل من مدنها أقطاب جذب بفضل البنية الأساسية العصرية والشبكات التواصلية المتطورة والداعمة.



# الوضع التنموي بولاية توزر

## 2. متابعة تنفيذ المخطط الجهوي للتنمية 2016-2020

- بلغت الاستثمارات المدرجة بالمخطط التنموي الجهوي 2016-2020 حوالي **803,3** مليون دينار منها **512,3** مليون دينار بالقطاع العمومي (**63,77%**) و **291** مليون دينار بالقطاع الخاص (**36,23%**).
- قُدرت الاستثمارات الجمالية المنجزة خلال الفترة 2016-2020 بحوالي **710,845** مليون دينار وبذلك بلغت نسبة الإنجاز **87,78%** من جملة الاستثمارات المبرمجة بالمخطط (**72.598%** للقطاع العام و**114.858%** للقطاع الخاص).

نسبة الإنجاز %	الاستثمارات المنجزة		
	2016 - 2020 (م د)	تكلفة المخطط 2016-2020 (م د)	
72.598	376,608	512,3	القطاع العام
114.858	334,237	291	القطاع الخاص
87,78	710,845	803,3	المجموع

# الوضع التنموي بولاية توزر

## 3. متابعة تنفيذ المشاريع العمومية

(متابعة المشاريع المدرجة بالميزانيات منذ سنة 2011 والى غاية سنة 2019)

النسبة من الكلفة %	الكلفة (أ د)	النسبة من العدد %	عدد المشاريع	درجة النضج
65,5	821,1	83,1	1007	المشاريع المنجزة كلياً
16,6	208,6	9,3	113	مشاريع بصدد الانجاز
5,6	70,4	1,2	15	مشاريع في مرحلة إعداد طلبات العروض
12,3	154,1	6,3	76	مشاريع بصدد الدراسة
0,02	0,3	0,1	1	مشاريع لم تنطلق
<b>100</b>	<b>1254,9</b>	<b>100</b>	<b>1212</b>	<b>المجموع</b>
10,25	128,665	2,06	25	منها مشاريع معطلة

\*منها استثمارات عمومية منجزة مبرمجة بالمخطط (2020/2016) قدرت بـ **258,4 م.د** أي بنسبة **50,44 %**

# الوضع التنموي بولاية توزر

## أهم المشاريع بمختلف مراحل الإنجاز

### أهم المشاريع بصدد الانجاز

نسبة الإنجاز %	الكلفة (أ.د.)	مكان المشروع	المشروع	القطاع
40%	3999,900	نفطة	تهيئة منطقة سقوية واحية وأخرى جيوحرارية على بئر وادي الرتم القاري الوسيط قسط2	الفلاحة والموارد المائية
80%	2200,000	حزوة	احداث منطقة سقوية واحية بزهمول	
80%	7236,000	كامل الولاية	انجاز 12 ابار تعويضية	
45%	5995,000	نفطة	بناء مستشفى جهوي بنفطة قسط1	الصحة
45%	6218,919	توزر	بناء مسبح مغطى بتوزر	الشباب والرياضة
%90	2000,000	نفطة	بناء قاعة مغطاة بنفطة	
%10	800,000	نفطة	تعشيب المركب الرياضي بنفطة	

# الوضع التنموي بولاية توزر

نسبة الإنجاز %	الكلفة (أ.د.)	مكان المشروع	المشروع	القطاع
90%	3750,000	توزر	بناء معهد نموذجي بتوزر	التربية
99%	500,000	توزر	بناء مقر محكمة الناحية ق 2	العدل
50%	1500,000	تمغزة	إحداث محطة لمعالجة المياه المستعملة باستعمال تقنيات النباتات المائية بالشبيكة	البيئة
80%	525,125	توزر	اشغال تهيئة ملاعب رياضية بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر	التعليم العالي
75%	1500	حامة الجريد	تهيئة الرواق (محطة سياحية)	البرنامج الجهوي للتنمية
5%	21800.000	توزر	اشغال تهيئة مدرج مطار توزر نفطة الدولي	النقل الجوي
70%	1147.000	توزر	احداث محطة سياحية ورواق للصناعات التقليدية بحيرة شمسة	التنمية المندمجة
60.3%	34.000.000	توزر	المحطة الفتوفلطائية توزر 2	الطاقة والمناجم

# الوضع التنموي بولاية توزر

أهم المشاريع بصدد طلب العروض

مكان المشروع	الكلفة (أ.د.)	المشروع
توزر	800,000	تعتيب الملعب الفرعي بتوزر
توزر	4500,000	إحداث ملعب لألعاب القوى بتوزر
توزر	7000,000	إحداث مركز تربصات بتوزر
حزوة	700,000	إحداث قاعة للرياضات الفردية بحزوة
توزر	4500,000	بناء مركب ثقافي بتوزر
حزوة	600,000	إحداث مركب طفولة بحزوة
تمغزة	200,000	إعادة بناء مركز الصحة الأساسية بالرميثة تمغزة

# الوضع التنموي بولاية توزر

أهم المشاريع بصدد الدراسة

مكان المشروع	الكلفة (أ.د.)	المشروع
توزر	13450,000	إعادة هيكلة مركز التكوين المهني والعمل المستقل.
توزر	2000,000	مركز للفنون الركحية والدرامية.
دقاش	10000,000	تعزيز الموارد وتحسين نوعية مياه الشرب بمنطقة دقاش (المرحلة الثانية).
توزر	20000,000	إحداث طريق حزامية لمدينة توزر (طو رقم 03 من ن ك 426 إلى نك 436 بطول 15 كلم).
توزر-نفطة-دقاش	16415,000	تهيئة وتهذيب أحياء (حي الانطلاقة بتوزر-حي الواحة بدقاش-نفطة المدينة).
توزر	7000,000	إحداث مركز وطني للتربصات الرياضية بتوزر: مركز إقامة-مطبخ ومطعم-مشرب- 2 ملاعب.
نفطة-توزر	9000,000	تهيئة منطقة صناعية بكل من معتمدية توزر وبنفطة

# الوضع التنموي بولاية توزر

## متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى

- **طبيعة النشاط:** إقرار احداث مناطق سقوية في حدود 1000 هك والانطلاق في دراسات التنفيذ والشروع في الإنجاز سنة 2019.
- **المصدر:** قرار وزاري
- **الكلفة:** 60 م د
- **مكان الانتصاب:** كامل الولاية
- **الوضعية الحالية:** -الانطلاق في حفر الابار  
-إعطاء الاذن الإداري ببدء الدراسات  
-اعداد ملفات طلب العروض

# الوضع التنموي بولاية توزر

## متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى

- **طبيعة النشاط:** اشغال تهيئة مدرج مطار توزر نفطة الدولي.
- **المصدر:** مشروع متواصل ما قبل 2016
- **الكلفة:** 21,8 م د
- **مكان الانتصاب:** توزر
- **افاق المشروع:** تمكين المطار من استقبال جميع أصناف واحجام الطائرات.
- **الوضعية الحالية:**-تركيز الحاضرة.



# الوضع التنموي بولاية توزر

## متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى

- **طبيعة النشاط:** احداث منطقة لوجستية بتوزر.
- **المصدر:** مشروع متواصل ما قبل 2016
- **المساحة:** 100 هك
- **مكان الانتصاب:** توزر
- **افاق المشروع:** دعم التبادل التجاري مع المحيط الإقليمي والدولي.
- **الوضعية الحالية:** -تم تخصيص الأرض وفي انتظار ادراجها ضمن المخطط المديرى للمناطق اللوجستية.

# الوضع التنموي بولاية توزر

## متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى

- **طبيعة النشاط:** انطلاق إنتاج المحطة الفولطاضوية توزر 1 ، وإشارة انطلاق الأشغال للمحطة الفولطاضوية الجديدة توزر 2 بقدرة أحادية جمالية مركزة 20 ميغاوات وباستثمار يقدر بـ62 مليون دينار.
- **المصدر:** قرار وزاري
- **المساحة :** 40 هك
- **مكان الانتصاب:** توزر
- **افاق المشروع:** ستمكنان من انتاج 36 جيغاواط/سنة من الكهرباء وتغطية حاجيات 18 ألف حريف اي ما يعادل 1/3 حاجيات ولاية توزر من الكهرباء.
- كما ستمكن المحطتان من الاقتصاد في استهلاك 8000 طن مكافئ نפט من الغاز الطبيعي سنويا والحد من انبعاث 17 الف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
- **الوضعية الحالية:-**الانتهاء من المحطة الاولي وإنجاز نسبة 60,3 % بالنسبة للمحطة الثانية

# الوضع التنموي بولاية توزر

## أهم المشاريع التي تشكو صعوبات

الاشكالية	الكلفة (أ.د.)	سنة الادراج بالميزانية	المشروع	القطاع
المشاريع المتواصلة				
تمّ فضّ الإشكال بخصوص المجال الجوّي للمطار وفي انتظار استكمال الدراسات	2500,000	2016	بناء نواة المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات.	التعليم العالي
توقف المشروع في مستوى الدراسات منذ سنة 2011	5000,000	2011	إنجاز المنطقة السياحية الجديدة على مساحة 62 هك	السياحة
في مرحلة الدراسات الهندسية منذ سنة 2017	400,000	2016	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين المهني والعمل المستقل بتوزر	التشغيل

# الوضع التنموي بولاية توزر

## أهم المشاريع التي تشكو صعوبات

الاشكالية	الكلفة (أ.د.)	سنة الادراج بالميزانية	المشروع	القطاع
القرارات الوزارية				
-وجود صعوبات في اتخاذ القرار نظرا لعدم الاختصاص وما يتطلبه ذلك من اتفاق بين وزارتي الفلاحة والتعليم العالي بوضع البرامج ونوعية الشهادات المتحصل عليها. وتوصية بمراسلة وزارة التعليم العالي في الغرض	-	-	الإنتلاق في إحداث مسارات جديدة للفلاحة الواحية والجيوحرارية بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر خلال السنة الجامعية 2018/2019.	التعليم العالي

# الوضع التنموي بولاية توزر

أهم المشاريع المدرجة بالمخطط 2016-2020 والتي لم تنطلق بعد

(غير مرسمة بالميزانية)

القطاع	المشروع	الكلفة (أ.د.)
التجهيز	إحداث طريق حزامية لمدينة توزر (طو رقم 03 من ن,ك 426 إلى ن,ك 436 بطول 15 كلم).	20000,000
	احداث طريق موازية للطريق الوطنية 16 في مستوى جبل معذب	5000,000
	دراسات خاصة بربط مدينة توزر بالطريق السيارة	5625,000
	بناء جسر على وادي الرميثة (على مستوى ن,ك 76+000)	7000,000
	تهيئة المسلك الريفي (شمسة مراح الحوار بطول 02 كلم)	2500,000
	تهيئة المسلك الفلاحي (نفطة-رجيم معتوق) بطول 70 كلم	17000,000
	تهيئة مسالك فلاحية (حزوة- الفوار) بطول 80 كلم.	19000,000
	تهيئة المسلك الريفي (ميداس-فج بوزيان) بطول 6,5 كلم	3500,000

# الوضع التنموي بولاية توزر

القطاع	المشروع	الكلفة (أ.د.)
	تدعيم بالخرسانة الاسفلتية مسلك (ط,و رقم 16 - الظافرية- بنقشة) بطول 35 كلم	18000,000
	تهيئة المسلك الفلاحي (سندس-الحدود الجزائرية) بطول 1,2 كلم.	2500,000
	تدعيم المسلك الفلاحي (ط,و رقم 16 - سندس)	3000,000
التهديب والتجدد العمراني	حي الانطلاقة بتوزر	7475,000
	نفطة المدينة	5590,000
	حي الواحة بدقاش	3350,000

# الوضع التنموي بولاية توزر

القطاع	المشروع	الكلفة (أ.د.)
الفلاحة	حفر بئر واحداث منطقة سقوية(30 هك) بقم الخنقة	7000,000
	حفر بئر واحداث منطقة سقوية(20 هك) بالفريد	5000,000
التربية	بناء معهد ثانوي بتوزر المدينة	4000,000
	احداث مدرسة اعدادية بالشبيكة	2500,000
	احداث مدرسة ابتدائية بين فرج الله بنفطة	1500,000
	احداث مدرسة ابتدائية بالمحاسن محاذية للمشروع القطري للمساكن الاجتماعية	1600,000
	بناء مدرسة ابتدائية تتوسط المنطقة بالظافرية	1500,000
	اضافة مطعم مدرسي بالمدرسة الابتدائية بدغومس	150,000
	اقتناء اراضي	255,000

# الوضع التنموي بولاية توزر

القطاع	المشروع	الكلفة (أ.د.)
التطهير	تأهيل محطة التطهير بتوزر	3800,000
	مشروع تهذيب وتوسيع محطات التطهير ومحطات الضخ بالمخطط 2016-2020	400,000
الصحة	احداث اقسام جامعية بالمستشفى الجهوي بتوزر	4000,000
	تجهيز اقسام استشفائية جامعية بالمستشفى الجهوي بتوزر	2000,000
البريد	احداث مكتب بريد ومركز توزيع بالشرفة	1755,000
	احداث وكالة طرود بريدية	150,000
	احداث مركز توزيع بدقاش	150,000
	احداث مكتب بريد بعين الكرمة	200,000
	بناء مكتب بريد بمدخل مدينة نفطة	400,000



# الوضع التنموي بولاية توزر

القطاع	المشروع	الكلفة (أ.د.)
الصناعة	تهيئة المنطقة الصناعية حزوة	3000,000
	بناء محلات صناعية	15000,000
السياحة	تهيئة المنطقة السياحية الجديدة 62 هك بتوزر	5000,000
الشؤون الاجتماعية	توسعة الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتوزر	500,000
	النهوض الاجتماعي	300,000

# الوضع التنموي بولاية توزر

## 4. متابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية

تاريخ الجلسة	مشاريع أنجزت	مشاريع بصدد التنفيذ	مشاريع لم تنفذ
19 ماي 2015	03	0	10
25 ديسمبر 2015	13	11	23
16 و 17 فيفري 2018	09	12	01
المجموع	25	23	34
مجموع قرارات المجالس 3	120 قرار وباعتبار اعادة القرار في اكثر من مجلس يبقي 82 قرار		

# الوضع التنموي بولاية توزر

## 5. متابعة توصيات اللجنة البرلمانية خلال زيارتها لولاية توزر يوم 02 جوان 2018

الملاحظات	التوصيات
<b>مسائل تشريعية وترتيبية</b>	
تمّ تجسيم 25 قرار و 23 قرار بصدد الإنجاز و 34 قرار معطل.	-دعوة الحكومة إلى ضرورة تفعيل كل القرارات الوزارية السابقة التي تمّ اتخاذها في شأن الجهة (قرارات المجالس الوزارية المضيقه بتاريخ 25 ديسمبر 2015 و 16 فيفري 2018).
نسق بطيئ	-ضرورة تنفيذ بنود اتفاقية التوأمة الموقّعة بين الولايتين في مختلف المجالات والأنشطة الفلاحية والسياحية والعلمية والثقافية والبنية التحتية وغيرها.
في طور الانجاز	-ضرورة تفعيل النصوص التشريعية المعطلة وتطوير النصوص التشريعية المعطلة وإيجاد حلول للبيروقراطية بما يمكّن من اختصار اجال الردود ومنح التراخيص والتقليص من الوثائق الإدارية ومن طول مراحل إعداد الدراسات الفنية وتسريع الإجراءات خاصّة المتعلقة بتغيير صبغة الأراضي وتخصيص العقارات أو التفويت فيها والصّفقات العمومية والحدّ من المتدخلين.
ساري التفعيل	-ضرورة تصفية الأراضي الاشتراكية بالتسريع في إجراءات المصادقة على القانون الجديد المنقّح لقانون 1964 والمتعلّق بتصفية الأراضي الإشتراكية وبتفعيل القوانين ذات العلاقة لإدماج المساحات الشاسعة من الأراضي الفلاحية التي هي خارج الدورة الاقتصادية.

الملاحظات	التوصيات
ساري التفعيل	-على مصالح القانون التشريعي برئاسة الحكومة بالتسريع في المراجعة النهائية لأوامر تسوية الوضعية العقارية لـ 52 تجمّع سكني على مساحة 700 هك.
ساري التفعيل	-ضرورة توفير الموارد المادّية اللّازمة من نفقات الدولة للجهة مع الحرص على تطابق هذه الإعتمادات الذي تسبّب في تعطيل العديد من المشاريع العمومية التنموية في مختلف القطاعات.
<b>وزارة العدل</b>	
في انتظار التجسيم	-إحداث محكمة الاستئناف بتوزر
في انتظار التجسيم	-إحداث فرع للمحكمة العقارية بتوزر.
<b>وزارة النقل</b>	
تمّ عودة الخط	-فتح خط السكة الحديدية توزر – تونس وتأهيله وتجديد قاطراته لتيسير وتحسين ظروف ظروف وجودة خدمات النقل الحديدي بالجهة.
في انتظار التجسيم	-إحداث طريق سريعة.

الملاحظات	التوصيات
تمّ احداث عدد 2 خطوط طويلة وبناء محطة نقل بنفطة	-توفير خدمات النقل في وبين مختلف مناطق ومعتمديات الولاية وذلك بإنجاز محطات للنقل الريفي واللواج والتاكسي.
تمّ اقتناء 4 حافلات من مجموع 6	التسريع في اقتناء بقية الحافلات الجديدة (4) لاستكمال تدعيم أسطول النقل البري بالجهة.
لم يتم الانجاز	إحداث شركة جهوية للنقل بتوزر.
إرجاع خط توزر-باريس	فك العزلة عن الجهة من خلال تدعيم الربط عبر المطار.
بصد الانجاز	التسريع في انطلاق أشغال تهيئة مدرج مطار توزر - نفطة الدولي والطريق المؤدية الى مربط الطائرات.
إشكالية الانتظام	إعادة برمجة الخطوط الدولية المحذوفة بمطار توزر - نفطة الدولي توزر وإرجاع النسق المنتظم لرحلاته الداخلية للمساهمة في إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والثقافية بالجهة.
<b>وزارة المالية</b>	
في انتظار التجسيم	مراجعة القوانين المنظمة لهياكل التمويل والمساندة خاصة في علاقة بالبنك التونسي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدفع وتحفيز الانتصاب للحساب الخاص والاستثمار بالجهة.
تمّ الانجاز	توفير مصادر التمويل اللازمة بالجهة خاصة لدعم التمويل الذاتي بما يساهم في تشجيع الانتصاب لحساب الخاص.

الملاحظات	التوصيات
في انتظار التجسيم	إحداث صندوق جهوي للتنمية والاستثمار.
تمّ الانجاز	التسريع في إحالة اعتمادات الدفع الكافية للإيفاء بتعهدات الإدارة إزاء المقاولين ومسدي الخدمات.
<b>وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي</b>	
تمّ الانجاز	-التسريع في فتح كامل الاعتمادات المخصصة لبرنامج الجهوي للتنمية.
<b>وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</b>	
في انتظار التجسيم	- التسريع في تسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة على ارضي دولية.
في انتظار التجسيم	- التسريع في تفعيل الاتفاقية المبرمة من قبل الوزارة مع ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري لتصفية وضعية الأراضي الراجعة بالملكية للدولة وإدخالها في الدورة الاقتصادية من خلال تغيير الصبغة الفلاحية في إطار تنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالتصرف في العقارات الدولية الفلاحية.
في انتظار التجسيم	- تصفية الأراضي الاشتراكية في إطار أحكام القانون الجديد المنقح لقانون 1964 والمتعلق بتصفية الأراضي الاشتراكية.
في انتظار التجسيم	- فض الإشكاليات الخاصة بالأراضي المشمولة بالمعروض المؤرخ في 03 ديسمبر 1912 المعتبرة دولية خاصة بمقتضى الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 والتي تشكل أكثر من 75 % من المساحة الإدارية لولاية توزر.

الملاحظات	التوصيات
<b>وزارة الشؤون المحلية والبيئة</b>	
تمّ الانجاز	- التسريع في الإجراءات للانطلاق في أشغال تركيز محطة لمعالجة المياه المستعملة باعتماد تقنية النباتات المائية بالشبيكة.
تمّ الانجاز	- الحرص على احترام الأجل المقترح للانطلاق في أشغال تطهير حي البستان بدقاش وبن فرج الله ق ثان بنفطة (الانجاز الفعلي خلال شهر جويلية 2018).
تمّ الانجاز	- الحرص على احترام الأجل المقترح للانطلاق في أشغال تهذيب شبكات التطهير بمدينة نفطة وتوزر ودقاش (قبل موفى 2018).
<b>وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري</b>	
في انتظار التجسيم	- العمل على تطوير الفلاحة البيولوجية (إنتاج نباتي وحيواني) والزراعات الجيوحرارية.
في انتظار التجسيم	- دعم توظيف الطاقات البديلة في النهوض بالقطاع.
في انتظار التجسيم	- المطالبة بمراجعة الاتفاقيات التي أبرمتها تونس مع الجزائر في مجال استغلال المياه.
في انتظار التجسيم	- المطالبة بتفعيل القوانين ذات العلاقة لإدماج المساحات الشاسعة من الأراضي الفلاحية التي هي خارج الدورة الاقتصادية.

الملاحظات	التوصيات
تمّ الانجاز	- دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للتسريع في إعداد المنشور حول إجراءات كراء المقاسم الدولية الفلاحية وحسن توظيفها والمتعلق بالأراضي غير المهيكلة (على غرار المنشور عدد 40) للانطلاق في إحداث المناطق السقوية المقررة في حدد 1000 هك.
تمّ الانجاز	- التسريع في تحيين الدراسة المتعلقة بالموارد المائية التي تم إعداد طلب عروض في شأنها منذ مارس 2016.
في طور التجسيم	- الإسراع بتجسيم القرارات المتخذة والمتعلقة بالأحداثيات والتوسعات للمناطق السقوية.
تمّ الانجاز	- فضّ إشكالية إدراج الواحة القديمة كمنطقة تحجير.
في طور الانجاز	- انجاز القسط الثاني من المنطقة السقوية " بئر الرتم" بنفطة
في طور الانجاز	- التسريع في إجراءات الإعلان على طلب العروض لإحداث بئر للانطلاق في أشغال محطة تحلية المياه الجوفية بدقاش.
تمّ الانجاز	- دعوة الوزارة لإتمام تركيبة مجلس الإدارة للإسراع بتركيز المجمع المهني المشترك بتوزر.



الملاحظات	التوصيات
بصدد الانجاز	- التسريع في إجراءات طلب وتقييم العروض وإعداد كراس الشروط للانطلاق في إحداث 20 بئر بالولاية (17 بئرا تعويضيا و03 أبار استغلال).
<b>وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة</b>	
في طور الانجاز	- استكمال تهيئة المناطق الصناعية المبرمجة أو المنجزة وتوفير المرافق الضرورية بها للتشجيع على الاستثمار بالجهة.
تمّ الانجاز	- التسريع في رفع التحفظات لإتمام إجراءات المصادقة على تقسيم المنطقة " كستيليا".
<b>وزارة التجارة</b>	
في انتظار التجسيم	-إحداث المنطقة اللوجستية بتوزر
في انتظار التجسيم	-إحداث سوق الإنتاج بتوزر
في انتظار التجسيم	-إحداث منطقة التبادل الحر بحزوة
<b>وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية</b>	
في انتظار التجسيم	- انجاز طريق سريعة لفك العزلة عن الجهة وتحسين ربطها ببقية الولايات المجاورة.
في انتظار التجسيم	- الإسراع باستكمال تهيئة الطريق الرابطة بين نفطة وحزوة (طريق الموت)

الملاحظات	التوصيات
في طور التجسيم	-على الوكالة العقارية للسكني بالتسريع في تغيير الصبغة وإصدار الأوامر الحكومية لإحداث دوائر.
في انتظار التجسيم	-التدخل العقاري لإنجاز 9000مقسم بين فردي وجماعي بكل من توزر ونفطة ودقاش.
في انتظار التجسيم	- إحداث فرع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بتوزر
<b>وزارة السياحة والصناعات التقليدية</b>	
في انتظار التجسيم	-نثمين واستغلال المياه الجوفية الحارة بدقاش في القطاع السياحة الاستشفائية وسياسة الاسترخاء.
<b>وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة</b>	
في انتظار التجسيم	-المطالبة بربط ولاية توزر بالغاز الطبيعي.
تمّ إسناد 12 رخصة	-التسريع في إسناد رخص منجميه لاستغلال 20 المخصصة من المساحة الجمالية لشط الجريد بما أنه تم الانتهاء من انجاز الدراسة المتعلقة بنثمين الأملاح به.
تم الانجاز	-المطالبة بالتسريع في إسناد الـ 5 رخص استثمار الملح المعطلة والتي تقدم بها أبناء الجهة.

الملاحظات	التوصيات
<b>وزارة المرأة الأسرة والطفولة</b>	
في انتظار التجسيم	-المطالبة بأحداث رياض أطفال منطقة "دغومس "
<b>وزارة الشباب والرياضة</b>	
تمّ الانجاز	-المطالبة بالتسريع في رصد الاعتمادات اللازمة لا استكمال تعشيب الملاعب بمختلف معتمديات الجهة.
بصد الانجاز	التسريع في إجراءات طلب العروض لاستكمال إنجاز المضمار الاصطناعي بتوزر.
بصد الانجاز	-الإسراع برصد الاعتمادات للانطلاق في الدراسات المتعلقة بإنجاز مشروع بناء مركز التربصات الرياضية بتوزر.
<b>وزارة الشؤون الثقافية</b>	
تمّ فتح المركز في مقر على وجه الكراء.	إحداث مركز الفنون الركحية والدرامية بتوزر.
بصد الانجاز	-التسريع في إجراءات المصادقة على نظام المناظرة المعمارية للشروع في الدراسات المتعلقة بإحداث المركب الثقافي أبو القاسم الشابي بتوزر.

الملاحظات	التوصيات
<b>وزارة الصحة</b>	
بصدد الانجاز	-استكمال بناء المستشفى الجهوي بنفطة.
في طور التنفيذ	-توفير وتدعيم المستشفيات الجهوية والمحلية بالإمكانات البشرية والتجهيزات والمعدات الطبية والازمة ووسائل النقل وسيارات الإسعاف للارتقاء بجودة الخدمات الصحية بمختلف المؤسسات العمومية للصحة بالجهة.
في انتظار التجسيم	-الترفيغ في عدد المستشفيات بالجهة وعدد الأطباء وخاصة أطباء الاختصاص.
<b>وزارة التعليم العالي والبحث العلمي</b>	
تمّ الانجاز	- إحدات شعبة لتكوين المعلمين بالمعهد العالي للإنسانيات بتوزر.
في انتظار التجسيم	-تطبيق القرار الوزاري المتعلق بإحدات شعب جديدة في مجال العلوم الفلاحة الواحية والزراعية الجيوحرارية بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية.
في انتظار التجسيم	-تطور المركز الجهوي للبحوث في الواحة بدقاش إلى معهد بحوث.

الملاحظات	التوصيات
	وزارة التكوين المهني والتشغيل
في انتظار التجسيم	إعادة هيكلة مركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بتورز.
في انتظار التجسيم	-الإسراع بإيجاد حل للإشكال العقارية للانطلاق في بناء مكتب التشغيل بنفطة.

عدد التوصيات 68

تمّ التفعيل 30

بصدد التفعيل 20

لم يفعل 18

# الوضع التنموي بولاية توزر

## 6. إنجازات القطاع الخاص لولاية توزر سنة 2019

الفلاحة والصيد البحري	
1670 مشروعا مصرحا به في قطاع الفلاحة والصيد البحري بحجم استثمار يقدر بـ 21,7 م.د.	
انجاز 59 مشروعا فلاحيا بكلفة استثمار تقدر بـ 7 م.د	وبطاقة تشغيل تبلغ 81 موطن شغل ومجموع منح استثمار تقدر بـ 2.382 م.د.
انجاز 1611 عملية استثمارية فلاحية بكلفة استثمار قدرت بـ 14,6 م.د.	
سجل الاستثمار الخاص في المشاريع الفلاحية صنفى "أ" و"ب" بالولاية تطورا بـ 65% من حيث عدد نوايا الإستثمار المصرح به (1670 عملية تصريح سنة 2019 مقابل 1015 سنة 2018) و بـ 45% من حيث حجم الإستثمار (21,6 أ.د سنة 2019 مقابل حوالي 15 أ.د بسنة 2018).	

## 6. إنجازات القطاع الخاص لولاية توزر سنة 2019

الصناعات المعملية والخدمات المرتبطة بالصناعة	
26 مشروعا مصرحا به في قطاع الصناعات المعملية بحجم استثمار يقدر بـ 21,6 م د و طاقة تشغيلية تقدر بـ 543 موطن شغل.	83 مشروعا مصرحا به في قطاع الخدمات الصناعية بحجم استثمار يقدر بـ 22,1 م د و 466 موطن شغل.
المصادقة على ارتفاع 53 مشروعا بحجم استثمار 36,6 م.د بمنح بـ 10,9 م.د ستوفر 1047 موطن شغل سنة 2019 مقابل 20 مشروعا بحجم استثمار بـ 7,7 م.د بمنح -1,2 م.د ستوفر 517 موطن شغل سنة 2018.	
تراجع الاستثمار الخاص المصرح به في القطاع الصناعي خلال سنة 2019 بـ 23,5% من حيث عدد نوايا الاستثمار المصرح بها وبـ 40,4% من حيث حجم الاستثمار المصرح به (21,6 م.د سنة 2019 مقابل 36,2 م.د سنة 2018).	

# الوضع التنموي بولاية توزر

## 6. إنجازات القطاع الخاص لولاية توزر سنة 2019

السياحة	
271 ألف وافد في القطاع السياحي	389 ألف ليلة مقضاة
24% نسبة الإيواء السياحي سنة 2019 مقابل 20,5% سنة 2018	
بلغ حجم الإستثمارات المصرّح بها 22م.د	
التمويل البنكي وآليات المساهمة في التمويل الذاتي	
بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة	البنك التونسي للتضامن
تمويل 1 مشروع بحجم استثمار 237 م.د وبطاقة تشغيلية تبلغ 5 مواطن شغل من طرف بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة	تمويل 517 مشروعا في قطاع المهن الصغرى والصناعات التقليدية بكلفة استثمار تقدر بـ 5,1 م.د وبطاقة تشغيل تبلغ 575 مواطن شغل
إنتفع 1 باعث بمساهمة آلية إعتماذ الإنطلاق 2 في التمويل الذاتي بإعتماذ يقدر بـ 50 أ.د سيتمكن من خلق 5 مواطن شغل.	إنتفع 68 باعثا بتدخل آلية إعتماذ الإنطلاق 1 في توفير التمويل الذاتي بإعتماذات جمالية تفوق 444 أ.د سيتمكن من خلق 135 مواطن شغل.



# الوضع التنموي بولاية توزر

## 6. إنجازات القطاع الخاص لولاية توزر سنة 2019

أهم المشاريع الفلاحية المنجزة والتي دخلت طور الانتاج خلال سنة 2019

المشروع	المعتمدية	كلفة المشروع المصرح بها (أ د)	مواطن الشغل المصرح بها
فلاحي	دقاش	347,2	4
فلاحي	نفطة	581,8	25
فلاحي	توزر	830,8	12
فلاحي	تمغزة	793,4	2
الخدمات	دقاش	205,4	2
الخدمات	نفطة	357,4	3
التحويل الأولي	دقاش	220	1

# الوضع التنموي بولاية توزر

## 6. إنجازات القطاع الخاص لولاية توزر سنة 2019

### أهم المشاريع الصناعية المنجزة والتي دخلت طور الإنتاج خلال سنة 2019

المشروع	المعتمدة	تكلفة المشروع المصرح بها (أ د)	مواطن الشغل المصرح بها
شركة أولاد احمد للتمور	دقاش	500	17
شركة وفاء تاكس	توزر	350	32
شركة رميس للتمور	دقاش	250	5
شركة بن يونس لتخزين والتبريد	دقاش	950	25
شركة خليفة للتمور	دقاش	1250	80

# الوضع التنموي بولاية توزر

## 6. إنجازات القطاع الخاص لولاية توزر سنة 2019

### أهم المشاريع السياحية المنجزة سنة 2019

الملاحظات	مواطن الشغل المصرح بها	كلفة المشروع المصرح بها (د.ا)	المعتمدية	المشروع
منجز	4	824	حزوة	إقامة عائلية
منجز	4	580	توزر	إقامة عائلية
منجز	42	6.205	توزر	نزل باديس الواحة
منجز	150	146.282	توزر	الديار القطرية*
منجز	4	323	توزر	إقامة عائلية
منجز	3	200	توزر	استضافة عائلية
منجز	3	150	توزر	استضافة عائلية
منجز	5	200	توزر	استضافة عائلية
منجز	3	800	توزر	استضافة عائلية
منجز	3	400	توزر	استضافة عائلية

# المشاغل التنموية بولاية توزر

## القطاع الفلاحي

## القطاع السياحي

## القطاع الصناعي والخدماتي

## المجال العقاري

## التنمية البشرية

➤ ضعف الترابط بين التكوين والخصوصيات الجهوية:

➤ اختصاصات جامعية: زراعة النخيل – الطاقة الشمسية والبديلة -سياحة إستشفائية و إيكولوجية.

➤ تكوين مهني: سياحة صحراوية - مشتقات التمور- الاجر المحلي- نجارة خشب النخيل.

➤ معضلة الانقطاع المبكر عن الدراسة: 2860 منقطع سنويا (وطنيا ما يقارب 100 ألف منقطعا سنويا).

➤ تراجع نسب النجاح في المناظرات الوطنية.



ديوان تنمية الجنوب

الهاتف: (216) 75.640.363

الفاكس: (216) 75.641.747

E-mail: [odsud@mdci.gov.tn](mailto:odsud@mdci.gov.tn)

Site web: [www.ods.nat.tn](http://www.ods.nat.tn)

الجمهورية التونسية  
وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي  
ديوان تنمية الجنوب  
الإدارة الجهوية للتنمية بتوزر



# المشاريع التي تشكو صعوبات بولاية توزر

جوان 2020

# 1. المشاريع العمومية المتواصلة المعطلة

القطاع	بيان المشروع	الكلفة (أ د)	الصعوبات المعترضة	الحلول المقترحة
التعليم العالي	بناء نواة المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بتوزر	2500	- الارض متوفرة على ملك وزارة التعليم العالي كما ان الاعتماد مبرمج - تم فض الاشكال مع وزارة النقل بخصوص المجال الجوي في مارس 2020	توفير الإعتمادات والإنتلاق في الدراسات
السياحة	إنجاز المنطقة السياحية الجديدة على مساحة 62 هك بتوزر (الوكالة العقارية السياحية)	5000	توقف المشروع في مستوى الدراسات منذ 2011 لعدم توفر الاعتمادات	الحرص على رصد اعتمادات لاستئناف الدراسات وإنجاز المشروع لما له من دور في تجاوز اشكالية سياحة العبور
البيئة	انجاز عدد 3 مراكز تحويل بدقاش تمغزة ونفطة (الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات)	1200	مشروع متوقف على تخصيص الأرض لمراكز التحويل وتوفير التمويلات	استحثاث تخصيص الأراضي للمراكز الثلاث لانطلاق الإنجاز
	تهيئة منتزه عين الشوع بحامة الجريد (6 هك)	1500	إشكالية تخصيص الأرض من وزارة املاك الدولة الى وزارة الداخلية	الحرص على إتمام عملية التخصيص للانطلاق في المشروع وتوفير الإعتمادات
التشغيل	إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين المهني والعمل المستقل بتوزر	13450	مشروع من انظار الوكالة وهو في مرحلة الدراسات الهندسية منذ سنة 2017	استحثاث مصالح وكالة التشغيل على الانطلاق في انجاز المشروع
	بناء مكتب التشغيل بنفطة	400	عدم توفر الارض	-

## 2. أهم المشاريع الهيكلية المدرجة في المخطط 2016-2020 والتي لم تنطلق في الإنجاز

الملاحظات	الكلفة (أد)	مكان المشروع	المشروع	القطاع
لم تتم برمجته خلال سنوات المخطط	20000	توزر	احداث طريق حزامية لمدينة توزر (ط و رقم 3 من ن ك 426 الى ن ك 436 بطول 15 كلم	التجهيز والإسكان
لم تتم برمجته خلال سنوات المخطط	24500	تمغزة	تدعيم الطريق الوطنية رقم 16 بين ط و 3 مفترق عين الكرمة (من ن ك 201,7 الى ن ك 263)	
	5000	تمغزة	احداث طريق موازية للطريق الوطنية 16 في مستوى جبل معذب	
لم تتم برمجته خلال سنوات المخطط	5625	توزر	دراسات خاصة بربط مدينة توزر بالطريق السيارة	
	7000	تمغزة	بناء جسر على وادي الرميثة (على مستوى ن ك 76+000)	
	2500	توزر	تهيئة المسلك الريفي (شمسة مراح الحوار بطول 02 كلم)	
	17000	نفطة	تهيئة المسلك الفلاحي (نفطة-رجيم معتوق) بطول 70 كلم	
	19000	حزوة	تهيئة مسالك فلاحية (حزوة- الفوار) بطول 80 كلم.	
	3500	تمغزة	تهيئة المسلك الريفي (ميداس-فج بوزيان) بطول 6,5 كلم	
	18000	تمغزة	تدعيم بالخرسانة الاسفلتية مسلك (طو رقم 16 - الظافرية- بنقشة) بطول 35 كلم	
	2500	تمغزة	تهيئة المسلك الفلاحي (سندس-الحدود الجزائرية) بطول 1,2 كلم.	
	3000	تمغزة	تدعيم المسلك الفلاحي (طو رقم 16 - سندس)	
	7000	تمغزة	حفر بئر واحداث منطقة سقوية (30 هك) بقم الخنقة	الفلاحة



الملاحظات	الكلفة (أد)	مكان المشروع	المشروع	القطاع
	5000	تمغزة	حفر بئر واحداث منطقة سقوية (20 هك) بالفريد	
لم تتم برمجته خلال سنوات المخطط	2000	دقاش	اعادة بناء دار الثقافة بالمحاسن	الثقافة
	2000	حزوة	بناء دار الثقافة حزوة	
	3000	كامل الولاية	صيانة وترميم المعالم التاريخية	
	2000	توزر	مركز للفنون الركحية والدرامية	
	2100	توزر	احداث مركب ثقافي أبوالقاسم الشابي	
تم فتح اعتماد تعهد بـ 400 اد للدراسات	7000	توزر	احداث مركز وطني للتريصات الرياضية بتوزر: مركز اقامة- مطبخ ومطعم-مشرب- 2 ملاعب معشبة ملاعب اختصاص، حجرات ملابس	الشباب والرياضة
لم ينطلق	900	توزر	احداث مركب الطفولة بعمادة الحضر بتوزر	المرأة والطفولة
لم ينطلق	500	توزر	توسعة الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتوزر	الشؤون الاجتماعية
	300	توزر	النهوض الاجتماعي	
لم ينطلق	400	نفطة	بناء مكتب بريد بمدخل مدينة نفطة	البريد
	1755	نفطة	احداث مكتب بريد ومركز توزيع بالشرفة	
	150	توزر	احداث وكالة طرود بريدية	
	150	دقاش	احداث مركز توزيع بدقاش	
	200	تمغزة	احداث مكتب بريد بعين الكرمة	
	4000	توزر	بناء معهد ثانوي بتوزر المدينة	التربية
	2500	تمغزة	احداث مدرسة اعدادية بالشبيكة	
	1500	نفطة	احداث مدرسة ابتدائية بين فرج الله بنفطة	
	1600	دقاش	احداث مدرسة ابتدائية بالمحاسن محاذية للمشروع القطري للمساكن الاجتماعية	
	1500	تمغزة	بناء مدرسة ابتدائية تتوسط المنطقة بالطافية	
	150	دقاش	اضافة مطعم مدرسي بالمدرسة الابتدائية بدغومس	
	3000	دقاش	تهيئة المنطقة الصناعية حزوة	الصناعة
	15000	كامل الولاية	بناء محلات صناعية	

الملاحظات	الكلفة (أد)	مكان المشروع	المشروع	القطاع
	5000	توزر	تهيئة المنطقة السياحية الجديدة 62 هك بتوزر	السياحة
لم ينطلق	8000	توزر	تطهير مدينة حامة الجريد: تدعيم الشبكة وربطها بمحطة تطهير توزر	التطهير
لم ينطلق	3800	توزر	تأهيل محطة التطهير بتوزر	
لم تتم برمجته خلال سنوات المخطط	4000	توزر	احداث أقسام جامعية بالمستشفى الجهوي بتوزر	الصحة
لم تتم برمجته خلال سنوات المخطط	2000	توزر	تجهيز أقسام استشفائية جامعية بالمستشفى الجهوي بتوزر	
لم ينطلق	7475	توزر	حي الانطلاق توزر	وكالة التجديد والتهديب العمراني
لم ينطلق	5590	نفطة	نفطة المدينة	
لم ينطلق	3350	دقاش	حي الواحة دقاش	

### 3. قرارات المجالس الوزارية المعطلة

الحلول المقترحة	المتابعة	حالة التنفيذ	المعني بالتنفيذ	نص القرار
العمل على ابرام اتفاق بين وزارتي الفلاحة والتعليم العالي بوضع البرامج ونوعية الشهادات المتحصل عليها وتوصية بمراسلة وزارة التعليم العالي في الغرض.	وجود صعوبات في اتخاذ القرار نظرا لعدم الاختصاص وما يتطلبه ذلك من اتفاق بين وزارتي الفلاحة والتعليم العالي بوضع البرامج ونوعية الشهادات المتحصل عليها. وتوصية بمراسلة وزارة التعليم العالي في الغرض	مرحلة الدراسة	وزارة التعليم العالي	الإنتلاق في إحداث مسارات جديدة للفلاحة الواحية والجيوجرافية بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر خلال السنة الجامعية 2018/2019

حوصلة تقدم انجاز القرارات التي أعلن عنها السيد رئيس الحكومة لفائدة ولاية توزر

خلال زيارته إلى الجهة بتاريخ 16 و 17 فيفري 2018

تحيين بتاريخ 10 جوان 2020

22	العدد الإجمالي للقرارات
09	المنجز
12	في طور الانجاز
01	يشكو صعوبات

جدول متابعة القرارات التي أعلن عنها السيد رئيس الحكومة لفائدة ولاية توزر

خلال زيارته الى الجهة بتاريخ 16 و 17 فيفري 2018

تحيين بتاريخ 10 جوان 2020

المجال	القرار	الهيكل المعني بالتنفيذ	المتابعة	ملاحظات
المجال الفلاحي	1-إقرار إحداث مناطق سقوية في حدود 1000 هكتار والانطلاق الفوري في دراساتها التنفيذية والشروع في الإنجاز سنة 2019.	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	بصدد التنفيذ	مشروع تنمية مندمجة جيل3. تم تعيين المقاولات لحفر بئرين بكلفة 3.345 م د. تمّ الاعطاء الاذن الإداري ببدء الدراسات لإحداث المنطقة بكلفة 4 م د
	2-حزوة 50هك(بئر سعيد)		بصدد التنفيذ	مشروع تنمية مندمجة جيل3. تم تعيين المقاولات لحفر البئر تمّ الاعطاء الاذن الإداري ببدء الدراسات لإحداث المنطقة بكلفة 2.5 م د

ملاحظات	المتابعة	الهيكل المعني بالتنفيذ	القرار	المجال
	بصدد التنفيذ		3-إبن الشباط 150 هك	
			4-الصحن الطويل نفطة 40هك (1.5 م د)	
			5-الغواطين بنفطة 70هك (2.5 م د)	
			6-حامة جيوجراري الجريد 30 هك (1.5م د)	
			7-بوهلال دغومس 40 هك (1.5م د)	
			8-النفلايات معتمدية توزر 40 هك (1.5 م)	
تمت مناقشة الدراسة التنفيذية وفي تم اعداد ملف الانجاز وملف طلب العروض من طرف مكتب دراسات. كما تم فتح اعتماد بقيمة 4 م د لحفر 4 ابار وهو بصدد تقييم العروض. تقدر كلفة المنطقة السقوية ب 6 م د.	بصدد التنفيذ			
تمت مناقشة النسخة الأولى من دراسة الجدوي الاقتصادية بالنسبة بئر الطويل ووالغواطين كما تتم المراجعة بالنسبة للحامة ووبوهلال والنفلايات وتتم إعداد الدراسة بالنسبة	بصدد التنفيذ			

المجال	القرار	الهيكل المعني بالتنفيذ	المتابعة	ملاحظات
	9- جهيم 2 معتمدية توزر 70 هك (2.5 م د)			
	10- حزوة جيوجراري 40 هك (1.5 م د)			
	11- المزارة معتمدية حزوة 20 هك (1.5 م د)			
2	الانطلاق في إحداث 22 بئر بولاية توزر بكلفة 18,3 م د بداية من سنة 2018: 19- بئر عميقة تعويضية بكلفة 15,6 م د.		بصدد التنفيذ	- تم إنجاز عدد 04 آبار - عدد 03 آبار في طور الانجاز - عدد 12 بئر في انتظار توفير حفارة. تم التأكيد علي اعداد تصور لتجاوز اشكالية توفر الحفارات
	03- ابار عميقة للاستغلال بالجهة بكلفة 2.7 م د			- عدد 01 بئر منجز - عدد 01 بئر في انتظار حفارة. - عدد 1 بئر في طور اعداد كراس

المجال	القرار	الهيكل المعني بالتنفيذ	المتابعة	ملاحظات
				الشروط تم التأكيد على إعداد تصور لتجاوز إشكالية توفر الحفارات
	3		بصدد التنفيذ	في انتظار التنفيذ
	4		بصدد التنفيذ	- تم تركيز الإدارة العامة بالمجمع المهني للغلال بتونس. وفي انتظار تركيز الإدارة العامة بتوزر
مجال التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	5	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	بصدد التنفيذ	1-100 هك بتوزر: تم التحويل الوقتي وطلب عروض لإنجاز مثال التهيئة التفصيلي وقسط عملي للتقسيم وبصدد فرز العروض لأشغال الرفع التوبوغرافي. 2-بصدد القيام بإجراءات استصدار أوامر حكومية لإحداث مناطق تدخّل عقاري كل من:

المجال	القرار	الهيكل المعني بالتنفيذ	المتابعة	ملاحظات
				-توزر 70 هك (اشكال مع بلدية توزر) -نفطة 50 هك -دقاش 10 هك على أن يتم تغيير الصبغة بعد أن صادقت المجالس البلدية المعنية على المقترح.
6	-إدراج حي "بني علي" من معتمدية نفطة ضمن تدخلات وكالة التهذيب والتجديد العمراني عل ان تتولى مصالح وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون المحلية والبيئة كل في مجال تدخله انجاز عملية تخفيض المائدة المائية، وذلك بصفة مسبقة قبل الشروع في انجاز أشغال مشروع التهذيب من قبل الوكالة.	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وزارة الشؤون المحلية والبيئة	بصدد التنفيذ	-تم الانطلاق في الدراسة
مجال أماكن	-تسوية الوضعية العقارية العقارية لـ 52 تجمع سكني على مساحة 700 هكتار.	وزارة أملاك الدولة والشؤون	بصدد التنفيذ	-تم ابرام اتفاقية مع ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بكلفة 122



المجال	القرار	الهيكل المعني بالتنفيذ	المتابعة	ملاحظات
الدولة والشؤون العقارية	7	العقارية		مليار للإسراع في تسوية هذه الوضعيات العقارية.
المجال الصناعي	8	وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	بصدد التنفيذ	-تم الانجاز
مجال النقل	9	وزارة النقل	بصدد التنفيذ	تم الانجاز
	10		بصدد التنفيذ	-تم اقتناء 3 حافلات سنة 2017 و4 حافلات سنة 2018 وفي انتظار عدد 2 حافلات مبرمجة لسنة 2019.
مجال الشؤون المحلية	11	وزارة الشؤون المحلية والبيئة	تم الانجاز	-انطلقت الأشغال خلال شهر افريل من سنة 2019. (25 ديسمبر 2018/5 أوت 2019)

المجال	القرار	الهيكل المعني بالتنفيذ	المتابعة	ملاحظات
والبيئة	12		بصدد التنفيذ	-انطلقت الأشغال خلال شهر أفريل 2019 ومن المؤمل ان تنتهي الأشغال قبل أحر سنة 2019.نسبة الانجاز 60%
	13		بصدد التنفيذ	-في انتظار الإعلان على طلب العروض من طرف المصالح المركزية.
مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة	14	وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة	بصدد التنفيذ	-انطلقت في الاستغلال يوم 7 أوت تحت إشراف السيد رئيس الحكومة
المجال الاجتماعي	15	وزارة الشؤون الاجتماعية	-	-تم الإنجاز.
مجال الشباب	16	وزارة الشباب والرياضة	بصدد التنفيذ	-تم استكمال مكونات المشروع ليصبح ملعب العاب قوي وتمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة وتم

المجال	القرار	الهيكل المعني بالتنفيذ	المتابعة	ملاحظات
والرياضة				برمجت 7 م د بميزانية 2020 منها 400 ا د كاعتمادات تعهد للدراسات.
	17		بصدد التنفيذ	-تمت دعوة المترشحين لتقديم ملاحظاتهم بخصوص الدراسات وحدد اخر اجل يوم 4 سبتمبر 2019 لأدرجه ضمن ميزانية سنة 2020.
مجال التعليم العالي والبحث العلمي	18	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	معطل	-وجود صعوبات في اتخاذ القرار نظرا لعدم الاختصاص وما يتطلبه ذلك من اتفاق بين وزارتي الفلاحة والتعليم العالي بوضع البرامج ونوعية الشهادات المتحصل عليها. وتوصية بمراسلة وزارة التعليم العالي في الغرض
مجال التكوين المهني والتشغيل	19	وزارة التكوين المهني والتشغيل	بصدد التنفيذ	في مرحلة الدراسات التمهيدية المفصلة APD
	20		بصدد التنفيذ	-تمّ الإنجاز وفي انتظار الربط بمختلف الشبكات

ملاحظات	المتابعة	الهيكل المعني بالتنفيذ	القرار	المجال
			سنة 2018.	
--انطلقت الدراسات وحدد آخر اجل لاستكمالها موفي سنة 2019	بصدد التنفيذ	وزارة الشؤون الثقافية	--الشروع في الدراسات لإحداث المركب الثقافي أبو القاسم الشابي بكلفة 4000 أ د خلال سنة 2018.	21 المجال الثقافي
--يسير بنسق عادي.	تم الانجاز	البنك التونسي للتضامن	--تمويل المشاريع عن طريق البنك التونسي للتضامن: *برمجة توفير 700 قرض صغير عن طريق البنك التونسي للتضامن بقيمة 6 مليون دينار لفائدة الجهة.	22 مجال المشاريع عن طريق البنك

## متابعة تقدّم تجسيم التوصيات المنبثقة عن زيارة لجنة التنمية الجهوية بمجلس النواب لولاية توزر جوان 2018

الملاحظات	التوصيات
	<b>مسائل تشريعية وترتيبية</b>
	-دعوة الحكومة إلى ضرورة تفعيل كل القرارات الوزارية السابقة التي تمّ اتخاذها في شأن الجهة (قرارات المجالس الوزارية المضيق بتاريخ 25 ديسمبر 2015 و 16 فيفري 2018).
نسق بطيئ	-ضرورة تنفيذ بنود اتفاقية التوأمة الموقعة بين الولايتين في مختلف المجالات والأنشطة الفلاحية والسياحية والعلمية والثقافية والبنية التحتية وغيرها.
	-ضرورة تفعيل النصوص التشريعية المعطلة وتطوير النصوص التشريعية المعطلة وإيجاد حلول للبيروقراطية بما يمكن من اختصار اجال الردود ومنح التراخيص والتقليص من الوثائق الإدارية ومن طول مراحل إعداد الدراسات الفنية وتسريع الإجراءات خاصة المتعلقة بتغيير صبغة الأراضي وتخصيص العقارات أو التقويت فيها والصفقات العمومية والحدّ من المتدخلين.
ساري التفعيل	-ضرورة تصفية الأراضي الاشتراكية بالتسريع في إجراءات المصادقة على القانون الجديد المنقّح لقانون 1964 والمتعلّق بتصفية الأراضي الإشتراكية وبتفعيل القوانين ذات العلاقة لإدماج المساحات الشاسعة من الأراضي الفلاحية التي هي خارج الدورة الاقتصادية.
في انتظار التفعيل	-على مصالح القانون التشريعي برئاسة الحكومة بالتسريع في المراجعة النهائية لأوامر تسوية الوضعية العقارية لـ 52 تجمّع سكني على مساحة 700 هك.
تمّ الانجاز	-ضرورة توفير الموارد المادية اللازمة من نفقات الدولة للجهة مع الحرص على تطابق هذه الإعتمادات الذي تسبّب في تعطيل العديد من المشاريع العمومية التنموية في مختلف القطاعات.
	<b>وزارة العدل</b>
في انتظار التجسيم	-إحداث محكمة الاستئناف بتوزر
في انتظار التجسيم	-إحداث فرع للمحكمة العقارية بتوزر.

الملاحظات	التوصيات
<b>وزارة النقل</b>	
تمّ عودة الخط	-فتح خط السكة الحديدية توزر - تونس وتأهيله وتجديد قاطراته لتيسير وتحسين ظروف ظروف وجودة خدمات النقل الحديدي بالجهة.
في انتظار التجسيم	-إحداث طريق سريعة.
تمّ احداث عدد 2 خطوط طويلة وبناء محطة نقل بنفطة	-توفير خدمات النقل في وبين مختلف مناطق ومعتمديات الولاية وذلك بإنجاز محطّات للنقل الريفي واللواج والتاكسي.
تمّ اقتناء 4 حافلات من مجموع 6	التسريع في اقتناء بقية الحافلات الجديدة (4) لاستكمال تدعيم أسطول النقل البري بالجهة.
لم يتمّ الانجاز	إحداث شركة جهوية للنقل بتوزر.
إرجاع خط توزر-باريس	فك العزلة عن الجهة من خلال تدعيم الربط عبر المطار.
في انتظار الانجاز	التسريع في انطلاق أشغال تهيئة مدرج مطار توزر . نفطة الدولي والطريق المؤدية الى مريبط الطائرات.
إشكالية الانتظام	إعادة برمجة الخطوط الدولية المحذوفة بمطار توزر . نفطة الدولي توزر وإرجاع النسق المنتظم لرحلاته الداخلية للمساهمة في إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والثقافية بالجهة.
<b>وزارة المالية</b>	
في انتظار التجسيم	مراجعة القوانين المنظمة لهياكل التمويل والمساندة خاصة في علاقة بالبنك التونسي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدفع وتحفيز الانتصاب للحساب الخاص والاستثمار بالجهة.
تمّ الانجاز	توفير مصادر التمويل اللازمة بالجهة خاصة لدعم التمويل الذاتي بما يساهم في تشجيع الانتصاب لحساب الخاص.
في انتظار التجسيم	إحداث صندوق جهوي للتنمية والاستثمار .
تمّ الانجاز	التسريع في إحالة اعتمادات الدفع الكافية للإيفاء بتعهدات الإدارة إزاء المقاولين ومسدي الخدمات.
<b>وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي</b>	
تمّ الانجاز	-التسريع في فتح كامل الاعتمادات المخصصة لبرنامج الجهوي للتنمية.
<b>وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</b>	

الملاحظات	التوصيات
في انتظار التجسيم	- التسريع في تسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة على ارضي دولية.
في انتظار التجسيم	- التسريع في تفعيل الاتفاقية المبرمة من قبل الوزارة مع ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري لتصفية وضعية الأراضي الراجعة بالملكية للدولة وإدخالها في الدورة الاقتصادية من خلال تغيير الصبغة الفلاحية في إطار تنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالتصرف في العقارات الدولية الفلاحية.
في انتظار التجسيم	- تصفية الأراضي الاشتراكية في إطار أحكام القانون الجديد المنقح لقانون 1964 والمتعلق بتصفية الأراضي الاشتراكية.
في انتظار التجسيم	- فض الإشكاليات الخاصة بالأراضي المشمولة بالمعروض المؤرخ في 03 ديسمبر 1912 المعتبرة دولية خاصة بمقتضى الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 والتي تشكل أكثر من 75 % من المساحة الإدارية لولاية توزر.
وزارة الشؤون المحلية والبيئة	
تمّ الانجاز	- التسريع في الإجراءات للانطلاق في أشغال تركيز محطة لمعالجة المياه المستعملة باعتماد تقنية النباتات المائية بالشبيكة.
تمّ الانجاز	- الحرص على احترام الأجل المقترح للانطلاق في أشغال تطهير حي البستان بدقاش وبن فرج الله ق ثان بنفطة (الانجاز الفعلي خلال شهر جويلية 2018).
تمّ الانجاز	- الحرص على احترام الأجل المقترح للانطلاق في أشغال تهذيب شبكات التطهير بمدينة نفطة وتوزر ودقاش (قبل موفى 2018).
<b>وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري</b>	
في انتظار التجسيم	- العمل على تطوير الفلاحة البيولوجية (إنتاج نباتي وحيواني) والزراعات الجيوحرارية.
في انتظار التجسيم	- دعم توظيف الطاقات البديلة في النهوض بالقطاع.
في انتظار التجسيم	- المطالبة بمراجعة الاتفاقيات التي أبرمتها تونس مع الجزائر في مجال استغلال المياه.
في انتظار التجسيم	- المطالبة بتفعيل القوانين ذات العلاقة لإدماج المساحات الشاسعة من الأراضي الفلاحية التي هي خارج الدورة الاقتصادية.
تمّ الانجاز	- دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للتسريع في إعداد المنشور حول إجراءات كراء المقاسم الدولية الفلاحية وحسن توظيفها والمتعلق بالأراضي غير المهيكلة (على غرار المنشور عدد 40) للانطلاق في إحداث المناطق السقوية المقررة في حدود 1000 هك.

الملاحظات	التوصيات
تمّ الانجاز	- التسريع في تحيين الدراسة المتعلقة بالموارد المائية التي تم إعداد طلب عروض في شأنها منذ مارس 2016.
في طور التجسيم	- الإسراع بتجسيم القرارات المتخذة والمتعلقة بالاحداثيات والتوسعات للمناطق السقوية.
تمّ الانجاز	- فضّ إشكالية إدراج الواحة القديمة كمنطقة تحجير.
في طور الانجاز	- انجاز القسط الثاني من المنطقة السقوية " بئر الرتم" بنقطة
في طور الانجاز	- التسريع في إجراءات الإعلان على طلب العروض لإحداث بئر للانطلاق في أشغال محطة تحلية المياه الجوفية بدقاش.
تمّ الانجاز	- دعوة الوزارة لإتمام تركيبة مجلس الإدارة للإسراع بتركيز المجمع المهني المشترك بتوزر.
بصدد الانجاز	- التسريع في إجراءات طلب وتقييم العروض وإعداد كراس الشروط للانطلاق في إحداث 20 بئر بالولاية (17 بئرا تعويضيا و03 أبار استغلال).
<b>وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة</b>	
في طور الانجاز	- استكمال تهيئة المناطق الصناعية المبرمجة أو المنجزة وتوفير المرافق الضرورية بها للتشجيع على الاستثمار بالجهة.
تمّ الانجاز	- التسريع في رفع التحفظات لإتمام إجراءات المصادقة على تقسيم المنطقة " كستيليا".
<b>وزارة التجارة</b>	
في انتظار التجسيم	- إحداث المنطقة اللوجستية بتوزر
في انتظار التجسيم	- إحداث سوق الإنتاج بتوزر
في انتظار التجسيم	- إحداث منطقة التبادل الحر بحزوة
<b>وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية</b>	
	- انجاز طريق سريعة لفك العزلة عن الجهة وتحسين ربطها ببقية الولايات المجاورة.
في انتظار التجسيم	- الإسراع باستكمال تهيئة الطريق الرابطة بين نقطة وحزوة (طريق الموت)
في طور التجسيم	- على الوكالة العقارية للسكني بالتسريع في تغيير الصيغة وإصدار الأوامر الحكومية لإحداث دوائر.
في انتظار التجسيم	- التدخل العقاري لإنجاز 9000مقسم بين فردي وجماعي بكل من توزر ونقطة ودقاش.
في انتظار التجسيم	- إحداث فرع لديوان قيس الأرضي والمسح العقاري بتوزر



الملاحظات	التوصيات
<b>وزارة السياحة والصناعات التقليدية</b>	
في انتظار التجسيم	-تثمين واستغلال المياه الجوفية الحارة بدقاش في القطاع السياحة الاستشفائية وسياحة الاسترخاء.
<b>وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة</b>	
في انتظار التجسيم	-المطالبة بربط ولاية توزر بالغاز الطبيعي.
تمّ إسناد 12 رخصة	-التسريع في إسناد رخص منجميه لاستغلال 20 المخصصة من المساحة الجمالية لشط البريد بما أنه تم الانتهاء من انجاز الدراسة المتعلقة بتثمين الأملاح به.
	-المطالبة بالتسريع في إسناد الـ 5 رخص استثمار الملح المعطلة والتي تقدم بها أبناء الجهة.
<b>وزارة المرأة الأسرة والطفولة</b>	
في انتظار التجسيم	-المطالبة بأحداث رياض أطفال منطقة "دغومس "
<b>وزارة الشباب والرياضة</b>	
تمّ الانجاز	-المطالبة بالتسريع في رصد الاعتمادات اللازمة لاستكمال تعشيب الملاعب بمختلف معتمديات الجهة.
بصدد الانجاز	التسريع في إجراءات طلب العروض لاستكمال إنجاز المضمار الاصطناعي بتوزر
في طور الدراسة	-الإسراع برصد الاعتمادات للانطلاق في الدراسات المتعلقة بإنجاز مشروع بناء مركز التريصات الرياضية بتوزر.
<b>وزارة الشؤون الثقافية</b>	
تمّ فتح المركز في مقر على وجه الكراء.	إحداث مركز الفنون الركحية والدرامية بتوزر
بصدد الانجاز	-التسريع في إجراءات المصادقة على نظام المناظرة المعمارية للشروع في الدراسات المتعلقة بإحداث المركب الثقافي أبو القاسم الشابي بتوزر .
<b>وزارة الصحة</b>	
بصدد الانجاز	-استكمال بناء المستشفى الجهوي بنفطة.
في طور التنفيذ	-توفير وتدعيم المستشفيات الجهوية والمحلية بالإمكانات البشرية والتجهيزات والمعدات الطبية والازمة ووسائل النقل وسيارات الإسعاف للارتقاء بجودة الخدمات الصحية بمختلف المؤسسات العمومية للصحة بالجهة.

الملاحظات	التوصيات
في انتظار التجسيم	-الترفيح في عدد المستشفيات بالجهة وعدد الأطباء وخاصة أخصائى الاختصاص.
<b>وزارة التعليم العالى والبحث العلمى</b>	
تمّ الانجاز	- إحداه شعبة لتكوين المعلمين بالمعهد العالى للإنسانيات بتورز.
في انتظار التجسيم	- تطبيق القرار الوزارى المتعلق بإحداه شعب جديدة فى مجال العلوم الفلاحة الواحية والزراعية الجيوحرارية بالمعهد العالى للدراسات التكنولوجية.
في انتظار التجسيم	- تطور المركز الجهوى للبحوث فى الواحة بدقاش إلى معهد بحوث.
<b>وزارة التكوين المهنى والتشغيل</b>	
في انتظار التجسيم	إعادة هيكلة مركز التكوين المهنى والنهوض بالعمل المستقل بتورز.
في انتظار التجسيم	-الإسراع بإيجاد حل للإشكال العقارية للانطلاق فى بناء مكتب التشغيل بنفطة.




الجمهورية التونسية  
وزارة الداخلية  
ولاية قبلي



# جلسة لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب الوضع التتموي بولاية قبلي

مجلس نواب الشعب 19 جوان 2020



# المحتوى

ولاية قبلي... الخصوصيات والميزات

ثروات الولاية ... التنوع

الوضع التتموي الراهن

آفاق التتمية





# ولاية قبلي : الخصوصيات والميزات

---



# التقسيم الإداري



# أهم الخصوصيات والميزات

- 698 كلم من الطرقات المرقمة وأكثر من 1007 كلم من المسالك الريفية (منها 39 % معبدة)
- 02 منطقة صناعية (43 هك : المساحة المهيأة 49 %)، مع وجود منطقة صناعية تمسح 100 هك بصدد تهيئة قسط أول منها
- 11 مركزا للتكوين المهني متعددة الاختصاصات منها 2 عمومية ومركز تكوين فلاحي
- مراكز فنية :المركز الفني للتمور بقبلي
- مركز العمل عن بعد





# أهم الخصوصيات والميزات

## 3 قرية حرفية

حدائق وطنية: الجبيل بدوز (150 ألف هكتار)

قطب الفلاحة الجيوجرافية

قطب سياحية الصحراوية

شركة استثمار ذات رأس مال مخاطر: SIDEK


هياكل مساندة للاستثمار





ثروات قبلي ... التنوع

---



■ موارد مائية جوفية وموارد حارة صالحة للفلاحة الجيوتحرارية وللاستشفاء

■ 50 ألف هك من الأراضي الصالحة للفلاحة

■ 38 ألف هك من المساحات السقوية (70% من الإنتاج الوطني للتمور)

■ 567 ألف هك من المراعي (25% من مساحة الولاية)



Fig.3: forage géothermique dans le sud tunisien




## تربية الماشية:

- ✓ أبقار 431 رأس،
- ✓ أغنام 150 ألف رأس،
- ✓ ماعز 100 ألف رأس،
- ✓ إبل 13 ألف رأس ...

## إنتاج فلاحي متنوع : تمور، خضروات وباكورات، لحوم، جلود،

### صوف...






- مخزون هام من المواد الإنشائية : خامات أولية عديدة كالبتروك والغاز الطبيعي ومواد إنشائية وفيرة وذات جودة عالية كالطين والجبس والرمل السليسي والأملاح والحجارة ، ...
- طاقة شمسية (300 يوم مشمس) وطاقة رياح،
- مناظر طبيعية خلابة ومتنوعة وثراء تاريخي وثقافي متجذر: جبال، صحاري، واحات، محمية طبيعية، آثار ، منتوجات تقليدية من مرقوم، نسيج بدوي ومنسوجات حائطية...





# الوضع التّتموي الراهن


---



# استثمارات المخطط التنموي 2016-2020


## توزيع الاستثمارات الجمالية حسب المتدخل

الاستثمارات المنجزة 2019-2016 وتقديرات 2020 (م د)	نسبة الإنجاز %	الاستثمارات المنجزة 2019-2016 (م د)	التكلفة المبرمجة بالمخطط 2020-2016 (م د)	المتدخل
65 358	49	273	548	القطاع العام
111 299	51	136	268	القطاع الخاص
80 657	50	410	817	المجموع




## تقدم الانجاز المالي 2016-2019

الحجم الجملي للاستثمار العمومي 273 مليون دينار  
المعدل السنوي للاستثمار العمومي : 68 م د

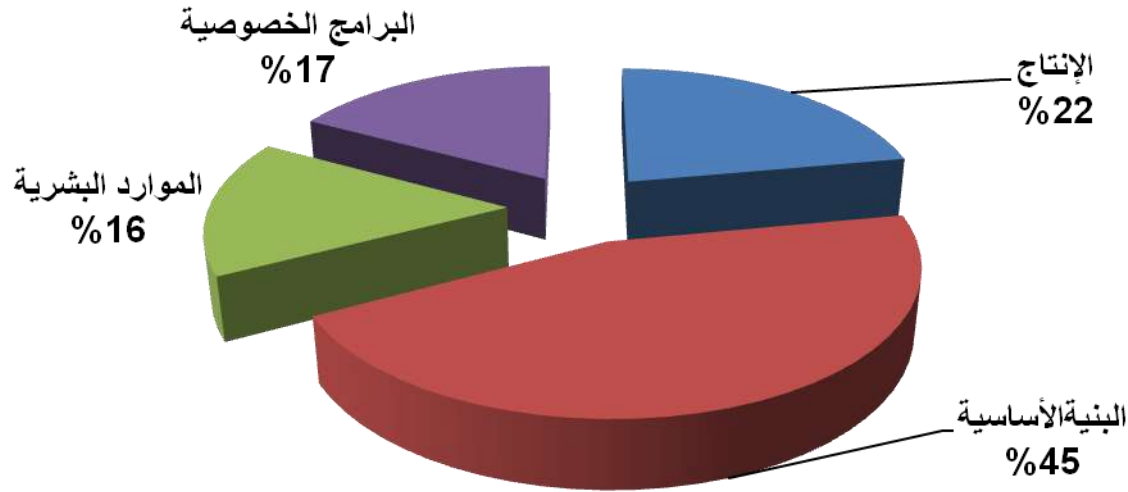







## تقدم الانجاز المالي 2016-2019

الحجم الجملي للاستثمار الخاص 136 مليون دينار  
المعدل السنوي للاستثمار الخاص : 34 م د





## تقدم الانجاز المادي 2011-2019

النسبة من الكلفة %	الكلفة (م د)	عدد المشاريع	مراحل الإنجاز
45%	342.189	774	مشاريع أنجزت
15.2%	114.574	115	مشاريع بصدد الانجاز
6.6%	50.098	53	مشاريع بصدد طلب العروض
20.7%	156.426	147	مشاريع بصدد الدراسة
12.5%	94.813	5	مشاريع معطلة
100%	759101	1094	المجموع

# أهم المشاريع المنجزة

المشروع	مكان المشروع	الكلفة (أ د)
تحسين نوعية المياه بقبلي :	قبلي	7600
تحسين نوعية المياه بدوز :	دوز	4713
تحسين نوعية المياه بسوق الأحد	سوق الأحد	3917
تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 من ن ك 167 إلى ن ك 198 على طول 31 كلم (دوز - الفوار)	الفوار	16582
تهذيب حي العوينة	دوز شمالية	3062
تهذيب الحي الشمالي بسوق الاحد	سوق الاحد	2565
تهذيب حي طريق قابس بقبلي	قبلي شمالية	3900
تهذيب حي العوينة	دوز شمالية	3062
المنطقة الصناعية بالقلعة: قسط أول 15هك	دوز الشمالية	3049

## أهم المشاريع بصدد الانجاز

نسبة الإنجاز %	الكلفة (أ د)	مكان المشروع	المشروع
30%	9600	قبلي الشمالية	هيكلة مركز التكوين المهني بقبلي : تجهيز قاعات للتكوين في الطاقات المتجددة في اطار التعاون التونسي الألماني
60%	3750	قبلي الشمالية	بناء معهد نموذجي
55%	18040		تهيئة و تعبيد الطريق الوطنية 20 بين ن ك 101 و 156.4
90%	500	دوز ش	بناء عيادات خارجية بالمستشفى المحلي بدوز
45%	3000	قبلي الشمالية	إحداث قسم لجراحة العظام وأمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بقبلي
75%	2500	دوز الشمالية	احداث قسم للجراحة العامة و قاعات عمليات: .بالمستشفى الجهوي صنف "ب": بدوز
45%	3000	قبلي ش	إحداث قسم لجراحة العظام وأمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بقبلي

# أهم المشاريع التي تشهد صعوبات في الإنجاز



ع.ار	بيان المشروع	الكلفة (أ د)	الميزانية	الصعوبات
1	تطهير مدينة سوق الأحد، وذلك بمد حوالي 35 كلم من القنوات وربط 3000 مسكن بشبكة التطهير إنجاز محطة تطهير بسوق الأحد	23000	2016	مشروع معطل: عدم مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثرات بسبب رفض الإدارة العامة للغابات تصريف مياه المعالجة في شط الجريد -تم تحيين الدراسة بإضافة المعالجة الثلاثية(23 م.د) ومراسلة وزارة الفلاحة والموارد المائية في الغرض ولا يزال المشروع معطلا.
2	احداث 3 مراكز تحويل للتصرف في النفايات بكل من قبلي +دوز +سوق الأحد	1400	2012	مشروع متأخر: -عدم التنسيق المسبق من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات مع مصالح الولاية إلا في سنة 2019 وحاليا بصدد تجاوز الاشكاليات العقارية. -عدم وجود ادارة جهوية للوكالة بقبلي
3	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بدوز (بناء وتجهيز)	11300	2012	مشروع متأخر: مشروع ممول من طرف البنك الإسلامي للتنمية تتم متابعته من طرف الوكالة التونسية للتكوين المهني، بصدد إعداد ملف طلب العروض الخاص بالبناءات (مارس 2020 الإعلان عن الصفقة)
4	المنطقة الصناعية باستطيمي	19113	2015	مشروع متأخر: -تم التفويت في العقار للوكالة سنة 2015، - قامت الوكالة بإعداد مثال تهيئة تفصيلي وتمت المصادقة عليه من طرف لجنة التوافقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية خلال شهر نوفمبر 2017. - تم إنجاز الشبكة الخارجية لتزويد المنطقة بالتيار الكهربائي بمبلغ قدره 0,74 م د - تم إبرام الصفقة مع الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه لإنجاز الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب بمبلغ قدره 13 م د. - بصدد اعداد الدراسات الفنية التفصيلية وملف التقسيم (انطلاق اشغال القسط الأول موفى 2020)



# أهم المشاريع غير مرسمة في الميزانيات : قطاع الصحة

التنفيذ	المشاريع المبرمجة بالمخطط	المشاريع الجديدة
	عدم التنفيذ نقص في الاعتمادات: 4 م.د	1 800
غير مدرج في ميزانيات 2020-2016	4000	بناء قسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجهوي بقبلي
		بناء قسم الأنف والحنجرة والأذنين بالمستشفى الجهوي بقبلي
	500	بناء قسم مخبر وبنك دم بالمستشفى المحلي بدوز

# البرنامج الجهوي للتنمية



الإعتمادات المستهلكة (م.د)				الإعتمادات المفتوحة (م.د)		البرنامج
النسبة مقارنة بالإعتمادات المفتوحة	الدفع	النسبة	التعهد	دفع	تعهد	
87%	57.505	91%	64.975	65.938	71.556	2019-2011
30% للقطاع الصحي					8.4	2020

المنجز	الوحدة	العنصر
170	كلم	الطرق والمسالك
3120	عائلة	الماء الصالح للشرب
287	عائلة	التنوير الريفي
2689	منتفع	تحسين المسكن
4566	منتفع	موارد الرزق
3	وحدة	الفضاءات الصناعية
582	منتفع	التكوين المهني
11	نادي	بناء وتوسيع نوادي الشباب
12	ملعب	ملاعب رياضية
9	شبكة	شبكات صرف المياه
1	حي	تهذيب أحياء
18	جرار	معدات نظافة
762	وحدة	الإنارة عمومية بالطاقة الشمسية

# برنامج التنمية المندمجة



المؤشرات	التعهد (م.د)	الدفع (م.د)
برنامج التنمية المندمجة القسط الأول والثاني : قبلي الشمالية والفوار	15.5	9.5
برنامج التنمية المندمجة القسط الثالث : قبلي الجنوبية، سوق الأحد، رجم معتوق، دوز الشمالية والجنوبية		
		50

## مشاريع تم إنجازها

- القرية السياحية بتلمين : 1000 أ.د
- القرية الحرفية باستفطيمي: 623 أ.د
- المركز الثقافي بالجديدة والمنصورة: 567 أ.د
- مركز أعمال المرأة الريفية بالجديدة والمنصورة: 270 أ.د
- تهيئة ملعب حي باستفطيمي وتلمين: 177 أ.د
- تهيئة وتجميل قرية تلمين : 363 أ.د
- تهيئة طرقات داخل قرية الصابرية 2,1 كلم : 280 أ.د
- تنوير عمومي بمنطقة الصابرية: 100 أ.د
- تهيئة منطقة صناعية بالصابرية الشرقية: 1400 أ.د






## برنامج مقاومة الإرهاب

الإعتمادات المحالة		البرنامج
نسبة الدفع	نسبة التعهد	
83%	96%	معمديتي الفوار ورجيم معتوق

## مشروع تنمية رجم معتوق


عدد المنتفعين	الكلفة (م.د.)	المساحة (هك)	المساحة
1568	107	2460	معمدية رجم معتوق

□ مشروع المحدث 1500 هك



# متابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية

---



## جلسات العمل الوزارية

### رئاسة الحكومة

- المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 23 أبريل 2015
- المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 18 جوان 2015

### ولاية قبلي

- المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 26 ديسمبر 2015
- الاتفاق المبرم بين الطرف الحكومي وممثلي الجهة بتاريخ 26 أوت 2017



## 1- العدد الجملي للقرارات

تاريخ الجلسة				المجالس الوزارية
26 أوت 2017	26 ديسمبر 2015	18 جوان 2015	23 افريل 2015	
109	10	73	05	القرارات
	197			المجموع

## 2- متابعة تنفيذ القرارات

حالة التنفيذ			تاريخ الجلسة
لم تنفذ	بصدد التنفيذ	أنجزت	
-	-	5	2015-04-23
3	25	45	2015-06-18
4	3	3	2015-12-26
10	53	46	2017-08-26
17	81	99	المجموع

# أهم القرارات التي لم تنجز

- المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 18 جوان 2015

نص القرار	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة
قرار عدد 47 : الانطلاق في إعداد دراسة طريق سريعة قابس - قبلي ويرمجة أشغالها انطلاقا من المخطط 13.	وزارة التجهيز والإسكان والتهئية الترابية	عدم التنفيذ	غير مدرج بالمخطط.
قرار عدد 62 : إدراج مشروع تزويد المناطق السكنية والصناعية بمدينة قبلي بالغاز الطبيعي ضمن المخطط المديرى للغاز 2016-2020 بكلفة 40 مليون دينار وتقدر مدة الانجاز بـ3 سنوات.	وزارة الصناعة والطاقة والمناجم	عدم التنفيذ	ربط الجهة بالغاز الطبيعي بكلفة 31 م.د حيث ستنتهي الدراسات في 2018 مع امكانية تقديم آجال الانجاز. - من المتوقع انطلاق الاشغال أوت 2020
قرار عدد 64 : تدعيم شبكة التطهير وانجاز منظومة تحويل المياه بمدينة سوق الأحد وذلك بمد حوالي 35 كلم من القنوات وربط 3000 مسكن بشبكة التطهير وانجاز محطة تطهير بسوق الأحد بكلفة تبلغ 17.2 مليون دينار. وسيتم الانتهاء من الدراسات في موفى جويلية 2015.	وزارة الشؤون المحلية والبيئة	عدم التنفيذ	عدم مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثرات بسبب رفض الادارة العامة للغابات تصريف مياه المعالجة في شط الجريد -تم تحيين الدراسة بإضافة المعالجة الثلاثية(23 م.د) ومراسلة وزارة الفلاحة والموارد المائية في الغرض
قرار عدد 65 :انجاز دراسة لإحداث منظومة جديدة متكاملة تتضمن وحدة لمعالجة النفايات وتثمينها مراكز التحويل. وستنطلق الدراسة خلال سنة 2016 بتمويل من البنك الألماني	وزارة الشؤون المحلية والبيئة	عدم التنفيذ	إحداث منظومة لكل من توزر وقبلي لمعالجة النفايات وتثمينها وإحداث عدد من مراكز التحويل لفائدة البلديات بكلفة جمالية تقدر ب 33 م.د. وسيتم انطلاق الدراسات قبل موفى سنة 2017 وانطلاق الأشغال خلال شهر جويلية 2019 ( مدة الأشغال 21 شهرا).

# أهم القرارات التي لم تنجز

- المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 26 ديسمبر 2015

نص القرار	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة
قرار عدد 11: دراسة إمكانية إحداث معبر حدودي بمنطقة المطروحة لتعزيز التبادل التجاري مع الجزائر. دراسة إمكانية إحداث معبر حدودي بمنطقة المطروحة لتعزيز التبادل التجاري مع الجزائر.	الديوان الوطني للمعابر الحدودية	عدم التنفيذ	تبعاً لجلسة الوفد الحكومي بتاريخ 04 أوت 2017 بمناسبة زيارته للجهة وجلسة العمل بإشراف السيد رئيس الحكومة مع ممثلي مجلس نواب الشعب بتاريخ 16 جانفي 2018 تم التأكيد على أهمية عرض مشروع البوابة الحدودية على اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية

# أهم القرارات التي لم تنجز

- جلسة العمل بتاريخ 26 أوت 2017

نص القرار	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة
قرار عدد 19: الترفيع في رأس مال شركة البيئة والبستنة إلى 5 م.د. وإقرار 2000 إنتداب بها وذلك على مدى 4 سنوات (600 عامل سنة 2017 و600 عامل سنة 2018 و500 عامل سنة 2019 و300 عامل سنة 2020).	وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة/ وزارة المالية	عدم التنفيذ	*وجود اشكال في الترفيع في رأس مال الشركة وقد تم مراسلة وزارة المالية للنظر في امكانية التمويل العمومي وعقد جلسات بمقر وزارة الصناعة للنظر في خلاص العملة الحاليين والمزمع انتدابهم على حساب ETAP.
قرار عدد 19: الترفيع في رأس مال شركة التنمية والإستثمار قبلي لتبلغ 15 م.د (رأس المال الحالي 5 م.د).	وزارة المالية	عدم التنفيذ	- تم خلال شهر أوت 2018 موافقة وزارة الإشراف ودعوة المؤسسات الراجعة لها بالنظر الى الرفيع في رأس مال الشركة - تم خلال سنة 2019 تكليف مكتب دراسات للقيام بمخطط أعمال في الغرض ليكون جاهزا خلال شهر سبتمبر 2019
قرار عدد 26: إحداث ديوان وطني للتمور قبلي	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	تأخر في التنفيذ	تم إمضاء الأمر المنظم لمشمولات الديوان يوم 23 اوت 2018 من قبل السيد وزير الفلاحة وبصدد مراجعته من طرف مصالح رئاسة الحكومة
قرار عدد 101: إحداث صندوق تنمية ولاية قبلي بمبلغ أولي قدره 50 مليون دينار يخصص لتمويل المشاريع المقترحة من قبل أبناء الجهة أو بقية المستثمرين	وزارة المالية	عدم التنفيذ	




# متابعة تنفيذ توصيات لجنة التنمية الجهوية

حالة التنفيذ			تاريخ الجلسة
لم تنفذ	بصدد التنفيذ	أنجزت	
50	17	14	2018-06-01
81			المجموع





# أهم المؤشرات التنموية



# المؤشرات الاقتصادية التمور

2020 جانفي- ماي		2019		2018		2017		2016		
القيمة (م.د.)	الكمية	القيمة (م.د.)	الكمية	القيمة (م.د.)	الكمية الف	القيمة (م.د.)	الكمية الف	القيمة (م.د.)	الكمية الف	
88.396	12671	157.647	22546	140.896	23	87.665	15450	62.955	14301	ولاية قبلي (ألف طن)
410.6	61	780	113.9	744.1	124	557.6	104.4	486.5	113.5	مجموع تونس (ألف طن)
-16%	%17-	%20.5	%19.9	18,9%	%18,7	%15.8	%14.8	%12.9	%12.5	مساهمة ولاية قبلي %

## السياحة

الفارق 2020-2019 (جانفي أبريل)	الفارق 2019 - 2018 %	2019	الفارق 2018-2017 %	2018	2017	2016	السنة
%- 59.5	+15.8	192224	+38.6%	1659965	119785	72121	عدد الوافدين
% -58.7	+17.4	215684	+34.93%	183752	136258	79657	الليالي المقضاة

## النسيج الصناعي

أكثر من 10 مواطن شغل	أكثر من 100 مواطن شغل	مواطن الشغل
30	2	عدد الوحدات الصناعية

# مؤشرات النوع الاجتماعي




النسبة		المؤشر	
وطني	قبلي		
% 15.3	%23.5 (13100)	البطالة العامة	البطالة
% 28	%51.5 (9300)	بطالة حاملي الشهادات العليا	
%19.27	%18.69 (24190)	نسبة الأمية	
%15.2	%18.5	نسبة الفقر	
%64.6	%59.5	التغطية الاجتماعية	
%18.7	%12.4	نسبة السكان غير منتفعين بالتغطية الصحية	
%61.40	%34.50	الصرف الصحي	




# أهم الإشكاليات التّتمويّة



# الإشكاليات التنموية






# آفاق التنمية



# تطلعات ولاية قبلي



طريق سيارة قابس -  
قبلي - الوادي

منطقة عبور على  
مستوى المطروحة  
برجيم معتوق

منطقة للتبادل الحر

ديوان وطني للتمور

تزويد ولاية قبلي بالغاز  
الطبيعي

سوق إنتاج كبرى  
للتمور

إقليم جامعي في الفلاحة  
الصحراوية

ولاية قبلي  
2025



# قبرلي اتيها نريد





مع الشكر

الجمهورية التونسية  
وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي  
ديوان تنمية الجنوب  
الإدارة الجهوية للتنمية بقبلي



# المشاريع العمومية التي تواجه صعوبات بولاية قبلي

جوان 2020

# 1- المشاريع العمومية المعطلة

القطاع	بيان المشروع	صاحب المشروع	الكلفة (أ د)	الصعوبات المعترضة	الحلول المقترحة
التطهير	تطهير مدينة سوق الأحد: إنجاز محطة تطهير بسوق الأحد / مد حوالي 35 كلم من القنوات / ربط 3000 مسكن بشبكة التطهير	الديوان الوطني للتطهير	23000	مشروع معطل: - عدم مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثرات بسبب رفض الإدارة العامة للغابات تصريف مياه المعالجة في شط الجريد - تم تحيين الدراسة بإضافة المعالجة الثلاثية (23 م.د) ومراسلة وزارة الفلاحة والموارد المائية في الغرض ولا يزال المشروع معطلا	دعوة كل من وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية لحماية المحيط لزيارة الولاية والإسراع باختيار الموقع المناسب والإعلان عن طلب العروض.
البيئة	إحداث 3 مراكز تحويل للتصرف في النفايات بقبلي ودوز وسوق الأحد	وكالة التصرف في النفايات	1400	مشروع متأخر: - عدم التنسيق المسبق من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات مع مصالح الولاية إلا في سنة 2019 وحاليا بصدد تجاوز الإشكاليات العقارية. - عدم وجود إدارة جهوية للوكالة بقبلي.	دعوة كل من وزارة البيئة ووزارة الشؤون المحلية للتنسيق مع البلديات للإسراع في تجاوز الإشكاليات العقارية وإنجاز المشروع.
التكوين المهني	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بدوز (بناء وتجهيز)	الوكالة الوطنية للتشغيل	11300	مشروع متأخر: مشروع ممول من طرف البنك الإسلامي للتنمية تتم متابعته من طرف الوكالة التونسية للتكوين المهني، بصدد إعداد ملف طلب العروض الخاص بالبناءات (مارس 2020 الاعلان عن الصفقة).	الإسراع بالإعلان عن طلب العروض واختيار المقاول لإنجاز المشروع.
التنوير	مشروع إنجاز محطة تحويل للكهرباء 150 / 33 بمنطقة نويل (الخط الكهربائي-المحطة الكهربائية- محطة متنقلة)	الشركة التونسية للكهرباء والغاز	40000	مشروع معطل من قبل بعض أبناء القلعة رغم عديد الجلسات على المستوى المحلي والجهوي مما قد يتسبب في انقطاع الكهرباء المتكرر خلال فصل الصيف.	دعوة وزارة الشؤون المحلية للتنسيق مع بلدية القلعة لإقناع المواطنين بأهمية المشروع والحصول على التعويضات بعد الانجاز.

القطاع	بيان المشروع	صاحب المشروع	الكلفة (أ د)	الصعوبات المعترضة	الحلول المقترحة
	بدوز الجنوبية			التأخر المسجل في تنفيذ هذا المشروع سينجر عنه تعطيل مشاريع ستتجز على غرار المحدث، المناطق الصناعية... كما يمكن أن يحول إلى ولاية أخرى.	
الصناعة	المنطقة الصناعية باستطيمي قبلي الشمالية 100 هك (قسط 1: 50 هك)	الوكالة العقارية الصناعية	19113	مشروع متأخر: - تم التقويت في العقار للوكالة سنة 2015، - قامت الوكالة بإعداد مثال تهيئة تفصيلي وتمت المصادقة عليه من طرف لجنة التوافقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية خلال شهر نوفمبر 2017، - تم إنجاز الشبكة الخارجية لتزويد المنطقة بالتيار الكهربائي بمبلغ قدره 0,74 م د، - تم إبرام الصفقة مع الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه لإنجاز الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب بمبلغ قدره 13 م د، - بصدد اعداد الدراسات الفنية التفصيلية وملف التقسيم (انطلاق اشغال القسط الاول موفى 2020).	الإسراع بإعداد ملف عن طلب العروض واختيار المقاوله لإنجاز المشروع باعتبار أهمية المنطقة الصناعية ووجود نوايا استثمار هامة لإنجاز مشاريع في هذه المنطقة.

## 2- قرارات المجالس الوزارية المعطلة

- المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 18 جوان 2015

نص القرار	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	الحلول المقترحة
قرار عدد 47: الانطلاق في إعداد دراسة طريق سريعة قابس - قبلي وبرمجة	وزارة التجهيز والإسكان	عدم التنفيذ	غير مدرج بالمخطط.	أهمية إدراج هذا المشروع في المخطط الاستراتيجي

الحلول المقترحة	المتابعة	حالة التنفيذ	المعنى بالتنفيذ	نص القرار
القادم 2021-2025 باعتبار قبلي هي الولاية الوحيدة المستثناة من الطرق السيارة الى حدود 2020.			والتهيئة الترابية	أشغالها انطلاقا من المخطط 13.
أهمية هذا المشروع للجهة باعتبارها منتجة للغاز والبتروول.	ربط الجهة بالغاز الطبيعي بكلفة 31 م.د حيث ستنتهي الدراسات في 2018 مع امكانية تقديم آجال الانجاز. - من المتوقع انطلاق الاشغال أوت 2020	عدم التنفيذ	وزارة الصناعة والطاقة والمناجم	قرار عدد 62: إدراج مشروع تزويد المناطق السكنية والصناعية بمدينة قبلي بالغاز الطبيعي ضمن المخطط المديرى للغاز 2016-2020 بكلفة 40 مليون دينار وتقدر مدة الانجاز بـ3 سنوات.
	عدم مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثرات بسبب رفض الادارة العامة للغابات تصريف مياه المعالجة في شط الجريد -تم تحيين الدراسة بإضافة المعالجة الثلاثية (23 م د) ومراسلة وزارة الفلاحة والموارد المائية في الغرض	عدم التنفيذ	وزارة الشؤون المحلية والبيئة	قرار عدد 64: تدعيم شبكة التطهير وانجاز منظومة تحويل المياه بمدينة سوق الأحد وذلك بمد حوالي 35 كلم من القنوات وربط 3000 مسكن بشبكة التطهير وانجاز محطة تطهير بسوق الأحد بكلفة تبلغ 17.2 مليون دينار.
دعوة وزارة البيئة لإسراع بالإعلان عن طلب العروض لانجاز هذا المشروع لمدى أهميته في التسويق للولاية كوجهة للسياحة الصحراوية.	إحداث منظومة لكل من توزر وقبلي لمعالجة النفايات وتثمينها وإحداث عدد من مراكز التحويل لفائدة البلديات بكلفة جملية تقدر بـ 33 م.د. وسيتم انطلاق الدراسات قبل موفى سنة 2017 وانطلاق الأشغال خلال شهر جويلية 2019 (مدة الأشغال 21 شهر).	عدم التنفيذ	وزارة الشؤون المحلية والبيئة	قرار عدد 65: انجاز دراسة لإحداث منظومة جديدة متكاملة تتضمن وحدة لمعالجة النفايات وتثمينها مراكز التحويل. وستنطلق الدراسة خلال سنة 2016 بتمويل من البنك الألماني

نص القرار	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	الحلول المقترحة
قرار عدد 11: دراسة إمكانية إحداث معبر حدودي بمنطقة المطروحة لتعزيز التبادل التجاري مع الجزائر. دراسة إمكانية إحداث معبر حدودي بمنطقة المطروحة لتعزيز التبادل التجاري مع الجزائر.	الديوان الوطني للمعابر الحدودية	عدم التنفيذ	تبعاً لجلسة الوفد الحكومي بتاريخ 04 أوت 2017 بمناسبة زيارته للجهة وجلسة العمل بإشراف السيد رئيس الحكومة مع ممثلي مجلس نواب الشعب بتاريخ 16 جانفي 2018 تم التأكيد على أهمية عرض مشروع البوابة الحدودية على اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية	أهمية عرض هذا القرار على اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية لما يمثله من أهمية لولاية قبلي التي تشترك في حدودها مع الجزائر على مسافة 140 كم. إضافة إلى تنشيط ميناء قابس وتدعيم التعاون الدولي اللامركزي مع الجزائر تبعاً للقرارات المنبثقة عن زيارة السيد رئيس الجمهورية للجزائر.

- جلسة العمل بتاريخ 26 أوت 2017

نص القرار	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	الحلول المقترحة
قرار عدد 19: الترفيع في رأس مال شركة البيئة والبستنة إلى 5 م.د وإقرار 2000 إنتداب بها وذلك على مدى 4 سنوات (600 عامل سنة 2017 و 600 عامل سنة 2018 و 500 عامل سنة 2019 و 300 عامل سنة 2020).	وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة/ وزارة المالية	عدم التنفيذ	*وجود اشكال في الترفيع في رأس مال الشركة وقد تم مراسلة وزارة المالية للنظر في امكانية التمويل العمومي وعقد جلسات بمقر وزارة الصناعة للنظر في خلاص العملة الحاليين والمزمع انتدابهم على حساب ETAP.	دعوة كل من وزارة الصناعة والشركة التونسية للأنشطة البترولية والمنشآت المساهمة في رأس مال الشركة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لانئداب ما هو منفق عليه.
قرار عدد 19: الترفيع في رأس مال شركة التنمية والإستثمار قبلي لتبلغ 15 م.د (رأس المال الحالي 5 م.د).	وزارة المالية	عدم التنفيذ	- تم خلال شهر أوت 2018 موافقة وزارة الإشراف ودعوة المؤسسات الراجعة لها بالنظر الى الرفيع في رأس مال الشركة	دعوة المنشآت المساهمة في شركة sicar للترفيع في رأس مال الشركة.

	<p>- تم خلال سنة 2019 تكليف مكتب دراسات للقيام بمخطط أعمال في الغرض ليكون جاهزا خلال شهر سبتمبر 2019</p>			
<p>الإسراع بإمضاء الأمر ونشره بالرائد الرسمي.</p>	<p>تم إمضاء الأمر المنظم لمشمولات الديوان يوم 23 اوت 2018 من قبل السيد وزير الفلاحة وصيد وراجعته من طرف مصالح رئاسة الحكومة</p>	<p>تأخر في التنفيذ</p>	<p>وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري</p>	<p>قرار عدد 26: إحداث ديوان وطني للتمور قبلي</p>
<p>النظر في مدى ملائمة التشريع القانوني لإحداث هذا الصندوق لدعم تمويل مشاريع الاستثمار الخاص بالجهة.</p>		<p>عدم التنفيذ</p>	<p>وزارة المالية</p>	<p>قرار عدد 101: إحداث صندوق تنمية ولاية قبلي بمبلغ أولي قدره 50 مليون دينار يخصص لتمويل المشاريع المقترحة من قبل أبناء الجهة أو بقية المستثمرين بناء عن دراسات جدوى مسبقة يقوم بها ديوان تنمية الجنوب والهياكل المعنية (وكالة حماية المحيط...).</p>

## توصيات زيارة اللجنة البرلمانية خلال زيارتها لولاية قبلي يوم 1 جوان 2018

المتابعة	التوصيات
	<b>*وزارة الدفاع الوطني:</b>
عدم التنفيذ	-إحياء المطار العسكري ببازمة وتغيير صبغته إلى مطار مدني.
تم إحداث مصحة عسكرية متعددة الاختصاصات من قبل وزارة الدفاع الوطني وفي انتظار توفير التجهيزات وانطلاق الاستغلال	-إحداث مستشفى عسكري.
	<b>*وزارة النقل</b>
عدم التنفيذ	-إحداث معبر حدودي بمنطقة المطروحة من رجم معتوق لتعزيز التبادل التجاري مع الجزائر (تفعيلا للخطة الوطنية الخاصة بتنمية المناطق الحدودية التي تم إقرارها في 06 فيفري 2015)
-قدمت الولاية الجدوى الاقتصادية لهذا المقترح لعرضه على الدورة الواحدة والعشرين (21) للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية. - تبعا لجلسة الوفد الحكومي بتاريخ 04 أوت 2017 بمناسبة زيارته للجهة، تم التأكيد على استئناف الحوار مع الجزائر لإحداث معبر حدودي على مستوى المطروحة برجم معتوق.	
-تم دعم أسطول الحافلات بين المدن بـ 02 حافلات وتم إحداث خط قبلي- تونس عبر قفصة والقيروان -تم إلى حد الآن تدعيم أسطول الحافلات الراجعة بالنظر لوكالتي قبلي ودوز بـ 11 حافلة - تم دعم الوكالتين بعدد 04 حافلات مستعملة فرنسية الصنع	- تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل البري لتدعيم الأسطول بحافلات جديدة وإحداث خطوط لربط الجهة ببقية الولايات، إضافة إلى الإسراع بإعادة تشغيل الخطوط المتوقفة.



التوصيات	المتابعة
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم ربط رجيم معتوق قبلي/ ربط دوز بقابس خط جديد/قبلي- سوسة خط جديد</li> <li>- تم ربط رجيم معتوق قبلي/قبلي-سوسة خط جديد/ دوز-قابس</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-تحسين خدمات النقل وذلك بإنجاز محطات للنقل الريفي واللواج والتاكسي.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- استغلال محطة سيارات الاجرة لواج منذ فيفري 2018</li> <li>- انطلاق العمل بمحطة للنقل الريفي قرب السوق الاسبوعية</li> <li>- تم احداث منطقة جولان ببلديات الفوار وجمنة ورجيم معتوق</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- إحداث مطار مدني بالجهة وربطه بالخطوط الجوية المتجهة نحو افريقيا.</li> </ul>	عدم التنفيذ
<b>*وزارة المالية:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>-إحداث صندوق تنمية ولاية قبلي بمبلغ أولي قدره 50 م.د يخصص لتمويل المشاريع المقترحة من قبل أبناء الجهة أو بقية المستثمرين بناء على دراسات جدوى مسبقة يقوم بها ديوان تنمية الجنوب والهيكل المعنية (وكالة حماية المحيط). ...</li> </ul>	عدم التنفيذ
<ul style="list-style-type: none"> <li>-النظر في إمكانية التمويل العمومي لتجاوز إشكال الترفيع في رأس مال شركة البيئة والبستنة.</li> </ul>	عدم التنفيذ
<ul style="list-style-type: none"> <li>-وضع برنامج قصير المدى للتعريف بمزايا الإنتصاب للحساب الخاص وآليات التمويل والإمميزات الجبائية ذات الصلة لفائدة حاملي الشهادات وموجه أيضا للطلبة وأصحاب الشهادات والهيكل المهن ية خاصة .وتتولى القيام بهذه الأعمال هيكل المساندة (كوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ديوان تنمية الجنوب). ...</li> </ul>	تقوم هيكل المساندة بصفة دورية بالتعريف بالامتيازات المالية والجبائية وبفرص الاستثمار ووالتأطير والتوجيه واعداد مخططات الاعمال ودراسات الجدوى
<ul style="list-style-type: none"> <li>-مراجعة القوانين المنظمة لهيكل التمويل والمساندة وخاصة التعجيل بإحداث آليات جديدة في علاقة بالبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبفريقيهما الجهويين بقلي للرفع من أدائهما بالجهة ولإضفاء المزيد من المرونة والنجاعة على برنامج وأساليب عمل هذين البنكين بما يساهم فعليا في تقليص الإجراءات وتيسير الإنتصاب للحساب الخاص وتحفيز الاستثمار بالجهة.</li> </ul>	عدم التنفيذ
<ul style="list-style-type: none"> <li>-على البنك التونسي للتضامن أن يقوم بإعادة النظر في الشروط التي يعتمدها لإسناد القروض.</li> </ul>	عدم التنفيذ

التوصيات	المتابعة
-تدعيم فرعي البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقبلي بالموارد البشرية اللازمة.	تم تدعيم البنك التونسي بـ 3 موظفين
-التسريع في إحالة اعتمادات الدفع الكافية للإيفاء بتعهدات الإدارة إزاء المقاولين ومسدي الخدمات.	عدم التنفيذ
<b>وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي:</b>	
-مراجعة قانون الاستثمار بهدف تبسيط الإجراءات.	عدم التنفيذ
-تنفيذ الوعد بالترفيغ في رأس مال شركة التنمية والإستثمار بقبلي ليلبلغ 35 م.د) رأس المال الحالي 5 م.د.)	- تم خلال شهر أوت 2018 موافقة وزارة الإشراف ودعوة المؤسسات الراجعة لها بالنظر الى الرفيغ في رأس مال الشركة - تم خلال سنة 2019 تكليف مكتب دراسات للقيام بمخطط أعمال في الغرض ليكون جاهزا خلال شهر سبتمبر 2019
-توسيع دائرة نشاط ديوان تنمية رجم معتوق ليشمل معتمدية الفوار.	بصدد إحداث مشروع فلاحي بالمنطقة الحدودية "المحدث" على غرار مشروع رجم معتوق (وزارة الدفاع الوطني).
-تسوية وضعية العاملين على حساب الآلية 36 بانتدابهم لتعويض المحالين على التقاعد في مختلف الإدارات الجهوية التي تشكو من غياب الموارد البشرية الضرورية بها نتيجة إيقاف العمل بالمناظرات للإنتداب في الوظيفة العمومية.	يتم ذلك بصفة تدريجية
<b>وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:</b>	
مراجعة قانون الأراضي الإشتراكية.	عدم التنفيذ
ضرورة تسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية	عدم التنفيذ
تسوية وضعية الأراضي الدولية.	عدم التنفيذ
<b>وزارة الشؤون المحلية والبيئة:</b>	

المتابعة	التوصيات
عدم التنفيذ	-تنفيذ الوعد بالترفيه في رأس مال شركة البيئة والبستنة إلى 5 م.د وإقرار 2000 إنتداب بها وذلك على مدى 3 سنوات.
عدم التنفيذ	-التسريع في الإجراءات لانطلاق في الدراسات المتعلقة بإحداث منظومة جديدة متكاملة لمعالجة النفايات وتثمينها لكل من توزر وقبلي وإحداث عدد من مراكز التحويل لفائدة البلديات (الكلفة الجمالية تقدر ب 11 م.د.)
عدم التنفيذ	-إحداث مناطق خضراء ومنتزهات بما يتلاءم مع حاجيات س كان الجهة من العيش الكريم.
يتم ذلك تدريجيا حسب إمكانيات البلديات	-تهيئة وتهديب الطرقات داخل المناطق البلدية.
عدم التنفيذ	-إقرار خصوصية للمعمدية الجديدة" بالرجيم معتوق " يمكن أن يطلق عليها معتمدية سنة 2018 تتوج بفتح المعبر الحدودي مع الجزائر بعد موافقة اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية وذلك في إطار الاعتناء بالتنمية المحلية.
عدم المسبق من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات مع مصالح الولاية إلا في سنة 2019 وحاليا بصدد تجاوز الاشكاليات العقارية.	-على وكالة التصرف في النفايات بالإسراع في تقديم مطلب لمجلس التصرف لإسناد العقار لاستكمال إجراءات إحداث مركز تحويل للتصرف في النفايات قبلي.
	-على وكالة التصرف في النفايات بالإسراع في تقديم مطلب إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قصد التقويت في العقار لاستكمال إجراءات إحداث مركز تحويل للتصرف في النفايات بسوق الأحد.
	-على وكالة التصرف في النفايات بالإسراع في تحديد موقع مركز تحويل للتصرف في النفايات بدوز.
	<b>وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري:</b>
عدم التنفيذ	-إعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة للتنمية الفلاحية بالجهة.
عدم التنفيذ	-التسريع في تفعيل النصوص التطبيقية الخاصة بتسوية الوضعية العقارية المتعلقة بالتوسعات الفلاحية الخاصة.
عدم التنفيذ	-إعداد برنامج لتأهيل وتوسعة الأراضي السقوية بالجهة.

التوصيات	المتابعة
-إتخاذ الإجراءات اللازمة لتدعيم الموارد المائية بالجهة.	برمجة حفر 5 آبار عميقة جيوحرارية بكلفة 30 م.د كتعويض ل5 آبار جيوحرارية (كامل الولاية) تم برمجة بئر عميقة كل سنة بكلفة 6 مليون دينار الى حدود سنة 2020.
-بعث وحدات تحلية مياه جديدة خاصة وأن الجهة ممتدة على رقعة جغرافية شاسعة (14.5 % من مساحة الجمهورية التونسية).	عدم التنفيذ
-إدراج برامج تخص مقاومة التصحر الذي يهدد العديد من القرى بجهة قبلي.	برنامج سنوي متواصل ضمن ميزانية التنمية السنوية وذلك كما يلي: - سنة 2017: تم تخصيص وصرف 4م.د -سنة 2018: تم تخصيص 4.145 م.د - سنة 2019: تم اقتراح ترسيم 4.435 م. د - سنة 2020: 5.780 م د
-إحداث آليات جديدة لتثمين منتوجات الثروة الحيوانية وخاصة قطيع الإبل.	عدم التنفيذ - يبلغ انتاج الجلود في ولاية قبلي 1500 وحدة جلد وهي غير مستغلة البتة منها 365 وحدة تحت إشراف المسالخ الموجودة بالجهة. - انتاج قبلي من الوبر يقدر ب 15 طن (80% غير مستغلة).
إحداث ديوان وطني للتمور بقبلي.	تم امضاء الأمر المنظم لمشمولات الديوان يوم 23 اوت 2018 من قبل السيد وزير الفلاحة وبصدد مراجعته من طرف مصالح رئاسة الحكومة
-ضرورة تسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية.	عدم التنفيذ

التوصيات	المتابعة
-إدماج التوسعات الخاصة في التوسعات المعترف بها من قبل الدولة وتمتعها بالمنح والإميازات التي توفرها الدولة للفلاحين( وهي في حدود 27 ألف هك إلى حد اوت2014	عدم التنفيذ
-على الإدارة العامة للغابات بالتسريع في إبداء رأيها بخصوص الدراسة المحينة لتصريف مياه المعالجة في شط الجريد لاستكمال إجراءات مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثرات المتعلقة بإنجاز محطة تطهير بسوق الأحد.	عدم مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثرات بسبب رفض الإدارة العامة للغابات تصريف مياه المعالجة في شط الجريد -تم تحيين الدراسة بإضافة المعالجة الثلاثية (23 م.د) ومراسلة وزارة الفلاحة والموارد المائية في الغرض ولا يزال المشروع معطلا.
-التسريع في استكمال الإجراءات الإدارية على مستوى المصالح المركزية للإعلان عن طلب العروض المتعلقة بمشروع تحسين تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب بكل من تلمين وتببيب وطنبار والمنصورة ا ولرابطة وفج الريح (ميزانية تكميلية).	في طور طلب العروض
-تمكين أصحاب مخازن التبريد ومجمعي الثمر والمصدرين المنتصبين بالجهة من جدولة الديون المتخلدة بذمتهم لتدعيم التصدير.	عدم التنفيذ
<b>*وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة:</b>	
-إحداث مناطق صناعية جديدة بالجهة.	عدم التنفيذ
-التسريع في تهيئة المنطقة الصناعية باستطيمي بمعتمدية قبلي الشمالية.	- تم إدراج هذا الموقع الماسح 100 هك ضمن القائمة النهائية للمدخرات العقارية الصناعية الصادرة بقرار من وزيرى الصناعة والتجهيز المؤرخ في 5 ماي 2014 -انعقدت جلسة عمل اللجنة الوزارية للموافقات للمناطق الصناعية بمقر وزارة التجهيز والاسكان يوم 2017/11/21 حيث تمت المصادقة على مثال التهيئة التفصيلي للمنطقة الصناعية استطيمي التي تسمح 100 هكتار - تم انجاز الشبكة الخارجية لتزويد المنطقة بالتيار الكهربائي بمبلغ قدره 0.74 م.د - بصدد ابرام الصفقة مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لانجاز الشبكة

التوصيات	المتابعة
	الخارجية للماء الصالح للشرب بمبلغ قدره 13 م.د. - تم ابرام الصفقة مع مكتب دراسات للقيام بالدراسات الفنية وملف التقسيم. - الانطلاق في انجاز القسط الاول بمساحة 50 هك موفى سنة 2020
<b>*وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية:</b>	
-تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإحداث الطريق السيارة قابس -قبلي-الوادي.	عدم التنفيذ
-إنجاز الطريق الرابطة بين بلدة" دوار الماء "في ولاية وادي" سوف "مرورا بقرى المطروحة ورجيم معتوق وصولا إلى قابس (تفعيل للخطة الوطنية الخاصة بتنمية المناطق الحدودية التي تم إقرارها في 06 فيفري 2015	عدم التنفيذ
-دعم وتحسين البنية التحتية بكامل ولاية قبلي من صيانة وتعهد لشبكة الطرقات لفك العزلة عنها.	يتم ذلك بصفة دورية حسب البرامج السنوية
-وضع برنامج للسكن الاجتماعي في كل معتمديات الجهة وذلك بصفة عاجلة.	عدم التنفيذ
-على الإدارة العامة للجسور والطرق بالتسريع في إيداء موافقتها على تغيير المسلك المتعلق بالجزء المعطل (1 كلم) لاستئناف الأشغال واستكمال تهيئة 33 كلم من المسالك الريفية بقبلي.	تم الانجاز
<b>*وزارة السياحة والصناعات التقليدية:</b>	
-تنمية النشاط السياحي بالجهة بتدعيم السياحة الصحراوية إضافة إلى سياحة العبور من خلال تشجيع المستثمرين الخواص على الاستثمار في المجال وخاصة منهم أبناء الجهة والتشجيع أيضا على إحداث أنماط السياحة البديلة كالإستضافات العائلية والإقامات الريفية وغيرها.	تتولى هيكل المساندة الاحاطة والإرشاد وإعداد الدراسات والتكوين لكل الراغبين في بعث المشاريع السياحية
-إعادة تهيئة المنطقة السياحية بقبلي.	عدم التنفيذ
-إدراج مدينة قبلي القديمة بالمسلك السياحي.	عدم التنفيذ
-إحداث منطقة سياحية بمعتمدية الفوار.	عدم التنفيذ
<b>*وزارة الطاقة و المناجم والطاقات المتجددة:</b>	

التوصيات	المتابعة
-تفعيل قانون الاستثمار في الطاقات المتجددة المصادق عليه منذ ديسمبر 2013 لما له من مكاسب في التشغيل والتنمية.	تم انجاز
-تفعيل مشروع أكسيوم الذي صادقت عليه اللجنة العليا لاستثمار بتاريخ 31 ديسمبر 2013 والذي لا يزال معطوق إلى هذا التاريخ.	عدم التنفيذ
-المطالبة بمنح تراخيص لاستثمار في الملح.	عدم التنفيذ
-تفعيل مشروع طاقة الرياح.	- محطة إنتاج كهرباء بواسطة الرياح بجبل الطباقة تم اسناد مساحة 38 هكتار لانجاز المحطة تم قبول تمويل المشروع من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية من المتوقع الإعلان عن طلب العروض في جانفي 2020 وبداية الانجاز خلال سنة 2023
-تفعيل مشروع الطاقة الشمسية.	- محطة إنتاج كهرباء بواسطة الطاقة الشمسية (20 ميغا واط) تم اسناد مساحة 40 هكتار لانجاز المحطة - كلفة المشروع: 50 م.د - سيمكن المشروع من توفير 200 موطن شغل (150 بداية الأشغال و50 خلال الاستغلال) - بداية الأشغال: جانفي 2020 الى غاية 2022- بصدد البحث عن التمويل
-تطبيق الاتفاق المتعلق بتنفيذ أبناء الجهة في الانتدابات بالشركات البترولية المنتسبة قبلي.	بصدد الانجاز
-الترفيغ في المبالغ المخصصة للمسؤولية المجتمعية للشركات البترولية إلى مبلغ يتناسب مع إنتاج الجهة من البترول والغاز.	-تم تكوين مجموعة من الراغبين في بعث مشاريع فلاحية "تربية الماشية" بالتنسيق مع مركز التكوين المهني الفلاحي بجمنة وذلك قصد تمكينهم من تمويل مشاريعهم. -تم توزيع 40 مشروعا لتربية الأغنام بمبلغ جملي قدره 538.454 ألف دينار

التوصيات	المتابعة
	-تم تمويل مشاريع خدماتية مختلفة بدوز ومشاريع فلاحية بالفوار
-إدراج مشروع تزويد المناطق السكنية والصناعية بمدينة قبلي بالغاز الطبيعي ضمن المخطط المديرى للغاز 2016-2020	ربط الجهة بالغاز الطبيعي بكلفة 31 م.د حيث ستنتهي الدراسات في 2018 مع امكانية تقديم آجال الانجاز. - من المتوقع انطلاق الاشغال أوت 2020
-تخصيص نسبة مائوية من عائدات البترول لضخها في صندوق جهوي يعنى بالتنمية على أن يتم الاتفاق على تحديد هذه النسبة حسب الإنتاج السنوي لكل الحقول التي دخلت حيز العمل (المبلغ المقترح 50 م.د.)	عدم التنفيذ
<b>*وزارة الشباب والرياضة:</b>	
-التسريع في تحويل الإعتمادات الناقصة (المقدرة ب 22724283 أ.د.) لإتمام إجراءات إبرام الصفقة المتعلقة بانجاز مشروع بناء قاعة الرياضات الفردية بسوق الأحد.	تم توفير التمويل في طور اتمام اجراء اتمام الصفقة
<b>*وزارة الشؤون الثقافية:</b>	
-تشجيع الاستثمار في القطاع الثقافي وخاصة في صناعة السينما من خلال احداث فضاء لتصوير الأفلام بصحراء دوز على غرار ما هو متعارف عليه في عدة دول بـ" مدن للسينما."	عدم التنفيذ
-على الوزارة القيام بدراسة شاملة حول تفشي ظاهرة مرض الالتهاب الكبدي بالولاية والتي تكاد تكون وباء بالجهة ما فتىء يتفاقم.	عدم التنفيذ
-الترفيغ في عدد المستشفيات بالجهة.	
-تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإحداث وحدة صحية متكاملة لمعالجة أمراض السرطان والكبد.	عدم التنفيذ
-الترفيغ في عدد المخابر الطبية.	عدم التنفيذ
-الترفيغ في عدد الأطباء وخاصة أطباء الاختصاص.	يتم ذلك بصفة تدريجية



المتابعة	التوصيات
عدم التنفيذ	-توفير طائرة للنجدة الطبية السريعة.
يتم ذلك بصفة تدريجية	توفير وتدعيم المستشفيات الجهوية والمحلية بالإمكانات البشرية والتجهيزات والمعدات الطبية اللازمة ووسائل النقل وسيارات الإسعاف للارتقاء بجودة الخدمات الصحية بمختلف المؤسسات العمومية للصحة بالجهة.
يتم ذلك بصفة تدريجية	-ضرورة دعم الإدارة الجهوية ومدرسة علوم التمريض والمؤسسات الصحية بعدد العملة اللازم عن طريق الانتداب لسد الشغور والنقص الكبير الحاصل في مختلف هذه المؤسسات لتلافي تعطيل السير العادي للعمل وتأمين المستوى الأدنى من خدمات الكتابة والسياسة والصيانة والنظافة والحراسة.
	<b>*وزارة الشؤون الاجتماعية:</b>
-تم بتاريخ 30 ماي 2019 المصادقة على أرض المشروع والبرنامج الوظيفي والاعتمادات المقترح في حدود 376 أ.د. باعتبار الدراسات وتم تعيين المهندسين المصممين	-إحداث دار خدمات بمعتمدية سوق الأحد.
تم الانجاز	-التسريع في تدعيم دار خدمات الضمان الاجتماعي بالفوار بالإطار البشري اللازم حتى تتم ك ن من الدخول حيز النشاط.
تم الانجاز	-تعميم تدعيم بقية دور الخدمات المتواجدة حاليا في الجهة بالإطار البشري اللازم لتقريب إساءة الخدمات فعليا للمواطنين.
	<b>*وزارة التربية:</b>
عدم التنفيذ	-اقتراح ترميم وتهيئة البناءات الراجعة بالنظر لديوان سكن أعوان وموظفي وزارة التربية واستغلالها كفضاءات للإدارات المحلية.
عدم التنفيذ	-بناء إدارات محلية على مستوى المعتمديات.

المتابعة	التوصيات
عدم التنفيذ	-على الوزارة إعداد مركز شبابي وثقافي نموذجي تستغله شعبة الرياضة ويكون مقرا لها.
عدم التنفيذ	-إقتناء حافلة مدرسية ووضعها على ذمة معهد" رجيم" الذي يبعد عن المطروحة قرابة 17 كم.
	<b>*وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:</b>
تم إحداث ماجستير في القطاع الفلاحي (الفلاحة الصحراوية) وماجستير في الصناعات الغذائية	-فتح إختصاصات جديدة تتماشى وحاجيات الجهة خاصة في القطاع الفلاحي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية وإعادة هيكلة المعهد لهذا الغرض.
عدم التنفيذ	-إحداث شعبة جديدة بالمعهد العالي للدراسات تعنى بالفنون والحرف تماشيا مع خصوصيات ومميزات الجهة كمنطقة سياحية.
	<b>*وزارة التكوين المهني والتشغيل:</b>
2018: 651 منتقع 2019: 750 منتقع	إعادة النظر في عقد الكرامة فيما يتعلق بولاية قبلي حتى لا يتم حرمانها من الإستفادة من هذه الفرصة باعتبار عدم وجود مؤسسات صناعية أو اقتصادية بالجهة.
سيتم برمجة احداث اختصاصات جديدة عند الانتهاء من اعادة تأهيل مركز التكوين المهني بقبلي واحداث مركز للتكوين والتدريب المهني بدوز (لم يتم بعد الانتهاء من اعداد طلب العروض لاختيار المقاوله المكلفه بالانجاز).	-إحداث إختصاصات جديدة وواعدة كصيانة الشاحنات والمعدات الثقيلة والطاقت البديلة والمحروقات في إطار إعادة هيكلة مراكز التكوين المهني بالجهة.

## متابعة قرارات المجالس الوزارية لفائدة ولاية قبلي

- المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 23 أفريل 2015
- المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 18 جوان 2015
- المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 26 ديسمبر 2015
- الاتفاق المبرم بين الطرف الحكومي وممثلي الجهة بتاريخ 26 أوت 2017

### 1- العدد الجملي للقرارات:

تاريخ الجلسة				المجالس الوزارية
26 أوت 2017	26 ديسمبر 2015	18 جوان 2015	23 أفريل 2015	
109	10	73	05	القرارات
197				المجموع

### 2- متابعة تنفيذ القرارات:

حالة التنفيذ			تاريخ الجلسة
لم تنفذ	بصدد التنفيذ	أنجزت	
-	-	5	2015-04-23
3	25	45	2015-06-18
4	3	3	2015-12-26
10	53	46	2017-08-26
17	81	99	المجموع

### 3- أهم القرارات التي لم تنجز:

- المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 18 جوان 2015

نص القرار	المعنى بالتنفيذ	التنفيذ	المتابعة
قرار عدد 47: الانطلاق في إعداد دراسة طريق سريعة قابس - قبلي وبرنامج أشغالها انطلاقا من المخطط 13.	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	عدم التنفيذ	غير مدرج بالمخطط.
قرار عدد 62: إدراج مشروع تزويد المناطق السكنية والصناعية بمدينة قبلي بالغاز الطبيعي ضمن المخطط المديرى للغاز 2016-2020 بكلفة 40 مليون دينار وتقدر مدة الانجاز بـ3 سنوات.	وزارة الصناعة والطاقة والمناجم	عدم التنفيذ	ربط الجهة بالغاز الطبيعي بكلفة 31 م.د حيث ستنتهي الدراسات في 2018 مع امكانية تقديم آجال الانجاز. - من المتوقع انطلاق الاشغال أوت 2020
قرار عدد 64: تدعيم شبكة التطهير وانجاز منظومة تحويل المياه بمدينة سوق الأحد وذلك بمد حوالي 35 كلم من القنوات وربط 3000 مسكن بشبكة التطهير وانجاز محطة تطهير بسوق الأحد بكلفة تبلغ 17.2 مليون دينار. وسيتم الانتهاء من الدراسات في موفى جويلية 2015.	وزارة الشؤون المحلية والبيئة	عدم التنفيذ	عدم مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثرات بسبب رفض الادارة العامة للغابات تصريف مياه المعالجة في شط الجريد تم تحيين الدراسة بإضافة المعالجة الثلاثية (23 م.د) ومراسلة وزارة الفلاحة والموارد المائية في الغرض
قرار عدد 65: انجاز دراسة لإحداث منظومة جديدة متكاملة تتضمن وحدة لمعالجة النفايات وتثمينها مراكز التحويل. وستنطلق الدراسة خلال سنة 2016 بتمويل من البنك الألماني	وزارة الشؤون المحلية والبيئة	عدم التنفيذ	إحداث منظومة لكل من توزر وقبلي لمعالجة النفايات وتثمينها وإحداث عدد من مراكز التحويل لفائدة البلديات بكلفة جمالية تقدر ب 33 م.د وسيتم انطلاق الدراسات قبل موفى سنة 2017 وانطلاق الأشغال خلال شهر

جويلية 2019 ( مدة الأشغال 21 شهرا).			
-------------------------------------	--	--	--

- المجلس الوزاري المضيّق بتاريخ 26 ديسمبر 2015

نص القرار	المعني بالتنفيذ	التنفيذ	المتابعة
قرار عدد 11: دراسة إمكانية إحداث معبر حدودي بمنطقة المطروحة لتعزيز التبادل التجاري مع الجزائر. دراسة إمكانية إحداث معبر حدودي بمنطقة المطروحة لتعزيز التبادل التجاري مع الجزائر.	الديوان الوطني للمعابر الحدودية	عدم التنفيذ	تبعاً لجلسة الوفد الحكومي بتاريخ 04 أوت 2017 بمناسبة زيارته للجهة وجلسة العمل بإشراف السيد رئيس الحكومة مع ممثلي مجلس نواب الشعب بتاريخ 16 جانفي 2018 تم التأكيد على أهمية عرض مشروع البوابة الحدودية على اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية.

- جلسة العمل بتاريخ 26 أوت 2017

نص القرار	المعني بالتنفيذ	التنفيذ	المتابعة
قرار عدد 19: الترفيع في رأس مال شركة البيئة والبستنة إلى 5 م.د وإقرار 2000 إنداب بها وذلك على مدى 4 سنوات (600 عامل سنة 2017 و 600 عامل سنة 2018 و 500 عامل سنة 2019 و 300 عامل سنة 2020).	وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة/ وزارة المالية	عدم التنفيذ	*وجود اشكال في الترفيع في رأس مال الشركة وقد تم مراسلة وزارة المالية للنظر في امكانية التمويل العمومي وعقد جلسات بمقر وزارة الصناعة للنظر في خلاص العملة الحاليين والمزمع انتدابهم على حساب ETAP.

نص القرار	المعني بالتنفيذ	التنفيذ	المتابعة
قرار عدد 19: الترفيع في رأس مال شركة التنمية والإستثمار بقبلي لتبلغ 15 م.د (رأس المال الحالي 5 م.د).	وزارة المالية	عدم التنفيذ	- تم خلال شهر أوت 2018 موافقة وزارة الإشراف ودعوة المؤسسات الراجعة لها بالنظر الى الرفيع في رأس مال الشركة - تم خلال سنة 2019 تكليف مكتب دراسات للقيام بمخطط أعمال في الغرض ليكون جاهزا خلال شهر سبتمبر 2019.
قرار عدد 26: إحداث ديوان وطني للتمور بقبلي	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	تأخر في التنفيذ	تم إمضاء الأمر المنظم لمشمولات الديوان يوم 23 اوت 2018 من قبل السيد وزير الفلاحة ويصدد مراجعته من طرف مصالح رئاسة الحكومة.
قرار عدد 101: إحداث صندوق تنمية ولاية قبلي بمبلغ أولي قدره 50 مليون دينار يخصص لتمويل المشاريع المقترحة من قبل أبناء الجهة أو بقية المستثمرين بناء عن دراسات جدوى مسبقة يقوم بها ديوان تنمية الجنوب والهياكل المعنية (وكالة حماية المحيط...).	وزارة المالية	عدم التنفيذ	



الجمهورية التونسية  
وزارة الداخلية  
ولاية قفصة



# جلسة لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب الوضع التتموي بولاية قفصة



مجلس نواب الشعب 19 جوان 2020



# المحتوى

ولاية قفصة... الخصوصيات والميزات

ثروات الولاية... التنوع

الوضع التنموي الراهن

آفاق التنمية






# ولاية قفصة : الخصوصيات والميزات

---

# الموقع الجغرافي

موقع جغرافي (تتوسط خمس ولايات، ثلاثة أقاليم إقتصادية، تربط الشمال بالجنوب وشرق البلاد بغربها، تفصل بين سهول البلاد وصحرائها، الجزائر )

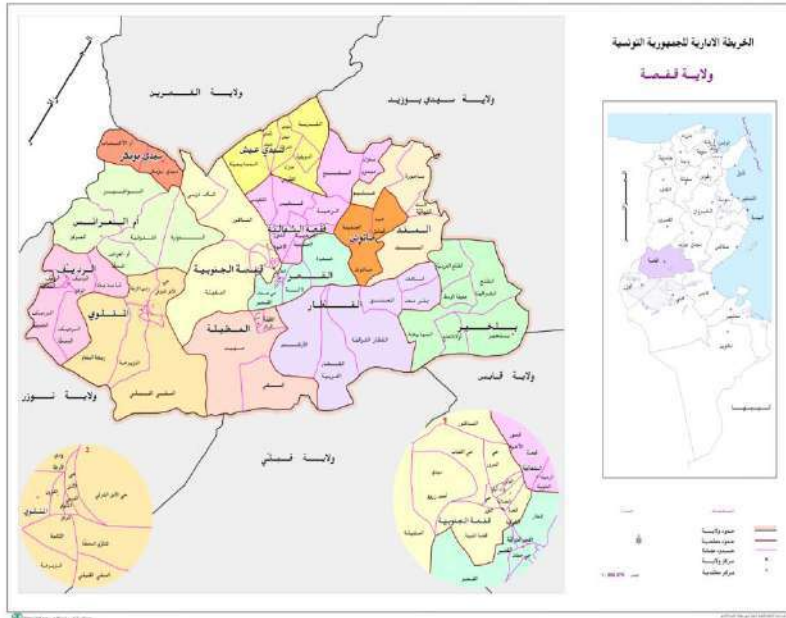

# التقسيم الإداري



7807 كلم<sup>2</sup>

353 ألف ساكن

13 معتمدية

13 بلدية

76 عمادة

## أهم الخصوصيات والميزات

▪ مطار دولي وسكك حديدية (388 كلم)

▪ 578.7 كلم من الطرقات المرقمة (منها 97 % معبدة) و3407.6

كلم من المسالك الريفية (منها 31 % معبدة)

▪ 11 منطقة صناعية (284.8 هك : المساحة المهيأة 37 هك ما

يعادل 12 %)

▪ 69 مركزا للتكوين المهني متعددة الاختصاصات منها 2 عمومية

ومركز تكوين فلاحي

▪ 2 مراكز العمل عن بعد

# أهم الخصوصيات والميزات




- مناطق حرفية بكل معتمديات الولاية
- حدائق وطنية : حديقة عرياطة
- قطب تنموي
- هياكل مساندة للاستثمار
- إذاعة جهوية.



# ثروات قفصة ... التنوع





## أهم الثروات

- موارد مائية جوفية (تقدر بـ 128 مليون متر مكعب في السنة)  
وسد سيدي عيش (بطاقة إستعاب تقارب 88,5 مليون متر مكعب)
- 574 ألف هك من الأراضي الصالحة للفلاحة
- 31 ألف هك من المساحات السقوية منها 6895 هك مناطق  
سقوية عمومية و24337 هك مناطق سقوية خاصة
- 319800 هك من المراعي





# أهم الثروات

## ■ تربية الماشية:

- ✓ أبقار 9500 رأس،
- ✓ أغنام 180000 رأس،
- ✓ ماعز 52500 رأس،
- ✓ أجباح نحل 4000
- ✓ إبل 1705 رأس ...

- إنتاج فلاحي متنوع : زياتين، نخيل، تين، لوز، فستق، خضروات وباكورات...





- مخزون هام من المواد الإنشائية : خامات أولية عديدة كالفسفاط ومواد إنشائية وفيرة وذات جودة عالية كالطين والجبس والرمل السليسي والأملاح والحجارة ،...
- طاقة شمسية (300 يوم مشمس) وطاقة رياح،
- مناظر طبيعية خلابة ومتنوعة وثرء تاريخي وثقافي متجذر: جبال، آثار ، منتجات تقليدية ....



# الوضع التّتموي الراهن

---



# استثمارات المخطط التنموي 2016-2019

## توزيع الاستثمارات الجمالية حسب المتدخل


نسبة الإنجاز %	الاستثمارات المنجزة 2016-2019 (م د)	التكلفة المبرمجة بالمخطط 2016-2020 (م د)	المتدخل
49	500	1029	القطاع العام
48	287	750	القطاع الخاص
44	787	1779	المجموع



# الاستثمارات المنجزة 2016-2019

الحجمجمالي للاستثمار العمومي : 500,5 مليون دينار

المعدل السنوي للاستثمار العمومي : 125 م د

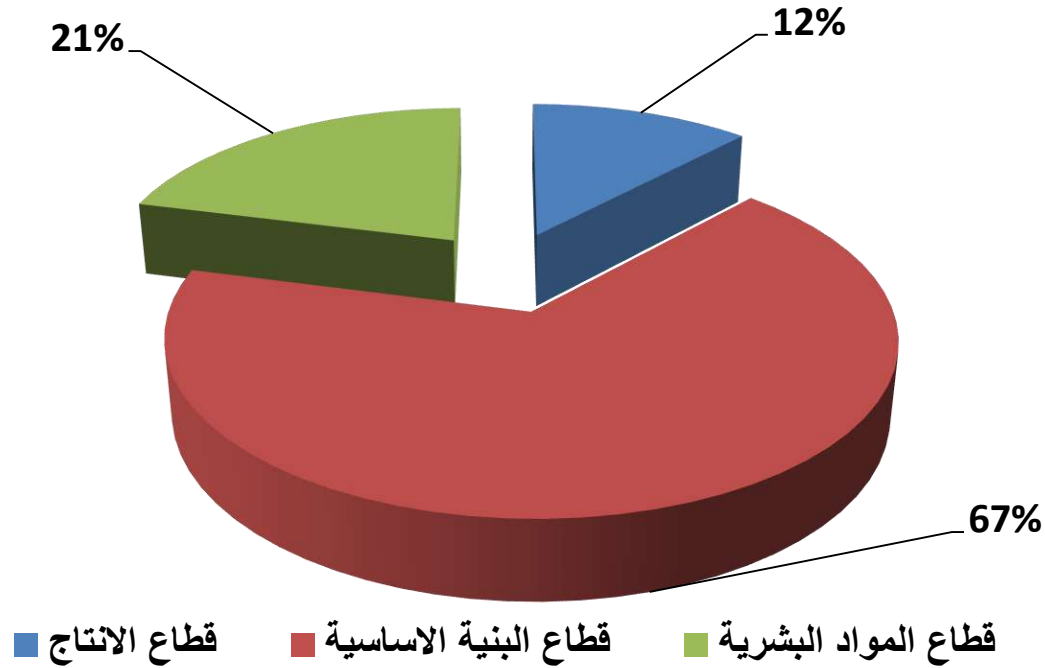




# الاستثمارات المنجزة 2016-2019

الحجمجمالي للاستثمار الخاص : 287,3 مليون دينار

المعدل السنوي للاستثمار الخاص : 72 م د

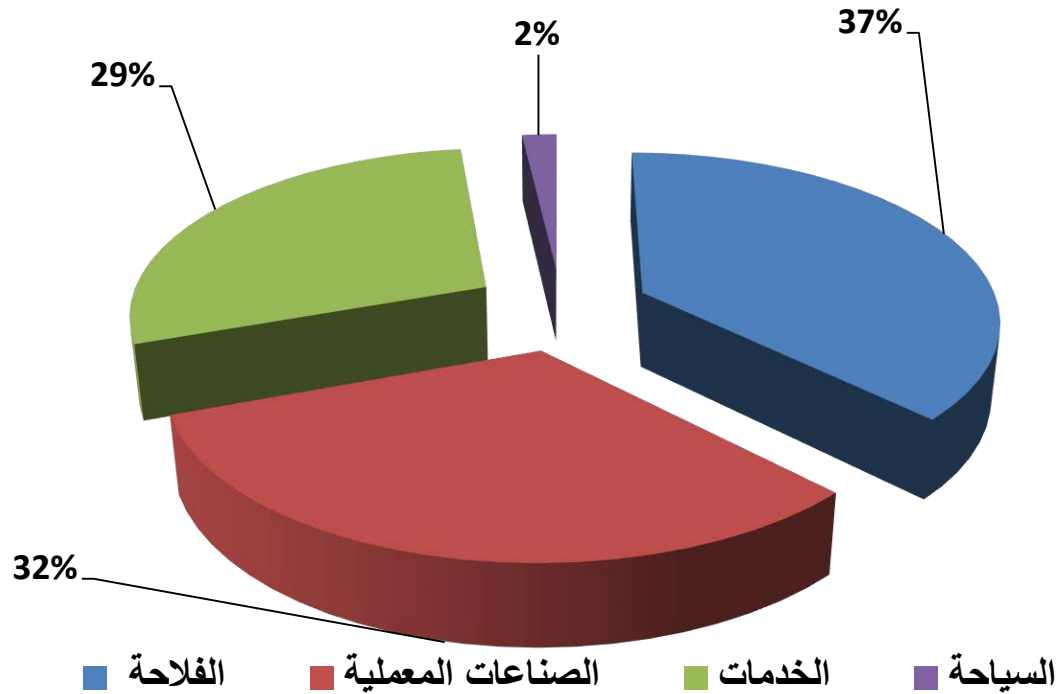




## تقدم الانجاز المادي 2011-2019

النسبة (%)	الكلفة (أ د)	العدد	مراحل الانجاز
9,67	100 056	70	مشاريع بصدد الدراسة
19,00	196 595	76	مشاريع بصدد طلب العروض
17,97	186 003	113	مشاريع بصدد الانجاز
2,19	22 670	18	مشاريع معطلة
51,17	529 576	555	مشاريع منجزة
100,00	1 034 900	832	المجموع

# أهم المشاريع المنجزة



المشروع	مكان المشروع	الكلفة (أد)
إنجاز الطريق الحزامية لمدينة قفصة	قفصة الجنوبية	18378
تهيئة 27 كم من المسالك الريفية بولاية قفصة	بلخير . زانوش والقطار	11140
أشغال تدعيم الطريق الوطنية رقم 03 من ن د 337,5 إلى ن د 381 (43,5 كم )	قفصة . المتلوي	27601
تدعيم الطريق الوطنية رقم 15 من ن د 114 على طول 59 كلم من مفترق القطار اولاد بو عمران الى حدود ولاية قابس القسط 34 من ن د 55 الى ن د 85 على طول 30 كلم	بلخير	12528
تدعيم الطريق الوطنية رقم 15 من ن د 114 على طول 59 كلم من مفترق القطار اولاد بو عمران الى حدود ولاية قابس القسط 34 من ن د 55 الى ن د 85 على طول 30 كلم	بلخير	14.80
مركز التكوين والتدريب المهني بقفصة العقيلة القسط الثاني بناء وتجهيز وحدة مبيت بـ 300 سرير واقتناء تجهيزات إضافية	قفصة الجنوبية	4500
بناء مقر جامعة قفصة	قفصة الجنوبية	1998



# أهم المشاريع بصدد الانجاز

نسبة الإنجاز %	الكلفة (أد)	مكان المشروع	المشروع
90	12406	المتلوي	أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 122 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 03 بمدينة المتلوي والطريق الجهوية 122 أ1 المؤدية الى أم العرائس (8,2 كم)
80	9 921	سيدي عيش	تهيئة الطريق المحلية رقم 901 الرابطة بين ط . و03 ومدينة سيدي عيش (23,5 كم)
40	2600	سيدي بويكر	بناء نواة مدرسة اعدادية
بصدد الدراسة : تم تخصيص قطعة الأرض وتغيير صبغتها وفي مرحلة إعداد الأمثلة الهندسية	14430	المتلوي	مركز تكوين وتدريب مهني بالمتلوي
طلب العروض	8375	القصر	مركز التكوين المهني بالقصر
طلب العروض	25.000	الرديف وام العرائس	انجاز منظومتي تحويل ومحطة التطهير لفائدة مدينتي الرديف وام العرائس مع تهنيز وتوسيع الشبكة
25	1.700	القطار	بناء ملعب رياضي
25	2.646	قفصة الجنوبية	بناء قاعة للرياضات الجماعية بسيدي أحمد زروق
62	975	القطار	بناء مجمع المالية
45	2.968	قفصة الجنوبية	بناء مطعم جامعي بالمركب الجامعي



# المشاريع التي تشهد صعوبات في الإنجاز



ملاحظات	سنة الإدراج في الميزانية	الكلفة المحيطة (أد)	مكان المشروع	بيان المشروع
معطل : بسبب الاشكاليات العقارية وقد صدر الامر الحكومي الخاص بالانتزاع بتاريخ 07 اكتوبر 2019	2014	4 501	القصر	إنجاز جسر بوادي المالح على الطريق الوطنية رقم 15 ن د 129 على طول 0,18 كلم
معطل : في انتظار فتح الاعتمادات	2016	325	المظيلة	أشغال بناء قسم طب الاطفال ووحدة لطب الرضيع بالمستشفى المحلي بالمظيلة (تهينة وصيانة وتوسعة الأقسام المتواجدة بالبنائية القديمة)
معطل: اشكالية عقارية		500	قفصة الجنوبية	مشروع المركز الجهوي لنقل الدم
لم ينطلق البحث على قطعة أرض	2013	1 200	القصر	بناء نواة مدرسة اعدادية
معطل : تم ايقاف الدراسة من طرف المصالح الجهوية	2016	123	قفصة الجنوبية	تجميل مدخل مدينة قفصة
معطل : بصدد فسخ الصفقة واعداد ملف استشارة في الغرض	2014	1371	قفصة الجنوبية	تهينة المركب الثقافي ابن منظور وبناء نوادي اختصاص
لم ينطلق في انتظار توفير الأرض	2012	4000	الرديف	بناء فرع لمعهد الصحة والسلامة المهنية
معطل : لم تنطلق الاشغال نظرا لعدم تطابق الامثلة مع الموجود	2016	911	قفصة الجنوبية	تهينة وتوسيع مقر قسم النهوض الاجتماعي
معطل : بصدد اتمام اجراءات فسخ الصفقة	2010	1600	قفصة الجنوبية	توسعة فضاءات التدريس بكلية العلوم
معطل : اجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب المشروع من المقاول	2012	2366	المتلوي	بناء قاعة للرياضات الجماعية

# البرنامج الجهوي للتنمية

الإعتمادات (م.د)		البرنامج
دفع	تعهد	
85.346	110.711	2019 - 2011
30% للقطاع الصحي	10.4	2020

المنجز	الوحدة	العنصر
211	كلم	الطرق والمساكن
54924	عائلة	الماء الصالح للشرب
2743	عائلة	التنوير الريفي
4516	منتفع	تحسين المسكن
1761	منتفع	موارد الرزق
1294	منتفع	التكوين المهني

## برنامج التنمية المندمجة

عدد المعتمديات	المؤشرات	الكلفة (أ.د.)
4	برنامج التنمية المندمجة القسط الأول : (الرديف : 5067.3 أ.د، أم العرائس 4790 أ.د، المتلوي 4852 أ.د والرديف 4465 أ.د)	19175.3
6	برنامج التنمية المندمجة القسط الثاني : قفصة الجنوبية 5089.8 أ.د، القصر 5588.1 أ.د، قفصة الشمالية 5187.7 أ.د، سيدي عيش 5663 أ.د، السند 5565.1 أ.د وبلخير 5011.8 أ.د)	32105.5
3	برنامج التنمية المندمجة القسط الثالث : (القطار 10000 أ.د، زانوش 10000 أ.د وسيدي بوبكر 10000 أ.د)	30000
13	المجموع	81279.8



# مشاريع تم إنجازها :

## . القسط الأول :

- منطقة حرفية بام العرائس بكلفة 495 أ.د.
- احداث بئر عميقة القرار 2 بأم العرائس بكلفة 206 أ.د.
- احداث 3 مناطق سقوية 939 أ.د ( أم العرائس : هنشير القلال 50 هك بكلفة 150 أ.د، والرديف : تبديت 35 هك بكلفة 289 أ.د)
- تهيئة ملاعب احياء (أم العرائس، الرديف، سيدي بوبكر والمظيلة) بكلفة 334 أ.د.
- توسعة فضاء مسرح الهواء الطلق بالمظيلة بكلفة 113 أ.د.
- تهيئة وتجميل قرية تلمين : 363 أ.د.
- تهيئة طرقات داخل قرية الصابرية 2,1 كلم : 280 أ.د.
- تنوير عمومي بمنطقة الصابرية: 100 أ.د.
- تهيئة منطقة صناعية بالصابرية الشرقية: 1400 أ.د.



# مشاريع تم إنجازها :


## . القسط الثاني :

- احداث آبار عميقة (بلخير : بئر زمور، بئر أولاد زايد وبئر اولاد بلحسن، قفصة الجنوبية : بئر حفرة السدر، بئر العضلة الحمراء والقصر بئر الروابح) بكلفة 1645 أ.د.
- تهيئة وتعبيد مسالك فلاحية (قفصة الشمالية، سيدي عيش، السند وبلخير) بكلفة 3513 أ.د.
- تهيئة وتعبيد طرقات بلدية (قفصة الجنوبية، القصر والسند) بكلفة 3002.8 أ.د.
- تطهير وتصريف مياه الامطار بالقصر بكلفة 370 أ.د.
- التنوير العمومي : (قفصة الجنوبية، القصر والسند) بكلفة 433 أ.د.
- تهيئة ملعب حي سيدي عيش بكلفة 107 أ.د.




# برنامج مقاومة الإرهاب

الإعتمادات المحالة		المعتمديات	
نسبة الدفع	نسبة التعهد		الكلفة (م.د.)
2827	2827	3000	أم العرائس
			الريديف
			سيدي بوبكر



# متابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية

---



## جلسات العمل الوزارية

- المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 15 ماي 2015
- المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 18 مارس 2018
- المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 08 جانفي 2019





## 1- العدد الجملي للقرارات

تاريخ الجلسة			المجالس الوزارية
08 جانفي 2019	18 مارس 2018	15 ماي 2015	
16	105	66	القرارات
187			المجموع

## 2- متابعة تنفيذ القرارات

حالة التنفيذ			تاريخ الجلسة
لم تنفذ	بصدد التنفيذ	أنجزت	
11	26	29	15 ماي 2015
76	26	3	18 مارس 2018
16	-	-	08 جانفي 2019
103	52	32	المجموع

# أهم القرارات التي لم تنجز



نص القرار	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة
دراسة إنجاز معبر حدودي بعقلة إحمد	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية / وزارة الدفاع الوطني / وزارة المالية	صعوبات في التنفيذ	انتظار قرار اللجنة العليا التونسية الجزائرية، بعد أن تم توجيه ملف إلى وزارة الشؤون الخارجية قصد ادراج المشروع ضمن جدول أعمال اللجنة العليا التونسية الجزائرية (متابعة المشروع على مستوى مركزي).
إنجاز مشروع تهذيب 8 أحياء شعبية بكلفة 33 م.د بكل من : 1- مندره بالقصر : 4 م.د 2- النور بقفصة : 7 م.د 3- حي إخوة العبيدي بالقطار: 4 م.د 4- حي السعادة بالمتلوي : 6 م.د 5- حي سيدي يعيش: 3 م.د 6- حي بلخير : 4 م.د 7- حي النورة بالسند : 3 م.د- 8- حي الشباب: 2 م.د	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	صعوبات في التنفيذ	مدرجة في المخطط التنموي 2016-2020 في انتظار توفير التمويل

# أهم القرارات التي لم تنجز

نص القرار	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة
إنجاز معهد عالي للرياضة والتربية البدنية.	وزارة الشباب والرياضة / وزارة التجهيز والإسكان والتهنية الترابية	صعوبات في التنفيذ	تعمل انجاز المشروع تبعا للاعتراض على المناظرة المعمارية حيث طالبت هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية اعادتها. المشروع في مرحلة إعادة المناظرة كلفة المشروع 19.2 م د. تمت مراسلة رئاسة الحكومة من قبل السيد والي قفصة بتاريخ 2018/05/08 وطلب إعداد مقرر لتفويض وزارة التجهيز للإشراف على المشروع
تحويل صندوق تأهيل وتنمية المناطق المنجمية إلى مؤسسة مالية جهوية تساهم في تمويلها "شركة فسفاط قفصة".	وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة / وزارة المالية	صعوبات في التنفيذ	المتابعة على مستوى مركزي
إنجاز مشروع القطب التكنولوجي بكلفة 99 م.د وذلك خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 2015 و2017.	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة /	بطء في الانجاز بمختلف المراحل نظرا لتعدد المتدخلين رغم مساعي التنسيق جهويا و وطنيا	* - صدور أمر الانتزاع لفائدة الدولة بمساحة 26 هك وتسجيل قطعة المساحة 62 هك لفائدة القطب، وتم تقدير قيمة التعويضات ب 175. أ.د. مودعة بالخزينة في انتظار التسوية، - انطلقت شركة القطب في الاجراءات الادارية والقانونية والدراسات الاولية، - تم الانطلاق في إعداد مثال التهيئة التفصيلي، - بالاتفاق مع وزارة الدفاع شرعت شركة القطب في بناء السور الفاصل بين الثكنة العسكرية والمطار وموقع المشروع بتكلفة 800.أ.د. وبلغت نسبة تقدم الأشغال 60% بالنسبة للسور، - تغيير الصبغة : تمت المصادقة الأولية على تبديل الصبغة (النشر بمركز ولاية قفصة) - في انتظار توفير الاعتمادات اللازمة في الغرض

# أهم القرارات التي لم تنجز

نص القرار	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة
إحداث مركز إقليمي للإصابات البليغة والحروق	وزارة الصحة العمومية	لم ينجز	دعوة وزارة الصحة لإعداد برنامج وظيفي وتعيين مكاتب دراسات
معالجة إشكاليات المصابات العشوائية وإحداث مشروع المصعب المراقب ومرطز التحويل بالولاية بكلفة 17 م.د.	وزارة البيئة	لم ينجز	صعوبات في توفير التمكويل
إنجاز الطريق السيارة قفصة جلمة تونس	دعوة الوزارة المعنية للتسريع في إيجاد التمويلات اللازمة	لم ينجز	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية



# أهم المؤشرات التنموية


# مؤشرات النوع الاجتماعي



النسبة		المؤشر	
وطني	قفصة		
% 15.3	27.3	البطالة العامة	البطالة
% 30.3	60.4	بطالة حاملي الشهادات العليا	


%19.27	21,5	نسبة الأمية
--------	------	-------------

%15.2	30.9	نسبة الفقر
%61.40	71,1	الصرف الصحي



# أهم الإشكاليات التّتمويّة

# الإشكاليات التنموية



- اقتصاد جهوي غير ديناميكي وغير مندمج في محيطه وغير متوازن بين معتمدياته ولا يثمن الميزات التفاضلية للجهة
- ضعف النسيج الاقتصادي وعدم تمكن الجهة من القطع مع أحادية اقتصادها (القطاع المنجمي وهو ما نتج عنه صعوبات في القدرة على استيعاب طلبات الشغل)
- غياب محيط أعمال محفز نتيجة ضعف اقتصاد الجهة وعزلتها على محاور النمو وعلى المراكز الاقتصادية الكبرى
- نقص التجهيزات والفضاءات الكفيلة بتشجيع الباعثين والمستثمرين على الانتصاب بمعتمديات الولاية (الطرق العصرية، شبكة السكة الحديدية، المنطقة اللوجستية، المناطق السياحية والصناعية)
- ضعف المخزون العقاري وطول وتشعب الإجراءات المتعلقة بتحويل الملكية واستبدال صبغة الأراضي وعدم تمثيلية بعض الإدارات الجهوية
- غياب المشاريع الاستثمارية الكبرى التي بإمكانها المساهمة في حل إشكالية التشغيل ونقص الاستثمار الخارجي المباشر
- ارتفاع نسبة البطالة مقارنة بالمستوى الوطني وخاصة لدى حاملي شهادات التعليم العالي





# آفاق التنمية



# الأهداف والرؤية المستقبلية للتنمية

- قفصة قطب اقتصادي متنوع وديناميكي يقوم على إنتاج فلاحي وصناعي وسياحي ذا جودة عالية
- شبكة طرقات عصرية مستغلة كل الفرص المتاحة لجعل قفصة وجهة تكنولوجية وعلمية وثقافية وصحية بالجنوب الغربي
- تطور أساليب إنتاج الفسفاط باعتماد الطاقات المتجددة وترشيد استغلال المياه تصبح قفصة بيئة سليمة وملائمة للحياة
- خدمات اجتماعية عالية الجودة في مجال الصحة والتعليم والتكوين وموارد رزق للجميع

# الإستراتيجية التنموية

## إستراتيجية التنمية بولاية قفصة

العمل على  
تحقيق  
أهداف  
التنمية  
البشرية  
والإجتماعية

تعزيز  
ومضاعفة  
الدور الذي  
تقوم به  
الدولة في  
مجالات  
تطوير البنية  
الأساسية  
وتحسين  
مناخ  
الأعمال

تحقيق الحد  
الأقصى من  
القيمة  
المضافة  
والجودة  
العالية


الاستغلال  
الأمثل  
للموارد  
والإمكانيات  
المتوفرة

## تطلعات ولاية قفصة



- التسريع بإنجاز المشاريع المهيكلّة كربط الولاية بالغاز الطبيعي وإحداث المستشفى الجامعي والقطب التكنولوجي والمنطقة اللوجستية
- مواصلة تهيئة المناطق الصناعية وتعميمها بأغلب معتمديات الولاية وربطها بكل الشبكات (الكهرباء، الغاز الطبيعي، التطهير...)
- جعل ولاية قفصة وجهة سياحية هامة بإحداث مسالك سياحية متكاملة تربط جميع المواقع الأثرية والطبيعية والإيكولوجية وتثمين وتسويق المنتج السياحي الذي يميز الولاية
- بعث مناطق سياحية وفضاءات ترفيهية واستشفائية وتوسيع وإحداث متاحف لمختلف المنتوجات التاريخية
- التوجه نحو السياحة الثقافية والإيكولوجية الداخلية والخارجية باستغلال الموروث الثقافي العريق والطبيعي الذي يميز ولاية قفصة كمعلم حضاري فريد
- وضع خطة للنهوض بترويج وتصدير الصناعات التقليدية

## تطلعات ولاية قفصة



- مزيد دعم تصدير الفسفاط والمنتجات الكيماوية والبحث عن أسواق جديدة
- الإسراع بإنجاز معرض قفصة كفضاء لدعم المنتج الجهوي والحرفي
- مزيد تعبئة وتوظيف الموارد المائية بحفر الآبار الاستكشافية وآبار المراقبة والاستغلال وتهيئة مصبات الأودية
- مواصلة العمل بتحسين ظروف استغلال المناطق السقوية بتجهيز الآبار العميقة وتعهد خزانات المياه وقنوات الري وصيانتها بما يساعد على إحكام استغلال الموارد المائية والرفع من مردودية الفلاحة المروية والترفيح في نسب التكثيف الزراعي واستصلاح بعض الواحات والمناطق السقوية القديمة
- معالجة إشكالية نقص الموارد المائية المخصصة للماء الصالح للشرب ببعض المناطق بالولاية مع ضرورة إعادة الشبكة وصيانتها وتمديدتها ببعض المناطق،

مع الشكر

## 1. توصيات زيارة اللجنة البرلمانية خلال زيارتها لولاية قفصة يوم 1 جوان 2018

في إطار زيارة لجنة التنمية الجهوية إلى ولاية قفصة، تم تقديم عرض تضمن تشخيصا عاما للوضع التنموي ونقدم فيما يلي ما تم رصده خلال هذه الزيارة الميدانية حيث تم التركيز على تفعيل قرارات المجالس الوزارية بتاريخ 15 ماي 2015 و 16 مارس 2018 و 08 جانفي 2019 وقرارات زيارة رئيس الجمهورية بتاريخ 14 جانفي 2017. وفي ما يلي جدول لأهم المشاريع التي تم التنصيص على تفعيلها:

التوصيات	المتابعة
. بناء مستشفى جامعي متعدد الاختصاصات صنف "أ" بقفصة بكلفة محينة 288م.د.	تم تحيين الاعتمادات المخصصة للمشروع بإضافة مبلغ 39 م د على ميزانية 2019 <b>في طور الدراسات</b>
إنجاز مشروع تهيئة مدرج الطائرات بمطار قفصة الدولي بكلفة 10 م.د.	تم انجاز تهيئة المدرج <b>إعادة برمجة الرحلات وتفعيل المطار ضمن رؤية استراتيجية</b>
مركز فحص فني للعربات بالمتلوي على 2 هك	صدر أمر تغيير صبغة الأرض. تم إبرام عقد تفويت لفائدة الوكالة الفنية للنقل البري. <b>الاسراع في الانجاز ضمن جدول زمني دقيق</b>
إنجاز معهد عالي للرياضة والتربية البدنية بكلفة 19.2 م.د.	تعطل انجاز المشروع تبعا للاعتراض على المناظرة المعمارية تم تفويض وزارة التجهيز لإعادة المناظرة والإشراف على المشروع. <b>الاسراع في الانجاز ضمن جدول زمني دقيق</b>
إحداث مركز تكوين وتدريب مهني بالمتلوي بكلفة 326.14 م.د.	المشروع بصدد الدراسة الهندسية : تم فسخ عقد الصفقة المبرم مع مجمع المهندسين الأول بعد انتهاء آجال اتمام الدراسات. في انتظار نشر طلب عروض جديد لتحديد مجمع المهندسين. <b>مشروع</b> <b>تأخر في الانجاز الاسراع في الاجراءات</b>
إحداث مركز تكوين وتدريب مهني ببلخير بكلفة 14 م.د. الولاية.	<b>النظر في امكانية اقتناء أرض من الخواص</b>
إعادة هيكلة مركز التكوين المهني بالقصر بالفضاء الحالي للمركز وفضاء خميسة تاكس سابقا بقفصة الجنوبية بكلفة 8.375 م.د.	في مراحل طلب العروض
ربط ولاية قفصة بالغاز الطبيعي	تعطل المشروع بمعتمدية المظيلة بمنطقة العكارمة 1 والعكارمة 2

<p>لأسباب عقارية، بالنسبة لمنطقة سيدي أحمد زروق انطلق استعمال الغاز بقية مناطق قفصة الجنوبية بصدد الإنجاز <b>مشروع متواصل بشكل عادي في انتظار ايجاد تسوية عقارية لمد الأنبوب إلى المظيلة</b></p>	<p>بكلفة 69 م.د : قفصة والمتلوي وأم العرايس على أن يتم العمل على حل الإشكاليات العقارية لمد الأنبوب إلى المظيلة .</p>
<p>تم تكوين لجنة قيادة لإعداد العناصر المرجعية للمسلك تضم السياحة، وكالة احياء التراث، المجلس الجهوي ومعهد الآثار . تم اقتراح مكونات المسلك السياحي من قبل الجهة وإحالتها الى وزير السياحة في شكل تقرير أولي. في انتظار دراسة الجدوى وتوفير الاعتمادات <b>دعوة وزارة السياحة لتبني المشروع واعتماد جدول زمني للإنجاز</b></p>	<p>المسلك السياحي</p>
<p>لم يتم ايجاد مستثمر جدي</p>	<p>بعث معمل إسمنت بمعتمدية القطار</p>
<p>تم الانطلاق في إعداد مثال التهيئة التفصيلي، بالاتفاق مع وزارة الدفاع شرعت شركة القطب في بناء السور الفاصل بين الثكنة العسكرية والمطار وموقع المشروع بتكلفة 800 أ.د. وبلغت نسبة تقدم الأشغال 60% بالنسبة للسور، تغيير الصبغة: تمت المصادقة الأولية على تبديل الصبغة (النشر بمركز ولاية قفصة)، في انتظار توفير الاعتمادات اللازمة في الغرض <b>دعوة وزارة الإشراف لتوفير الإعتمادات الضرورية لإنطلاق الأشغال.</b></p>	<p>إنجاز مشروع القطب التكنولوجي بكلفة 99 م.د</p>
<p>الموقع المبرمج للمشروع قرب المنطقة الصناعية العقيلة 2 على مساحة 5 هك مسواة صادر بها امر تغيير الصبغة تمت مراسلة وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية قصد تخصيص الأرض لفائدة المشروع تم تكوين لجنة قيادة للأطراف المحتملة للمساهمة في شركة انجاز المشروع (المجلس الجهوي، صندوق القروض، صندوق الودائع والأمانات المجمع الكيميائي، شركة فسفاط قفصة، FRDCM، القطب التموي واتحاد الصناعة والتجارة) أعدت اللجنة كراس شروط الخطوط المرجعية وكراس الشروط الادارية والمالية</p>	<p>فضاء المعارض (التكلفة التقديرية 10 م.د دون اعتبار كلفة الأرض)</p>



<p>الملف في انتظار تخصيص الاعتماد لانجاز دراسة الجدوى  <b>دعوة الأطراف المعنية للاسراع في الانجاز</b></p>	
<p>البحث عن قطعة أرض <b>(معطل)</b> في طور الدراسة وتوفير التمويل من  وزارة البيئة</p>	<p>مصعب مراقب</p>
<p><b>معطل</b>  انتظار قرار اللجنة العليا التونسية الجزائرية، بعد أن تم توجيه ملف إلى  وزارة الشؤون الخارجية قصد ادراج المشروع ضمن جدول أعمال اللجنة  العليا التونسية الجزائرية (متابعة المشروع على مستوى مركزي).</p>	<p>المعبر الحدودي "عقلة احمد"</p>

الجمهورية التونسية  
وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي  
ديوان تنمية الجنوب  
الإدارة الجهوية للتنمية بقفصة



# المشاريع العمومية التي تواجه صعوبات بولاية قفصة

جوان 2020

# 1- المشاريع العمومية المعطلة

المشروع	مكان المشروع	الكلفة (أ.د.)	نسبة الانجاز	أسباب التعطيل	الإجراءات المستعجلة المقترحة
<b>التجهيز والاسكان</b>					
<p>أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 1122 الرابطة بين مدينة المتلوي والطريق الجهوية 201 المؤدية الى ام العرائس (18 كم)</p> <p>أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 122 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 03 بمدينة المتلوي والطريق الجهوية 122 11 المؤدية الى أم العرائس (2,8 كم)</p>	المتلوي - أم العرائس	12604	67%	مشروع معطل في انتظار استكمال مد قنوات توزيع المياه من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وقد تم إبرام الاتفاق بين التجهيز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في شهر فيفري 2020 وفي انتظار رصد الشركة للاعتمادات الضرورية	التنسيق مع الشركة والتسريع بفتح الاعتمادات
	المتلوي				
إنجاز جسر بوادي المالح على الطريق الوطنية رقم 15 ن د 129 على طول 0,18 كلم	القصر	4501		توقف الأشغال بسبب الإشكالات العقارية وقد صدر الأمر الحكومي الخاص بالانتزاع بتاريخ 7 أكتوبر 2019	توفير اعتمادات الخاصة بالانتزاع
الطريق السيارة جلمة قفصة على طول 96 كلم	قفصة سيدي بوزيد	96000		المشروع في طور الدراسات	التسريع في رصد الاعتمادات للانطلاق في انجاز المشروع
تجميل مدخل مدينة قفصة	قفصة الجنوبية	123		تم إيقاف الدراسة من طرف المصالح الجهوية	
<b>الصحة</b>					
أشغال بناء قسم طب الاطفال ووحدة لطب الرضيع بالمستشفى المحلي بالمظيلة (تهيئة وصيانة وتوسعة الأقسام المتواجدة بالبنائية القديمة)	المظيلة	200		معطل: في انتظار فتح الاعتمادات	التسريع في رصد الاعتمادات للانطلاق في انجاز المشروع

المشروع	مكان المشروع	الكلفة (أ.د.)	نسبة الانجاز	أسباب التعطيل	الإجراءات المستعجلة المقترحة
مشروع المركز الجهوي لنقل الدم	قفصة الجنوبية	500		معطل: اشكالية عقارية غياب الرصيد العقاري	اقتراح برمجة توفير اعتمادات لشراء قطعة أرض
بناء فرع لمعهد الصحة والسلامة المهنية	الريفي	4000		لم ينطلق في انتظار توفير الأرض	
<b>التربية</b>					
بناء نواة مدرسة اعدادية	القصر	1 200		لم ينطلق بصدد البحث على قطعة أرض	اقتراح برمجة توفير اعتمادات لشراء قطعة أرض على حساب وزارة التربية (هنالك مقترحات من طرف خواص لدى المندوبية الجهوية للتربية)
بناء مدرسة ابتدائية بحي عمر بن سليمان	القصر	150		لم ينطلق بصدد البحث على قطعة أرض	اقتراح برمجة توفير اعتمادات لشراء قطعة أرض على حساب وزارة التربية (هنالك مقترحات من طرف خواص لدى المندوبية الجهوية للتربية)
<b>الثقافة</b>					
تهيئة المركب الثقافي ابن منظور وبناء نوادي اختصاص	قفصة الجنوبية	1350	90	معطل: بصدد فسخ الصفقة واعداد ملف استشارة في الغرض في انتظار إعلان طلب العروض لأشغال الخدمات المتبقية	توفير اعتمادات خاصة لإنجاز بقية الصفقة بكلفة تقارب 400 أ.د
<b>التعليم العالي</b>					
توسعة فضاءات التدريس بكلية العلوم	قفصة الجنوبية	1542	90	فسخ الصفقة في انتظار الإعلان على طلب العروض في الكميات المتبقية	توفير الاعتمادات في الكميات المتبقية للصفقة
<b>الطفولة</b>					
إحداث نادي أطفال	سيدي عيش	680		متعطل: في انتظار تسوية الوضعية العقارية	توفير اعتمادات لشراء قطعة أرض من قبل الخواص

المشروع	مكان المشروع	الكلفة (أ.د.)	نسبة الانجاز	أسباب التعطيل	الإجراءات المستعجلة المقترحة
<b>الشباب والرياضة</b>					
بناء قاعة للرياضات الجماعية	المتلوي	2366		تم فسخ الصفقة وإسنادها لمقاولات رشيد زيان وإعلان العروض في الكميات المتبقية	في انتظار فتح بقية اعتمادات الصفقة المقدرة بـ 500 أ.د
بناء قاعة ألعاب فردية بالمركز الشبابي بالمتلوي	المتلوي	750		تم فسخ الصفقة في انتظار طلب العروض في الكميات المتبقية	رصد الاعتمادات
<b>الشؤون الاجتماعية</b>					
تهيئة وتوسيع مقر قسم النهوض الاجتماعي	قفصة الجنوبية	911		لم تنطلق الاشغال نظرا لعدم تطابق الامثلة مع الموجود.	

## 2- قرارات المجالس الوزارية المعطلة

قرارات المجالس الوزارية بتاريخ 15 ماي 2015 و 18 مارس 2018 و 08 جانفي 2019 وقرارات زيارة رئيس الجمهورية بتاريخ 14 جانفي 2017.

القطاع	المشروع	الكلفة (أ.د.)	المتابعة	الحلول المقترحة
الصحة	. بناء مستشفى جامعي متعدد الاختصاصات صنف "أ" بقفصة	288000	بصدد إتمام مشروع بناء السور وتم اعداد ملف طلب العروض الخاص بالمصممين وإنجاز الدراسات والشركات المختلفة على ان لا تتجاوز جويلية 2020	التسريع في انجاز المشروع من قبل المصالح المركزية
	إحداث مركز إقليمي للإصابات البليغة والحروق		لم ينجز	دعوة وزارة الصحة لإعداد برنامج وظيفي وتعيين مكاتب دراسات
النقل الجوي	إنجاز مشروع تهيئة مدرج الطائرات بمطار قفصة الدولي	10000	تنشيط مطار قفصة- القصر ضمن رؤية استراتيجية بدعم من وزارة	التسريع في الإجراءات الإدارية

القطاع	المشروع	الكلفة (أد)	المتابعة	الحلول المقترحة
			السياحة وشركة فسفاط قفصة	
النقل البري	مركز فحص فني للعربات بالمتلوي على 2 هك		تم التقويت في قطعة أرض بقيمة 300 أد تم إبرام العقد	توفير اعتمادات الدراسات والأشغال
الرياضة	إنجاز معهد عالي للرياضة والتربية البدنية	19200	تعطل إنجاز المشروع تبعا للاعتراض على المناظرة المعمارية حيث طالبت هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية اعادتها. المشروع في مرحلة إعادة المناظرة كلفة المشروع 19.2 م د. -تمت مراسلة رئاسة الحكومة من قبل السيد والي قفصة بتاريخ 08/05/2018 وطلب إعداد مقرر لتفويض وزارة التجهيز للإشراف على المشروع -تم تحديد مكتب الدراسات	الإسراع في إنجاز المشروع من قبل المصالح المركزية
الغاز الطبيعي	ربط ولاية قفصة بالغاز الطبيعي بكلفة 69 م.د : قفصة والمتلوي وأم العرايس على أن يتم العمل على حل الإشكاليات العقارية لمد الأنبوب إلى المظيلة .	69000	تم اتفاق مبدئي بين الأطراف المتنازعة العكارمة 1 والعكارمة 2 على عدم تعطيل المشروع في محضر جلسة بتاريخ 2020/02/26 على ان يتم إنجاز مشروع الدراسات والأشغال خلال سنتين	المقترح التسريع في انطلاق الأشغال والدراسات لحاجة المنطقة الصناعية بالمظيلة للغاز الطبيعي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /	إنجاز مشروع القطب التكنولوجي	99000	- صدور أمر الانتزاع لفائدة الدولة بمساحة 26 هك وتسجيل قطعة الماسحة 62 هك لفائدة	دعوة وزارة الإشراف لتوفير الإعتمادات الضرورية لانطلاق الأشغال.

القطاع	المشروع	الكلفة (أد)	المتابعة	الحلول المقترحة
وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة			<p>القطب، وتم تقدير قيمة التعويضات ب. 175 أ.د. مودعة بالخزينة في انتظار التسوية،</p> <p>- انطلقت شركة القطب في الاجراءات الادارية والقانونية والدراسات الاولى،</p> <p>- تم الانطلاق في إعداد مثال التهيئة التفصيلي، بالاتفاق مع وزارة الدفاع شرعت شركة القطب في بناء السور الفاصل بين الثكنة العسكرية والمطار وموقع المشروع بتكلفة 800 أ.د.</p> <p>وبلغت نسبة تقدم الأشغال 60% بالنسبة للسور، تغيير الصبغة: تمت المصادقة الأولية على تبديل الصبغة (النشر بمركز ولاية قفصة)، في انتظار توفير الاعتمادات اللازمة في الغرض</p>	
البيئة	وإحداث مشروع المصب المراقب ومركز التحويل بالولاية بكلفة 17 م.د		<p>تم منح مساحة 32 هك لإنجاز مصب مراقب تمت تسوية الوضعية العقارية في انتظار تخصيص الاعتمادات اللازمة</p>	توفير الاعتمادات لانطلاق الأشغال



الجمهورية التونسية  
ولاية قفصة

القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيّق المخصّص لولاية قفصة والمنعقد بتاريخ 15 ماي 2015

قرارات الجلسة الاستثنائية للمجلس الجهوي للتنمية بولاية قفصة المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2018

القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيّق المخصّص لقطاع الفسفاط والأسمدة والمنعقد بتاريخ 8 جانفي 2019

جوان 2020



## ملاحظات:

- قرارات وزارية موجودة في المتابعة مع نفس الملاحظة تجدونها باللون الأصفر وهي: قرار عدد 9، 10، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 22، 26، 109، 110، 130 و 134
- قرارات مكررة 40 و 41 باللون الأخضر
- 58 و 60 نفس القرار باللون الأزرق
- 61 و 62 نفس القرار باللون الوردي

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	البرنامج
المجال الثقافي							
1	احداث مركب متحفى للمناجم بالمتلوي	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الشؤون الثقافية		دعوة مصالح وزارة الثقافة لإعداد برنامج وظيفي والتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز لتعيين مكاتب دراسات	لم يرد على الإدارة أي برنامج
2	احداث متحف للحضارات ما قبل التاريخ بالقطار	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الشؤون الثقافية		دعوة مصالح وزارة الثقافة لإعداد برنامج وظيفي والتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز لتعيين مكاتب دراسات	لم يرد على الإدارة أي برنامج
3	احداث مركبات ثقافية مندمجة بمعتمديات ام العرائس الرديف والمظيلة تحتوي على معهد موسيقى - مكتبة معلوماتية - مسرح - قاعة سينما - رواق فنون - قاعة متعددة الاختصاصات.. (الاستغلال من قبل حاملي الشهادات عن طريق اللزما).	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الشؤون الثقافية		دعوة مصالح وزارة الثقافة لإعداد برنامج وظيفي والتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز لتعيين مكاتب دراسات	لم يرد على الإدارة أي برنامج
4	إنجاز مشروع إحداث مسلك سياحي.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	المخطط القادم	وزارة الشؤون الثقافية / وزارة السياحة والصناعات التقليدية	صعوبات في التنفيذ	تم إعداد كراس شروط الدراسات وتم طلب توفير الإعتمادات اللازمة للدراسات من شركة فسفاط قفصة	

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	البرنامج
5	تهيئة المسلك السياحي لولاية قفصة.	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الشؤون الثقافية		دعوة مصالح وزارة الثقافة لإعداد برنامج وظيفي والتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز لتعيين مكاتب دراسات	لم يرد على الإدارة أي برنامج
6	تجديد المسيح الروماني بمعتمدية قفصة الجنوبية ودراسة اعادة تهيئة المدينة العتيقة بقفصة المدينة.	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الشؤون الثقافية		دعوة مصالح وزارة الثقافة لإعداد برنامج وظيفي والتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز لتعيين مكاتب دراسات	لم يرد على الإدارة أي برنامج
7	تهيئة المغاور الجبلية بالسند (الاستغلال من قبل حاملي الشهادات عن طريق اللزمة)	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الشؤون الثقافية		دعوة مصالح وزارة الثقافة لإعداد برنامج وظيفي والتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز لتعيين مكاتب دراسات	لم يرد على الإدارة أي برنامج
المجال الصحي							
8	تدعيم الجهة بأطباء الاختصاص والتجهيزات الصحية	ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الصحة العمومية	بصدد التنفيذ		
9	إحداث مركز صحي وسيط بالقصر.	م. وازي. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الصحة العمومية / وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	منجز	في طور الاستغلال (يوجد في متابعة المشاريع العمومية)	تم انجازه

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
10	إنجاز مشروع تهيئة المستشفى المحلي بالقطار المرسم على ميزانية 2011 بكلفة 450 أ.د، بما في ذلك بناء وحدة لتصفية الدم.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الصحة العمومية / وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	منجز	تم القبول الوقي بالنسبة للمستشفى بتاريخ 2017/2/13 ما تم القبول النهائي للمشروع بتاريخ 2018/5/31 بتكلفه جمالية تقدر ب 0.405 م د تقدم الإنجاز 55 % بالنسبة لوحدة تصفية الدم بتكلفه جمالية تقدر ب 0.553 م د (يوجد في متابعة المشاريع العمومية)	بصدد انجاز وحدة تصفية الدم
11	تركيز وحدات للإسعاف الطبي الاستعجالي بكل من السند وأم العرائس والقطار	مشاريع عمومية تم التعهد بها خلال ج. !. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الصحة العمومية		دعوة وزارة الصحة لتركيز الوحدات	
12	تدعيم أسطول السيارات بالمستشفى الجهوي بالمتلوي ب: • 02 سيارتي اسعاف. • 01 سيارة إدارية. • 01 شاحنة.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الصحة العمومية	منجز		
13	اقتناء 8 سيارات إسعاف وتجهيزات طبية وآلة مفراس للمستشفى الجهوي بالمتلوي بكلفة جمالية ب 3.8 م.د بمساهمة "شركة فسفاط قفصة".	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الصحة العمومية	منجز		
14	تهيئة أقسام العمليات وأمراض النساء والتوليد وطب الأطفال بالمستشفى الجهوي بالمتلوي على أساس اختبار يجرى في الغرض.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الصحة العمومية / وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	في مرحلة اسناد الصفقة	بصدد التنفيذ 50 % نسبة تقدم الاشغال	بصدد التنفيذ

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
15	إحداث وحدة إنعاش وإسعاف طبي بالمستشفى الجهوي بالمتلوي.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الصحة العمومية	في طور الدراسة	تمت المصادقة على الدراسة الفنية (يوجد في متابعة المشاريع العمومية)	
16	احداث وحدة للإسعاف الطبي الاستعجالي بالمتلوي بكلفة 200 أ.د.	ج. إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الصحة العمومية	بصدد التنفيذ	في إنتظار فتح إعتمادات إضافية (يوجد في متابعة المشاريع العمومية)	
17	احداث قسم للإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بالمتلوي	ج. إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الصحة العمومية	بصدد التنفيذ	(يوجد في متابعة المشاريع العمومية)	
18	تفعيل القرار الوزاري القاضي بإحداث وحدة للإسعاف الطبي الاستعجالي بالمتلوي	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج. إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الصحة العمومية		دعوة وزارة الصحة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القرار (يوجد في متابعة المشاريع العمومية)	
19	إحداث قسم للإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بالمتلوي	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج. إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الصحة العمومية		دعوة وزارة الصحة لإعداد برنامج وظيفي وتعيين مكاتب دراسات (يوجد في متابعة المشاريع العمومية)	
20	تدعيم المستشفى المحلي بالمظيلة بسيارة إسعاف.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الصحة العمومية	منجز		

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
21	تطوير المستشفى المحلي بالمظلية إلى مستشفى جهوي صنف "ب".	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الصحة العمومية / وزارة التجهيز والإسكان والهيئة الترابية	منجز	- نسبة تقدم الأشغال: 100 % تم القبول الوقي بتاريخ 15 جوان 2017. في انتظار قرار التحويل (يوجد في متابعة المشاريع العمومية)ل.	تم الانجاز
22	تطوير المستشفى المحلي بالمظلية الى مستشفى جهوي قبل موفى 2018.	ج. إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الصحة العمومية		(يوجد في متابعة المشاريع العمومية)	تم الانجاز
23	إحداث دائرة صحية ببلخير.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الصحة العمومية	منجز		
24	تجهيز المستشفى المحلي ببلخير بآلات الكشف والتحليل وتجهيز مخبر التحاليل الطبية.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الصحة العمومية	منجز		
25	تعزيز وتدعيم القطاع الصحي بالجهة بالمشاريع والتجهيزات التالية: تعهد وصيانة مركز الصحة الأساسية بالعياشة المركز ببلخير.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الصحة العمومية / وزارة التجهيز والإسكان والهيئة الترابية	منجز	تقدم الإنجاز 100 %	تم الانجاز
26	تطوير مركز الصحة الأساسية بسيدي عيش إلى مستشفى محلي.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الصحة العمومية / وزارة التجهيز والإسكان والهيئة الترابية	منجز	تم استكمال انجاز الأشغال بنسبة 100 % في جوان 2015. وفي انتظار توفر الاطار الطبي و الشبه الطبي (يوجد في متابعة المشاريع العمومية)	تم الانجاز
27	الانطلاق في إنجاز أشغال مشروع بناء مستشفى جامعي متعدد الاختصاصات صنف "أ" بقفصة بكلفة محينة 160م.د في بداية سنة 2016 والشروع في الاستغلال خلال سنة 2018.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الصحة العمومية / وزارة التجهيز والإسكان والهيئة الترابية	في طور الدراسة	تمت ضبط برنامج لتعيين المصممين وإنجاز الدراسات وإعداد ملف طلب العروض من جانفي 2019 الى غاية جويلية 2020 وقد تم تعيين فريق المصممين منذ 11 نوفمبر 2019 كما انطلقت أشغال تهيئة المحيط الخارجي يوم 5 اوت 2019 وبلغت نسبة تقدم الاشغال 90 وفي إنتظار تحويل إتمادات لتغيير خط كهربائي.	

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
28	الانطلاق في انجاز المستشفى الجامعي المتعدد الاختصاصات بداية من جانفي 2019	ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الصحة العمومية	بصدد التنفيذ		نفس القرار عدد 27
29	إحداث مركز إقليمي للإصابات البليغة والحروق	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الصحة العمومية		دعوة وزارة الصحة لإعداد برنامج وظيفي وتعيين مكاتب دراسات	
30	تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الأدوية شمال الولاية	ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الصحة العمومية	بصدد التنفيذ		
31	رصد اعتمادات تفوق 950 ألف دينار لدعم التجهيزات الطبية بالجهة.	م. وزارتي. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الصحة العمومية	منجز		
32	تركيز وحدة للكشف بالرنين المغناطيسي IRM	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الصحة العمومية		دعوة وزارة الصحة لإنجاز المطلوب	
33	تدعيم الجهة بأطباء الاختصاص والأطباء العامين	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ. م. جهوي		وزارة الصحة العمومية		دعوة وزارة الصحة لإنجاز المطلوب	

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
		بتاريخ 16 مارس 2018					
34	تزويد الجهة بالتجهيزات الثقيلة التالية : Tables télécommandé ; - échographies ; respirateurs respirateur de ; d'anesthésie réanimation ; respirateur de transport ; moniteurs desurveillance, fibro gastroscope adulte et pédiatrique ; autoclaves pour ; blocsopératoires Tables d'opérations	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الصحة العمومية		دعوة وزارة الصحة لإعداد برنامج وظيفي وتعيين مكاتب دراسات	
35	تدعيم اسطول السيارات ب4 سيارات و4 رباعية الدفع	ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الصحة العمومية	منجز	منجز	
36	تدعيم أسطول سيارات الإسعاف بعدد 04 سيارات صنف ب لفائدة أقسام الاستعجالي بسيدي يعيش وزانوش والمستشفى الجهوي بقفصة و عدد 04 سيارات رباعية الدفع	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الصحة العمومية		دعوة وزارة الصحة لإنجاز المطلوب	
37	تهيئة وتوسعة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي حسين بوزيان قفصة	ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الصحة العمومية	بصدد التنفيذ		



العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
38	تهيئة وتوسعة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بقفصة	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الصحة العمومية		دعوة وزارة الصحة لإعداد برنامج وظيفي وتعيين مكاتب دراسات	
39	تدعيم المستشفيات الجهويين بقفصة والمتلوي بالتي ترقيم الصور الطبية عالية الجودة Système de numérisation d'image HD	م. وزارتي. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الصحة العمومية	منجز		
40	تحويل مركز الصحة بمنزل ميمون من صنف 2 الى صنف 4 بكلفة 450 أ.د.	ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الصحة العمومية		وجود إشكال عقاري قرار مكرر	
41	تحويل مركز الصحة الأساسية بمنزل ميمون من صنف 2 الى صنف 4	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الصحة العمومية		دعوة وزارة الصحة لإعداد برنامج وظيفي وتعيين مكاتب دراسات	
42	تدعيم المستشفيات المحلية ببلخير/القطار/المظيلة/ السند/الرديف/سيدي بوبكر بالآت ترقيم الصور الطبية متوسطة الجودة Système	م. وزارتي. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الصحة العمومية	منجز		

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	البرنامج
	denumérisation d'image .MD						
43	إنجاز دراسة حول التأثيرات البيئية والصحية الناجمة عن نشاط قطاع الفسفاط ومشتقاته وخاصة بمعدميات الحوض المنجمي والمظلية.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الصحة العمومية / وزارة البيئة والتنمية المستدامة	في طور الانجاز	تم إعداد الضوابط المرجعية لهذه الدراسة من قبل مصالح وزارة الصحة (إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط) بالتنسيق مع مصالح وزارة البيئة والتنمية المستدامة (الوكالة الوطنية لحماية المحيط) وقد تكفلت وزارة البيئة والتنمية المستدامة برصد التمويلات اللازمة ضمن ميزانيتها لإنجاز الوزارة المذكورة.	
44	فتح 5 خطط لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في اختصاصات طب القلب/ الإستعجالي / جراحة الأطفال/جراحة القلب/ طب النساء والتوليد.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الصحة العمومية	منجز		
المرأة و الطفولة							
45	تعميم إحداث مؤسسات طفولة بالمعتمديات التي تخلو من المؤسسات التابعة للوزارة: معتمدية سيدي بوبكر. معتمدية زانوش. معتمدية قفصة الشمالية (الشبيبة).	مشاريع عمومية تم التعهد بها خلال ج. إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة المرأة والطفولة / وزارة التجهيز والإسكان والهيئة الترابية		دعوة مصالح وزارة المرأة والطفولة لإعداد برنامج وظيفي والتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز لتعيين مكاتب دراسات	لم يرد على الإدارة أي برنامج
قرارات لفائدة البلديات							
46	تعزيز أسطول الشاحنات لنقل الفضلات واقتناء معدات النظافة لفائدة البلديات (5.4 م.د) بتمويل من "شركة فسفاط قفصة".	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة / وزارة الداخلية	منجز		

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
47	إحداث بلدية جديدة بكل من لالة ( في إطار تقسيم بلدية القصر) وبلخير.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الداخلية	منجز	في طور النشاط	
48	إحداث معتمدية جديدة بكل من زانوش وسيدي بوبكر.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الداخلية	منجز	في طور الاستغلال	
مجال الاتصالات							
49	بناء مراكز العمل عن بعد ومراكز النداء بمختلف معتمديات الولاية التي تفتقر لذلك	مشاريع عمومية تم التعهد بها خلال ج. إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الاتصالات		دعوة وزارة الاتصالات لإعداد برامج وظيفية والتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجهيز لتعيين مكاتب دراسات	وكالة الاتصال لها استقلالية في الدراسات والتنفيذ
مجال لإستثمار والتنمية							
50	إنجاز أشغال مشروع تنمية الشريط الحدودي خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 إلى سنة 2020 وبكلفة تقدر بـ 17 م.د	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	المخطط القادم	وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي	منجز	برنامج سنة 2016 -حفر بئر عميقة بأولاد القبلي(500م): تم فتح الإعتمادات الضرورية 622,120 أ.د وقد تمت مراسلة المقاوله للمشروع في الإنجاز أو فسخ الصفقة . - دراسة تهيئة 30 كلم من المسالك الفلاحية (72,3296 أ.د) : انتهت الدراسة في شهر أفريل 2017. برنامج الاستعمالات لسنة 2017 - تهيئة وتعبيد 11,2 كلم من المسالك الفلاحية بكلفة 1329 أ.د تقدم الإنجاز 60%. - تم فتح إعتمادات التعهد في 18-5-2017 لحفر بئر عميقة بالقالب الأبيض من معتمدية ام العرائس وبئر بالظهيره بالرديف بكلفة 3,870 أ.د وحاليا في انتظار انطلاق الأشغال.	

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	البرنامج
مجال البيئة والتطهير							
51	إنجاز مشاريع تطهير لفائدة 11 حي شعبي مدرجة ضمن البرنامج الخامس لتطهير الأحياء الشعبية والمتمثلة في: رأس الكاف3 بقفصة وعمر بن سليمان والشبيبي بلالة والغزالة والحلو بالقصر والكائنة والنهوض بالمتلوي وبرج العكارمة والعكارمة وأولاد وهيبة والشباب بالمظيلة، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2015 وسنة 2018 وبكلفة جملية تقدر بحوالي 3.8 مليون دينار.	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة البيئة والتنمية المستدامة / ديوان التطهير	في طور الانجاز	*- رأس الكاف3 بقفصة فرز العروض - عمر بن سليمان والشبيبي بلالة تم إحالة ملف فرز العروض إلى اللجنة العليا للصفقات للموافقة وإبرام الصفقة . - الغزالة والحلو بالقصر انتهت الأشغال وبصدد القبول الوقي. - الكائنة والنهوض بالمتلوي بعد فض الاشكال العقاري بمحطات الضخ ، تم إرسال ملف طلب العروض إلى لجنة الصفقات وسيقع نشر طلب العروض خلال الثلاثي الاول لسنة 2020 - الشباب بالمظيلة انتهت الأشغال -وبرج العكارمة وأولاد هيبة. بالمظيلة تم إحالة ملف فرز العروض إلى اللجنة العليا للصفقات للموافقة وإبرام الصفقة	
52	إنجاز مشروع تطهير مدينة القطار بكلفة جملية تقدر بحوالي 10 مليون دينار مموله في إطار رسكلة الديون مع البنك الألماني للتنمية، وذلك من خلال: - تدعيم شبكة التطهير ومنظومة تحويل المياه المستعملة بالمدينة 25 كلم من القنوات وربط 2800 مسكن بالشبكة العمومية للتطهير. على أن تنطلق الأشغال خلال شهر نوفمبر 2015 وعلى امتداد 15 أشهر. -إنشاء محطة تطهير، مع	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة البيئة والتنمية المستدامة / ديوان التطهير	في طور الانجاز	*- تدعيم شبكة التطهير ومنظومة تحويل المياه المستعملة بمدينة القطار: الأشغال متواصلة لإنجاز محطة التطهير . تم تعيين مكتب دراسات للمساندة الفنية SCET Tunisie - إنشاء محطة التطهير بمدينة القطار: نسبة تقدم الأشغال: 40 %	

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
	الانطلاق في الأشغال خلال الثلاثية الأولى من سنة 2016.						
53	معالجة إشكاليات المصبات العشوائية وإحداث مشروع المصب المراقب ومركز التحويل بالولاية بكلفة 17 م.د.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	المخطط القادم	وزارة البيئة والتنمية المستدامة / ديوان التطهير	صعوبات في توفير التمويل	في طور الدراسة وتوفير التمويل من وزارة البيئة	
54	إنجاز منظومتي تحويل ومحطة تطهير لفائدة مدينتي الرديف وأم العرايس مع تهذيب وتوسيع الشبكة بكلفة 44 م.د.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	المخطط القادم	وزارة البيئة والتنمية المستدامة / ديوان التطهير	مراحل طلب العروض	بصدد فرز العروض الخاص باختيار المقاولون الذين سيشاركون بالمناقسة (Pré qualification) تبعا لاختيار الممول KFW	
55	انجاز المصب المراقب ومراكز التحويل	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج. إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة البيئة والتنمية المستدامة / ديوان التطهير	بصدد التنفيذ	إقرار تخصيص مبلغ في حدود 500 أ.د. لانطلاق دراسات المصب المراقب ومراكز التحويل في اطار المسؤولية المجتمعية لشركة فسفاط قفصة تجاه الجهة.	
56	إقرار مديرية الجنوب الغربي لليديوان الوطني للتطهير بقفصة	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج. إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة البيئة والتنمية المستدامة		تم اقرار المديرية في الهيكلة الجديدة المقترحة وهي على أنظار رئاسة الحكومة	

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	البرنامج
57	تزويد انهج صرف صحي بباب الرمل قفصة الجنوبية	مشاريع عمومية تم التعهد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة البيئة والتنمية المستدامة / ديوان التطهير		منجز	
مجال التجهيز والإسكان							
58	تدعيم الطريق الجهوية 123 من القصر قفصة الى المضيلة على طول 15 كلم بتكلفة تقدر بحوالي 11 مليار	مشاريع عمومية تم التعهد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		بصدد اعداد ملف طلب العروض على المستوى المركزي قرار مكرر	تم ادراجه ضمن المخطط الإدارة العامة للجسور والطرق
59	إنجاز الطريق السيارة قفصة جلمة تونس	ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	بصدد التنفيذ	الطريق السيارة قفصة تونس 385 كلم : دراسة المشروع ممولة من طرف البنك الأوروبي للاستثمار في شكل هبة للدولة التونسية 4 م يورو حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسات التمهيديّة الأولى والتفصيلية وملفات طلب العروض الأولى وهو حاليا في طور إعداد ملفات طلب العروض النهائية القسط الأولي تونس جلمة على طول 186 كلم بتقديرات 1660 م د وقد أنهى ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري الخدمات الطبوغرافية على الميدان وامتدّ الوزارة بكل الأمثلة القطعية والقائمت البيانية الخاصة بالمشروع كما تم اختبار كل القطع حيث تم عرض ملفات معتمديات بن عروس بئر مشاركة وزغوان والفحص والناظور وصواف والسبيخة وحفوز وحاجب العيون وجلمة على أنظار لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية وفي انتظار إعداد التقارير الختامية واستصدار أوامر الانتزاع. هذا ويحتوي المشروع على 8 أقساط 4 منها والتي تربط تونس بالسبيخة ممولة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وال4 المتبقية والتي تربط السبيخة بجلمة ممولة من طرف البنك الأوروبي للاستثمار وبعد ان تم الانطلاق في الإعلان عن طلب عروض تحرير الحوزة في 6 جوان 2018 من المؤمل ان تنطلق أشغال	إنجاز الطريق السيارة قفصة جلمة تونس

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	البرنامج
						فتح الحوزة العقارية في مارس 2019 على ان تنطلق اشغال انجاز الطريق على كافة الأقسام الـ 8 في الثلاثي الاول من سنة 2020 .	
60	تدعيم الطريق الجهوية 123 قفصة - المظيلة على طول 15 كم.			وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية			نفس القرار عدد 58
61	الانطلاق في الدراسات المتعلقة بالجزء الثاني من الطريق السيارة جلمة - قفصة والقصرين سنة 2016 .	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	المخطط القادم	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	في طور الدراسات	ألقسط الثاني جلمة سيدي بوزيد والقصرين وقفصة على طول 199 كلم بتقديرات 1540 م د ويتكون من : جلمة القصرين 59 كلم 580 م د جلمة سيدي بوزيد 44 كلم 522 م د سيدي بوزيد قفصة 96 كلم 960 م د حيث تم إعداد الدراسات التمهيدية والأولية والتفصيلية وملفات طلب العروض الأولية وحاليا في طور إعداد ملفات طلب العروض النهائية . قرار مكرر	نفس القرار 59
62	الانطلاق في التصفية العقارية لانجاز الطريق السيارة قفصة- جلمة مرورا بسيدي بوزيد والقصرين وجلمة والانطلاق في البحث عن التمويل لتصبح جاهزة سنة 2024.	ج. إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	بصدد التنفيذ	كما قام ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بعمليات البحث العقاري وقام بإنجاز الأشغال الطبوغرافية على الميدان وهو في طور إعداد الأمثلة القطعية والقوائم البيانية.	نفس القرار 59
63	إحداث فضاء للمعارض بمركز الولاية.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الداخلية / وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	صعوبات في التنفيذ	تم اعداد كراس الشروط والضوابط المرجعية : المشروع في مرحلة دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية وتوفير الاعتمادات وتكليف جهة الانجاز .	
64	دراسة إنجاز معبر حدودي بعقلة إحمد.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية / وزارة الدفاع الوطني / وزارة المالية	صعوبات في التنفيذ	انتظار قرار اللجنة العليا التونسية الجزائرية، بعد أن تم توجيه ملف إلى وزارة الشؤون الخارجية قصد ادراج المشروع ضمن جدول أعمال اللجنة العليا التونسية الجزائرية (متابعة المشروع على مستوى مركزي).	

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	البرنامج
65	البحث عن حلول لفتح المعبر الحدودي عقلة احمد.	ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	بصدد التنفيذ	والذي يعتبر متوقف بعد أن تم عرض الموضوع في إطار اللجنة العليا التونسية الجزائرية في انتظار موافقة الجانب الجزائري لإحداث المعبر وتحديد موقفه بناء للملف الموجه إلى وزارة الشؤون الخارجية	
66	تسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية المقامة على رسوم عقارية دولية. على أن يتم إنهاء المسح الطبوغرافي في غضون 6 أشهر.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية / وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية	في طور الانجاز	تم اجراء عمليات المسح الطبوغرافي الأولى وتم امضاء عقود مبدئية مع البلديات المعنية.	
67	تدخل الوكالة العقارية للسكنى في الحوض المنجمي	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		دعوة الوكالة العقارية للسكنى للتنسيق مع الإدارة الجهوية لأمولاك الدولة للتسريع في إنجاز المشروع	
68	إنجاز برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، بتدخل من وكالة التهذيب والتجديد العمراني في الـ 5 أحياء التالية: 1- حي الشباب ببلدية المتلوي، وذلك بكلفة تقدر بـ 5,685 م.د. ويشمل التدخل العناصر التالية: - بنية أساسية. - ملعب الحي والفضاء متعدد الاختصاصات والفضاء الصناعي. - تحسين السكن. 2- 3- حي السروروي المولى ببلدية قفصة منجز 100% 4- حي الثكنة ببلدية الرديف نسبة انجاز 100% 5- حي الكسيلة ببلدية أم العرائس بصدد الانجاز نهاية الأشغال فيفري 2020	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	تم الإنجاز 100%	1- بالنسبة لحي الشباب ببلدية المتلوي حوالي (5.6 م د) : يشمل التدخل العناصر التالية : - بنية أساسية (2.885 م د) : الطرقات : تم تحديد المقاول الماء الصالح للشرب : 100% التنوير العمومي : 100% تحسين السكن (0.3 م د) : 100% 2- 3- حي السروروي المولى ببلدية قفصة منجز 100% 4- حي الثكنة ببلدية الرديف نسبة انجاز 100% 5- حي الكسيلة ببلدية أم العرائس بصدد الانجاز نهاية الأشغال فيفري 2020	وكالة التجديد والتهذيب العمراني



العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
	تبلغ 8,75 م د. ويشمل التدخل العناصر التالية: - البنية الأساسية (برنامج أصلي). - برنامج توسعة للبنية الأساسية. - تحسين السكن. 4- حي الثكنة ببلدية الرديف: بكلفة 5,05 م د. ويشمل التدخل العناصر التالية: - البنية الأساسية. - ملعب الحي والفضاء متعدد الاختصاصات والفضاء الصناعي. - تحسين السكن. 5- حي الكسيلة ببلدية أم العرائس.						وكالة التجديد والتهديب العمراني
69	إنجاز مشروع تهديب 8 أحياء شعبية بكلفة 33 م.د بكل من : 1- مندره بالقصر: 4 م.د 2- النور بقفصة : 7 م.د 3- حي إخوة العبيدي بالقطار: 4 م.د 4- حي السعادة بالمتلوي : 6 م.د 5- حي سيدي يعيش: 3 م.د 6- حي بلخير : 4 م.د 7- حي النورة بالسند : 3 م.د- 8- حي الشباب: 2 م.د	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	المخطط القادم	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	صعوبات في التنفيذ	مدرجة في المخطط التنموي 2020-2024 في انتظار توفير التمويل وقد تم الإعلان عن طلبات عروض الدراسات .	وكالة التجديد والتهديب العمراني

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
70	تهيئة حي فرحات حشاد لالة : طرقات- تنوير- ماء صالح للشرب	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		دعوة مصالح وكالة التجديد والتهذيب العمراني لإعداد الدراسات	وكالة التجديد والتهذيب العمراني
71	تهيئة حي الشباب والنسيم وأولاد وهيبة والعمالي 2 بالمظيلة : طرقات- تنوير- ماء صالح للشرب	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		تم إدراجه ضمن برنامج التفاوت الجهوي بتمويل مشترك بين (صندوق القروض وبلدية المظيلة)	
72	تهيئة حي المغرب العربي بالردف : تطهير- طرقات- تنوير عمومي- ماء صالح للشرب	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		تم إدراجه ضمن برنامج التفاوت الجهوي بتمويل مشترك بين (صندوق القروض والبلدية)	
73	تهيئة حي سيدي حمد زروق بقفصة : تطهير- طرقات- تنوير عمومي- ماء صالح للشرب	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		دعوة مصالح وكالة التجديد والتهذيب العمراني لإعداد الدراسات	وكالة التجديد والتهذيب العمراني

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
74	تهيئة مدخل مدينة الرديف: الطريق الجهوية 201 على طول 4 كلم. بتكلفة تقدر ب4 مليار	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		دعوة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للإنطلاق في الدراسات	غير مبرمج
75	تهيئة مدخل مدينة المتلوي: الطريق الوطنية 3 من جهة توزر على طول 5 كلم. بتكلفة تقدر ب5 مليار	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		دعوة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للإنطلاق في الدراسات	مبرمج في اطار الصيانة الدورية لشبكة الطرق 2019 في انتظار توفر الاعتمادات
76	تهيئة مدخل مدينة قفصة القصر: الطريق الوطنية 3 الطريق الوطنية 15 على طول 5 كلم. بتكلفة تقدر ب5 مليار	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		دعوة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للإنطلاق في الدراسات	مبرمج في اطار الصيانة الدورية لشبكة الطرق 2019 على مستوى مدينة القصر ط و 15 ومقترح في نفس الاطار على مستوى مدينة قفصة ط و 3 برنامج سنة 2020
77	تهيئة مدخل مدينة ام العرائس: الطريق الجهوية 201 على طول 4 كلم. بتكلفة تقدر ب4 مليار	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	منجز	دعوة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للإنطلاق في الدراسات	غير مبرمج

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
78	تعبيد مدخل مدينة سيدي عيش على طول 23 كلم	مشاريع عمومية تم التعهد بها خلال ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		لن يتم انجازه ضمن مشروع تهذيب الطريق المحلية 901 وذلك لعدم توفر اعتمادات اضافية لانجازه.	
79	تكليف وزارة التجهيز بإنجاز بعض المشاريع الجهوية التي تشهد تعطلا على غرار المعهد العالي للرياضة.	ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	بصدد التنفيذ		مكرر للقرار 137
80	استكمال إنجاز الطريق الحزامية لمدينة قفصة وإتمام أشغال التنوير العمومي قبل موفي ماي 2015 بكلفة 17.86 م.د.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	منجز	تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 2017/11/2 على طول 9.1 كمبتكلفة تقدر ب 18.37 م د كما تم القبول النهائي	
81	استكمال أشغال الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين القطار وقفصة بكلفة 6.9 م.د. (2015).	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	منجز	تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 2015/11/17 على طول 16.8 كم بتكلفة تقدر ب 9.06 م د	
82	تدعيم الطريق الوطنية 15 من نك 138 الى نك 166.700 على طول 28.7 كلم الرابطة بين قفصة وحدود ولاية القصرين بتكلفة تقدر بحوالي 18 مليار	مشاريع عمومية تم التعهد بها خلال ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		بصدد اعداد ملف طلب العروض لدى المصالح المركزية	مدرج ضمن المخطط الإدارة العامة للجسور والطرق

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	البرنامج
83	إنجاز منحرج على مدينة قفصة يربط الطريق الوطنية 15 في اتجاه قابس الى الطريق الوطنية 03 باتجاه توزر مرورا على طريق الجهوية 123 بطول 14 كلم (غير مبرمج في المخطط تم اقتراحه	مشاريع عمومية تم التعهد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		دعوة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للإنطلاق في الدراسات	غير مبرمج
84	الطريق الحزامية 2 لمدينة قفصة والتي بصدد الدراسة حاليا على المستوى المركزي) بتكلفة تقدر بحوالي 12 مليار	مشاريع عمومية تم التعهد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية			الدراسة حاضرة بالإدارة العامة للجسور والطرق في انتظار التمويل
85	إنجاز منحرج على مستوى وسط مدينة قفصة على مستوى وادي بياش للتقليص من الاكتظاظ المروري يربط الطريق الحزامية بالطريق الوطنية 3 من جهة وبمطقة العقيلة من جهة اخرى بطول 10 كلم.(موجود داخل مثال التهيئة العمرانية بالمنطقة البلدية لقفصة - بصدد اعداد استشارة لدراسة الطريق باعتمادات المجلس الجهوي في حدود 200 أد)بتكلفة تقدر بحوالي 8.5 م.د	مشاريع عمومية تم التعهد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		قامت الإدارة بإعلان طلب عروض لدراسة إنجاز طريق حزامية على طول 5 كلم تحاذي الواحة ووادي بياش وقد تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 2019/04/26 وتم فتح العروض بتاريخ 2019/05/27 وإعداد تقرير تقييم العروض واحالته الى السيد والي قفصة بتاريخ 22 جويلية 2019 وقد انطلقت الدراسة خلال نهاية شهر جانفي 2020	

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
86	مسلك القويصلة - المزينتة - المظيلة يربط بين الطريق الوطنية 03 والطريق الجهوية 123 على طول 42 كلم بتكلفة تقدر بحوالي 26 مليار	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		تم اسناد الصفقة لمكتب الدراسات BCIC بمبلغ قدره 79.000.000 الف دينارو في انتظار توفر الاعتمادات من طرف المصالح المركزية	لدى المصالح المركزية
87	المسلك الرابط بين المظيلة الطريق الجهوية 123 والطريق الجهوية 103 المؤدية الى قبلي على طول 29 كلم منها 10 كلم معبدة والباقي ترابي. بتكلفة تقدر بحوالي 13 مليار	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		دعوة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للإنطلاق في الدراسات	غير مبرمج
88	مسلك الشارية المظيلة يربط بين الطريق الوطنية 03 والطريق الجهوية 123 على طول 15 كلم بتكلفة تقدر بحوالي 6 مليار	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	منجز	دعوة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للإنطلاق في الدراسات	غير مبرمج إنجاز بالخرسانة الاسفلتية وترقيمه
89	مسلك المتكيدس العمايمية سيدي عيش يربط الطريق الوطنية 15 والطريق المحلية 900 على طول 36 كلم بتكلفة تقدر بحوالي 20 مليار	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		دعوة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للإنطلاق في الدراسات	غير مبرمج تهذيبه وترقيمه

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
90	مسلك بلخير حوال الوادي يربط الطريق الوطنية 15 والطريق الجهوية 124 على طول 19 كلم بتكلفة تقدر بحوالي 11 مليار	مشاريع عمومية تم التعهد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		دعوة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للإنطلاق في الدراسات	غير مبرمج تهيئته وترقيمه
91	مسلك زانوش أولاد حمد بن سعد يربط الطريق الوطنية 14 والطريق الوطنية 03 على طول 22.5 كلم بتكلفة تقدر بحوالي 13 مليار	مشاريع عمومية تم التعهد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		دعوة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للإنطلاق في الدراسات	غير مبرمج تهيئته وترقيمه
92	مسلك المتلويثالجهة سقدود المتلوي: 30.7 كلم (مسلك به معابر مائية عديدة ومنها الكبير يتطلب الدراسة) بتكلفة تقدر بحوالي 13 مليار	مشاريع عمومية تم التعهد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		دعوة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للإنطلاق في الدراسات	غير مبرمج
93	مسلك سقدود الرديف: 12.5 كلم (الدراسة جاهزة بصدد التثبت من ملف طلب العروض) بتكلفة تقدر بحوالي 6 مليار	مشاريع عمومية تم التعهد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		توقف اشغال منذ 2019/11/15 في انتظار المصادقة على الملحق عدد 01	نسبة الإنجاز 80 % و قد تمت المصادقة على ملحق الصفقة وتوفير الاعتمادات الإضافية بقيمة 1.5 م. د.

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	البرنامج
94	مسلك تبيديت الرديف: 11 كلم (به معبر مائي كبير متضرر من جاء الفيضانات) بتكلفة تقدر بحوالي 4 مليار	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		دعوة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للإنطلاق في الدراسات	تم إدراج نجاز المعابر المائية ضمن مشروع إصلاح أضرار الفيضانات الذي هو بصدد اعداد تقرير تقييم العروض لتعيين المقولة
95	مسلك تبيديت ام العرائس: 10 كلم (به معابر مائية تتضرر من جلاء الفيضانات) بتكلفة تقدر بحوالي 3.5 مليار	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		دعوة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للإنطلاق في الدراسات	غير مبرمج
96	مسلك المتلوي الدبين السقي القبلي سقي الخمايلية المظيلة	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		دعوة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للإنطلاق في الدراسات	غير مبرمج
97	تعبيد المسالك الفلاحية الترابية بولاية قفصة و التي تفوق 2000 كلم بمعدل 50 كلم بكل معتمدية اي بطول جمالي 650 كلم .	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		دعوة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للإنطلاق في الدراسات	غير مبرمج



العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
98	انجاز العديد من المسالك الفلاحية.	ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	بصدد التنفيذ		غير مبرمج
99	تهيئة المسالك الريفية المبرمجة خلال سنوات 2012 و2013 على مسافة 52 كم والتي تغطي بعض مناطق الولاية بكلفة قدرها 11.3 م.دبتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية، على أن يتم الإعلان عن طلب عروض، في الغرض، خلال السداسية الثانية من سنة 2015.	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	تم الانجاز	القسط عدد 33: 100% بصدد القبول الوقي على الرغم من عدم توفير اعتماد اضافي في حدود 400 أد . القسط عدد 34 : 80 % تمت دعوة المقاوله لاستكمال اشغال مسلك عين سلطان بالطريق الوطنية 14 ماعدا الجزء المحاذي للسكة الحديدية واستانفت الاشغال في ديسمبر 2019	قسط 33 بصدد القبول الوقي وقسط 34 في طور اتمام الاشغال من المؤمل انتهائها موفى شهر مارس 2020
100	تعبيد وتهيئة وإنارة الطريق الحزامية السوالمية بأم العرائس	مشاريع عمومية تم التعهد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		دعوة الوزارة المعنية للتسريع في إيجاد التمويلات اللازمة	غير مبرمج تم اقتراحه في زيارة السيد الوزير في أكتوبر 2017
101	تهيئة الطريق المحلية 899 من نك 0 بالسند الى نك 29 بالفج بالطريق الوطنية 03 بطول 29 كم بتكلفة تقدر بحوالي 13 مليار	مشاريع عمومية تم التعهد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		دعوة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للإنطلاق في الدراسات	غير مبرمج تم اقتراحه في عديد المرات

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
102	تهيئة الطريق المحلية 900 من ن ك 21 بسيدي عيش الى ن ك 37 حدود معتمدية بن عون ولاية سيدي بوزيد بطول 16 كلم بتكلفة تقدر بحوالي 7.6 مليار	م.م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية		دعوة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للإطلاق في الدراسات	غير مبرمج
103	مشروع إقامة جسر بوادي الكبير على الطريق الوطنية رقم 15، في موفي جوان 2015 وبكلفة قدرها 6.6 م.د .	م.م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية			مكرر القرار 104
104	استكمال انجاز جسر وادي الكبير بعد تعيين مقاوله جديدة	ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	بصدد التنفيذ	بصدد الإنجاز بالرغم من تعطل الأشغال بسبب الإشكاليات العقارية في انتظار استكمال الملف العقاري حيث تم ارسال امثلة الإحالة والإرشاد مع محاضر التحديد وشهائد الملكية وكل الأمثلة القطعية ومحاضر إنجازها مع تقرير ختم الاعمال للجنة الاستقصاء والمصالحة بتاريخ 20 جوان 2018 الى الإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة لاستكمال باقي إجراءات الانتزاع ونقل الملكية وقد صدر امر الانتزاع في 28 ماي 2019 وتم الانتهاء من اجراءات النشر في 30 نوفمبر 2019 حيث تم احالة الملف لاملاك الدولة لاتمام باقي المراحل	تم اسناد صفقة إتمام الأشغال الى مجمع مقاولات بمبلغ 6.7 م د وانطلقت الأشغال منذ 30 مارس 2018 بلغت نسبة تقدم الأشغال 70%
105	بناء جسر على الطريق الوطنية رقم 3 على مستوى وادي المربطية.	ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	بصدد التنفيذ		غير مبرمج

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الزرنامة
106	تعلية الممر العلوي لسكة الحديدية على مستوى الطريق الجهوية 123 (يتبع السكة الحديد في علو 3.80 بما يمثل عائقا امام المنطقة الصناعية كما يمثل نقطة زرقاء بما ان الجسر عبارة عن منشأة مائية) بتكلفة تقدر بحوالي 10 م.د	مشاريع عمومية تم التعهد بها خلال ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التجهيز والإسكان والهيئة الترابية		تم اعداد الدراسة من قبل مكتب الدراسات BCIC واحالتها الى السيد والي قفصة والسيد معتمد القصورو في انتظار فتح الاعتمادات وحل الاشكالات الراجع لسكة الحديدية	غير مبرمج يتبع السكة
مجال التربية والتعليم							
107	تهيئة وصيانة المؤسسات التربوية بالجهة	ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التربية	بصدد التنفيذ	- تعهدت الوزارة بالإسراع بإتمام انجاز المشاريع المبرمجة لفائدة الجهة باعتبار رصد التمويلات اللازمة وتدعيم الإدارة الجهوية للتربية بالجهة بالموارد البشرية المختصة.	
108	تجهيزات تربوية	مشاريع عمومية تم التعهد بها خلال ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التربية		دعوة مصالح وزارة التربية لإعداد كراس الشروط للصيانة العامة للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة وصيانة قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة المجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة	
109	إنجاز مشروع بناء المدرسة الإعدادية "سيدي بوبكر" بأم العرايس المبرمج على ميزانية 2012 بكلفة 2.5 م.د.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة التربية	في طور الانجاز	بعد تعطل المقاوله الموكول لها الإنجاز في عديد المناسبات مما افضى الى فسخ الصفقة بتاريخ 2018/9/4 وتم الإعلان عن طلب العروض في مرحله أولى خلال شهر نوفمبر 2018 حيث لم يتم سحب أي ملف وفي مرحلة ثانية خلال شهر جانفي 2019 وافضت الى مشارك وحيد حيث تم فتح العروض بتاريخ 2019/02/27 حيث تمت المصادقة على مقترح اسناد الصفقة بمبلغ 3 م د (يوجد في متابعة المشاريع العمومية)	تم فتح الإعتمادات وفي طور إمضاء الصفقة

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
110	إنجاز مشروع بناء المدرسة الإعدادية بالقطار المبرمج على ميزانية 2009 بكلفة 1.2 م.د.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	المخطط القادم	وزارة التربية / وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	في طور الانجاز	حيث حالت دون الإنجاز عديد الإشكاليات العقارية والإدارية وقد تم أخيرا الانطلاق في انجاز الأشغال بتاريخ 18 فيفري 2019 بصفحة بمبلغ 2.46 م د باجال تنفيذ 350 يوما وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال 70 % غير ان الأشكال العقاري لا يزال يتسبب في توقف الأشغال وآخرها خلال شهر جانفي 2020 . (يوجد في متابعة المشاريع العمومية)	بصدد الإنجاز
111	المدرسة الإعدادية الأمل بالمتلوي	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التربية		دعوة مصالح وزارة التربية لإعداد كراس الشروط للصيانة العامة للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة وصيانة قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة المجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة	
112	المدرسة الإعدادية التقنية بقفصة	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التربية		دعوة مصالح وزارة التربية لإعداد كراس الشروط للصيانة العامة للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة وصيانة قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة المجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة	
113	معهد ابن منظور بالمتلوي	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التربية		دعوة مصالح وزارة التربية لإعداد كراس الشروط للصيانة العامة للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة وصيانة قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة المجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة	

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
114	معهد طريق توزر المتلوي	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التربية		دعوة مصالح وزارة التربية لإعداد كراس الشروط للصيانة العامة للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة المجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة	
115	معهد طريق قفصة المتلوي	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التربية		دعوة مصالح وزارة التربية لإعداد كراس الشروط للصيانة العامة للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة المجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة	
116	معهد عليم	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التربية		دعوة مصالح وزارة التربية لإعداد كراس الشروط للصيانة العامة للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة المجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة	
117	المدرسة الابتدائية المحطة بالمتلوي	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التربية		دعوة مصالح وزارة التربية لإعداد كراس الشروط للصيانة العامة للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة المجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة	

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
118	المدرسة الابتدائية حي الزهور بأم العرائس	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التربية		دعوة مصالح وزارة التربية لإعداد كراس الشروط للصيانة العامة للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة المجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة	
119	المدرسة الابتدائية المنجم 1 بأم العرائس	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التربية		دعوة مصالح وزارة التربية لإعداد كراس الشروط للصيانة العامة للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة المجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة	
120	المدرسة الابتدائية المنجم بالمظيلة	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التربية		دعوة مصالح وزارة التربية لإعداد كراس الشروط للصيانة العامة للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة المجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة	
121	المدرسة الابتدائية ساحة الجمهورية بالمتلوي	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التربية		دعوة مصالح وزارة التربية لإعداد كراس الشروط للصيانة العامة للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة المجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة	

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
122	المدرسة الابتدائية طريق توزر المتلوي	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التربية		دعوة مصالح وزارة التربية لإعداد كراس الشروط للصيانة العامة للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة المجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة	
123	المدرسة الابتدائية أولاد وهيبة بقفصة الشمالية	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التربية		دعوة مصالح وزارة التربية لإعداد كراس الشروط للصيانة العامة للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة المجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة	
124	المدرسة الابتدائية سيدي عيش المركز	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التربية		دعوة مصالح وزارة التربية لإعداد كراس الشروط للصيانة العامة للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة المجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة	
125	المدرسة الابتدائية باطن زانوش	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التربية		دعوة مصالح وزارة التربية لإعداد كراس الشروط للصيانة العامة للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة و صيانة قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة المجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة	

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
126	المدرسة الإبتدائية الزيتونة السند	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة التربية		دعوة مصالح وزارة التربية لإعداد كراس الشروط للصيانة العامة للقاعات : دهن ، نجارة، تكتيم أسطح . صيانة للساحة وصيانة قنوات الصرف الصحي، صيانة الشبكة الكهربائية ، صيانة المجموعات الصحية، صيانة قاعة الرياضة	
مجال التكوين المهني والتشغيل							
127	تأكيد العمل على تفعيل القرارات المتعلقة بإحداث مشاريع صغرى ومتوسطة والانتدابات في اطار عقد الكرامة	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	إجراءات أفقية	وزارة التكوين المهني والتشغيل / وزارة المالية /	بصدد التنفيذ	تم خلال الجلسة الوزارية المنعقدة بمقر رئاسة الحكومة بتاريخ 24 اوت 2018 دعوة شركة فسفاط قفصة الى: - الانتهاء من تنفيذ برنامج انتداب 1700 عون تنفيذ لشركة فسفاط قفصة وذلك بمباشرتهم لمهامهم قبل موفى شهر اوت 2018 والاعلان بالتوازي مع ذلك على برنامج الانتدابات الجديد والمتعلق باننداب 1006 عون تنفيذ. - إقرار برمجة الإعلان عن نتائج مناظرة البيئـة قبل موفى سبتمبر 2018 بالتوازي مع ذلك الإعلان عن المناظرة المتعلقة بتكوين 2000 عامل قبل نهاية شهر سبتمبر سنة 2018.	
128	الانطلاق في إجراءات مناظرة لقبول عدد 2000 للتكوين لمدة سنتين بغاية الانتداب وبداية التكوين في غرة أكتوبر 2018 وتسند للمذكورين منحة.	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	إجراءات أفقية	وزارة التكوين المهني والتشغيل / وزارة المالية /	بصدد التنفيذ	تم خلال الجلسة الوزارية المنعقدة بمقر رئاسة الحكومة بتاريخ 24 اوت 2018 دعوة شركة فسفاط قفصة الى: - الانتهاء من تنفيذ برنامج انتداب 1700 عون تنفيذ لشركة فسفاط قفصة وذلك بمباشرتهم لمهامهم قبل موفى شهر اوت 2018 والاعلان بالتوازي مع ذلك على برنامج الانتدابات الجديد والمتعلق باننداب 1006 عون تنفيذ. - إقرار برمجة الإعلان عن نتائج مناظرة البيئـة قبل موفى سبتمبر 2018 بالتوازي مع ذلك الإعلان عن المناظرة المتعلقة بتكوين 2000 عامل قبل نهاية شهر سبتمبر سنة 2018.	



العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
129	إعادة هيكلة مراكز التكوين والتدريب المهني بقفصة العقيلة وقفصة قصر بكلفة 14 م.د.	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة التكوين المهني والتشغيل	في طور الدراسة		
130	إحداث مركز تكوين وتدريب مهني بالمتلوي بكلفة 14.430 م.د.	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة التكوين المهني والتشغيل	في طور الدراسة	(يوجد في متابعة المشاريع العمومية)	
131	إحداث مركز تكوين وتدريب مهني ببلخير بكلفة 14 م.د.	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	المخطط القادم	وزارة التكوين المهني والتشغيل	صعوبات في التنفيذ	في غياب رصيد عقاري على ملك الدولة بالجهة، تمت مراسلة وزارة التكوين المهني والتشغيل لتخصيص اعتمادات لاقتناء قطعة ارض	
132	إحداث مركز تكوين وتدريب مهني بمركز ولاية قفصة. بكلفة 6 م.د.	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	المخطط القادم	وزارة التكوين المهني والتشغيل	في طور الدراسة	يتم التحضير لدراسة تحديد مكونات المشروع في إطار إعداد المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020.	
مجال الحوكمة							
133	تكليف السيد الوزير لى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بالتواصل مع المنظمات الوطنية والهيئات الحقوقية وممثلي المجتمع المدني بالجهة قصد التثيت والتدقيق في التعهدات السابقة في مجال التشغيل، انطلاقا من الأسبوع القادم.	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	إجراءات أفقية	رئاسة الحكومة	في طور الانجاز		
134	تقييم أداء المسؤولين الجهويين على كافة المستويات وتعويض	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	إجراءات أفقية	جميع الوزارات	منجز	تم اتخاذ التدابير اللازمة. (يوجد في متابعة المشاريع العمومية)	

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
	كل من يثبت تقاعسه عن أداء واجبه.						
مجال الشباب والرياضة							
135	إحداث دار شباب بسيدي أحمد زروق بقفصة الجنوبية بكلفة 750 أ.دخلال سنة 2016.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الشباب والرياضة	في طور الانجاز	بصدد اعداد ملفات طلب العروض من طرف المصممين	
136	بناء قاعة رياضة جماعية بسيدي أحمد زروق بقفصة الجنوبية على حساب ميزانية التنمية لسنة 2013 بكلفة 150 أ.دبعنوان الدراسات الفنية وذلك على امتداد سنتي 2015 و2016.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الشباب والرياضة	في طور الانجاز	بصدد الإنجاز	
137	إنجاز معهد عالي للرياضة والتربية البدنية.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الشباب والرياضة / وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	صعوبات في التنفيذ	تعطل انجاز المشروع تبعا للاعتراض على المناظرة المعمارية حيث طالبت هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية اعادتها. المشروع في مرحلة إعادة المناظرة كلفة المشروع 19.2 م د. تمت مراسلة رئاسة الحكومة من قبل السيد والي قفصة بتاريخ 08/05/2018 وتم إعداد مقرر لتفويض وزارة التجهيز للإشراف على المشروع علا انه وقع إيقاف إجراءات المناظرة الى حين البت في القضية المنشوره من طرف مجمع المهندسين المعماريين امام المحكمة الإدارية والإدارة العامة للبنىات المدنية وقد قامت الادارة العامة للبنىات المدنية بوزارة التجهيز بإعادة المناظرة وقد تم تعيين فريق المصممين في 16 سبتمبر 2019	تم تعيين فريق المصممين في 16 سبتمبر 2019
138	تخصيص مبلغ 1.5 م.دلفائدة قطاع الشباب والرياضة منها 750 أ.د لتعشيب ملاعب	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الشباب والرياضة / وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	منجز		

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	البرنامج
	الأحياء، بتمويل من "شركة فسفاط قفصة".						
139	تاهيل وتعشيب ملعب القطار و القصر(القديم).	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج. إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الشباب والرياضة		دعوة مصالح وزارة الشباب والرياضة لإعداد برنامج وظيفي والتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز لتعيين مكاتب دراسات	لم يرد على الإدارة أي برنامج
140	تاهيل الملعب البلدي "القمودي" بقفصة الجنوبية.	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج. إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الشباب والرياضة		دعوة مصالح وزارة الشباب والرياضة لإعداد برنامج وظيفي والتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز لتعيين مكاتب دراسات	لم يرد على الإدارة أي برنامج
141	احداث مسبح مغطى بالمظيلة.	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج. إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الشباب والرياضة		دعوة مصالح وزارة الشباب والرياضة لإعداد برنامج وظيفي والتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز لتعيين مكاتب دراسات	لم يرد على الإدارة أي برنامج
142	احداث مسبح مغطى بالقطار.	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج. إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الشباب والرياضة		دعوة مصالح وزارة الشباب والرياضة لإعداد برنامج وظيفي والتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز لتعيين مكاتب دراسات	لم يرد على الإدارة أي برنامج

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
143	احداث مسيحين بمعتمديتي قفصة الشمالية وسيدي عيش.	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الشباب والرياضة		دعوة مصالح وزارة الشباب والرياضة لإعداد برنامج وظيفي والتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز لتعيين مكاتب دراسات	لم يرد على الإدارة أي برنامج
144	احداث مسيح مغطى بأمر العرائس	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الشباب والرياضة		دعوة مصالح وزارة الشباب والرياضة لإعداد برنامج وظيفي والتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز لتعيين مكاتب دراسات	لم يرد على الإدارة أي برنامج
مجال الشؤون الاجتماعية							
145	إحداث دار للخدمات الاجتماعية بالقطار.	م. وزارتي. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الشؤون الاجتماعية	منجز	في طور النشاط	
مجال الصناعة والطاقة							
146	الاستئناف الفوري لنشاط قطاع الفسفاط.	م. وزارتي. م. بتاريخ 15 ماي 2015	إجراءات أفقية	وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	انجز	استأنف النشاط	
147	تفعيل شركات البيئة من خلال ضبط برامج عملها وآلية إسداء الخدمات مع الهياكل المنتفعة خاصة في برامج التشجير بالمدن وأطرافها	م. وزارتي. م. بتاريخ 15 ماي 2015	إجراءات أفقية	وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	منجز	تم اتخاذ التدابير اللازمة.	

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	البرنامج
	واستصلاح الأراضي وإزالة الشوائب العالقة بها وربط صرف الأجور بالحضور والعمل الفعلي.						
148	تسريع انجاز الدراسة المتعلقة بمشروع تحويل مياه البحر المحلاة وايصالها الى الحوض المنجعي في اطار اللجنة المشتركة بين وزارتي الطاقة والمناجم والطاقت المتجددة والفلاحة والموارد المائية وعرض المشروع خلال الندوة المخصصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص المزمع عقدها يوم 18 سبتمبر 2018.	ج.إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	بصدد التنفيذ		
149	ربط ولاية قفصة بالغاز الطبيعي بكلفة 69 م.د : قفصة والمتلوي وأم العرايس على أن يتم العمل على حل الإشكاليات العقارية لمد الأنبوب إلى المظيلة .	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة / وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية	في طور الانجاز	انطلاق الأشغال بالنسبة لمنطقة سيدي أحمد زروق بداية من شهر جوان 2017 على أن تنطلق الأشغال بالنسبة لبقية مناطق مدينة قفصة ابتداء من السادسة الثانية من سنة 2018. تقدم الأشغال 70 %.	
150	تحويل صندوق تأهيل وتنمية المناطق المنجمية إلى مؤسسة مالية جهوية تساهم في تمويلها "شركة فسفاط قفصة".	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة / وزارة المالية	صعوبات في التنفيذ	لم يتم الانجاز المتابعة على مستوى مركزي	

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة	
151	إقرار برنامج مرحلي لإخراج مغاسل الفسفاط من مناطق العمران وذلك ببرمجة الشروع الفعلي في تفكيك واخراج المغسلة عدد 1 والمغسلة عدد 3 بالمتلوي قبل نهاية سنة 2018 والشروع في الدراسات لبقية المغاسل بالمظيلة وام العرائس والرديف.	ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	بصدد التنفيذ			
152	احداث محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة سقدود بطاقة 100 ميغاواط وبكلفة 275 م.د وذلك في إطار لزمة سيقع اصدار طلب العروض عنها خلال شهر افريل 2018.	ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	بصدد التنفيذ	*- إقرار مساعدة القطب على تخطي الإشكاليات المالية التي تعترضه وذلك بدعوة وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مساعدته على اعداد مخطط اعماله ووزارة الطاقة والمناجم ( شركة فسفاط قفصة) على الترفيع في مساهمتها في راس ماله بمبلغ 7 مليون دينار. - إقرار برنامج مرحلي لإخراج مغاسل الفسفاط من مناطق العمران وذلك ببرمجة الشروع الفعلي في تفكيك واخراج المغسلة عدد 1 والمغسلة عدد 3 بالمتلوي قبل نهاية سنة 2018 والشروع في الدراسات لبقية المغاسل بالمظيلة وام العرائس والرديف. - تسريع انجاز الدراسة المتعلقة بمشروع تحويل مياه البحر المحلات وايصالها الى الحوض المنجعي في اطار اللجنة المشتركة بين وزارتي الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والفلاحة والموارد المائية وعرض المشروع خلال الندوة المخصصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص المزمع عقدها يوم 18 سبتمبر 2018.		

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	البرنامج
153	إحداث 7 مناطق صناعية خلال الفترة 2015-2017 بكلفة تقدر بـ 8.4 م.د، وذلك بالمناطق التالية : 1- المنطقة الصناعية العقيلية: 10 هك. 2- المنطقة الصناعية المطيلة : 6 هك. 3- المنطقة الصناعية الرديف : 5 هك. 4- المنطقة الصناعية السند : 15 هك. 5- المنطقة الصناعية القطار: 5.6 هك. 6- المنطقة الصناعية بلخير : 7 هك. 7- المنطقة الصناعية الرحيبة بقفصة الشمالية : 17 هك.	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	المخطط القادم	وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	في طور الدراسة تقدم انجاز الدراسات 80 %	*- المنطقة الصناعية العقيلية 2: تمت المصادقة على مثال التهيئة التفصيلي وصدر بالرائد الرسمي وتم عرض ملف التقسيمات وفي انتظار الحصول على الترخيص. - المنطقة الصناعية المطيلة: تمت المصادقة على مثال التهيئة التفصيلي. تمت المصادقة على ملف التقسيمات في 2017/02/24. - المنطقة الصناعية الرديف: تم صدور القرار الخاص بتغيير الصبغة في 2015/11/17 وتمت المصادقة على ملف التقسيمات وانتهت دراسة التهيئة ودراسة المؤثرات على المحيط القسط الأول. - المنطقة الصناعية بلخير: تم صدور القرار الخاص بتغيير الصبغة وتمت المصادقة على مثال التقسيمات وانتهت دراسة التهيئة والمؤثرات على المحيط وتم طلب العروض لانجاز التهيئة. - الرحيبة والقطار: يعتبر هذا المشروع مقترح حديث. وقد تم تشخيص المواقع المبرمجة (17 هك بالرحيبة و20 هك بالقطار) وعرض الملف على أنظار اللجنة الوطنية للمدخرات العقارية الصناعية التي أبدت موافقتها على المشروعين، وتمت مراسلة المستلزمين العموميين لضبط كلفة الربط بالشبكات الخارجية. كما يتم حاليا إعداد ملفي طلب العروض الخاص بالدراسة. - المنطقة الصناعية السند: صدر القرار الخاص بتغيير الصبغة وتمت المصادقة على مثال التقسيمات وانتهت دراسة التهيئة ودراسة التأثيرات على المحيط وتم إعداد ملف طلب العروض.	البرنامج
154	إنجاز مشروع منجم الفسفاط بأم الخشب بكلفة 270 م.د.	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	المخطط القادم	وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	في طور الانجاز	في طور الانجاز	البرنامج

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	البرنامج
155	إعادة فتح معمل «SOMOSAN» بالمتلوي، وفي انتظار ذلك تمكين العملة من إعانات اجتماعية ظرفية تتكفل بها وزارة الشؤون الاجتماعية.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة / وزارة الشؤون الإجتماعية	في طور الانجاز	1. انطلقت الأشغال ربط المنطقة الصناعية بالمتلوي بوضع قنوات الغاز الطبيعي في شهور أوت 2017 لمدة تعاقدية ب6 أشهر عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز (EXTRA MUROS) ومن المؤمل انطلاق شركة "SOMOSAN" في ربط محطة الغاز الطبيعي بالمصنع خلال هذه الفترة بإشراف الشركة التونسية للكهرباء والغاز. 2. لم يتم تمكين العملة من إعانات اجتماعية ظرفية	
156	الموافقة على بعث معمل إسمنت بمعتمدية القطار والإعلان عن المستثمر في غضون 3 أشهر.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	لم يتم الانجاز	لم يتم ايجاد مستثمر جدي	
157	إنجاز مشروع القطب التكنولوجي بكلفة 99 م.دوذلك خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 2015 و2017.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	المخطط القادم	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة /	بطء في الانجاز بمختلف المراحل نظرا لتعدد المتدخلين رغم مساعي التنسيق جهويا و وطنيا	*- صدور أمر الانتزاع لفائدة الدولة بمساحة 26 هك وتسجيل قطعة المساحة 62 هك لفائدة القطب، وتم تقدير قيمة التعويضات ب 175. أ.د مودعة بالخزينة في انتظار التسوية، - انطلقت شركة القطب في الاجراءات الادارية والقانونية والدراسات الاولى، - تم الانطلاق في إعداد مثال التهيئة التفصيلي، - بالاتفاق مع وزارة الدفاع شرعت شركة القطب في بناء السور الفاصل بين الثكنة العسكرية والمطار وموقع المشروع بتكلفة 1800.أ.د. وبلغت نسبة تقدم الأشغال 60% بالنسبة للسور، - تغيير الصبغة : تمت المصادقة الأولية على تبديل الصبغة (النشر بمركز ولاية قفصة) - في انتظار توفير الاعتمادات اللازمة في الغرض	
158	إقرار مساعدة القطب على تخطي الإشكاليات المالية التي تعترضه وذلك بدعوة وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى	ج. ل. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	بصدد التنفيذ		



العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
	والمتوسطة مساعده على اعداد مخطط اعماله ووزارة الطاقة والمناجم ( شركة فسفاط قفصة) على الترفيع في مساهمتها في راس ماله بمبلغ 7 مليون دينار.						
159	الانطلاق في إعداد برنامج لسد حاجيات "شركة فسفاط قفصة" من الموارد البشرية والمقدرة بحوالي 1500 عون وذلك خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 2016 و2018.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	إجراءات أفقية	وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	في طور الانجاز	في انتظار نتائج المناظرات.	
160	تكوين لجنة مستقلة في نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة بما في ذلك التثبيت في مختلف المناظرات القائمة والاعلان عن النتائج قبل موفى شهر ماي 2018.	ج. إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018	إجراءات أفقية	وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	بصدد التنفيذ	تم خلال الجلسة الوزارية المنعقدة بمقر رئاسة الحكومة بتاريخ 24 اوت 2018 دعوة شركة فسفاط قفصة الى: - الانتهاء من تنفيذ برنامج انتداب 1700 عون تنفيذ لشركة فسفاط قفصة وذلك بمباشرتهم لمهامهم قبل موفى شهر اوت 2018 والاعلان بالتوازي مع ذلك على برنامج الانتدابات الجديد والمتعلق بانتداب 1006 عون تنفيذ. - إقرار برمجة الإعلان عن نتائج مناظرة البيئة قبل موفى سبتمبر 2018 بالتوازي مع ذلك الإعلان عن المناظرة المتعلقة بتكوين 2000 عامل قبل نهاية شهر سبتمبر سنة 2018.	

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
161	دعوة شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي الى الإعلان عن المناظرة الجديدة في اجل أقصاه غرة جوان 2018 وذلك لانتداب 1006 عون.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	إجراءات أفقية	وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	بصدد التنفيذ	تم خلال الجلسة الوزارية المنعقدة بمقر رئاسة الحكومة بتاريخ 24 اوت 2018 دعوة شركة فسفاط قفصة الى: - الانتهاء من تنفيذ برنامج انتداب 1700 عون تنفيذ لشركة فسفاط قفصة وذلك بمباشرتهم لمهامهم قبل موفى شهر اوت 2018 والاعلان بالتوازي مع ذلك على برنامج الانتدابات الجديد والمتعلق بانتداب 1006 عون تنفيذ. - إقرار برمجة الإعلان عن نتائج مناظرة البيئة قبل موفى سبتمبر 2018 بالتوازي مع ذلك الإعلان عن المناظرة المتعلقة بتكوين 2000 عامل قبل نهاية شهر سبتمبر سنة 2018.	
162	دعوة الشركات العمومية المتعددة بانتداب 394 عون الى فتح المناظرات في اجل لا يتجاوز غرة جوان 2018.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	إجراءات أفقية	وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	بصدد التنفيذ	تم خلال الجلسة الوزارية المنعقدة بمقر رئاسة الحكومة بتاريخ 24 اوت 2018 دعوة شركة فسفاط قفصة الى: - الانتهاء من تنفيذ برنامج انتداب 1700 عون تنفيذ لشركة فسفاط قفصة وذلك بمباشرتهم لمهامهم قبل موفى شهر اوت 2018 والاعلان بالتوازي مع ذلك على برنامج الانتدابات الجديد والمتعلق بانتداب 1006 عون تنفيذ. - إقرار برمجة الإعلان عن نتائج مناظرة البيئة قبل موفى سبتمبر 2018 بالتوازي مع ذلك الإعلان عن المناظرة المتعلقة بتكوين 2000 عامل قبل نهاية شهر سبتمبر سنة 2018.	

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
163	تفعيل قرار القيام بعملية تدقيق في أساليب التصرف بـ"شركة فسفاط قفصة" والشركات المتفرعة عنها دعما لقواعد الحوكمة الرشيدة.	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	إجراءات أفقية	وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة	منجز	تم اتخاذ التدابير اللازمة.	
مجال النقل							
189	إنجاز مشروع تهيئة مدرج الطائرات بمطار قفصة الدولي بكلفة 10 م.د.	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة النقل	في طور الانجاز	منجز	
190	الإسراع في انجاز المنطقة اللوجستية بالقطار	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج. إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة النقل		دعوة وزارة النقل إلى الإسراع واتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز المطلوب	
191	تدعيم شبكة السكك الحديدية بشراء 20 عربة لنقل الفسفاط ومشتقاته بكلفة 130 م.د وذلك خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 2015 و2018.	م. وزارى. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة النقل	في التنفيذ	أول دفعة بعشرقاطرات تمت خلال سنة 2018	
192	الإعلان عن صفقة لاقتناء 400 عربة قطار لنقل الفسفاط.	ج. إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة النقل	بصدد التنفيذ	*- تم استلام 20 قاطرة لنقل الفسفاط خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018. - برمجة الإعلان عن طلب عروض اختيار المصممين لبناء مركز الفحص الفني للعربات بالمتلوي بعد أن تم تغيير صبغة العقار المزمع استغلاله. - استئناف اشغال بناء مستودع صيانة القاطرات التي بلغت نسبة 70 % بعد توقفها بسبب الاعتصامات .	

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
193	احداث ورشة لصيانة العربات	ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة النقل	بصدد التنفيذ	- برمجة الإعلان عن طلب عروض اختيار المصممين لبناء مركز الفحص الفني للعربات بالمتلوي بعد أن تم تغيير صبغة العقار المزمع استغلاله. - استئناف اشغال بناء مستودع صيانة القاطرات التي بلغت نسبة 70 % بعد توقفها بسبب الاعتصامات .	
194	تدعيم شبكة السكة الحديدية بالجهة	ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة النقل	بصدد التنفيذ	- برمجة الإعلان عن طلب عروض اختيار المصممين لبناء مركز الفحص الفني للعربات بالمتلوي بعد أن تم تغيير صبغة العقار المزمع استغلاله. - استئناف اشغال بناء مستودع صيانة القاطرات التي بلغت نسبة 70 % بعد توقفها بسبب الاعتصامات .	
195	إحداث خط حديدي سريع قفصة- صفاقس	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة النقل		دعوة وزارة النقل إلى الإسراع واتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز المطلوب.	
196	تفعيل الخط الحديدي ام العرايس سيدي بوبكر	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة النقل		دعوة وزارة النقل لإعداد برنامج وظيفي والتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز لتعيين مكاتب دراسات	
197	تدعيم الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة بعدد هام من الحافلات المكيفة	ج.إ.م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018		وزارة النقل	بصدد التنفيذ	منجز	

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	البرنامج
198	إنجاز مشروع تهيئة محطة النقل البري بقفصة خلال سنة 2015 بكلفة 300 أ.د.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة النقل	منجز		
199	إحداث محطة للنقل البري خارج المدينة	ج. إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال	وزارة النقل			
200	إحداث محطات نقل القوافل بجميع المعتمديات	ج. إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال	وزارة النقل		دعوة وزارة النقل لإعداد برنامج وظيفي والتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز لتعيين مكاتب دراسات	
201	بناء مركز فحص في للعربات بالمتلوي بكلفة 6 م.د.	م. وزاري. م. بتاريخ 15 ماي 2015	مشاريع حينية	وزارة النقل	صعوبات في التنفيذ	تم إبرام عقد تفويت لفائدة الوكالة الفنية للنقل البري.	
202	التسريع في إجراءات تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز الفحص الفني بالمتلوي	ج. إ. م. جهوي بتاريخ 16 مارس 2018	مشاريع عمومية تم التعمد بها خلال	وزارة النقل		دعوة وزارة النقل لإعداد برنامج وظيفي والتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز لتعيين مكاتب دراسات	

الجانب الأمني

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	البرنامج
203	إبرام اتفاقية مع وزارة الداخلية لتأمين قطاع الفسفاط و الأسمدة	م. وزاري. م. بتاريخ 8 جانفي 2019	وزارة الداخلية / شركة فسفاط قفصة / المجمع الكيميائي التونسي	تمكين شركات فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للأسمدة من خدمات مرافقة وتأطير أمني في إطار اتفاقية يتم امضاؤها مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية يتم في إطار هذه الاتفاقية تحديد المسؤوليات بالنسبة ل: - التأمين الذاتي لمواقع الإنتاج - المرافقة الأمنية لحافلات الأعوان - تركيز وحدات أمنية قارة بالمواقع الحساسة على غرار محطات ضخ المياه - تأطير الإعتصامات والاحتجاجات السلمية ومنعها من إيقاف الإنتاج - تخصيص وحدات أمنية متنقلة تجوب مراكز الاستخراج والنقل والشحن والنقل الحديدي والإنتاج وتتعهد الشركات المعنية بتحمل التكاليف المباشرة لتنفيذ كل النقاط المبينة فيالاتفاقية			
204	التأمين الذاتي للمؤسسات القطاعية: -	م. وزاري. م. بتاريخ 8 جانفي 2019	وزارة الداخلية / شركة فسفاط قفصة / المجمع الكيميائي التونسي	التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية لوضع خطة تأمين ذاتي للمؤسسات القطاعية عن طريق: - تحديد العدد اللازم من الأعوان الذين سيتم تكليفهم بالتأمين الداخلي مع دراسة إمكانية اختيارهم من المنتدبين في شركات البيئة الراجعة بالنظر لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي - تنظيم دورات تكوينية في المجال الأمني لفائدة هولاء الأعوان - توفير الدعم اللوجستي اللازم لإنجاح خطة التأمين الذاتي ○ اعتماد زي موحد لأعوان الأمن الداخلي ○ تركيز أدوات المراقبة والكشف			
205	تجهيز كافة المقرات الإدارية ومواقع الإنتاج الراجعة بالنظر لشركة فسفاط	م. وزاري. م. بتاريخ 8 جانفي 2019	شركة فسفاط قفصة / المجمع الكيميائي التونسي				

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
	قفصة و المجمع الكيميائي التونسي بأنظمة المراقبة عبر الفيديو						
206	إنجاز سور لحماية مواقع الإنتاج (من مغاسل فسفاط وغيرها .... )	م. وزاري. م. بتاريخ 8 جانفي 2019		شركة فسفاط قفصة			
207	الإسراع في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين ظروف العمل لفائدة وحدات الجيش الوطني الساهرة على تأمين مخازن المواد المتفجرة التابعة لشركة فسفاط قفصة	م. وزاري. م. بتاريخ 8 جانفي 2019		شركة فسفاط قفصة / وزارة الدفاع		الإشارة إلى نيّة الوحدات العسكرية الانسحاب من المواقع المذكورة بسبب تردّي ظروف العمل	
الجانب التنموي							
208	الشروع في انجاز دراسة استراتيجيّة استشرافيّة عن طريق مكتب دراسات مختص بهدف دراسة مستقبل قطاع الفسفاط و الأسمدة على مستوى مراكز الإنتاج الحاليّة و على المستوى الوطني	م. وزاري. م. بتاريخ 8 جانفي 2019		شركة فسفاط قفصة / المجمع الكيميائي التونسي			
209	الشروع في انجاز دراسة استراتيجيّة عن طريق مكتب دراسات مختص بهدف تأهيل مواقع الإنتاج الراجعة بالنظر لمؤسسات القطاع	م. وزاري. م. بتاريخ 8 جانفي 2019		شركة فسفاط قفصة / المجمع الكيميائي التونسي			
210	دعوة شركة فسفاط قفصة و المجمع الكيميائي التونسي لدراسة إمكانية بعث مشروع لتطوير القطاع و تنميته، و ذلك في حدود استثمار بألف مليون دينار سنويًا (للخمس سنوات القادمة) و بضمان من الدّولة التونسية بوصفهما مؤسستان قابلتان للتمويل (bancables)	م. وزاري. م. بتاريخ 8 جانفي 2019		شركة فسفاط قفصة / المجمع الكيميائي التونسي			

العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
211	برمجة اجتماع دوري أسبوعي مساء كل يوم خميس يضم كافة المعنيين بملف قطاع الفسفاط و الأسمدة بهدف متابعة تنفيذ القرارات المتخذة	م. وزاري. م. بتاريخ 8 جانفي 2019		رئاسة الحكومة			
212	دعوة كل هياكل مساندة المشاريع وهيكل التمويل على المستوى الوطني لتنظيم حملات جهوية لمصاحبة الشبان الراغبين في إحداث مؤسسات صغرى في إطار "أسبوع إحداث المؤسسات" بالجهات.	م. وزاري. م. بتاريخ 8 جانفي 2019		شركة فسفاط قفصة / المجمع الكيميائي التونسي			
213	متابعة انجاز مشروع سراورثان و العمل على رفع جميع العراقيل المتعلقة به	م. وزاري. م. بتاريخ 8 جانفي 2019		وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة			
214	تسريع نسق إنجاز تعهدات الدولة في مجال التنمية و غيرها من المجالات حسب رزنامة توضع في الغرض بعد	م. وزاري. م. بتاريخ 8 جانفي 2019		جميع الوزارات			
قرارات متعلّقة بالإنتاج							
215	الإذن فورا لمصالح الشركة الوطنية للسكك الحديدية بإجراء ما يتعين القيام به لإنجاز أشغال الصيانة اللازمة لفائدة ثمانية (08) منشآت تخص السكك الحديدية لنقل الفسفاط بكلفة جمليّة تناهز 32 مليون دينار	م. وزاري. م. بتاريخ 8 جانفي 2019		الشركة الوطنية للسكك الحديدية			
216	العمل على رفع نسق الإنتاج بشركة فسفاط قفصة في غضون الأشهر الثلاث	م. وزاري. م. بتاريخ 8 جانفي 2019		شركة فسفاط قفصة			



العدد الترتيبي	القرار	المرجع	البرمجة	المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة إلى غاية جوان 2020	الرزنامة
	القادمة بما يمكن من بلوغ 5.5 مليون طن سنة 2019						
الجانب العدلي							
217	إرساء الآليات الضرورية التي تضمن المعالجة الأمنية القانونية وذلك بهدف التصدي لجميع التجاوزات وردع المتحدّين لسلطة الدولة والقانون.	م. وزاري. م. بتاريخ 8 جانفي 2019		شركة فسفاط قفصة / المجمع الكيميائي التونسي /وزارة العدل		التأكيد على ضرورة فرض سلطة القانون عن طريق رفع قضايا عدلية ضد كل من يتسبب في غلق أو تعطيل العمل بمواقع الإنتاج أو بالمقرات الإدارية مع العمل على التسريع في استجلاب القضايا و البت فيها، وذلك لإضفاء النجاعة المطلوبة على مستوى التدخّل الأممي	
تفعيل شركات البيئة							
218	دعوة كل الهياكل العمومية للانخراط في عملية تفعيل نشاط شركات البيئة من خلال ضبط برامج عمل لهذه الشركات بالتنسيق مع كافة الهياكل المركزية والجهوية المعنية (تنمية، بيئة، فلاحية، داخلية...) وبالخصوص وزارة الشؤون الإجتماعية - اعتماد صيغة عقود لإسداء الخدمات بين شركات البيئة والهياكل المنتفعة وذلك في إطار اتفاقيات تجارية.	م. وزاري. م. بتاريخ 8 جانفي 2019		وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة / شركة فسفاط قفصة / المجمع الكيميائي التونسي			



الجمهورية التونسية  
وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي  
ديوان تنمية الجنوب

# جلسة لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب

## الوضع التتموي بولاية قابس



19 جوان 2020

# ولاية قابس في أرقام

المستوى الوطني	إقليم الجنوب	قابس	المؤشر
91 076	163 610	7166	المساحة (كلم2)
1 708,6	11 732,9	402,9	عدد السكان (ألف ساكن)
276	56	13	المعتمديات
350	61	16	البلديات
2085	386	73	العمادات
3497,8	411,2	92,6	النشيطون المشتغلون (ألف مشتغل)
15,3		24,3	النسبة العامة للبطالة (2019)
0,486		0,501 (الرتبة 9)	مؤشر التنمية الجهوية
		3,18	مؤشر جاذبية الأعمال

# خصوصيات وميزات ولاية قابس

## موارد وثروات طبيعية هامة

أراضي فلاحية تمتد على مساحة 596 ألف هكتار منها 211 ألف هكتار أراضي زراعية،  
379 ألف هكتار مراعي و6 آلاف هكتار غابات.

مياه معدنية حارة متوفرة وسهلة الاستغلال بما يبشر بفلاحة جيوحرارية وسياحة استشفائية  
واعدة (25 ألف طن إمن الباكورات و 13 محطة استشفائية)

مناخ يمكن استغلاله كمصدر لإنتاج الطاقة البديلة (الشمس، الرياح،...)

ثروات هامة من المواد الكيميائية مما فتح آفاق واعدة للكيمياء الدقيقة ومشتقات  
الفسفاط مع تزايد الطلب العالمي بعد تطور أساليب الفلاحة والزراعة

خليج يعد من أكبر الخلجان بالمتوسط (مشاريع هامة لتثمين سلطعون البحر بطاقة  
تشغيلية كبرى)

قابس قطب ثقافي تضامني بإقليم الجنوب وخصوصا بإقليم الجنوب الشرقي

# خصوصيات وميزات ولاية قابس

## ثراء طبيعي وموروث ثقافي متنوع

الواحة البحرية الفريدة من نوعها في البحر الأبيض المتوسط والتي تمثل امتياز بجهة قابس لا مثيل له مقارنة بالجهات الأخرى

المعمار الجبلي بكل خصائصه التاريخية من حفريات كنموذج فريد من نوعه يمكن تثمينه عبر استغلاله في برامج ومشاريع سياحية تنشيطية

سياحة استشفائية هامة (أكثر من 900 ألف زائر سنة 2018 للحمامات الاستشفائية)

المساكن الحجرية والمساكن المنقورة بجهة مطماطة

المعمار الإسلامي من مساجد وأسواق ومدن عتيقة كمقام الصحابي الجليل سيدي أبي لبابه الأنصاري

قابس قطب ثقافي تضامني بإقليم الجنوب وخصوصا بإقليم الجنوب الشرقي

# خصوصيات وميزات ولاية قابس

## بنية تحتية متنوعة

بنية تحتية مرضية تستجيب لمتطلبات الإستثمار

شبكة سكك حديدية تربط الولاية بالعاصمة وبقية الولايات لنقل المسافرين والبضائع والفسفاط

ميناء قابس (مطابق للمواصفات العالمية) بغاطس مائي 13 متر

مطار دولي قابس-مطماطة مطابق للمواصفات الدولية بطاقة استيعاب تفوق 200 ألف مسافر

6 مناطق صناعية بكل من قابس (828 هك) والمطوية (29 هك) والحامة (50 هك) ومنزل الحبيب (7 هك) ومطماطة

شبكة طرق عصرية تربط ولاية قابس بمختلف الجهات الداخلية والخارجية المشروع الوطني لطريق السيارة قابس-مدنين والطريق السريعة قابس-وادي سوف

قابس قطب ثقافي تضامني بإقليم الجنوب وخصوصا بإقليم الجنوب الشرقي

# خصوصيات وميزات ولاية قابس

## آفاق لوجستية واعدة

تصدير حوالي 2500 حاوية سنويا لمنتجات الفلاحة الجيوحرارية (15 ألف طن سنويا)

تصدير 18 ألف حاوية سنويا للمنتجات الصناعية

وجود عدد من الاتصالات من طرف الفاعلين الاقتصاديين بالجنوب الجزائري لاستغلال ميناء قابس للتوريد والتصدير (أقرب ميناء للحدود الجزائرية)

وجود رصيد عقاري هام داخل الميناء يمكن استغلاله في تنويع أنشطة الميناء

وجود منطقة لوجستية محاذية للميناء في طور الدراسات الى جانب وجود المطار

قابس قطب ثقافي تضامني بإقليم الجنوب وخصوصا بإقليم الجنوب الشرقي

# إشكاليات التنمية بولاية قابس

## الموقع وعلاقة الجهة بمحيطها

عدم تمكن الجهة من تفعيل البنية التحتية المتطورة لدفع نسق التنمية

محدودية نشاط المطار وعدم برمجة رحلات داخلية وخارجية للمسافرين

اقتصار أنشطة ميناء قابس على أنشطة الصناعات الكيماوية والفحم الحجري وتصدير وتوريد السوائب الصلبة والسائلة

تعطل مشروع تفعيل خط الحاويات لاستغلال ميناء قابس في الأنشطة التجارية وعدم تفعيل المنطقة اللوجستية

اعتماد الإستثمار الخارجي المباشر وبالرغم من محدوديته على بعث وحدات دون أن يكون لها ارتباط بالأنشطة المحلية مما جعل إمكانيات اندماج المؤسسات المحلية في حلقات التوريد والإنتاج مع المؤسسات الأجنبية محدودة

التباين الجغرافي في مؤشرات التنمية بين المعتمديات



# إشكاليات التنمية بولاية قابس

## نقص إشعاع نشاط الصناعات الكيماوية على تطوير الأنشطة الاقتصادية

رغم وجود قطب صناعي هام للصناعات الكيماوية بولاية قابس الذي من المفترض أن يكون قاطرة للنهوض بالنسيج الصناعي بالجهة إلا أن تأثيره بقي محدودا

تطوير أنشطة صناعية نظيفة والصناعات الغذائية

تطوير عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتجة بالجهة

عدم تطوير الصناعات الكيماوية الدقيقة

تنمية الإنتاج الفلاحي وتنشيط القطاع السياحي

# إشكاليات التنمية بولاية قابس

## الضغوطات المسلّطة على الوضع البيئي

التلوث البحري بسبب إلقاء 5 ملايين طن سنويا من مادة الفوسفوجيبس في الخليج منذ أكثر من 40 سنة

التلوث الهوائي

تدني نوعية المياه خاصة بالواحات القديمة واستنزاف الثروة المائية والاستغلال المفرط من طرف القطاع الصناعي

تدهور المنظومة الواحية التقليدية بقابس وتقلص التنوع الحيوي نتيجة الزحف العمراني والتلوث

تفاقم ظاهرة الجفاف والتصحر

تقادم شبكات تصريف المياه ومياه الصرف الصحي

# إشكاليات التنمية بولاية قابس

## ضعف أداء القطاع الخاص

عدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب عدد طالبي الشغل المتزايدة سنويا

ضعف الطاقة التشغيلية للمؤسسات الكبرى حيث تمثل 10% من الطبقة الشغيلة (8700 موطن شغل)

عدم قيام المؤسسات البنكية بدورها في تمويل الاستثمار خاصة الحكومية منها (حجم التمويلات تبقى دون المأمول)

نقص في عدد المشاريع المتمتعة بالامتيازات الممنوحة في قانون الاستثمار خاصة في المجال الصناعي

طول إجراءات الحصول على التمويل البنكي

عدم وجود المناطق الصناعية المخصصة للتحويل الأولي خاصة للصناعات الغذائية (مناطق تنمية ذات أولوية)

تطور نسبة البطالة %



# الوضع التنموي بولاية قابس

## 1. الرؤية الإستراتيجية

قابس قطب اقتصادي واستشفائي واجتماعي  
وجامعي وثقافي تضامني بإقليم الجنوب و  
خصوصا بإقليم الجنوب الشرقي يوفر بيئة نظيفة  
ويحقق الرفاه الاجتماعي والتنمية المستدامة  
على قاعدة الحوكمة المحلية والمواطنة الفاعلة

# الوضع التنموي بولاية قابس

## 2. متابعة تنفيذ المخطط الجهوي للتنمية 2016-2020

– بلغت الاستثمارات المدرجة بالمخطط التنموي الجهوي 2016 – 2019 حوالي 2239,381 مليون دينار منها 1180,751 مليون دينار بالقطاع العمومي (52,73 % و 1058,630 مليون دينار بالقطاع الخاص (47,27 %).

– قوّدت الاستثمارات الجمالية المنجزة خلال الفترة 2016-2019 بحوالي 1010,739 مليون دينار وبذلك بلغت نسبة الإنجاز 45 % من جملة الاستثمارات المبرمجة بالمخطط (39 % للقطاع العام و52% للقطاع الخاص).

نسبة الإنجاز %	الاستثمارات المنجزة 2016 – 2019 (م د)	تكلفة المخطط 2016-2020 (م د)	
39	460,793	1180,751	القطاع العام
52	550	1058,630	القطاع الخاص
45	1010,793	2239,381	المجموع

# الوضع التنموي بولاية قابس

## 3. متابعة تنفيذ المشاريع العمومية (متابعة المشاريع المدرجة بميزانيات سنوات 2016 و2017 و2018 و2019 و2020)

النسبة من الكلفة %	الكلفة (أ د)	النسبة من العدد %	عدد المشاريع	درجة النضج
33,81	145514	35,32	313	المشاريع المنجزة كلياً
31,7	136416	29,79	264	مشاريع بصدد الانجاز
6,54	28172	6,77	60	مشاريع في مرحلة إعداد طلبات العروض
27,83	119808	28	248	مشاريع بصدد الدراسة
0,12	500	0,11	1	مشاريع لم تنطلق
100	430410	100	886	المجموع
	500		1	منها مشاريع معطلة

علماً وأنه منذ سنة 2011 وإلى نهاية سنة 2019 تم انجاز 2291 مشروعاً بكلفة 1346,655 مليون دينار.

# الوضع التنموي بولاية قابس

أهم المشاريع التي هي في مراحل الإنجاز (بصدد الإنجاز أو طلب العروض أو بصدد الدراسة)

الملاحظات	نسبة الانجاز	مستوى التنفيذ	الكلفة (أد)	المشروع
تم عرض الملفات الأولية لطلب العروض بتاريخ 28/02/2020- في انتظار مدنا بملاحظات المصالح المركزية للصحة للأقسام الخاصة		الملف الأولي لطلب العروض	3506	تعويض المستشفى المحلي بمطماطة الجديدة
تمت المصادقة على اتفاقية تمويل المشروع وفي انتظار المصادقة على نظام المناظرة المنقح للإعلان عن المناظرة.		الدراسات	3500	بناء مدرج بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس
تمت المصادقة على الرسوم التمهيدية المفصلة بتاريخ 24/09/2018 - وتم الفتح والتقييم والاحالة للولاية بتاريخ -تمت مطالبة المعارض الأقل ثمنا لتمديد عرضه الا انه لم يستجب		فتح الاعتمادات للجزء 1 (هـ. مدينة)	4200	-تم تاجيل موعد ارجاع ملفات المناظرة الى 27/05/2020 بسبب جائحة كورونا
-تم الاعلان عن نتائج المناظرة بتاريخ 27 ماي 2020		المناظرة المعمارية	2200	بناء محطة نقل بري جديدة بقابس
تم الإعلان عن طلب العروض في شهر جوان الحالي		طلب العروض	13000	انشاء 02 جسور على واد قابس

# الوضع التنموي بولاية قابس

أهم المشاريع التي هي في مراحل الإنجاز (بصدد الإنجاز أو طلب العروض أو بصدد الدراسة)

المشروع	الكلفة (أد)	مستوى التنفيذ	نسبة الانجاز (%)	الملاحظات
تهيئة الطريق المحلية 780 من ن ك 0 إلى ن ك 29 بولاية قابس	12000	في طور الانجاز	50	
بناء منشأة فنية فوق السكة الحديدية بالطريق الوطنية رقم 1 ن ك 100+391 بمعتمدية المطوية	3300	في طور الانجاز	10	
بناء ورشتي الهندسة المدنية و الهندسة الميكانيكية بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس	1060	في طور الانجاز	25	أشغال تخشيب الاعمدة
توسعة فضاءات الإقامة لقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بقابس	1062	في طور الانجاز	90	اشغال متوقفة لاستغلال الفضاء بصفة استعجالية
بناء مركب الطفولة بمارث	900	في طور الانجاز	65	أشغال البناء الجدران والملاط
بناء قصر المالية	7000	في طور الانجاز	3	انطلاق أشغال الحفر وصب الخرسانة
بناء مسبح مغطى بقابس المدينة	5700	في طور الانجاز	76	مشروع يسير بنسق ضعيف ( تجاوز الاجال لأكثر من سنة)
بناء مدرسة إعدادية بالزرارة	3500	في طور الانجاز	20	أشغال صب الأسقف



# الوضع التنموي بولاية قابس

## متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى : انجاز محطة تحلية مياه البحر بالزارات



يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الموارد المائية وتحسين نوعيتها بولايات قابس ومدنين وتطاوين. ويرتكز المشروع على إنشاء قطب جديد لإنتاج المياه المحلاة بطاقة إنتاج 50 ألف م<sup>3</sup>/اليوم قابلة للتوسعة إلى حدود 100 ألف م<sup>3</sup>/اليوم و ربطها بالقنوات الرئيسية للتوزيع.

### المكونات:

- محطة تحلية بسعة 50 ألف م<sup>3</sup>/اليوم قابلة للتوسعة إلى حدود 100 ألف م<sup>3</sup>/اليوم
- انجاز خزانات و محطة الضخ نسبة الإنجاز 20%
- جلب مياه البحر و صرف مياه الرجيع،
- اقتناء و وضع 60 كم من القنوات لربط محطة التحلية بالقنوات الرئيسية للتوزيع، نسبة الإنجاز مد القنوات 5% ( تم اقتناء القنوات)
- دراسة المؤثرات البيئية، كهربة المحطة والمنشآت التابعة لها. نسبة الإنجاز 100%
- محطة كهرباء جهد عالي نسبة الإنجاز 2%

الكلفة التقديرية: 304 مليون دينار تونسي.

التمويل: البنك الألماني للإعمار (KFW)

نسبة الإنجاز الجمالية : 30%

# الوضع التنموي بولاية قابس

## مشروع انجاز الطريق السيارة قابس مدنين

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية للجنوب الشرقي في اطار الخطة الوطنية لتعميم الطرقات السيارة ويتوزع مشروع الطريق السيارة قابس - مدنين على 4 اقساط تمتد على مسافة 84 كلم وتبلغ كلفة انجازه 360 مليون دينار.

### تقدم الانجاز:

مشروع الطريق السيارة قابس -مدنين	القسط عدد4	القسط عدد3	القسط عدد2	القسط عدد1	تقدم الأشغال: سبتمبر 2019	
78.26 كم - 93 %	16.240 كم - 76 %	20.750 كم - 99 %	21 كم - 100 %	21 كم - 100 %	فتح حوزة الطريق	
2 مقاولات تونسية 1 مجمع مقاولات ايطالي تونسي	شعبان وشركائه « CHAABANE & Cie »	شعبان وشركائه « CHAABANE & Cie »	بلقريني -س ج ت « Pellegrini-CGT »	سوروبات « SOROUBAT »	المقولة	
359 331 957.487	105 289 664.365	91 548 338,746	73 347 812,765	97022415,392	المبلغ (د.ت باعتبار الآداءات)	
94%	80 %	99 %	99 %	100 %	التقدم في الدراسات	
68 %	40 %	90 %	45 %	99 %	الطريق	التقدم المادي للأشغال
87 %	60 %	93 %	97 %	99 %	النتريبات	
89 %	70 %	99 %	90 %	99 %	المنشآت	
78.75 %	46 %	93 %	77 %	99 %	المشروع	

# الوضع التنموي بولاية قابس

## مشروع انجاز التنمية الفلاحية المندمجة بقابس ( المرحلة الثانية)

يهدف مشروع التنمية الفلاحية قابس 2 إلى الترفيع في دخل المواطنين و تحسين مستوى العيش في مناطق التدخل بالاعتماد على تنمية الانتاج الفلاحي و تحسين البنية التحتية و التصرف الرشيد و المستديم في الموارد الطبيعية و إدماج المرأة الريفية في الدورة الاقتصادية باعتماد المقاربة التشاركية.

### المكونات:

- دعم البنية التحتية الريفية: ( احداث 18 بئر للري، 10 مناطق سقوية 5000 هك و 26 منطقة سقوية صغيرة، تهيئة 50 كم من المسالك الريفية، أشغال المحافظة على المياه والترية)
- التنمية الفلاحية التشاركية (غراسة الأشجار، مقاومة التصحر، التكوين، بعث المشاريع,,,,,)
- **الكلفة التقديرية: 76,730 مليون دينار تونسي.**

### التمويل:

- قرض البنك الافريقي للتنمية : 46669 ألف دينار / 20652 ألف أورو
- ميزانية الدولة : 20567 ألف دينار باعتبار الاداء على القيمة المضافة
- بنك التضامن التونسي : 5697 ألف دينار
- موارد أخرى : 3797 ألف دينار

### الجدول الزمني للتنفيذ:

الدفعات (أد)		الإعتمادات المتعهددة (أد)		الإعتمادات المفتوحة (أد)		الكلفة (أد)	مصادر التمويل
%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ		
32,112	6604,613	57,731	11873,611	79,360	16322,000	20567,000	ميزانية
55,681	25985,805	74,632	34830,118	83,717	39070,700	46669,000	قروض خارجية
48,471	32590,418	69,462	46703,729	82,385	55392,700	67236,000	الجملة

# الوضع التنموي بولاية قابس

## مشروع تشيية الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين الحامة وقابس

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية بولاية قابس و كذلك في اطار تعزيز الترابط الاقتصادي بين معتمديات ولاية قابس وكذلك المشروع في انجاز جزء من الطريق السريعة قابس-واد سوف.



### المكونات:

- فتح وتحرير حوزة الطريق
- الحفر والتتريبات
- الطبقة التحتية بالمواد المقطعية
- طبقة الأسس وطبقة GRH
- المنشآت المائية
- التغليف السطحي بالخرسانة الإسفلتية GB و BB
- التنوير العمومي بالمفترقات
- التشوير الأفقي والعمودي

**الكلفة التقديرية: 16 مليون دينار تونسي.**

**نسبة الإنجاز: 75%**

# الوضع التنموي بولاية قابس

## مشروع بناء قصر المالية بقابس

يهدف هذا المشروع إلى تحسين مردودية المؤسسات المالية على المستوى الجهوي و تعويض المبنى القديم للمالية الذي تعرض الى التخريب سنة 2011

### المكونات:

- مبنى الخزينة الجهوية للمنشآت (R+3)
- مبنى الخزينة الجهوية للتمويلات (R+4)
- مبنى المديرية العامة للضرائب (R+4)



الكلفة التقديرية: 7 مليون دينار تونسي.

نسبة الإنجاز: 3%

# الوضع التنموي بولاية قابس

## انجاز المنطقة اللوجستية ببوشمة

### أهداف المشروع :

- النهوض بالنشاط الاقتصادي بولاية قابس،
- تطوير الحركة التجارية بميناء قابس،
- الاستجابة للحاجيات اللوجستية المتزايدة للفاعلين الاقتصاديين (الاستيراد والتصدير) بالجهة،
- استقطاب الاستثمارات الخارجية،
- تعصير وتطوير البنية التحتية بميناء قابس.
- توفير مواطن الشغل والحد من البطالة من خلال تطوير النشاط اللوجستي.

### □ كيفية الانجاز :

- انجاز الدراسات الفنية والاقتصادية من طرف مكتب دراسات (ACC + SAMARCAND) المكلف من طرف وزارة النقل ( تمت المصادقة على الدراسة الأولية)
- انجاز دراسة سوق معمقة للمشروع
- انجاز الدراسات القانونية لإحداث شركة تعنى بالتصرف في المنطقة اللوجستية
- دعوة الفاعلين الاقتصاديين بالجهة للاكتتاب في رأس المال الشركة
- دعوة الوكالة الصناعية العقارية للمساهمة في رأس المال من خلال توفير الأرض
- تسوية الوضعية العقارية للمنطقة اللوجستية بالمطوية كجزء 02 من المنطقة بمساحة 100 هكتار (قرار مجلس وزاري 22 أوت 2019)

□ **الكلفة** : تبلغ الكلفة التقديرية للمشروع حوالي 12 مليون دينار بمساحة 30 هكتار.

# الوضع التنموي بولاية قابس

## أهم المشاريع التي تشكو صعوبات

المقترحات	الصعوبات	تقدم الإنجاز (%)	سنة الانجاز	الكلفة (أد)	المشروع	
التسريع بعرض مشروع الملحق عدد 03 على أنظار اللجنة الوزارية لاستئناف الأشغال	- تأخر في الإنجاز نتيجة عدم قدرة إدارة المستشفى على إيجاد حلول بديلة لغلط أقسام ووضعها على ذمة المقاول للتسريع في نسق الإنجاز نظرا للضغط الكبير المسلط على المستشفى الجهوي	65	2012	5681	هندسة مدنية	استصلاح و تقوية أسس و هياكل مباني المستشفى الجهوي بقاس
	- مطابقة المقاول بملحق مالي للمشروع	55	2014	1390	كهرباء	
	- بصدد الأشغال (المستعجلة) للمرحلة الثانية (عيادات خارجية - القسم الفني )	46	2015	835	الوقاية من الحرائق	
		65	2015	3100	سوائل	
دعوة وزارة الصحة لخلاص الشركة لاستئناف الأشغال في أقرب الآجال	أشغال شبه متوقفة لعدم خلاص المقاول في 04 كشوفات حساب	45	2017	5500	تطوير المستشفى المحلي بمارث إلى مستشفى جهوي صنف «ب»	
	اشغال متوقفة لاستغلال الفضاء بصفة استعجالية في اطار جهود مكافحة فيروس كورونا	90	2018	1060	توسعة فضاءات الإقامة لقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بقابس	
دعوة وزارة الشباب والرياضة لتوفير الاعتمادات والمصادقة على الملحق	اشغال متوقفة بانتظار المصادقة على الملحق و توفير اعتمادات إضافية	86	2017	2200	تأهيل مركز التخميم و الاصياف بالزارات	

# الوضع التنموي بولاية قابس

## أهم المشاريع التي تشكو صعوبات

المشروع	الكلفة (أد)	سنة الانجاز	تقدم الإنجاز (%)	الصعوبات	المقترحات
قاعة الرياضات الجماعية بالحامة	2520	2018	5	تخلي المقاول عن المشروع و تم فسخ الصفقة وبصدد حصر الكميات	التسريع في إجراءات إعادة إجراءات تعيين مقاول جديد للمشروع
بناء مسبح مغطى بقابس	5700	2016	76	أشغال شبه متوقفة وتم التنبيه على المقاول ( شركة تمر بصعوبات مالية)	
انجاز المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس	8280	2016	70	شهد الإنجاز تأخر كبير وخاصة من قبل مقاوله أشغال الهندسة المدنية أشغال شبه متوقفة وتم التنبيه على المقاول ( شركة تمر بصعوبات مالية)	دعوة المقاول الى التسريع في نسق الإنجاز بعد خلاص المستحقات المالية مؤخرا



# الوضع التنموي بولاية قابس

## أهم المشاريع التي تشكو صعوبات : وضعية القطب التكنولوجي بقابس

ضرورة القيام الفوري بتحرير المبلغ المتبقي و المقابل لـ 4/1 من مساهمة المجمع الكيميائي التونسي (400000,000 د.ت) في الترفيع في رأس مال الشركة من 5 إلى 7 م د ( جلسة الجمعية العمومية الخارقة للعادة بتاريخ 29 ديسمبر 2016 )

المساعدة على توجيه  
المجامع الإستثمارية الكبرى  
التونسية و الأجنبية للإنتصاب  
بالمناطق الصناعية للشركة

المساعدة على الترفيع -بصفة تدريجية- في رأس مال الشركة إلى 20 مليون دينار وذلك بالترفيع بمبلغ قدره إثنين (02) مليون دينار في مرحلة أولى سنة 2020 من خلال إدراج مساهمين جدد لهم أنشطة هامة بولاية قابس و ذلك في إطار مسؤولياتهم المجتمعية

## مقترحات لتجاوز الصعوبات المالية و تحسين أداء الشركة

المساعدة على القيام بإجراءات استرجاع منحة الدولة للتشجيع على الاستثمار و المتعلقة بإنجاز مشروع من طرف الشركة التونسية للملابس القطنية (STVM) بالمنطقة الصناعية بمعتمدية الحامة - طريق المطار بمبلغ قدره 792306,845 د.ت الأخرى

المساعدة على إبرام اتفاقية الشراكة مع الوكالة العقارية الصناعية لإنجاز أشغال تهيئة المنطقة الصناعية بمعتمدية مظامة الجديدة على غرار ما تم مع أقطاب تكنولوجية أخرى

المساعدة على الإسراع في إنجاز المكونات الأساسية للقطب (مركز الموارد التكنولوجية و محضنة المؤسسات) بالمنطقة الصناعية ببوشمة- معتمدية قابس الغربية .

المساعدة على التسريع في إجراءات الهيئة العليا للاستثمار لإسناد امتيازات تكفل الدولة للربط بالشبكات الخارجية للمنطقة الصناعية بمعتمدية مظامة الجديدة (منطقة تنمية ذات أولوية) و المخصصة لإنجاز المشاريع في مجال الطاقات المتجددة و التحويل الطاقى.

المساعدة على الحصول على قرض بنكي خاصة من طرف بنك الإسكان (مساهم حالي في رأس المال) لإنجاز أشغال تهيئة المنطقة الصناعية بمعتمدية مظامة الجديدة .

# الوضع التنموي بولاية قابس

أهم المشاريع المدرجة بالمخطط 2016-2020 والتي لم تنطلق بعد (غير مرسمة بالميزانية)

المشروع	الكلفة (ا.د.)	الجهة المكلفة بالتنفيذ	المتابعة
حماية مدينة مارث من الفيضانات	2300		
ترميم القرى الجبلية (مطاطة-توجان-تمزرت-بني زلطن...)	3200	وزارة السياحة	لم يبرمج في الميزانية
بناء مستشفى جامعي	160000	وزارة الصحة	لم يبرمج في الميزانية
احداث مركز للحروق البليغة			
احداث بئر استكشافية بعقلة المرتبة (الحامة)	4000	وزارة الفلاحة	لم يبرمج في الميزانية
احداث مركز فنون ركحية ودرامية بقابس الكبرى	3000	وزارة الثقافة	لم يبرمج في الميزانية
تطهير بلدية مطاطة الجديدة	18000	وزارة التجهيز	لم يبرمج في الميزانية
تأهيل ميناء الصيد البحري بالزارات	25000	وزارة الفلاحة	لم يبرمج في الميزانية
انجاز المركز القطاعي للتكوين المهن في النقل واللوجستيك	12000	وزارة التكوين المهني والتشغيل	لم يبرمج في الميزانية
انجاز معهد ثانوي بقابس المدينة	2000	وزارة التربية	لم يبرمج في الميزانية
انجاز مركب تربوي بقابس الجنوبية	4000	وزارة التربية	

# الوضع التنموي بولاية قابس

## 4. متابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية

مشاريع لم تنفذ	مشاريع بصدد التنفيذ	مشاريع أنجزت	تاريخ الجلسة
32	29	44	25 جوان 2015
31	33	5	22 أوت 2019
63	62	49	المجموع

# الوضع التنموي بولاية قابس

## 4. متابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية : أهم المشاريع التي لم تنفذ 25 جوان 2015

المقترحات	المتابعة	القرار
الإسراع بتصنيف المستشفيات كمستشفيات جهوية	- تم القبول النهائي للأشغال بتاريخ 29 جويلية 2015 بالنسبة لمستشفى الحامة ولم يتم تفعيل القرار - عشر الأشغال على مستوى مستشفى مارث في حدود 45%	(17) تطوير المستشفيات المحليين بكل من الحامة ومارث الى مستشفيات جهوية صنف "ب"
ضرورة فسخ التعاقد مع الجانب البريطاني والبحث عن ممول جديد للمشروع	تعطل المفاوضات مع الممول البريطاني	(62) الشروع في بناء المستشفى الجامعي مع الانطلاق خلال سنة 2016 بإعداد الدراسات
التسريع في فتح باب الترشيحات للانتداب بالمناظرة	لم يتم الانطلاق في ترتيبات اجراء المناظرة من سنة 2016	(68) دعم مجهود التشغيل من خلال إعداد برنامج إنتدابات لتعويض الإحالات على التقاعد البالغ عددها 541 عوناً بالمجمع الكيميائي التونسي للفترة 2016/2018
برمجة المشروع لسنة 2021	عدم البرمجة ضمن ميزانية وزارة الفلاحة	(42) إحداث بئر استكشافية بعقلة المرتبة (الحامة) بكلفة 4 م د
توفير الاعتمادات لانجاز المشروع	تم توفير قطعة الأرض من طرف بلدية المكان	(95) إحداث متحف للحركة الوطنية بالحامة 4 م د
دعوة وزارة السياحة في الشروع باعداد الدراسات الفنية واعداد تصور لعناصر المشروع	عدم استكمال التسوية العقارية ل38 هكتار من مجموع 320 هكتار	(99) تهيئة المنطقة السياحية بشط الحمروني
دعوة وزارة التكوين المهني والتشغيل للشروع في اعداد الدراسات و انجاز المشروع	تم اختيار مكان المشروع وتخصيص العقار	(89) إحداث مركز للتكوين في اللوجستيك وصيانة المعدات الثقيلة

# الوضع التنموي بولاية قابس

## 4. متابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية : أهم المشاريع التي لم تنفذ 22 أوت 2019

المقترحات	المتابعة	القرار
دعوة المؤسسات الوطنية المنتصبة بالجهة للمساهمة	امتناع المؤسسات البنكية منح قرض للشركة بسبب عدم قدرتها على توفير التمويل الذاتي ( 700 ألف دينار) وكذلك المؤسسات المساهمة في رأس المال من الترفيع في الأسهم	معالجة الإشكاليات والصعوبات المالية التي يمر بها القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس وذلك من خلال: - دعوة مساهمين جدد للترفيح في رأس مال شركة التصرف في القطب . - المساعدة على الحصول على قرض بنكي بقيمة 3 م.د بالتنسيق مع صندوق الودائع والامانات لإنجاز التهيئة الداخلية للقسط الأول من المنطقة الصناعية مطماطة الجديدة.
التسريع بتفعيل قانون المسؤولية المجتمعية	عدم صدور الأوامر الترتيبية لقانون المسؤولية المجتمعية	تخصيص مساهمة سنوية في المجهود التنموي بالجهة من قبل المجمع الكيميائي التونسي بعنوان المسؤولية المجتمعية.
	مشروع غير مرسوم بالميزانية	الانطلاق في انجاز دراسة لحماية مدينة غنوش من الفيضانات وتهيئة وادي الطين قبل موفى سنة 2019 والشروع في الاشغال سنة 2020 بكلفة جمالية للمشروع 5 م.د.
دعوة وزارة التجهيز والإسكان للانطلاق الفوري في انجاز الدراسات	تم مراسلة وزارة التجهيز من أجل انطلاق الدراسات	انطلاق الدراسات لإنجاز الطريق السريعة قابس- قبلي- توزر-الحدود الجزائرية بطول 270 كلم سنة 2020 بكلفة 3 م.د.
التسريع بإحالة الاعتمادات لوكالة التصرف في النفقات للتسريع	تمت مراسلة الوزارة الغرض بتاريخ 04 سبتمبر 2019 لاحالة الاعتمادات	الانطلاق في أشغال إنجاز مركز لتجميع ونقل الفضلات المنزلية مشترك بين بلديات قابس وتبليو وذلك قبل شهر جوان 2020 ، الكلفة التقديرية حوالي 1 مليون دينار

# الوضع التنموي بولاية قابس

## 5. متابعة توصيات اللجنة البرلمانية خلال زيارتها لولاية قابس جانفي 2018

مشاريع أنجزت	مشاريع بصدد التنفيذ	مشاريع لم تنفذ
10	26	47

الملاحظات	التوصية
	دعوة اللجنة العليا للاستثمار للتسريع في إسناد الامتيازات لفائدة القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس.
تمسك مكتب الدراسات المكلف من طرف الوزارة بالمسار القديم رغم قرار المجلس الجهوي الراض لهذا المسار	التسريع في مد الخط الحديدي الرابط بين قابس ومدنين مع ضرورة تحيين مساره .
	تفعيل الإجراءات المتعلقة بمطار قابس- مطماطة الدولي في مستوى الخطوط الداخلية والدولية
	مراجعة القوانين المنظمة لهياكل التمويل والمساندة خاصة في علاقة بالبنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدفع وتحفيز الانتصاب للحساب الخاص والاستثمار بالجهة.
	إحداث فروع لمؤسسات التمويل الصغير وشركات الاستثمار في رأس المال (SICAV, SICAR)
	التسريع في تمويل لإعداد دراسة إحداث طريق ساحلية تربط بين قابس والزارات (30 كلم) .
تم العدول من طرف المستثمر الصيني كما تم الاتصال من طرف شركة تركية و هي في طور انجاز الدراسات	التسريع في إتمام المفاوضات مع الممول الصيني للتسريع في إجراءات انجاز المدينة الإستشفائية بمنطقة الخبايات بالحامة.
تأخر البت في مكان انجاز المدينة الصناعية الجديدة	التسريع في اجراءات كراء وحدة لتحلية ماء البحر بطاقة 3م7000 وذلك في انتظار إيجاد حلول بخصوص الإشكال العقاري والاجراءات المستوجبة لانجاز مشروع بناء محطة التحلية المبرمجة بطاقة 150 ألف م3.

# الوضع التنموي بولاية قابس

## 5. متابعة توصيات اللجنة البرلمانية خلال زيارتها لولاية قابس جانفي 2018

الملاحظات	التوصية
لم يتم حل مسألة التمويل لكي يتم البدء في اجراءات تغيير الصبغة	الاسراع في اصدار امر تغيير صبغة الأرض التي تم تخصيصها لبناء المستشفى الجامعي وإحداث قسم للحروق البليغة بقابس.
عدم توفر الاعتمادات اللازمة	التسريع في أشغال المنطقة الصناعية ببوشمة من قبل القطب التكنولوجي.
	التسريع في مشروع مد خط السكة الحديدية بين قابس - مدنين مع المطالبة بتحيين مساره الذي حدد منذ سنة 1980
تم برمجة الشروع في الدراسات لسنة 2020 في انتظار توفير التمويلات اللازمة	المطالبة باستكمال المشروع المقترح من الجهة والمتعلق بانجاز الطريق المغاربية التي ستربط بين قابس ومعتمدية - واد صوف - بالجزائر.
مشروع غير مرسوم بالميزانية	التسريع في توفير التمويلات اللازمة لإعداد دراسة إحداث طريق ساحلية تربط بين قابس والزارات (30 كلم)
عدم استكمال اقتناء كافة العقار	المطالبة بالانطلاق في انجاز المنطقة السياحية -بشط الحمروني- بقابس خاصة وأن الدراسات تم إعدادها والتمويل تم توفيره.
تمسك ممثل وزارة الشباب والرياضة في لجنة القيادة لتصنيف المؤسسة كمركب رياضي	التسريع في رصد الاعتمادات اللازمة للانطلاق في مشروع بناء مركز تربية للرياضيين بمطماطة خاصة بعد توفر قطعة الأرض.
	المطالبة برصد الاعتمادات اللازمة لمشروع ترميم القرى الجبلية (كلفة 3,3م.د. وإدراجه ضمن ميزانية التنمية).
	إحداث فرع للصيدلية المركزية بقابس

# الوضع التنموي لولاية قابس

## 6. إنجازات القطاع الخاص لولاية قابس سنة 2019

- تطور حجم الاستثمار المصرح به في القطاع الصناعي بـ 22% (135 م د سنة 2019 مقابل 111 م د سنة 2018)،
- حسب متابعة المشاريع الصناعية المصرح بها خلال الأربع سنوات المنقضية، تم سنة 2019 إنجاز 52,1% من حيث العدد، 62,7% من حيث حجم الاستثمارات و 16,3% من مواطن الشغل
- بلغ عدد المشاريع المصادق عليها من لجنة اسناد الامتيازات منحة التنمية الجهوية 7 مشروعا بحجم استثمار 7,8 م د وبمنحة قدرها 2 م د سنة 2019
- بلغ حجم الاستثمار المصرح به في القطاع الفلاحي سنة 2019 حوالي 78 م د مسجلا بذلك ارتفاعا بـ 35% مقارنة بسنة 2018،
- تم سنة 2019 في القطاع الفلاحي المصادقة على 225 مشروعا بحجم الاستثمارات 25,7 مليون دينار و 177 مواطن الشغل،



# الوضع التنموي بولاية قابس

## 6. إنجازات القطاع الخاص لولاية قابس سنة 2019

- تطور حجم الاستثمار المصرح به في القطاع السياحي بـ 119% (11 م د سنة 2019 مقابل 5 م د سنة 2018)،
- تمويل 492 مشروعا بحجم استثمار قدره 5,389 أ د من طرف البنك التونسي للتضامن،
- ارتفاع 104 باعنا بتدخل آلية اعتماد الانطلاق 1 باعتمادات قدرها 3,840 أ د،
- بلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المنجزة 15 مشروعا بحجم استثمار 156,7 م د و 136 موطن شغل،

# الوضع التنموي بولاية قابس

## 6. إنجازات القطاع الخاص لولاية قابس سنة 2019

وتتمثل أهم المشاريع المنجزة حسب القطاع في:

- دخول شركة قابس للمنتجات البحرية حيز الاستغلال ( مشروع بكلفة 13 مليون دينار و طاقة تشغيلية 500 موطن شغل)
- احداث توسعة بشركة فرحة الصحراء للمنتجات الجيوحرارية بكلفة 15 مليون دينار و بطاقة تشغيلية 120 موطن شغل

# المشاغل التنموية بولاية قابس

وتتمثل أهم المشاغل التنموية في:

- انجاز المدينة الصناعية الجديدة للصناعات الكيماوية
- دعم جهود التشغيل من خلال إعداد برنامج إنتدابات لتعويض الإحالات على التقاعد البالغ عددها 541 عونا بالمجمع الكيماوي التونسي للفترة 2016/2018
- تخصيص مساهمة سنوية في الجهود التنموي بالجهة من قبل المجمع الكيماوي التونسي بعنوان المسؤولية المجتمعية
- التسريع في إجراءات إنجاز المدينة الإستشفائية بمنطقة الخبايات بالحامة
- إحداث صندوق للتنمية والتشغيل بالجهة
- انجاز مشاريع معالجة التلوث الهوائي للمجمع الكيماوي التونسي
- اصلاح مباني المستشفى الجهوي بقابس وشبكتي الماء والتطهير
- الارتقاء بالمستشفين المحليين بالحامة ومارث الى مستشفين جهويين
- توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمشاريع الشباب والرياضة وقطاع الصحة للتسريع في نسق الانجاز
- توجيه عدد من المشاريع الكبرى المشغلة لجهة قابس للحد من البطالة



ديوان تنمية الجنوب

الهاتف: (216) 75.640.363

الفاكس: (216) 75.641.747

E-mail: [odsud@mdci.gov.tn](mailto:odsud@mdci.gov.tn)

Site web: [www.ods.nat.tn](http://www.ods.nat.tn)

# متابعة قرارات زيارة لجنة التنمية لمجلس نواب الشعب لولاية قابس

## جانفي 2018

ملاحظة: المشاريع المعطلة أو التي لم تدرج للتنفيذ واردة بلون الأزرق

مسائل تشريعية وترتيبية

المجال	نص القرار	حالة التنفيذ	الملاحظات
	ضرورة تقييم المخطط الخماسي للتنمية الحالي لتحسين البرامج والمشاريع التنموية		
	تسريع المصادقة على مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى		
	ضرورة إيجاد حلول للبيروقراطية والنصوص التشريعية المعطلة بما يمكن من اختصار آجال الردود ومنح التراخيص وتسريع الإجراءات خاصة المتعلقة بتغيير صبغة الأراضي والتقليص من الوثائق الإدارية والحد من المتدخلين		
	ضرورة رصد اعتمادات الدفع اللازمة من نفقات الدولة للجهة لتلافي النقص الذي تسبب في تعطيل العديد من المشاريع العمومية التنموية في مختلف القطاعات.		
	دعوة اللجنة العليا للاستثمار للتسريع في إسناد الامتيازات لفائدة القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس.	معطل	
	تسوية الوضعيات المهنية لعملة الحظائر والمناولة والمتعاقدين العاملين على حساب الآليات.	أنجز	
	تسوية الوضعيات المهنية لعملة الحظائر والمناولة والمتعاقدين العاملين على حساب الآليات.	في التنفيذ	
	توضيح الطرف المعني بالتكفل بإنجاز الدراسة المتعلقة بالتأثيرات الصحية المنجزة عن التلوث ومدى علاقة الأنشطة الصناعية بالجهة ببعض الأمراض المتفشية بها (وزارة الشؤون المحلية والبيئية أو وزارة الصحة)	معطل	

وزارة الداخلية

المجال	نص القرار	حالة التنفيذ	الملاحظات
	الإسراع بتعيين معتمد أول وكاتب عام للولاية	أنجز	
	تركيز مركز للحماية المدنية بمنطقة مطامة الجديدة ومركز حرس وطني للمرور	معطل	

وزارة الدفاع الوطني

المجال	نص القرار	حالة التنفيذ	الملاحظات
	التسريع في إتمام أشغال تغيير موقع التكتنين العسكريين (بولبابة وباب بحر)	في التنفيذ	تم تغيير الأرض المقترحة إلى أرض محاذية للمطار بعد الاعتراض على قطعة الأرض ببوشمة

وزارة النقل

المجال	نص القرار	حالة التنفيذ	الملاحظات
	التسريع في مد الخط الحديدي الرابط بين قابس ومدنين مع ضرورة تحيين مساره .	معطل	تمسك مكتب الدراسات المكلف من طرف الوزارة بالمسار القديم رغم قرار المجلس الجهوي الراض لهذا المسار
	إحداث منطقة لوجستية بميناء قابس	في طور الدراسات	تم الانتهاء من انجاز دراسة الجدوى و في طور إعداد الهيكلية المالية لديوان المناطق اللوجستية
	التسريع في بناء محطة النقل البري الجديدة بالموقع المتفق عليه في المجلس الجهوي بقابس.	في التنفيذ	تم تحديد قطعة الأرض المخصصة من طرف بلدية قابس في انتظار تغيير صبغة الأرض و قد تم الاعلان عن فتح مناظرة وطنية في الهندسة المعمارية لانجاز الدراسات
	تفعيل الإجراءات المتعلقة بمطار قابس- مطماطة الدولي في مستوى الخطوط الداخلية والدولية.	معطل	

وزارة المالية

المجال	نص القرار	حالة التنفيذ	الملاحظات
	مراجعة القوانين المنظمة لهيكل التمويل والمساندة خاصة في علاقة بالبنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدفع وتحفيز الانتصاب للحساب الخاص والاستثمار بالجهة.	معطل	
	إحداث فروع لمؤسسات التمويل الصغير وشركات الاستثمار في رأس المال (SICAV, SICAR)	معطل	
	التسريع في إحالة اعتمادات الدفع الكافية للإيفاء بتعهدات الإدارة إزاء المقاولين ومسدي الخدمات.	في التنفيذ	
	توفير اعتمادات الدفع اللازمة لخلاص كافة المقاولين المكلفين بأشغال مشروع تقوية وترميم قواعد وأسس المستشفى الجهوي بقابس في الأجل القانونية.	في التنفيذ	
	رصد الاعتمادات اللازمة للانطلاق في مشروع بناء قصر المالية بقابس (الكلفة تفوق 12 م.د.).	في التنفيذ	تم الإذن بانطلاق الأشغال. تم الشروع في صب الأساسات

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

المجال	نص القرار	حالة التنفيذ	الملاحظات
--------	-----------	--------------	-----------

	معتل	التسريع في تمويل لإعداد دراسة إحداث طريق ساحلية تربط بين قابس والزارات (30 كلم) .
تم العدول من طرف المستثمر الصيني كما تم الاتصال من طرف شركة تركية و هي في طور انجاز الدراسات	معتل	التسريع في إتمام المفاوضات مع الممول الصيني للتسريع في إجراءات انجاز المدينة الإستشفائية بمنطقة الخبايات بالحامة.
تم عدول المستثمر عن الموضوع	معتل	التسريع في البحث عن ممول للتسريع في إجراءات انجاز المستشفى الخاص بالأمراض السرطانية.
	أنجز	الإسراع بتعيين مدير جهوي للتنمية.

#### وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

المجال	نص القرار	حالة التنفيذ	الملاحظات
	التسريع في إبداء الرأي فيما يتعلق بتحويل وزارة الصحة للعقار الذي تم تخصيصه لبناء المستشفى الجامعي وإحداث قسم للحروق البليغة بقابس.	أنجز	

#### وزارة الشؤون المحلية والبيئية

المجال	نص القرار	حالة التنفيذ	الملاحظات
	التسريع في إضفاء المقررات المخصصة لإحداث إدارة جهوية للبيئة.	معتل	في انتظار الهيكل الجديدة لوزارة البيئة
	برمجة مشروع إحداث مركز مشترك لتحويل النفايات المنزلية بين بلديات قابس تيلبو وغنوش.	معتل	عدم توفر العقار
	التسريع في البدء في أشغال مشروع ربط مطماطة الجديدة بشبكة التطهير المبرمج منذ سنة 2016.	في طور الدراسات	مشروع مبرمج لسنة 2020

#### وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

المجال	نص القرار	حالة التنفيذ	الملاحظات
	توفير اعتمادات إضافية لانجاز كل المناطق السقوية المبرمجة.	في التنفيذ	
	إيجاد حلول واقعية لتلافي محدودية الموارد المائية بالجهة وحمايتها من التلوث.	في التنفيذ	إقرار مشروع استغلال مياه الحمامات بالحامة
	التسريع في استكمال انجاز محطة الزارات لتحلية مياه البحر لمعالجة إشكالية النقص في المياه بالجهة.	في التنفيذ	تقدم انجاز المشروع 20%
	تسريع انجاز القسط الثاني من برنامج حماية مدينة مطماطة الجديدة من الفيضانات.	معتل	مشروع غير مرسوم بالميزانية
	التسريع في إجراءات كراء وحدة لتحلية ماء البحر بطاقة 3م7000 وذلك في انتظار إيجاد حلول بخصوص الإشكال العقاري والاجراءات المستوجبة لانجاز مشروع بناء محطة التحلية المبرمجة بطاقة 150 ألف م3.	معتل	تأخر البت في مكان انجاز المدينة الصناعية الجديدة
	إيجاد حلول عملية للنهوض بقطاع الصيد البحري بالجهة وحمايته من التلوث		
	التسريع في إجراءات تعيين مكتب دراسات في أقرب الاجال للقيام بتقييم دراسة إحداث ميناء الصيد البحري بغنوش.	معتل	عدم وجود التمويلات اللازمة من طرف المجمع الكيميائي

لم يتم حل مسألة التمويل لكي يتم البدء في اجراءات تغيير الصبغة	معطل	الاسراع في اصدار امر تغيير صبغة الأرض التي تم تخصيصها لبناء المستشفى الجامعي وإحداث قسم للحروق البليغة بقابس.
	أنجز	إحداث إقليم ثان للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمعتمدية قابس الجنوبية.

#### وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الملاحظات	حالة التنفيذ	نص القرار	المجال
تم الانتهاء من انجاز القسط الثالث للمنطقة الصناعية بمساحة 100 هكتار و برمجة المنطقة الصناعية بمساحة 50 هكتار بالحامة	في التنفيذ	إحداث مناطق صناعية جديدة واستكمال تهيئة المناطق الصناعية المبرمجة أو المنجزة.	
عدم توفر الاعتمادات اللازمة	معطل	التسريع في أشغال المنطقة الصناعية ببوشمة من قبل القطب التكنولوجي.	
	معطل	دعوة المجمع الكيميائي التونسي إلى التسريع في نسق إعداد كراس الشروط المتعلق بالقيام بالتهيئة الأولية لحسن سير بقية الإجراءات الرامية إلى تفعيل شركة الصيانة.	
بلغت نسبة تقدم انجاز المشروع 95%	في التنفيذ	دعوة المجمع الكيميائي التونسي إلى التسريع في إجراءات طلب العروض لاستحداث أشغال تركيب المعدات الجديدة للحد من انبعاث ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد الأزوت.	
تم القيام بتجارب نموذجية لاختيار الطريقة التي ستعتمد لمعالجة هذه الغازات. حاليا في طور الإعداد لتجربة على مستوى وحدة إنتاج صناعية بالوحدات ليقع تعميمها لاحقا على بقية الوحدات.	في التنفيذ	دعوة المجمع الكيميائي التونسي إلى التسريع في إجراءات طلب العروض للانطلاق في أشغال مشروع الحد من الروائح الكريهة	
	معطل	دعوة المجمع الكيميائي التونسي إلى استحداث عمل اللجنة الراجعة له بالنظر لإتمام إجراءات المناظرة المخصصة لتعويض الإحالات على التقاعد لسنوات 2016-2017-2018.	
بلغت نسبة تقدم انجاز المشروع 85%	في التنفيذ	دعوة المجمع الكيميائي التونسي إلى التسريع في استكمال إجراءات طلب العروض المخصص لإحداث مصنع للحامض التقني والأسمدة الذوابة.	
بلغت نسبة تقدم انجاز المشروع 85%	في التنفيذ	التسريع بإيجاد حلول مع البنك الممول لتوفير السيولة اللازمة للمقاول حتى يتمكن من مواصلة أشغال مشروع الحد من انبعاثات غاز الامونيا.	
بلغت نسبة تقدم الأشغال 10%	في التنفيذ	التسريع في المصادقة على تقرير فرز العروض من قبل اللجنة العليا لمراقبة الصفقات للانطلاق في بناء المقر الاجتماعي الجهوي للمجمع الكيميائي.	



دعوة بقية المساهمين للترفيح في رأس المال	معطل	طلب الترفيع في الموارد المالية المرصودة لتهيئة المناطق الصناعية التابعة لشركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي يقاس من 7م.د إلى حدود 20م.د.
عدم توفر الاعتمادات	معطل	التسريع بالإجراءات المتعلقة بإحداث المنطقة الصناعية التابعة للقطب التكنولوجي بمطاطة الجديدة
	معطل	إحداث إدارة جهوية للوكالة العقارية الصناعية

#### وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

الملاحظات	حالة التنفيذ	نص القرار	المجال
ويتوزع مشروع الطريق السيارة قابس - مدنين على 4 اقسام تمتد على مسافة 84 كلم وتبلغ كلفة انجازه 360 مليون دينار. نسبة تقدم الأشغال 72%	في التنفيذ	الإسراع باستكمال انجاز الطريق السيارة قابس- مدنين	
	معطل	التسريع في مشروع مد خط السكة الحديدية بين قابس - مدنين مع المطالبة بتحيين مساره الذي حدد منذ سنة 1980	
تم برمجة الشروع في الدراسات لسنة 2020 في انتظار توفير التمويلات اللازمة	معطل	المطالبة باستكمال المشروع المقترح من الجهة والمتعلق بانجاز الطريق المغاربية التي ستربط بين قابس ومعتمدية - واد صوف - بالجزائر.	
مشروع غير مرسوم بالميزانية	معطل	التسريع في توفير التمويلات اللازمة لإعداد دراسة إحداث طريق ساحلية تربط بين قابس والزارات (30 كلم)	
تم انجاز مشروع تهذيب المدينة القديمة بمارث + عدم برمجة المدينة القديمة بالمنزل وجارة و شنني	معطل	التسريع في إيجاد التمويلات اللازمة للانطلاق في مشروع تهيئة المدينة القديمة بالمنزل وجارة ومارث وشنني.	
	في التنفيذ	التسريع في إيجاد التمويلات اللازمة للانطلاق في انجاز تهيئة حي الحامة الشمالية بالحامة وحي خبير الدين بوذرف وحي سيدي راشد بشنني النحال وحي سيدي بولبابة بقابس وحي المزوايدة بغنوش وحي نخيلة فرحات بالمطوية.	
تم اقتراح مشروع تهيئة منزل الحبيب في إطار برنامج الوكالة الفرنسية للتنمية	معطل	التسريع في توفير التمويلات الضرورية للانطلاق في انجاز تهيئة المناطق الريفية التالية : منزل الحبيب ودخيلة توجان والمدو وعرام وكتانة (5 مناطق ريفية ذات كثافة سكانية)	
		تهذيب كل من مناطق بدورة والنحال والجواولة.	
تم إمضاء اتفاقية التمويل لانجاز المشروع . في طور إعداد الدراسات الجيولوجية و الفنية لتهيئة واد قريعة	في طور الدراسات	التسريع في انجاز جسرين -2- على مستوى شارع باريس والأخر بالكرنيش.	
	معطل	تتوير الطريق الرابطة بين مطاطة الجديدة والمطار	
تم الشروع في انجاز الدراسات لإعادة تعبيد الطريق 107 كما تم الانتهاء من تركيز منشآت السلامة بهذه الطريق	في الدراسات	تعبيد الطريق المرقمة الرابطة بين 107 و 956، إضافة إلى تفعيل إعادة تعبيد الطريق 107 الرابطة بين قابس ومطاطة المبرمج سنة 2017	

وزارة السياحة والصناعات التقليدية

المجال	نص القرار	حالة التنفيذ	الملاحظات
	المطالبة بالانطلاق في انجاز المنطقة السياحية -بشط الحمروني- بقباس خاصة وأن الدراسات تم إعدادها والتمويل تم توفيره.	معطل	عدم استكمال اقتناء كافة العقار
	إحداث مسلك سياحي بوادي شنتي	معطل	
	المطالبة بتوفير التمويلات اللازمة للانطلاق في انجاز المحطة الاستشفائية بالخبايات.	معطل	عدم وجود مستثمر استوفى كامل الإجراءات القانونية لانجاز المشروع
	المطالبة بتحويل الاعتمادات اللازمة للدراسات الأولية المتعلقة ببناء القرية الحرفية بالمطوية.	في التنفيذ	
	دعوة الديوان الوطني للصناعات التقليدية إلى الإسراع في انجاز دراسة الجدوى للقرى الحرفية بكل من الحامة ومارث.	أنجز	
	الإسراع بتعيين مدير جهوي لفرع الوكالة العقارية السياحية.	معطل	

وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

المجال	نص القرار	حالة التنفيذ	الملاحظات
	توسيع قدرات شركة البستنة والبيئة والغراسة من حيث الانتدابات. ( المطالبة بالتنظير مع ما تم اتخاذه في ولاية قفصة)	معطل	تم تجميد الانتدابات في شركة البيئة والغراسة

وزارة الشباب والرياضة

المجال	نص القرار	حالة التنفيذ	الملاحظات
	المطالبة برصد الاعتمادات اللازمة لإحداث حديقة رياضية بالميدة) المطوية (بكلفة 500 ألف دينار وإدراجها ضمن ميزانية التنمية.		
	التسريع في توفير وفتح اعتماد إضافي قدره 5،1 م.د. لتدعيم وظيفة القسط الأول من مشروع بناء إقامة الشالة من معتمدية قايس.	معطل	عدم برمجة القسط الثاني لأن القسط الأول لم يقع استغلاله
	التسريع في رصد الإعتمادات اللازمة للانطلاق في مشروع بناء مركز تربية للرياضيين بمطماطة خاصة بعد توفر قطعة الأرض.	معطل	تمسك ممثل وزارة الشباب والرياضة في لجنة القيادة لتصنيف المؤسسة كمركز رياضي

وزارة الشؤون الثقافية

المجال	نص القرار	حالة التنفيذ	الملاحظات
	المطالبة برصد الاعتمادات اللازمة لإحداث مركز فنون درامية وركحية بقباس وإدراجه ضمن ميزانية التنمية.		
	المطالبة برصد الاعتمادات اللازمة لإحداث متحف للحركة الوطنية بالحامة وإدراجه ضمن ميزانية التنمية.	معطل	

مطل	المطالبة برصد الاعتمادات اللازمة لمشروع ترميم القرى الجبلية (كلفة 3,3م.د) وإدراجه ضمن ميزانية التنمية.	
مشروع غير مرسوم بالميزانية	مطل	التسريع في رصد الاعتمادات اللازمة لصيانة وتهيئة المكتبة العمومية القديمة "الكنيسة" والتي تقدر بـ 600أد إضافة الى تخصيص عقار هذه المكتبة لفائدة الوزارة.

## وزارة الصحة

الملاحظات	حالة التنفيذ	نص القرار	المجال
عدم الوصول الى اتفاق نهائي مع الممول البريطاني	مطل	الإسراع بالانطلاق في دراسات بناء المستشفى الجامعي وإحداث قسم للحروق البليغة بقباس.	
	أنجز	التسريع في إجراءات إبداء الرأي حول دراسة الجدوى التي أعدتها الإدارة الجهوية للصحة بخصوص تجديد أو تهيئة قسم الاستعجالي بوزرف وإنشاء قسم لتصفية الدم.	
	مطل	التسريع في إتمام المفاوضات مع الممول الصيني للتسريع في إجراءات انجاز المدينة الاستشفائية بمنطقة الخبايات بالحامة.	
	مطل	التسريع في البحث عن ممول للتسريع في إجراءات انجاز المستشفى الخاص بالأمراض السرطانية.	
تم إخلاء أقسام جديدة للتسريع في نسق الانجاز	في التنفيذ	الترفيغ في نسق أشغال مشروع تقوية وترميم قواعد وأسس المستشفى الجهوي.	
	مطل	إحداث المستشفى الجهوي الثاني الذي وعدت به الجهة منذ سنة 2013.	
	مطل	إحداث فرع للصيدلية المركزية بقباس.	
	مطل	التسريع في انجاز المستشفى المبرمج منذ سنة 2014 بمنطقة الذكارة بمطماطة الجديدة.	
	مطل	إحداث مستشفى محلي ودائرة صحية بقباس الغربية.	
	في التنفيذ	تدعيم المستشفيات الجهوية والمحلية بالتجهيزات والمعدات الطبية اللازمة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية.	
	في التنفيذ	تدعيم المستشفى الجهوي بقباس بالإطار الطبي وشبه الطبي اللازمين وخاصة طب الاختصاص.	

## وزارة الشؤون الاجتماعية

الملاحظات	حالة التنفيذ	نص القرار	المجال
	أنجز	التسريع في تدعيم مركز للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومركز للصندوق الوطني للتأمين على المرض بمارث بالإطار البشري الضروري لضمان انطلاقهما في إسداء خدماتهما في أقرب الآجال.	
	مطل	التسريع في المصادقة على الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للتأمين على المرض للانطلاق في إجراءات إحداث إقليم طبي بالجهة.	

المجال	نص القرار	حالة التنفيذ	الملاحظات
	التسريع في المصادقة على قرار إحداث مكتب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالحامة.	أنجز	
	التسريع في مشروع إحداث دار خدمات بمطماطة الجديدة المطروح منذ سنة 2011 ولذلك تم اقتراح تمكين الجهة من المقر المصادر والمتمثل في دار الجمعيات حاليا المقر السابق للتجمع ليكو مقرا لبعث هذه الدار.	أنجز	
	التسريع في إجراءات إبرام اتفاقية الشراكة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفى العسكري بقابس.	معطل	

#### وزارة التكوين المهني والتشغيل

المجال	نص القرار	حالة التنفيذ	الملاحظات
	تفعيل انجاز مشروع إحداث مركز للتكوين في اللوجستيك وصيانة المعدات الثقيلة عبر إدراجه بميزانية التنمية (مشروع مبرمج في المخطط).	في طور الدراسات	
	الإسراع بإحداث مكتب تشغيل صلب دار الخدمات بمطماطة الجديدة والمعلن عليه ضمن الإجراءات المتعلقة بولاية قابس في جوان 2015.	معطل	

متابعة قرارات المجلس الوزاري المضيق لولاية قابس بتاريخ 25 جوان 2015

ملاحظة: المشاريع المعطلة او لم تدرج للتنفيذ و اردت باللون الأزرق

نص القرار	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة
(1) إحداث معتمدية وبلدية بدخيلة توجان	وزارة الداخلية	أنجز	تم إصدار الأمر 1517 لسنة 2015 بتاريخ 20 أكتوبر 2015 المتعلق بإحداث المعتمدية
	الولاية		تم تركيز مقر المعتمدية الجديدة بمقر المجلس القروي بدخيلة توجان
	المعتمدية		تم تركيز البلدية و تم توفير المقر
(2) فتح دار لخدمات الضمان الاجتماعي بمطامطة	وزارة الشؤون الإجتماعية-الولاية	أنجز	
(3) إحداث إدارة جهوية للبيئة بقابس	وزارة الشؤون المحلية و البيئة	معطل	
(4) إحداث صندوق للتنمية والتشغيل بالجهة	الولاية -الإدارة الجهوية للتشغيل	معطل	تم تكليف شركة تصريف الخليج للخدمات المالية لاستكمال الاجراءات الادارية والقانونية المرتبطة بالإكتتاب في رأس المال وتسيير الصندوق برأس مال قدره 50 مليون دينار ..
(5) التأهيل الفوري لمحطة التطهير بشط السلام بكلفة تناهز 6.2 مليون دينار	الإدارة الجهوية للتطهير وزارة الشؤون المحلية و البيئة الولاية	أنجز	
(6) توفير مخزون عقاري وذلك بالموافقة المبدئية على إخراج 240 هك من ملك الدولة الغابي الى ملك الدولة الخاص والإنطلاق في إجراءات إعداد مثال تهيئة تفصيلي.	وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية	أنجز	تم تغيير صبغة الأرض بالأمر عدد 440 بتاريخ 16 ماي 2018 لإنجاز مستشفى جامعي
(7) تغيير موقع الثكنتين العسكريتين (بولبابة وباب بحر) الى منطقة بوشمة لتوفير مخزون عقاري إضافي داخل المنطقة البلدية لولاية قابس	وزارة الدفاع الوطني	معطل	أجل حسب رد السيد الوزير خلال مناقشة ميزانية وزارة الدفاع لسنة 2018
			دراسة تهيئة 07 مناطق سقوية عمومية: إنتهاء الدراسات: (100 %)
			دراسة الوضعية المرجعية لمنطقة تدخل المشروع: إنتهاء الدراسات: (100 %)
			إحداث 02 آبار إستغلال بكل من كتانة والغندري
			كتانة: (100 %)
			الغندري: (100 %)
			تهيئة 7,8 كلم من المسالك الريفية بالمطوية (100 %)
			إستشارة لمراقبة ومتابعة أشغال تهيئة وتعبيد المسالك الريفية (100 %)
			إستشارة لتجهيز مخبر الصحة الحيوانية (100 %)
			إحداث بئر عميقة بمنطقة الشارب من معتمدية الحامة (100 %)

نص القرار	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة
(8) إنطلاق إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في المرحلة الثانية بكلفة 69 م.د	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	في التنفيذ	التهيئة العقارية على مساحة 3000 هك (15 % ) إقتناء عدد 2 محطات للرصد الجوي لاستعمالات فلاحية (100 % ) استشارة لمراقبة ومتابعة أشغال تهيئة وتعبيد المسالك الريفية: تقدم الأشغال بنسبة 100 % استشارة لتجهيز مخبر الصحة الحيوانية: 60 % دراسة الموارد المائية العميقة بمعتمدية منزل الحبيب: تمت المصادقة على المراحل الثلاثة الأولى و بصدد المصادقة على المرحلة النهائية (90%) تهيئة المنطقة السقوية زريق الغندري: 100% التهيئة العقارية على مساحة 3000 هك (360 أ.د) بصدد تسجيل الاتفاقية اقتناء عدد 02 محطات للرصد الجوي لاستعمالات فلاحية (37.524 أ.د ) 100% أشغال تهيئة وتعبيد المسالك الريفية. 100 %
(9) تدعيم البنية التحتية الرقمية بكلفة 1.5 م.د وذلك من خلال: ربط 60 مدرسة أساسية و 64 مركزا للصحة الأساسية بـ 13 منطقة ريفية تابعة لخمسة معتمديات من ولاية قابس بشبكة الاتصالات الجوّالة من الجيل الثالث والنفذ الى الأنترنت	إتصالات تونس	أنجز	في إطار إتمام إجراءات التنفيذ
(10) تدعيم الخدمات البريدية، وذلك من خلال: إحداث مكتب بريد بغفوش الجديدة. توفير سيارة جديدة للبريد المتجول مجهزة بالإعلامية تغطي المناطق النائية بالولاية تدعيم الموارد البشرية للبريد بجهة قابس بسبع انتدابات جديدة تدعيم الموزعات الآلية المالية بتوفير موزعين إضافيين في مجال التشغيل:			
	الديوان الوطني للبريد		
	الديوان الوطني للبريد	أنجز	
	الديوان الوطني للبريد		
(11) الإسراع في إنجاز المناظرة المتعلقة بانتداب 120 إطارا من قبل المجمع الكيميائي التونسي بشركة البيئة.	المجمع الكيميائي التونسي	أنجز	
(12) انتداب 170 عاملا بشركة الصيانة وشركة البيئة يكونون من بين الشباب العاطل عن العمل من المناطق المجاورة للمنطقة الصناعية بقابس، بعد التثبت من القائمة.	المجمع الكيميائي التونسي	أنجز	
(13) التدقيق في شركة البيئة وتفعيلها	المجمع الكيميائي التونسي	أنجز	
(14) تفعيل شركة الصيانة التي تم إحداثها من قبل المجمع الكيميائي التونسي.	المجمع الكيميائي التونسي	أنجز	تم ضبط برنامج لتفعيل نشاط الشركة يرتكز على ثلاثة محاور يتم إنجازها بالتوازي: 1) الإنطلاق في تنفيذ برنامج إنتدابات يمتد على 5 سنوات *2016 : تم انتداب 46 عونا بأشروا عملهم في إطار تريبص بداية من 08/08/2016 - ملف انتداب 10 إطارات في طور الإعداد

نص القرار	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة
			2) بناء المقر الاجتماعي والورشات : قامت الشركة باقتناء قطعة أرض (10 هك) بالمنطقة الصناعية بقابس ستخصص لانجاز المشروع. ملف بناء القسط الأول في طور الإعداد.
			3) اقتناء المعدات والتجهيزات خلال الفترة 2017/2018
			في القطاع الفلاحي
			15) الانطلاق في إعداد الدراسات التفصيلية لمحطة تحلية مياه البحر بالزارات من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بكلفة 160م.د.
			القطاع البيئي:
			16) تأهيل محطة التطهير بالحامة بكلفة حوالي 3.4 م.د.
			القطاع الصحي:
			بخصوص تطوير المستشفى المحلي بالحامة الى مستشفى جهوي صنف "ب"
			- تم القبول النهائي للأشغال بتاريخ 29 جويلية 2015
			بخصوص تطوير المستشفى المحلي بمارث الى مستشفى جهوي صنف "ب"
			إنطلقت الأشغال في 11 جانفي 2018 و بلغت نسبة تقدم الأشغال 45%
			في مجال التشغيل:
			18) الانطلاق في الدراسات للارتقاء بمركز الصحة الأساسية الخاص بمنطقة شط السلام من الصنف 3 الى الصنف 4
			19) فتح المركز الصحي الأساسي صنف 4 بدخيلة توجان وتوفير خدمات الإستعجالي
			20) تطوير الخدمات الصحية بكل من غنوش والمطوية ومنزل الحبيب ومطاطة الجديدة.
			21) تدعيم الجهة بطبيب وإطارات شبه طبية (03 فنيين سامين في التبنيج و 01 فني سامي في التصوير الطبي و 01 فني سامي مخبري و 01 فني سامي في التوليد و 04 ممرضين)، وذلك لاستغلال الإحداثيات الجديدة خاصة بمركز الصحة الأساسية بدخيلة توجان...
			22) قطاع الصناعة والطاقة والمناجم
			- دعم الجهود البيئي من خلال:
			الإطلاق في تنفيذ مشروع الحد من إنبعاث الـSO2 " ثاني أكسيد الكبريت" من وحدات الحامض الكبريتي أثناء فترات إعادة تشغيل الوحدات بكلفة 12 م.د.
			23) الإطلاق في تنفيذ مشروع الحد من إنبعاث الـ NOX " أكسيد الأوزون" من وحدة إنتاج الحامض الكبريتي بكلفة 5.2 م.د.
			24) الإطلاق في تنفيذ مشروع استعمال تقنية الامتصاص المضاعف واسترجاع الحرارة في الوحدة الثانية لإنتاج الحامض الكبريتي بكلفة 45 م.د.
			25) تفعيل برنامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية

المتابعة	حالة التنفيذ	المعنى بالتنفيذ	نص القرار
			(صرف مبلغ قيمته 4 م.د) من خلال دعم البنية التحتية:
	أنجز	المجمع الكيميائي التونسي	- صيانة المدارس والمعاهد: 642 أ.د.
	أنجز		تعبيد طرقا بالمناطق المحاذية للمنطقة الصناعية ومساعدة البلديات: 2 م.د.
	أنجز		- بناء مركز صحة أساسية بشاطيء السلام: 600 أ.د
	أنجز		قطاع التجهيز والبنية الأساسية
			إطلاق تهيئة وتعبيد 30 كلم من المسالك الريفية بكلفة 6.26 م.د خلال شهر أوت 2015
	أنجز	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	(26) منزل الحبيب) تهيئة وتعبيد مسلك زقراطة العهد الجديد 8,11 كم بكلفة 1998 أ.د
	أنجز	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	(27) استئناف أشغال تهيئة وتعبيد الطريق الحزامية لمدينة الحامة (القسط الأول) بكلفة 4.9 م.د خلال شهر جويلية 2015
			قطاع تهذيب الأحياء الشعبية
	أنجز	وكالة التهذيب والتجديد العمراني	(28) انطلاق أشغال تهذيب حي مطرش القديمة والجديدة بكلفة 4.35 م.د قبل موفى جوان 2015
	أنجز	وكالة التهذيب والتجديد العمراني	(29) إطلاق أشغال تهذيب حي محمّد علي بقابس بكلفة 6.4 م.د قبل موفى جويلية 2015 .
			مشاريع القطاع الفلاحي
			* مشاريع القطاع الفلاحي التي ستنتقل خلال سنة 2016:
	أنجز		(30) إحداث بئر للماء الصالح للشراب بالحملة من معتمدية مارث بكلفة 250 ألف دينار لفائدة 4500 ساكن .
	أنجز		(31) إحداث بئر تدعيمية بمنطقة السدرية من معتمدية مارث (50 هك) بكلفة 450 أ.د.
	أنجز		(32) إحداث بئر تدعيمية بواحة الحامة (400 هك) بكلفة 350 أ.د.
	أنجز		(33) إحداث منطقة سقوية بالموايزير 2 من معتمدية قابس الجنوبية (50 هك) بكلفة 960 أ.د.
	أنجز		(34) تزويد مناطق الريف بالماء الصالح للشراب لتونين بني رشيد من معتمدية مارث لفائدة حوالي 175 ساكن بكلفة 170 أ.د.
	أنجز		(35) تعهد وصيانة شبكة الماء الصالح للشراب بالمنطقة الريفية بمركب زاتن من معتمدية مطماطة لفائدة حوالي 300 ساكن بكلفة 100 أ.د.
	طلب العروض	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	(36) إعداد دراسة لإعادة تهيئة مركب سيدي التواتي من معتمدية مارث للماء الصالح للشراب لفائدة 4500 ساكن بكلفة 2500 ألف دينار .
	أنجز		(37) تهيئة وتعبيد المسالك الريفية على طول 11.33 كم بكل من مطماطة الجديدة والحامة ومنزل الحبيب بكلفة 3 م.د.



المتابعة	حالة التنفيذ	المعنى بالتنفيذ	نص القرار
	أنجز		(38) إحداث 03 آبار إستغلال ( 2 في معتمدية مطماطة و 1 في معتمدية المطوية) بكلفة 1.4 مليون دينار .
- في نطاق مشروع التنمية الفلاحية المندمجة المرحلة الثانية سيقع إنجاز المناطق السقوية التالية خلال سنة: 2016 * بونجمة (الحامة): في إنتظار مصادقة لجنة الصفقات على تقرير تقييم العروض * الغندري (مارث): 100 % * كتانسة (مارث): 100 % * شعبة الجيارة (مطماطة الجديدة): 100 %	أنجز		(39) تهيئة مناطق سقوية عمومية بكل من الحامة ومارث ومطماطة الجديدة بكلفة 3.7 مليون دينار
تكفل المجمع الكيميائي بتوفير الإعتمادات وتعهد الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك والإدارة العامة للمواني الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية القيام بإجراءات إختيار مكتب دراسات لتحيين الدراسة. إمضاء الإتفاقية بين الأطراف التالية: - المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس - المجلس الجهوي بقابس - المجمع الكيميائي التونسي	معطل	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	(40) تحيين دراسة إحداث ميناء الصيد البحري غنوش بكلفة 250 أ.د تمّول على موارد المجمع الكيميائي التونسي.
			(41) مشاريع القطاع الفلاحي التي ستتجزز خلال الفترة 2017/2020
تم إدراجه ضمن مشاريع المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 22 أوت 2019	معطل		تهيئة ميناء الصيد البحري بالزارات بكلفة 25 م د .
مشروع مقترح إدراجه ضمن المخطط 2017/2020	معطل		(42) إحداث بئر إستكشافية بعقلة المرتبة ( الحامة) بكلفة 4 م د
مشروع مقترح إدراجه ضمن المخطط 2017/2020 *(رزانمة الإنجاز)	في التنفيذ		(43) إحداث 3 آبار بواحة قابس الكبرى وذلك بكل من، قابس الوسطى بكلفة : 700 أ د قابس البحرية بكلفة: 650 أ د قابس العليا بكلفة: 550 أ د
قابس الوسطى: 2020 قابس البحرية: 2019			(44) إحداث بئر ببئر محجوب (غنوش) بكلفة 530 أ د
	أنجز	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	(45) إحداث بئر بالواحة القديمة بمارث بكلفة 1.3 م د
100%	أنجز	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	(46) إحداث بئر عميقة بمنطقة الزراوة بمطماطة الجديدة بكلفة 750 أ د
مشروع مقترح إدراجه ضمن المخطط 2016-2020 تم الانطلاق في الأشغال مشروع مقترح إدراجه ضمن المخطط 2017-2020 في طور دراسة 60 كلم من طرف مكتب دراسات STUDI حيث من المزمع إنجاز 5,38 كلم بولاية قابس بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية الدراسة جارية، تم تقديم المرحلة الأولى وفي إنتظار التقرير النهائي بعد أن تم ضبط 5,38 كلم مشروع مقترح إدراجه ضمن المخطط 2017-2020 . * مساهمة الجهة في هذا البرنامج كما يلي:	أنجز	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	(47) تعبيد 100 كلم من المسالك الفلاحية (داخل المنطقة السقوية) بكلفة 12 م د

نص القرار	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة
(48) دعم عملية كهربية الآبار الخاصة (150 بئر) بكلفة 4 م د .	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	أنجز	(1) المجلس الجهوي: 2016+ * كهربية آبار فلاحية بليماوة من معتمدية قابس الجنوبية 18.2 أ.د. * ربط آبار بواد زيتون بمعتمدية منزل الحبيب 21.984 أ.د. (2) المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس: تدخل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة القسط الثاني لكهربية آبار البسيبي من معتمدية المطوية بقيمة 1181.160 أ.د.
(49) في مجال التجهيز والبنية الأساسية: إكمال الطريق السيارة صفاقس-قابس بكلفة 502 مليون دينار	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	أنجز	
(50) تعبيد الطريق الرابطة بين غوش ووذرف خلال سنة 2016 بكلفة 2 م د (تهيئة وتعبيد مسلك كباكانا) 5.7 كلم بكلفة 2000	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	في التنفيذ	* تم إدراجه بالمخطط 13 في إطار تهيئة المسالك بكلفة 2 مليون دينار و هو في طور الدراسات
(51) تهيئة مدخل مدينة وذرف بكلفة 2.2 م د في سنة 2016 *وذرف: تهيئة الطريق الوطنية رقم 15 بمدخل مدينة وذرف 3 كلم الكلفة 2200 أ.د.	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	أنجز	
(52) تعبيد وصيانة 60 كلم من المسالك الريفية بكلفة 8.9 م د خلال سنة 2016	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	أنجز	
(53) مشاريع 2020-2017: إكمال الطريق السيارة قابس – مدينين	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	في التنفيذ	04 أقساط بكلفة جمالية 360 م.د تقدم الإنجاز 75%
(54) قابس المدينة / مارت: دراسة إحداث طريق ساحلية تربط بين قابس والزارات (30 كلم) خلال فترة 2016 – 2020	وزارة التجهيز	معطل	تم إدراجه ضمن مشاريع المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 22 أوت 2019
(55) قابس الجنوبية: تهيئة وادي قريعة بقابس بكلفة 30 م د.	وزارة التجهيز	طلب العروض	تم إدراجه ضمن مشاريع المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 22 أوت 2019 تم إدراجه ضمن مشاريع المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 22 أوت 2019 تم إدراجه ضمن مشاريع المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 22 أوت 2019
(56) تثنية الطريق الوطنية رقم 1 من مفترق المطوية الى مدخل قابس بكلفة 25 م د (10.1 كلم) بكلفة 12000 أ.د	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	الدراسات	مشروع سيدرج ضمن المخطط 13 إطلاقت الدراسات منذ أكتوبر 2017 بصدد إعداد ملف طلب العروض
(57) تعصير الطريق الوطنية رقم 16 من مدخل الحامة الى قابس بكلفة 24 م د على أن تتطلق الأشغال سنة 2017:	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	في التنفيذ	نسبة الانجاز 70 %
(58) تدعيم طرقات مرقمة بكلفة 29.4 م د	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	أنجز	
(59) تهيئة طرقات مرقمة بكلفة 17.5 م د	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	في التنفيذ	تهيئة الطريق المحلية رقم 780 بطول 29 كلم ( بتمويل من BAD.7 ): نسبة الانجاز 50 % الكلفة : 13.7 م.د

نص القرار	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة
			تهيئة الطريق المحلية رقم 953، بكلفة 10 م.د: مشروع سيدرج ضمن المخطط 13
60) بناء جسرين في مستوى وادي الغرم والمقرن بكلفة 10 م د	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	أنجز	1) جسر على مستوى وادي الغرم (BAD.7 ) - مبلغ الصفقة : حوالي 7 م.د - مدة الإنجاز : 18 شهرا - تاريخ إنطلاق الأشغال : 16 ماي 2016 نسبة تقدم الإنجاز : 100 %
61) تهذيب الأحياء التالية:			
تهيئة المدينة القديمة بمنزل وجارة وبمارث وبشني	وكالة التهذيب والتجديد العمراني	معطل	بخصوص تهيئة المدينة القديمة بمنزل و جارة و بشني بصدد البحث عن تمويل أما مارث بصدد الإنجاز نسبة التقدم 80 %
تهيئة أراضي بيضاء محاذية لمناطق التدخل: حوالي 40 هك لأراضي بيضاء محاذية لحي محمّد علي بقابس المدينة في مجال الصحة	وكالة التهذيب والتجديد العمراني	معطل	تطلب الجهة إنجاز برنامج عمراني عصري و ليس مقاسم إجتماعية أو مشاريع تهذيب
62) الشروع في بناء المستشفى الجامعي مع الانطلاق خلال سنة 2016 بإعداد الدراسات	وزارة الصحة	معطل	في إنتظار اتعاقد مع مستثمر لتمويل إنجاز المشروع
63) الانطلاق إبتداء من سنة 2016 في الدراسة المتعلقة بالتأثيرات الصحية المنجزة عن التلوث ومدى علاقة الأنشطة الصناعية بالجهة ببعض الأمراض المتفشية بها ( السرطان، ضيق التنفس ، هشاشة العظام...) علما أنه تم الشروع في إعداد الخطوط المرجعية للدراسة.	وزارة الصحة	معطل	تم إعداد الضوابط المرجعية من طرف برنامج الحوكمة البيئية PGE التي سيتم على أساسها الإعلان عن طلب العروض لتعيين مكتب دراسات في انتظار تولي الموضوع من إحدى الوزارتين
64) إحداث قسم للحروق البليغة بقابس ضمن مشروع المستشفى الجامعي الجديد خلال الفترة 2017/2020	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	معطل	تمت دعوة وزارة الصحة الى الشروع في إعداد البرنامج الوظيفي للمستشفى أخذا في الإعتبار قسما للحروق البليغة.
65) إعداد دراسة تهم تجديد أو تهيئة قسم الاستعجالي بوذرف وإنشاء قسم لتصفية الدم، وذلك حسب جدوى إحداثها.	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	في التنفيذ	في طور الدراسات
66) تكليف الديوان الوطني للتطهير للقيام بدراسة لإنجاز شبكة خاصة لتجميع المياه الاستشفائية بمنطقة الحامة ومعالجتها بطريقة أولية قبل تصريفها في المحيط.	الديوان الوطني للتطهير	أنجز	في طور الإستغلال
67) إنجاز شبكة تطهير بمدينة مطماطة الجديدة خلال الفترة 2017/2019 بإعمادات جمالية تناهز 18 م د	الديوان الوطني للتطهير	الدراسات	تمت المصادقة على المشروع من طرف مجلس النواب مؤخرا بكلفة انجاز 18 مليون دينار في طور الدراسات
68) دعم مجهود التشغيل من خلال إعداد برنامج إبتدابات لتعويض الإحالات على التقاعد البالغ عددها 541 عوناً بالمجمع الكيميائي التونسي للفترة 2016/2018	المجمع الكيميائي	معطل	تم تكوين لجنة إبتدابات بالمجمع الكيميائي التونسي يرأسها السيد الكاتب العام لهذه المؤسسة .
69) إستغلال المياه المستعملة المعالجة من قبل الديوان الوطني للتطهير في مصانع المجمع الكيميائي التونسي، وقدرت كلفة هذا المشروع 8 م د.	المجمع الكيميائي التونسي	معطل	

نص القرار	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة
(70) إعادة إستعمال المياه المعالجة الناتجة عن محطة تحلية المياه التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والتي تصرف حاليا بالبحر ، وذلك بكلفة 2 م.د.	المجمع الكيميائي التونسي	معطل	*تم التحديد النهائي للمسار الجديد للأنبوب الذي سيقع مده إنطلاقا من مصب واد الطين الى معامل المجمع الكيميائي التونسي مرورا بالمنطقة الصناعية (2.2 كم)
(71) مشروع إنجاز محطة لتحلية المياه من قبل المجمع الكيميائي التونسي بتقنية التناضح العكسي والكف عن إستغلال الموارد المائية الجوفية في المجال الصناعي، قيمة المشروع 100 م.د.	المجمع الكيميائي	معطل	- المشروع ذو طاقة إنتاج تقدر بـ 50 ألف م <sup>3</sup> يوميا تمت برمجة إنجازها في قطاع الشراكة بين القطاع العام والخاص وتعهد السيد كاتب الدولة المكلف بالمناجم بوزارة الطاقة والمناجم والطاقت المتجددة خلال جلسة 11 جانفي 2017 بتكل المجمع الكيميائي التونسي بإنجاز المشروع ومضاعفة إنتاجه من 50 الى 150 ألف م <sup>3</sup> يوميا وذلك لتمكين مغاسل ومصانع تحويل الفسفات بفقصة من التزود بالماء.
(72) إحداث وحدة للمعالجة النهائية لغاز الجنوب "نؤارة" بكلفة 160 مليون دولار.	شركة OMV الشركة التونسية للأنشطة البترولية ETAP	أنجز	يتوقع دخول الإنتاج في جويلية 2019 .
(73) إحداث مصنع للحامض التقني والأسمدة الذوابة وذلك بكلفة 200 م.د.	المجمع الكيميائي	معطل	*تم الإعلان عن طلب العروض في تاريخ 22 جوان 2015 *تم تلقي العروض في تاريخ 25 جانفي 2016. *المشروع حاليا في إنتظار مصادقة اللجنة المختصة على تقرير تقييم العروض.
(74) تنفيذ مشروع ضخ وتكديس الفسفوجيبس، الكلفة المحينة تقدر بـ 700 م.د (مشروع معطل نظرا لإعتراض أهالي وذرف على إنجازها)		تم تغيير صبغة المشروع (تعويضه بالمدينة الصناعية الجديدة النظيفة والصديقة للبيئة )	على إثر إنعقاد المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 30 جوان 2017 وبإشراف السيد رئيس الحكومة تقرر الإلتزام التام من حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف سكب الفوسفوجيبس في البحر عبر تبني خيار التخلي وتفكيك الوحدات الملوثة وإحداث وحدات صناعية جديدة تحترم المعايير الوطنية والدولية في السلامة البيئية في موقع يتم تحديده بناء على معطيات تراعي إحترام كافة المقنضيات البيئية. إجتمعت لجنة القيادة الوطنية للمشروع البيئي المندمج للمجمع الكيميائي التونسي يوم 21 ديسمبر 2017 برئاسة السيد رضا السعيد وزير المستشار لدى رئيس الحكومة وقد تم إستعراض الدراسات الجيولوجية والمائية والعقارية التي تم إنجازها حول المواقع المحتملة ليواء المدينة الصناعية الجديدة التي ستشتمل على وحدات صناعية نظيفة ومستجيبة للمعايير الدولية للسلامة البيئية كما تمت مناقشة المذكرة التي ستعرض على المجلس الوزاري المضيق الذي سيعقد للبت في الموقع النهائي لهذه المدينة الصناعية.
(75) مشروع القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس والإنطلاق في إنجاز مختلف مكوناته خلال الفترة 2016/2020		معطل	عدم توفر الاعتمادات
(76) تهيئة المنطقة الصناعية ببوشمة 10 هك: 2.1 م د	شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي	معطل	- تم تقديم طلب الى وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والمناجم والطاقت المتجددة للترفيغ في رأس مال القطب التكنولوجي والصناعي بقابس في حدود مبلغ 20 م د ليتسنى للقطب إنجاز المطلوب .
(77) تهيئة المنطقة الصناعية بالحامة 15 هك: 3.1 م د	شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي	معطل	- تم تقديم طلب الى وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والمناجم والطاقت المتجددة للترفيغ في رأس مال القطب التكنولوجي والصناعي بقابس في حدود مبلغ 20 م د ليتسنى للقطب إنجاز المطلوب .

نص القرار	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة
78) تهيئة المنطقة الصناعية بمنزل الحبيب 4 هك: 0.9 م د	شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي	أنجز	
79) تهيئة المنطقة الصناعية بمطماطة 25 هك: 5 م د	شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي	في التنفيذ	تم تقديم طلب الى وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والمناجم والطاقت المتجددة للترفع في رأس مال القطب التكنولوجي والصناعي بقباس في حدود مبلغ 20 م د ليتسنى للقطب إنجاز المطلوب . تم تغيير صبغة الأرض و الحصول على الملكية في انتظار توفر الاعتمادات لانجاز التهيئة
80) تهيئة مركز عمل عن بعد: Cyber Park بـمـارث 1000 م : 1.6 م د	شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي	معطل	في إنتظار إستكمال إجراءات التنفيذ
81) تدعيم أسطول حافلات الشركة الجهوية للنقل بقباس بـ 14 حافلة خلال موفى سنة 2015 و 17 حافلة خلال سنة 2016	وزارة النقل – الشركة الجهوية للنقل بقباس	أنجز	
82) إحداث منطقة لوجيستية بولاية قابس قرب الميناء التجاري.	وزارة النقل	في التنفيذ	في طور الدراسات
83) تطوير نشاط مطار قابس مطماطة بإحداث خطوط دولية، وذلك في صورة ثبوت المردودية الاقتصادية لهذه الخطوط.	الديوان الوطني للطيران المدني والمطارات	معطل	خلال جلسة عمل بمقر وزارة النقل بإشراف السيد الوزير وبحضور السيد والي قابس يوم 10 أوت 2016 تقرر إضافة خط جوي داخلي ثالث يربط بين تونس ومطار قابس مطماطة وذلك بداية من آخر شهر أكتوبر 2016 وإحداث خط دولي في الثلاثية الأخيرة لسنة 2016 يربط بين قابس وعدد من الدول الأوروبية .
84) الإنطلاق في دراسة مشروع خط نقل بحري لنقل الحاويات	ديوان المواني البحرية التجارية	معطل	تم إدراجه ضمن مشاريع المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 22 أوت 2019
85) تحسين خدمات النقل الحديدي من خلال:			
دراسة ربط الخط قابس مدينين خلال سنة 2016 بكلفة 300 أ.د.	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	معطل	تغيير مسار السكة من الجهة الساحلية الى الجهة الغربية لولاية قابس تم عقد إجتماع مع ممثلي الشركة التونسية للسكة الحديدية يوم 13 جانفي 2017 تبين خلاله أنه تم إصدار طلب العروض للقيام بتعيين الدراسة الفنية لمواصفات الخط ومن المؤمل أن ينطلق إنجازها خلال شهر جويلية 2017.
تهيئة منطقة لوجستية بمحطة غنوش بكلفة 4 م.د (2016/2020)	وزارة النقل	الدراسات	تم تخصيص قطعة أرض راجعة بالملكية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية مساحتها الجمالية 33 هكتار لاحتضان المنطقة اللوجستية ووضعها على ذمة وزارة النقل. وقد تم ربط الصلة مع السيد وزير الصناعة للعمل على تخصيص الموقع الكائن بالمنطقة الصناعية ووضعها على ذمة المشروع والموضوع محل متابعة. تم برمجة الدراسات الفنية والاقتصادية في ميزانية وزارة النقل لسنة 2019
دراسة إحداث خط مغاربي سريع (2016/2020)	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	معطل	تعهد السيد وزير النقل بالنظر في دراسة الموضوع في القريب العاجل خلال زيارته إلى ولاية قابس بتاريخ 05 ماي 2016.
86) بناء محطة جديدة للنقل البري بقباس	الوكالة الفنية للنقل البري	في التنفيذ	تمت الموافقة المبدئية لإنجاز المشروع بكلفة 4,5 مليون دينار و تمت المصادقة على التصاميم والاعلان عن نتائج المناظرة

في قطاع التعليم العالي

نص القرار	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة
(87) بناء مقرّ للمعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بقابس، بكلفة 10.000 م.د.	وزارة التعليم العالي و البحث العلمي	الدراسات	تم الإعلان عن طلب عروض وطني لاختيار مصممين من طرف الإدارة العامة للبنانات المدنية بوزارة التجهيز في انتظار مصادقة اللجنة العليا للصفقات
(88) بناء مقرّ للمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس بكلفة 10.000 م د .	وزارة التعليم العالي و البحث العلمي	الدراسات	
في مجال التكوين المهني والتشغيل:			
(89) إحداث مركز للتكوين في اللوجستيك وصيانة المعدات الثقيلة	وزارة التكوين المهني والتشغيل	الدراسات	تم تحديد موقع إنجاز المشروع و تمت مراسلة وزارة التكوين المهني في الغرض بتاريخ 09 جانفي 2020
في قطاع الشباب والرياضة:			
(90) بناء مدارج بملعبي عمر دغمان و غنوش وملاعب فرعية معشبة	وزارة شؤون الشباب والرياضة	في التنفيذ	إنطلقت الأشغال بتاريخ 24-02-2019 بملعب عمر دغمان أما في ما يتعلق بملعب غنوش في إنتظار برمجة المشروع ضمن ميزانية التنمية
(91) التسريع في تعشيب ملعب دار الشباب بمطاطة الجديدة بكلفة 150 أ د	وزارة شؤون الشباب والرياضة	أنجز	
(92) إحداث ملعب رياضي بمنطقة الزراوة بمطاطة الجديدة بكلفة 150 أ د (إنجاز ملعب بأبعاد (35*50م)+سياج داخلي+حجرات الملابس)	وزارة شؤون الشباب والرياضة	أنجز	نسبة تقدم الانجاز 100 %
(93) إحداث قاعة ألعاب فردية وحديقة رياضية بالميد (المطوية) بكلفة 500 أ د (ملعب كرة قدم صغير بأبعاد (24*44) + سياج خارجي + حجرات ملابس – ملعب لكرة اليد من الأرضية الصلبة (24*44) + سياج داخلي – قاعة متعددة الإختصاصات 150 م <sup>2</sup> + حجرات الملابس.	وزارة شؤون الشباب والرياضة	طلب العروض	بالنسبة لمشروع قاعة الألعاب الفردية غير مرسوم بميزانية التنمية أما في ما يتعلق بمشروع الحديقة الرياضية فقد تم ترسيمها بميزانية التنمية لسنة 2019 و استئنفت الدراسات
(94) إحداث مركز للفنون الركحية والدرامية بقابس	وزارة الشؤون الثقافية	معطل	تم توفير المكان بمنطقة مطرش على ملك الوكالة العقارية للسكنى والتي تتمسك ببيعه.
(95) إحداث متحف للحركة الوطنية بالحامة 4 م د	وزارة الشؤون الثقافية	معطل	تم توفير قطعة الأرض من طرف بلدية المكان التي تعهدت بإتمام إجراءات التقويت
(96) ترميم القرى الجبلية، بكلفة 3.3 م د	وزارة الشؤون الثقافية	معطل	الدراسة جاهزة بالمعهد الوطني للتراث وفي إنتظار رصد الإعتمادات والموضوع محل متابعة
في القطاع السياحي			
(97) ترميم القرية السياحية بتوجان	وزارة السياحة والصناعات التقليدية	معطل	أتم المعهد الوطني للتراث الدراسات الفنية
(98) إدراج بلديتي شنني نحال والحامة كبلديتين سياحيتين	وزارة السياحة والصناعات التقليدية	أنجز	
(99) تهيئة المنطقة السياحية بشط الحمروني	الوكالة العقارية السياحية	معطل	في انتظار استكمال اقتناء قطعة الأرض المتبقية
في قطاع المرأة والأسرة والطفولة			
(100) إنجاز مشروع نادي أطفال بقابس المدينة، بكلفة 680 أ.د ( ميزانية 2016).		في التنفيذ	نسبة الإنجاز 45%
(101) إنجاز مركب الطفل والأسرة بالمطوية بكلفة 2 م.د.		في التنفيذ	نسبة تقدم الأشغال : 90 %
(102) إنجاز مركب للطفولة بالحامة بكلفة 900 أ.د ( ميزانية 2016)	وزارة المرأة والأسرة والطفولة و كبار السن	طلب العروض	تمت مصادقة على الرسوم التمهيدية المفصلة اقساط خاصة بتاريخ 03-10-2019 و في طور إعداد كراس الشروط
(103) إنجاز مركب للطفولة بمارث بكلفة 900 أ.د (قسط 2016)		في التنفيذ	نسبة الانجاز 60%
(104) بناء مقر للمندوبية الجهوية بكلفة 1 م.د.		معطل	تم عرض الدراسة التمهيدية الموجزة بتاريخ 15 أوت 2019 ولم تتم المصادقة - وجود اشكال عقاري -مشروع متوقف
دفع مشاريع القطاع الخاص			
(105) التسريع في إجراءات إنجاز المدينة الإستشفائية بمنطقة الخبايات بالحامة	وزارة التنمية و الاستثمار والتعاون الدولي	الدراسات	في طور الاعداد التصاريح و الوثائق اللازمة من طرف المستثمر التركي "HATTUSA"

نص القرار	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة
دفع مشاريع القطاع الخاص			
106) التسريع في إجراءات إنجاز المستشفى الخاص للأمراض السرطانية	وزارة التنمية و الاستثمار والتعاون الدولي	معطل	- تم عدول المستثمر على إنجاز المشروع باعتبار أن اللجنة العليا للمشاريع الكبرى لم توافق على طلب المستثمر تغيير مكان تركيز هذا المشروع من منطقة الخبايات اللا تونس الكبرى.

## متابعة قرارات المجلس الوزاري المضيّق لولاية قابس بتاريخ 25 جوان 2015

### المشاريع المعطلة

نص القرار	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة
75) مشروع القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس والإطلاق في إنجاز مختلف مكوناته خلال الفترة 2016/2020		معطل	عدم توفر الاعتمادات
76) تهيئة المنطقة الصناعية ببوشمة 10 هك: 2.1 م د	شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي	معطل	- تم تقديم طلب الى وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة للترفيّع في رأس مال القطب التكنولوجي والصناعي بقابس في حدود مبلغ 20 م د ليتسنى للقطب إنجاز المطلوب .
77) تهيئة المنطقة الصناعية بالحامة 15 هك: 3.1 م د	شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي	معطل	- تم تقديم طلب الى وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة للترفيّع في رأس مال القطب التكنولوجي والصناعي بقابس في حدود مبلغ 20 م د ليتسنى للقطب إنجاز المطلوب .
80) تهيئة مركز عمل عن بعد: Cyber Park بـمـارث	شركة التصرف في القطب الصناعي	معطل	في إنتظار إستكمال إجراءات التنفيذ

نص القرار	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة
(83) تطوير نشاط مطار قابس مطماطة بإحداث خطوط دولية، وذلك في صورة ثبوت المردودية الاقتصادية لهذه الخطوط.	الديوان الوطني للطيران المدني والمطارات	معطل	خلال جلسة عمل بمقر وزارة النقل بإشراف السيد الوزير وبحضور السيد والي قابس يوم 10 أوت 2016 تقرر إضافة خط جوي داخلي ثالث يربط بين تونس ومطار قابس مطماطة وذلك بداية من آخر شهر أكتوبر 2016 وإحداث خط دولي في الثلاثية الأخيرة لسنة 2016 يربط بين قابس وعدد من الدول الأوروبية .
(84) الإنطلاق في دراسة مشروع خط نقل بحري لنقل الحاويات	ديوان الموانئ البحرية التجارية	معطل	تم إدراجه ضمن مشاريع المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 22 أوت 2019
(85) تحسين خدمات النقل الحديدي من خلال:			
دراسة ربط الخط قابس مدنين خلال سنة 2016 بكلفة 300 أ.د.	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	معطل	تعيين مسار السكك من الجهة الشمالية إلى الجهة الغربية بولاية قابس تم عقد إجتماع مع ممثلي الشركة التونسية للسكك الحديدية يوم 13 جانفي 2017 تبين خلالها أنه تم إصدار طلب للعموض القبلية لتحسين الدراسة الفنية لمصاصات
دراسة إحداث خط مغاربي سريع (2016/2020)	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية	معطل	تعهد السيد وزير النقل بالنظر في دراسة الموضوع في القريب العاجل خلال زيارته إلى ولاية قابس بتاريخ 05 ماي 2016.

نص القرار	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة
<b>في قطاع التعليم العالي</b>			
(87) بناء مقر للمعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بقابس، بكلفة 10.000 م.د	وزارة التعليم العالي و البحث العلمي	معطل	أقرت اللجنة الوطنية المنعقدة بتاريخ 11 جانفي 2017 إرجاء البت لأسباب متعلقة بانتظار نتائج الإستشارة الوطنية للتعليم العالي أو لعدم ترسيمها ضمن مشاريع المخطط.
(88) بناء مقر للمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس بكلفة 10.000 م.د .	وزارة التعليم العالي و البحث العلمي	معطل	
(89) إحداث مركز للتكوين في اللوجستيك وصيانة المعدات الثقيلة	وزارة التكوين المهني والتشغيل	في التنفيذ	
<b>في قطاع الشباب والرياضة:</b>			
(90) بناء مدارج بملعبي عمر دغمان وغنوش وملاعب فرعية معشبة	وزارة شؤون الشباب والرياضة	في التنفيذ	إنطلقت الأشغال بتاريخ 24-02-2019 بملعب عمر دغمان أما في ما يتعلق بملعب غنوش في إنتظار برمجة المشروع ضمن ميزانية التنمية
(93) إحداث قاعة ألعاب فردية وحديقة رياضية بالميدة (المطوية) بكلفة 500 أ.د (ملعب كرة قدم صغير بأبعاد (24*44) + سياج خارجي + حجرات ملابس - ملعب لكرة اليد من الأرضية الصلبة (24*44) + سياج داخلي - قاعة متعددة الإختصاصات 150 م <sup>2</sup> + حجرات الملابس.	وزارة شؤون الشباب والرياضة	معطل	بالنسبة لمشروع قاعة الألعاب الفردية غير مرسوم بميزانية التنمية أما في ما يتعلق بمشروع الحديقة الرياضية فقد تم ترسيمها بميزانية التنمية لسنة 2019 و استئنفت الدراسات
<b>في قطاع الثقافة</b>			
(94) إحداث مركز للفنون الركحية والدرامية بقابس	وزارة الشؤون الثقافية	معطل	تم توفير المكان بمنطقة مطرش على ملك الوكالة العقارية للسكنى والتي تتمسك ببيعه.
(95) إحداث متحف للحركة الوطنية بالحامة 4 م د	وزارة الشؤون الثقافية	معطل	تم توفير قطعة الأرض من طرف بلدية المكان التي تعهدت بإتمام إجراءات التقيوت
(96) ترميم القرى الجبلية، بكلفة 3.3 م د	وزارة الشؤون الثقافية	معطل	الدراسة جاهزة بالمعهد الوطني للتراث وفي إنتظار رصد الإعتمادات والموضوع محل متابعة
<b>في القطاع السياحي</b>			
(97) ترميم القرية السياحية بتوجمان	وزارة السياحة والصناعات التقليدية	معطل	أتم المعهد الوطني للتراث الدراسات الفنية



نص القرار	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة
-----------	-----------------	--------------	----------

نص القرار	المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة
99) تهيئة المنطقة السياحية بشط الحمروني دفع مشاريع القطاع الخاص	الوكالة العقارية السياحية	معطل	في انتظار استكمال اقتناء قطعة الأرض المتبقية
106) التسريع في إجراءات إنجاز المستشفى الخاص للأمراض السرطانية	وزارة التنمية و الاستثمار والتعاون الدولي	معطل	- تم عدول المستثمر على إنجاز المشروع باعتبار أن اللجنة العليا للمشاريع الكبرى لم توافق على طلب المستثمر تغيير مكان تركيز هذا المشروع من منطقة الخيايات اللا تونس الكبرى.

متابعة قرارات المجلس الوزاري المضيق لولاية قابس بتاريخ 22 أوت 2019

وزارة الداخلية

ملاحظة: المشاريع المعطلة او لم تدرج للتنفيذ واردة باللون الأزرق

رقم القرار	نص القرار	الكلفة ( م د )	المعني بالتنفيذ والمتابعة	حالة التنفيذ	المتابعة
1	إحداث معتمدين بكل من الحامة الغربية ووذرف.		وزارة الداخلية	في التنفيذ	

قطاع الكهرباء و الغاز

رقم القرار	نص القرار	الكلفة ( م د )	المعني بالتنفيذ والمتابعة	حالة التنفيذ	المتابعة
2	إحداث وكالات تجارية للشركة التونسية للكهرباء والغاز بكل من تلبو ودخيلة توجان قبل موفى سنة 2019.		الشركة التونسية للكهرباء والغاز	معطل	تمت مراسلة الشركة في الغرض بتاريخ 04-09-2019 تحت عدد 5755

قطاع التجهيز

رقم القرار	نص القرار	الكلفة ( م د )	المعني بالتنفيذ والمتابعة	حالة التنفيذ	المتابعة
3	انطلاق الدراسات لإنجاز الطريق السريعة قابس- قبلي- توزر-الحدود الجزائرية بطول 270 كلم سنة 2020 بكلفة 3 م.د.	3	وزارة التجهيز	معطل	
4	إعلان طلب عروض الأشغال لإنجاز جسرين على واد قابس بشوارع باريس والكرينش سنة 2020 بكلفة 13 م.د.	13	وزارة التجهيز	طلب العروض	مشروع مدرج ضمن مخطط التنمية 2016-2020 لولاية قابس
5	إعلان طلب عروض تدعيم الطريق الحزامية لولاية قابس سنة 2020 بكلفة 35 م.د .	35	وزارة التجهيز	الدراسات	مشروع مدرج ضمن مخطط التنمية 2016-2020 لولاية قابس تم إنجاز الدراسات و إعداد ملف طلب العروض على مستوى مركزي ( إدارة صيانة و إستغلال الطرقات ) سنة 2016 تم إقتراح المشروع في مرتبة أولى بمشاريع تدعيم الطرقات المرقمة لسنة 2019
6	الانطلاق فورا في إنجاز دراسة تهيئة مدخل ولاية قابس على مستوى المطوية على طول 4 كلم كلفة المشروع 3.5 م.د	3,5	وزارة التجهيز	الدراسات	مشروع مدرج ضمن مخطط التنمية 2016-2020 لولاية قابس تم إقتراح المشروع في مرتبة أولى بمشاريع تهيئة مداخل المدن لسنة 2019 مشروع مقترح بميزانية التنمية 2021

7	إتمام دراسات تثنية الطريق الوطنية رقم 1 من الطريق الوطنية رقم 15 الى مدخل مدينة قايس قبل موافى سنة 2019.	0,129	وزارة التجهيز	أنجز	تم إنجاز الدراسات وفي طور إعداد ملف طلب العروض
8	الانطلاق في إنجاز دراسة تهيئة الطريق الجهوية رقم 107 بين قايس ومطماطة بطول 40 كلم، مع الشروع فورا في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لدعم السلامة المرورية بالطريق المذكورة.		وزارة التجهيز	في التنفيذ	مشروع مدرج ضمن مخطط التنمية 2016-2020 لولاية قايس ، أما في ما يتعلق بتدعيم السلامة المرورية ب ط ج رقم 107 فقد تم الشروع في إعداد ملف طلب العروض
9	الانطلاق في إنجاز دراسة لحماية مدينة غنوش من الفيضانات وتهيئة وادي الطين قبل موافى سنة 2019 والشروع في الأشغال سنة 2020 بكلفة جمالية للمشروع 5 م.د.	5	وزارة التجهيز	معطل	في طور إعداد تقرير فرز العروض الخاص بمكتب الدراسات

#### الوكالة العقارية للسكنى

رقم القرار	نص القرار	الكلفة ( م د )	المعنى بالتنفيذ والمتابعة	حالة التنفيذ	المتابعة
10	تخصيص قطعة ارض تسمح حوالي 4 هك كائنة بالعوينات المطوية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لتوفير مقاسم سكنية بالجهة.		وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية	في التنفيذ	تم طلب توظيف قطعة ارض تسمح 04 هكتارات للعقار الدولي موضوع الرسم العقاري 1218 قايس مصنف ضمن منطقة سكن فردي منفرد وتبين انها جزء منها مساحته 2 هك تتبع مقسم فلاحي شاب مسوغ لمدة 40 سنة و ابتداء من جوان 1996 . و لإتم الإجراءات المستوجبة تم عرض الموضوع على وزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية قصد إبداء الرأي و ضبط المؤسسة التي ستتم إجراءات التفويت لفائدتها طبقا للترتيب الجاري بها العمل في المجال و تم تذكيرها في الغرض بتاريخ 2019-07-19

#### الوكالة العقارية الصناعية

رقم القرار	نص القرار	الكلفة ( م د )	المعنى بالتنفيذ و المتابعة	حالة التنفيذ	المتابعة
11	انطلاق دراسات إنجاز المنطقة الصناعية الفجيج بالحامة خلال شهر أكتوبر 2019.		الوكالة العقارية الصناعية	في طور الانجاز	بصدد إبرام الصفقة مع مكتب الدراسات
12	انطلاق استغلال المنطقة الصناعية قايس 3.		الوكالة العقارية الصناعية	أنجز	تم الانطلاق في الاستغلال الجزئي حيث تدشين معمل غاز الجنوب 23 أوت 2019 في انتظار تسوية مشروع تهيئة وادي التين

المجمع الكيميائي التونسي

رقم القرار	نص القرار	الكلفة ( م د )	المعني بالتنفيذ و المتابعة	حالة التنفيذ	المتابعة
13	تخصيص مساهمة سنوية في المجهود التنموي بالجهة من قبل المجمع الكيميائي التونسي بعنوان المسؤولية المجتمعية.			معطل	في انتظار تفعيل قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية
50	انطلاق اشغال احداث وبناء مدرج ثقافي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس (Auditorium) خلال سنة 2020 بتمويل من المجمع الكيميائي التونسي بكلفة 3 م.د.			ف التنفيذ	تمت إحالة الإتفاقية بعد التنقيحات التي قام بها المجمع الكيميائي التونسي لإمضائه بتاريخ 24 أكتوبر 2018 و تم التذكير بتاريخ 10 جويلية 2019

شركة التصرف في القطب الصناعي و التكنولوجي

رقم القرار	نص القرار	الكلفة ( م د )	المعني بالتنفيذ و المتابعة	حالة التنفيذ	المتابعة
14	معالجة الإشكاليات والصعوبات المالية التي يمر بها القطب الصناعي والتكنولوجي بقباس وذلك من خلال: - دعوة مساهمين جدد للترفيح في راس مال شركة التصرف في القطب .			معطل	
	- المساعدة على الحصول على قرض بنكي بقيمة 3 م.د بالتنسيق مع صندوق الودائع والامانات لإنجاز التهيئة الداخلية للقسط الأول من المنطقة الصناعية مطماطة الجديدة.				امتناع المؤسسات البنكية منح قرض للشركة بسبب عدم قدرتها على توفير التمويل الذاتي ( 700 ألف دينار)

الديوان الوطني للتطهير

رقم القرار	نص القرار	الكلفة ( م د )	المعني بالتنفيذ و المتابعة	حالة التنفيذ	المتابعة
15	الشروع في دراسات تطهير مدينة مطماطة الجديدة بإنجاز الشبكات ومحطة للتطهير خلال سنة 2020 بكلفة جمالية للمشروع 20 مليون دينار .	20		في طور الدراسات	تمت المصادقة على المشروع من طرف مجلس النواب مؤخرا بكلفة انجاز 18 مليون دينار منها 15 أد كلفة محطة التطهير والبقية مد الشبكة
16	الشروع في دراسات تطهير مدينة منزل الحبيب خلال سنة 2020، في إطار البرنامج الوطني لتطهير المناطق الريفية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بكلفة جمالية للمشروع 20 مليون دينار .	20		معطل	

17	الانطلاق سنة 2020 في اعداد الدراسات لإنجاز 02 أقطاب للتطهير بقباس الشمالية وقباس الجنوبية، كلفة الدراسات حوالي 5 مليون دينار .	5	معطل
----	--	---	------

### وزارة الشؤون المحلية والبيئة

رقم القرار	نص القرار	الكلفة ( م د )	المعنى بالتنفيذ والمتابعة	حالة التنفيذ	المتابعة
18	الانطلاق في أشغال إنجاز مركز لتجميع ونقل الفضلات المنزلية مشترك بين بلديات قابس وتلبو وذلك قبل شهر جوان 2020 ، الكلفة التقديرية حوالي 1 مليون دينار	1	وزارة البيئة والشؤون المحلية(وكالة التصرف في النفايات)	معطل	تمت مراسلة الوزارة الغرض بتاريخ 04 سبتمبر 2019 تحت عدد 5755 ( عدم توفر العقار من طرف البلديات المعنية)
19	الانطلاق في أشغال إنجاز مركز لتجميع ونقل الفضلات المنزلية ببلدية غنوش وذلك قبل شهر جوان 2020 ، الكلفة التقديرية حوالي 500 ألف دينار	0,5	وزارة البيئة والشؤون المحلية(وكالة التصرف في النفايات)	معطل	تمت مراسلة الوزارة الغرض بتاريخ 04 سبتمبر 2019 تحت عدد 5755 (بسبب اشكال عقاري قطعة الأرض على ملك الوكالة العقارية الصناعية و الملك العمومي البحري)
20	تخصيص اعتماد قدره 200 ألف دينار لدعم البلديات في مجهود التخلص من المصبات العشوائية لفواضل البناء	0,2	وزارة البيئة والشؤون المحلية	معطل	تمت مراسلة الوزارة الغرض بتاريخ 04 سبتمبر 2019 تحت عدد 5755
21	تحويل مبلغ 100 ألف دينار لفائدة المجلس الجهوي للقيام بدراسات تهيئة الطريق الساحلية الرابطة بين قابس والزارات .	0,1	وزارة البيئة والشؤون المحلية	معطل	تمت مراسلة الوزارة الغرض بتاريخ 04 سبتمبر 2019 تحت عدد 5755
22	تخصيص اعتماد قدره 100 ألف دينار لإعداد الدراسات لتهيئة الفسحة الشاطئية بقباس الجنوبية.	0,1	وزارة البيئة والشؤون المحلية(وكالة حماية الشريط الساحلي)	معطل	تمت مراسلة وكالة تهيئة و حماية الشريط الساحلي في الغرض بتاريخ 12 سبتمبر 2019 تحت عدد 5950
23	تخصيص اعتماد قدره 200 ألف دينار لإحداث منتزه حضري بقباس الجنوبية.	0,2	وزارة البيئة والشؤون المحلية	معطل	تمت مراسلة وزارة الشؤون المحلية و البيئة حول تخصيص العقار المزمع إستغلاله للمشروع لفائدة بلدية قابس بتاريخ 20 سبتمبر 2019 تحت عدد 6150
24	إحداث إدارة جهوية للبيئة وذلك في إطار مراجعة التنظيم الهيكلي الجديد لوزارة الشؤون المحلية والبيئة .		وزارة البيئة والشؤون المحلية	معطل	تمت مراسلة الوزارة الغرض بتاريخ 04 سبتمبر 2019 تحت عدد 5755

### وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

رقم القرار	نص القرار	الكلفة ( م د )	المعنى بالتنفيذ والمتابعة	حالة التنفيذ	المتابعة
------------	-----------	----------------	---------------------------	--------------	----------

10	تخصيص قطعة ارض تسمح حوالي 02 هك كائنة بالعوينات المطوية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لتوفير مقاسم سكنية بالجهة.	وزارة أملاك الدولة والشؤون المحلية	أنجز	تم طلب توظيف قطعة أرض تسمح 04 هكتار تابعة للعقار الدولي موضوع الرسم عدد 1218 قابس المصنف ضمن منطقة سكن فردي منفرد و تبين مكنها مساحة 2 هكتار تتبع مقسم فلاحي شاب مسوغ لمدة 40 سنة ابتداء من جوان 1996 ز لإتمام الإجراءات المستوجبة تم عرض الموضوع على وزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية قصد إبداء الرأي و ضبط المؤسسة التي ستتم إجراء الفويت فاندتها و طبقا للترتيب الجاري بها العمل في المجال و تم تذكرها في الغرض بتاريخ 19 جوياية 2019
25	تخصيص 555 هك من العقارات الدولية الفلاحية لفائدة حوالي 60 منتفعا من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا وغيرهم.	وزارة أملاك الدولة والشؤون المحلية	في طور الانجاز	تمت المصادقة ووزارة الفلاحة على 300 هك بالهيشة لحاملي الشهادات العليا بالنسبة 32 هك لغير حاملي الشهادات العليا و 65 لحاملي الشائد العليا و تم مراسلة الولاية للانطلاق في اعداد الامثلة
26	تسوية وضعية المتحورزين للعقارات الدولية الفلاحية الراجعة للدولة من حبس بوشمة الذي يمسح حوالي 4240 هك.	وزارة أملاك الدولة والشؤون المحلية	في طور الانجاز	في انتظار اصدار أمر حكومي لتحديد السعر الفردي لتسوية الوضعية

#### وزارة النقل

رقم القرار	نص القرار	الكلفة ( م د )	المعني بالتنفيذ و المتابعة	حالة التنفيذ	المتابعة
27	انطلاق انجاز دراسة جدوى لنقل محطة القطار من داخل مدينة قابس قبل موفى سنة 2019.		الشركة الوطنية للسكك الحديدية	معطل	تمت مرسللة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في الغرض بتاريخ 12 سبتمبر 2019 تحت عدد 5950
28	استحثاث إتمام الدراسات الفنية والاقتصادية لإحداث المنطقة اللوجستية بالمطوية من ولاية قابس على مساحة 100 هك .		وزارة النقل(وكالة النقل البري)	في التنفيذ	تمت مرسللة وزارة النقل في الغرض بتاريخ 04 سبتمبر 2019 تحت عدد 5756 هذا و قد تم إحداث لجنة قطاعية غير قارة لمتابعة مشاغل قطاع النقل و اللوجستيك و قد عقدت أول جلسة لها بتاريخ 23 جانفي 2020 تم تخصيصها لمتابعة مشروع المناطق اللوجستية بقابس و قد تم مرسللة وزارة النقل للانطلاق في إجراءات تخصيص العقار
29	انطلاق دراسات محطة النقل البري بقابس قبل موفى سنة 2019 و الشروع في الإنجاز سنة 2020 مع تكفل الدولة بكلفة الربط بالشبكات الخارجية والمقدرة بحوالي 3 م.د.	3	وزارة النقل(وكالة النقل البري)	طلب العروض	تمت المصدقة على التصميم واختيار المشروع الفائز( تم إصدار إذن تزود لإعداد الدراسة الجيوتقنية و طور إصدار أدون التزود الخاصة بالمراقبة الفنية و المسح الطبوغرافي )
30	تفعيل الخط البحري لنقل الحاويات بميناء قابس وذلك من خلال : - توفير دعم بـ 3 م.د. لفائدة الشركة التونسية للملاحة لضمان ديمومة الخط - إقرار تخفيضات للمعاليم المينائية ومعاليم الشحن والتفريغ بميناء قابس.		ديوان الموانئ البحرية	معطل	تمت مرسللة ديوان الموانئ التجارية في الغرض بتاريخ 12 سبتمبر 2019 تحت عدد 5950 ( تم اقرار التخفيضات الخاصة بالمعاليم المينائية اثر انعقاد مجلس ادارة المؤسسة) + رفض CTN فتح خط حاويات نظرا للصعوبات المالية التي تعترضها هذه المؤسسة
				أنجز	

31	الإسراع في تركيز المنطقة اللوجستية ببوشمة وتوفير اعتماد بقيمة 10 م.د لاقتناء قطعة الأرض لاقامة المشروع.	10	وزارة النقل(وكالة النقل البري)	في التنفيذ	تم انجاز دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية من طرف مكتب دراسات مختص في المجال و تم عرض التصور الأولي لمكونات المشروع خلال لجنة الاستثمار تم الانتهاء من دراسة السوق و سيتم الشروع في APS انطلاقا من شهر جويلية ويتم حاليا اعداد الاطار القانوني لاحداث ديوان المناطق اللوجستية
----	---	----	--------------------------------	------------	---

### وزارة الصحة

رقم القرار	نص القرار	الكلفة ( م د )	المعني بالتنفيذ و المتابعة	حالة التنفيذ	المتابعة
32	إضفاء الصبغة الجامعية على (03) أقسام إستشفائية بالمستشفى الجهوي بقباس : قسم الأمراض الصدرية، قسم الأعصاب وقسم الطب الفيزيائي والوظيفي قبل موفى 2019 - الحرص على استكمال هيكله تمويل المستشفى متعدد الاختصاصات والانطلاق في تمويل مكوناته بداية من السداسي الاول لسنة 2020			في التنفيذ	تم إقتراح تغيير الصبغة في مجلس المؤسسة و موافقة وزارة الصحة
33	تدعيم المستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية ومراكز الصحة الأساسية بالجهة الصحية بقباس بالموارد البشرية وذلك من خلال : - فتح 36 خطة طبيب مقيم لفائدة ولاية قابس و 52 اطار شبه طبي و 5 عملة.			في التنفيذ	في طور التمويل في طور التنفيذ
34	استحداث إجراءات احداث المركز الجهوي للعلاج بالأشعة بالمستشفى الجهوي بكلفة جمالية للمشروع 3 م.د			متعطل مرحلة الدراسات	في إنتظار المصادقة على الرسوم التمهيدية المفصلة هندسة معمارية من طرف المركز الوطني للحماية من الأشعة بتونس و الذي تمت إحالته إليها بتاريخ 19-10-2017. تم عقد جلسة بالوزارة في الغرض بتاريخ 14-02-2019 و تمت مراسلة المركز الوطني للحماية من الأشعة من طرف إدارة البناءات بالوزارة بتاريخ 10-06-2019 دون رد
35	انطلاق استغلال قسم أمراض القلب والشرابين بالمستشفى الجهوي بقباس قبل موفى شهر سبتمبر 2019 كلفة المشروع 1.061 م.د .			أنجز	
36	اتمام الإجراءات الخاصة بانجاز مشروع تهيئة وتوسعة قسم الإستعجالي بالمستشفى الجهوي بقباس بكلفة (1 م.د) و وحدة الإستعجالي بغنوش بكلفة (800 ألف د.) قبل موفى سنة 2019.			معتل	يتم حاليا تجميع المعطيات ( دراسة أولية+برنامج وظيفي ) لحوالي 23 مشروع ضمن هذا البرنامج في انتظار

رقم القرار	نص القرار	الكلفة ( م د )	المعني بالتنفيذ و المتابعة	حالة التنفيذ	المتابعة
------------	-----------	----------------	----------------------------	--------------	----------

تمت برمجة هذا المشروع ضمن ميزانية التنمية لسنة 2020	الدراسات			إحداث مركز لتصفية الدم و تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بوذرف سنة 2020 بكلفة 1.3 م.د.	37
	أنجز			إقتناء آلة Amplificateur de brilliance لفائدة المستشفى المحلي بالحامة قبل موفى سنة 2019 بكلفة 180 أ.د.	38
في انتظار تسليم المعدات من طرف الاتحاد الأوروبي	في التنفيذ			تدعيم الجهة الصحية بقباس بالتجهيزات التالية قبل موفى سنة 2019:	39
	في التنفيذ			- 06 سيارات إسعاف صنف "ب" و 01 سيارة إسعاف صنف "أ" و 03 سيارات إسعاف رباعية الدفع و 06 سيارات مصلحة.	
	في التنفيذ			- آلة Colonoscopie .	
	في التنفيذ			- آلة Mammographie .	
	في التنفيذ			- كرسي اسنان متنقل وكرسي اسنان لذوي الاحتياجات الخصوصية.	
	في التنفيذ			- تدعيم الخط الأول بالتجهيزات الخاصة بالعيادات الخارجية و أقسام الإستعجالي و وحدات التوليد و المخابر الطبية و مخبر Prothèse dentaire	
	معطل			تدعيم الجهة بـ (05) كرسي اسنان خلال سنة 2020 بكلفة 150 أ.د.	40
تم تعيين السيد سمير بالليل طبيب إنعاش	في التنفيذ			إعطاء الأولوية للجهة الصحية بقباس في إطار الخدمة المدنية لأطباء الاختصاص بالنسبة لإختصاصي التخدير و الإنعاش و الأشعة.	41

#### وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

رقم القرار	نص القرار	الكلفة ( م د )	المعنى بالتنفيذ و المتابعة	حالة التنفيذ	المتابعة
42	تهيئة المنطقة السفوية بقرعة اللطايفة على مساحة 250 هكتار بكلفة 5 م.د سنة 2020.			معطل	بصدد إتمام الدراسة
43	احداث 5 آبار بكل من دخيلة توجان، العمارات بالمطوية، واحة الحامة، بشيمة الزعترية بالحامة بكلفة 5.4 م.د سنة 2020.			طلب العروض	بصدد إتمام الدراسة
44	ربط وتجهيز بنري قرعة اللطايفة بالتيار الكهربائي بكلفة 845 أ.د سنة 2020.			الدراسات	في طور اعداد الدراسات الفنية من طرف الشركة



بصدد اعداد الدراسات الفنية من طرف مكتب دراسات مختص	الدراسات			تعبيد المسالك الفلاحية بكل من : الزراوة الجديدة -الزراوة القديمة على طول 05 كم، العكاري - الطلحة على طول 06 كم بالمطوية، خنقة بوحبيب بمطماطة على طول 02 كم ، النوايل -سيدي سلام على طول 01 كم و الملعب لدباش - ملعب وادي تمسه على طول 09 كم بكلفة 9 م.د سنة 2020.	45
مشروع غير مرسم بالميزانية	معطل			إتمام دراسة تهيئة ميناء الصيد البحري بالزارات قبل موفى سنة 2019 بكلفة جملية للمشروع 25 م.د	46
وقع الإعلان عن طلب العروض 21 جانفي و فتح العروض 18 فيفري	طلب العروض			انجاز دراسة لتجميع مياه الحمّات لري الأشجار قبل موفى سنة 2019.	47

#### وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

رقم القرار	نص القرار	الكلفة ( م د )	المعني بالتنفيذ والمتابعة	حالة التنفيذ	المتابعة
48	انطلاق أشغال توسعة المدرسة الوطنية للمهندسين وتهيئة مخابر الهندسة الميكانيكية بالمدرسة سنة 2020 بكلفة 1.5 م.د	1,5	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	الدراسات	تم عرض رسائل التعيين على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 04-09-2019) تم فحص الدراسة التمهيدية المفصلة لأقسط الهندسة المعمارية بتاريخ 28 ماي 2020 دراسة التمهيدية الموجزة بتاريخ 07 جانفي 2020
49	انجاز دراسة لبناء مركز البحوث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس قبل موفى سنة 2019 وانطلاق الاشغال سنة 2020 بكلفة جملية للمشروع 9.5 م.د	9,5	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	الدراسات	بصدد تحيين البرنامج الوظيفي والعلمي و الجذاذات الفنية للفضاءات

وزارة شؤون الشباب و الرياضة

رقم القرار	نص القرار	الكلفة ( م د )	المعني بالتنفيذ و المتابعة	حالة التنفيذ	المتابعة
51	انطلاق اشغال تهيئة المركز الجهوي لألعاب القوى بقباس الجنوبية قبل موفى سنة 2019 بكلفة 600 أ.د	0,6	وزارة الشباب و الرياضة	في الانجاز	( التهيئة الداخلية و السيج الخارجي ):90%
					( التنوير ) :في طور الإعداد لإنطلاق الأشغال
52	الانطلاق في تهيئة 9 ملاعب أحباء بكل من قابس الجنوبية، مطماطة، الحامة المدينة، الحامة أولاد سعيد، المطوية، قابس الغربية، مارث ، وذرف وكتانة قبل موفى سنة 2019 بكلفة 1.6 م.د			معطل	تمت مراسلة وزارة شؤون الشباب و الرياضة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 تحت عدد 6023 لإدراج هذه المشاريع ضمن ميزانية التنمية
53	تهيئة الملاعب البلدية بالحامة و المركب الرياضي بقباس سنة 2020 بكلفة 1.3 م.د			الدراسات	
54	انطلاق اشغال بناء قاعة متعددة الاختصاصات بقباس الجنوبية سنة 2020 بكلفة 2.3 م.د			في التنفيذ	تم تغيير قطعة الأرض في طور الاعداد للمناظرة

الديوان الوطني للصناعات التقليدية

رقم القرار	نص القرار	الكلفة ( م د )	المعني بالتنفيذ و المتابعة	حالة التنفيذ	المتابعة
55	توفير مبلغ إضافي بـ200 أ.د للانطلاق في تهيئة القرية الحرفية بالمطوية قبل موفى سنة 2019.	0,2		الدراسات	في طور الإعداد لعرض تقرير فرز العروض على انظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات
56	اعداد دراسة جدوى لإنجاز قرى حرفية بكل من الحامة ومارث قبل موفى سنة 2019.			الدراسات	تم الإعلان عن طلب العروض لتعيين مكتب دراسات و في طور تنقيح تقرير فرز العروض

وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و الكبار السن

رقم القرار	نص القرار	الكلفة ( م د )	المعنى بالتنفيذ و المتابعة	حالة التنفيذ	المتابعة
57	إتمام بناء مركب الطفولة بمارث خلال سنة 2020 بكلفة قدرها 1082.5 أ.د.	1,0825	وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة	في طور الإنجاز	نسبة تقدم الأشغال : 40 %
58	إتمام تهيئة و تجهيز روضة الأطفال البلدية بمارث خلال سنة 2020 بكلفة قدرها 180 أ.د.	0,18	وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة	في طور الإنجاز	نسبة تقدم الأشغال : 30 % بالنسبة لأشغال التهيئة و في إنتظار إعداد إستشارة تخص التجهيزات
59	استكمال الدراسات الفنية لبناء مركب الطفولة بالحامة على أن تنطلق الأشغال سنة 2020 بكلفة قدرها 1 مليون دينار	1	وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة	في طور الإنجاز	تمت مصادقة على الرسوم التمهيدية المفصلة اقساط خاصة بتاريخ 10-03-2019 و في طور إعداد كراس الشروط
60	إتمام بناء مركب الطفولة بالمطوية خلال سنة 2020 بكلفة قدرها 947 الف دينار	0,947	وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة	في طور الإنجاز	نسبة تقدم الأشغال : 90 %
61	إتمام بناء نادي الأطفال بقابس المدينة خلال سنة 2020 بكلفة قدرها 680 الف دينار	0,68	وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة	في طور الإنجاز	نسبة تقدم الأشغال : 35 %
62	استكمال الدراسات الفنية لبناء مقر المنديبية الجهوية للمرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن بقابس على أن تنطلق الأشغال سنة 2020 بكلفة قدرها 1.500 ألف دينار	1,5	وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة	معطل	تم فحص الرسم التمهيدي الموجز بتاريخ 15-08-2019
63	الشروع في تركيب الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بـ 07 مؤسسات طفولة قبل موفى سنة 2019 بكل من تيلبو، بوشمة، شنني، ذرف، غنوش، الزارات وقابس بكلفة 280 ألف دينار.	0,28	وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة	معطل	مشاريع وطنية :تمت مراسلة الوزارة في الغرض بتاريخ 04-09-2019 تحت عدد 5755
64	اقتناء حافلة لفائدة المنديبية الجهوية للمرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن بقابس.		وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة	معطل	

وزارة الشؤون الإجتماعية

رقم القرار	نص القرار	الكلفة ( م د )	المعني بالتنفيذ و المتابعة	حالة التنفيذ	المتابعة
65	الشروع في استغلال مركز لتخزين الادوية الخصوصية قبل موفى سنة 2019 في اطار اتفاقية تبرم للغرض بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفى العسكري بقابس.		وزارة الشؤون الاجتماعية	معطل	تمت مراسلة الوزارة في الغرض بتاريخ 2019-09-04 تحت عدد 5755
66	توفير حافلة لذوي الاحتياجات الخصوصية بولاية قابس خلال سنة 2019.		وزارة الشؤون الاجتماعية	معطل	تمت مراسلة الوزارة في الغرض بتاريخ 2019-09-04 تحت عدد 5755

وزارة الشؤون الثقافية

رقم القرار	نص القرار	الكلفة ( م د )	المعني بالتنفيذ و المتابعة	حالة التنفيذ	المتابعة
67	انطلاق دراسات انجاز متحف الحركة الوطنية بالحامة وبرمجة الإنجاز سنة 2020 بكلفة 4 م.د.		وزارة الثقافة	معطل	تمت مراسلة الوزارة في الغرض بتاريخ 2019-09-04 تحت عدد 5755/ تم توفير الأرض من بلدية الحامة
68	انطلاق دراسات انجاز مسرحين للهواء الطلق بكل من قابس والحامة سنة 2020.			معطل	تمت مراسلة الوزارة في الغرض بتاريخ 2019-09-04 تحت عدد 5755
69	رصد ميزانية إضافية ب-1.2 م.د للتممية الجهوية الثقافية بقابس خاصة بالتظاهرات الكبرى والمهرجانات الجهوية وعمل مركز الفنون الدرامية والركحية بقابس.			أنجز	تم صرف 800 ألف دينار النشاط الثقافي

الجمهورية التونسية  
وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي  
ديوان تنمية الجنوب  
الإدارة الجهوية للتنمية بقابس



# المشاريع العمومية التي تشكو صعوبات بولاية قابس

جون 2020

## 1. أهم المشاريع التي بصدد الإنجاز وتواجه صعوبات

المشروع	مكان المشروع	الكلفة (أ.د.)	نسبة الانجاز	أسباب التوقف	الملاحظات	الحلول المقترحة
<b>التجهيز</b>						
تثنية الطريق الوطنية رقم 16 الحامة قابس	الحامة	50.000	65%	جائحة الكورونا + اشكاليات عقارية	اعتراض بعض الفلاحين على توسعة الطريق لذلك وجب تفعيل قانون الانتزاع للمصلحة العامة	دعوة الوزارة لتفعيل قانون الانتزاع
<b>الصحة</b>						
استصلاح وتقوية أسس وهياكل مباني المستشفى الجهوي بقاس	5681	هندسة مدنية	65		<ul style="list-style-type: none"> <li>- تأخر في الإنجاز نتيجة عدم قدرة إدارة المستشفى على إيجاد حلول بديلة لعلق أقسام ووضعها على ذمة المقاول للتسريع في نسق الإنجاز نظرا للضغط الكبير المسلط على المستشفى الجهوي،</li> <li>- مطالبة المقاول بملحق مالي للمشروع،</li> <li>- بصدد إنجاز الأشغال (المستعجلة) للمرحلة الثانية (عيادات خارجية - القسم الفني)</li> </ul>	التسريع بعرض مشروع الملحق عدد 03 على أنظار اللجنة الوزارية لاستئناف الأشغال في أقرب الآجال.
	1390	كهرباء	55			
	835	الوقاية من الحرائق	46			
	3100	سوائل	65			
توسيع وتطوير	مارث	5500	45%	صعوبات	توقف الأشغال منذ	دعوة وزارة الصحة لخلاص

المشروع	مكان المشروع	الكلفة (أ.د.)	نسبة الانجاز	أسباب التوقف	الملاحظات	الحلول المقترحة
المستشفى المحلي بمارث الى مستشفى جهوي				مالية	06 أشهر لعدم حصول المقاول على المستحقات المالية (4 كشوفات حساب)	شركة المقاولات لاستئناف الأشغال في أقرب الآجال (توفير الاعتمادات).
الشباب والرياضة						
بناء مسبح مغطى يقابس	الجنوبية	5700	76%	صعوبات مالية	أشغال شبه متوقفة وتم التنبيه على المقاول (شركة تمر بصعوبات مالية: عدم حصول المقاول على مستحقات الأقساط المنجزة).	دعوة وزارة الشباب والرياضة لتوفير الاعتمادات.
تأهيل مركز الاصطياف والتخييم بالزارات	الزارات	2140	86%	صعوبات مالية	اشغال متوقفة في انتظار المصادقة على الملحق وتوفير اعتمادات إضافية.	دعوة وزارة الشباب والرياضة لتوفير الاعتمادات والمصادقة على الملحق.
بناء قاعة رياضات فردية بالحامة	الحامة	2523	10%	صعوبات مالية	توقف الأشغال وعدم استجابة المقاول لجلسات المتابعة: تخلي المقاول عن المشروع وتم فسخ الصفقة وبصدد حصر الكميات لاعادة طلب العروض	التسريع في إجراءات إعادة تعيين مقاول جديد للمشروع.

## 2. أهم المشاريع المهيكلية المدرجة في المخطط 2016-2020 والتي لم تنطلق في الإنجاز

المشروع	مكان المشروع	الكلفة (أ.د.)	الملاحظات	المقترحات
الثقافة				
إحداث مسرح للهواء الطلق	الحامة	4000	تم تخصيص قطعة	ترسيم المشروع ضمن ميزانية

المقترحات	الملاحظات	الكلفة (أ.د.)	مكان المشروع	المشروع
وزارة الثقافة	الأرض وتقديم مقترح تخصيص 300 ألف دينار ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2020			
				<b>التجهيز</b>
الحث على انجاز الدراسات	تأخر الدراسات من طرف وكالة التصرف في المياه العمرانية	2300	مارث	حماية مدينة مارث من الفيضانات
				<b>الصحة</b>
التسريع بإنهاء التصاميم والمصادقة عليها من طرف وزارة الصحة	تأخر المصممين في انجاز العمل مما أثر على برمجة المشروع وتضاعف الكلفة (حوالي 5000 أ.د.)	2500	الجنوبية	بناء قسم للمعالجة بالأشعة بالمستشفى الجهوي بقابس
				احداث مركز للحروق البليغة
التدخل لدى وزارة الفلاحة لتغيير صبغة الأرض	تم توفير قطعة الأرض ورصد الاعتمادات وانطلاق الدراسات	5700	الجنوبية	<b>النقل</b>
دعوة وزارة النقل لتسريع اجراءات التخصيص	تأخر انجاز الدراسات	10000	الغربية	انجاز محطة النقل البري بقابس تركيز المنطقة اللوجستية ببوشمة
				<b>التطهير</b>
التسريع في الاعلان عن طلب العروض بعد توفر التمويل	تأخر في الإنجاز رغم ترسيم المشروع في الميزانية من سنة 2016	18000	مطماطة الجديدة	تطهير بلدية مطماطة الجديدة



### 3. المشاريع المدرجة في المخطط 2016-2020 والتي لم ترسم بالميزانيات

المشروع	مكان المشروع	الكلفة (أ.د.)	الملاحظات	المقترحات
<b>الثقافة</b>				
احداث مركز فنون ركحية ودرامية بقابس الكبرى	قابس	3000	لم يبرمج في الميزانية	رصد الاعتمادات
<b>التجهيز</b>				
تدعيم الطريق الحزامية لولاية قابس	المدينة	35000	بصدد البحث عن التمويل توقف الدراسات	دعوة وزارة التجهيز لبرمجة المشروع
<b>الصحة</b>				
بناء مستشفى جامعي	قابس	160000	لم يبرمج في الميزانية	دعوة رئاسة الحكومة لفسخ العقد المبرم مع الجانب البريطاني واعدة البحث عن ممول للمشروع والانطلاق مباشرة في الدراسات
<b>السياحة</b>				
ترميم القرى الجبلية (مطماطة-توجان-تمزرت-بني زلطن...)	مطماطة	3200	لم يبرمج في الميزانية	ترسيم المشروع بالميزانية
<b>الزراعة</b>				
احداث بئر استكشافية بعقلة المرتبة	الحامة	4000	لم يبرمج في الميزانية	ترسيم المشروع بالميزانية
تأهيل ميناء الصيد البحري بالزارات	مارث	25000	لم يبرمج في الميزانية	ترسيم المشروع بالميزانية
<b>التربية</b>				
انجاز معهد ثانوي	قابس المدينة	2000	لم يبرمج في الميزانية لعدم توفر رصيد عقاري	برمجة عنصر اقتناء الأرض ضمن الكلفة الجمالية للمشروع
انجاز مركب تربوي بقابس الجنوبية	قابس الجنوبية	4000	لم يبرمج في الميزانية	برمجة عنصر اقتناء الأرض ضمن الكلفة الجمالية للمشروع
<b>التكوين المهني</b>				
انجاز المركز القطاعي للتكوين المهن في النقل واللوجستيك	قابس	12000	لم يبرمج في الميزانية	التسريع في انطلاق الدراسات

#### 4. أهم القرارات الوزارية التي لم تنجز وتواجه صعوبات

المقترحات	المتابعة	تاريخ القرار	القرار
الإسراع بتصنيف المستشفيات كمستشفيات جهوية	- تم القبول النهائي للأشغال بتاريخ 29 جويلية 2015 بالنسبة لمستشفى الحامة ولم يتم تفعيل القرار، - تعثر الأشغال على مستوى مستشفى مارث في حدود 45%.	25 جوان 2015	(17) تطوير المستشفيات المحليين بكل من الحامة ومارث الى مستشفيات جهوية صنف "ب"
ضرورة فسخ التعاقد مع الجانب البريطاني والبحث عن ممول جديد للمشروع.	تعطل المفاوضات مع الممول البريطاني.	25 جوان 2015	(62) الشروع في بناء المستشفى الجامعي مع الانطلاق خلال سنة 2016 بإعداد الدراسات
التسريع في فتح باب الترشيحات للانتداب بالمناظرة.	لم يتم الانطلاق في ترتيبات اجراء المناظرة منذ سنة 2016.	25 جوان 2015	(68) دعم مجهود التشغيل من خلال إعداد برنامج إنتدابات لتعويض الإحالات على التقاعد البالغ عددها 541 عوناً بالمجمع الكيميائي التونسي للفترة 2016/2018
برمجة المشروع لسنة 2021	عدم البرمجة ضمن ميزانية وزارة الفلاحة	25 جوان 2015	(42) إحداث بئر استكشافية بعقلة المرتبة (الحامة) بكلفة 4 م د
رصد الاعتمادات لإنجاز المشروع	تم توفير قطعة الأرض من طرف بلدية المكان	25 جوان 2015	(95) إحداث متحف للحركة الوطنية بالحامة بكلفة 4 م د
دعوة وزارة السياحة للشروع في اعداد الدراسات الفنية واعداد تصور لعناصر المشروع.	عدم استكمال التسوية العقارية لـ 38 هكتار من مجموع 320 هكتار	25 جوان 2015	(99) تهيئة المنطقة السياحية بشط الحمروني
دعوة وزارة التكوين المهني والتشغيل للشروع في اعداد الدراسات وانجاز المشروع.	تم اختيار مكان المشروع وتخصيص العقار	25 جوان 2015	(89) إحداث مركز للتكوين في اللوجستيك وصيانة المعدات الثقيلة

المقترحات	المتابعة	تاريخ القرار	القرار
	تم تكليف شركة تصرف الخليج للخدمات المالية لاستكمال الاجراءات الادارية والقانونية المرتبطة بالإكتتاب في رأس المال وتسيير الصندوق برأس مال قدره 50 مليون دينار ..	25 جوان 2015	إحداث صندوق للتنمية والتشغيل بالجهة
دعوة وزارة الدفاع للتسريع باقتناء الأرض	تم العدول عن نقل التكنيتين لمنطقة بوشمة بعد اعتراض الأهالي ويقترح حاليا نقلهم لمنطقة محاذية لمطار قابس الدولي وبصدد البحث عن عقار.	25 جوان 2015	تغيير موقع التكنيتين العسكريتين (بولبابة وباب بحر) الى منطقة بوشمة لتوفير مخزون عقاري إضافي داخل المنطقة البلدية لولاية قابس
دعوة المجمع الكيميائي لإنجاز المشروع	غير مبرمج	25 جوان 2015	الانطلاق في تنفيذ مشروع استعمال تقنية الامتصاص المضاعف واسترجاع الحرارة في الوحدة الثانية لإنتاج الحامض الكبريتي بكلفة 45 م.د.
دعوة وزارة التجهيز للانطلاق في الدراسات بالتنسيق مع وكالة حماية الشريط الساحلي	غير مبرمج	25 جوان 2015	قابس المدينة / مارث: دراسة إحداث طريق ساحلية تربط بين قابس والزارات (30 كلم) خلال فترة 2016 – 2020
		25 جوان 2015	إحداث قسم للحروق البليغة بقابس ضمن مشروع المستشفى الجامعي الجديد خلال الفترة 2017/2020
دعوة الهيئة العليا للاستثمار لمساعدة الباعث على التسريع في الإنجاز وتذليل الصعوبات.	طول إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لانطلاق أشغال المشروع من طرف المستثمر التركي	25 جوان 2015	إنجاز المدينة الإستشفائية بمنطقة الخبايات بالحامة

المقترحات	المتابعة	تاريخ القرار	القرار
دعوة المؤسسات الوطنية المنتسبة بالجهة للمساهمة في الترفيع في رأس مال الشركة.	امتناع المؤسسات البنكية منح قرض للشركة بسبب عدم قدرتها على توفير التمويل الذاتي (700 ألف دينار) وكذلك المؤسسات المساهمة في رأس المال من الترفيع في الأسهم.	22 أوت 2019	معالجة الإشكاليات والصعوبات المالية التي يمر بها القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس وذلك من خلال: - دعوة مساهمين جدد للترفيع في رأس مال شركة التصرف في القطب. - المساعدة على الحصول على قرض بنكي بقيمة 3 م د بالتنسيق مع صندوق الودائع والامانات لإنجاز التهيئة الداخلية للقسط الأول من المنطقة الصناعية مطماطة الجديدة.
التسريع بتفعيل قانون المسؤولية المجتمعية.	عدم صدور الأوامر الترتيبية لقانون المسؤولية المجتمعية	22 أوت 2019	تخصيص مساهمة سنوية في المجهود التنموي بالجهة من قبل المجمع الكيميائي التونسي بعنوان المسؤولية المجتمعية.
ضرورة تعهد وزارة التجهيز بالمشروع بالتنسيق مع الوكالة العقارية الصناعية (باعتبار تصريف مياه أمطار المنطقة الصناعية تسبب في تهديد مدينة غنوش بالفيضانات)	رفض الوكالة العقارية الصناعية تهيئة واد التين في إطار استكمال تهيئة القسط الثالث لتهيئة المنطقة الصناعية + المشروع لم يرسم في ميزانية وزارة التجهيز	22 أوت 2019	الانطلاق في انجاز دراسة لحماية مدينة غنوش من الفيضانات وتهيئة وادي الطين قبل موفى سنة 2019 والشروع في الاشغال سنة 2020 بكلفة جمالية للمشروع 5 م.د.
دعوة وزارة التجهيز والإسكان للانطلاق الفوري في انجاز الدراسات	تم مراسلة وزارة التجهيز من أجل انطلاق الدراسات	22 أوت 2019	انطلاق الدراسات لإنجاز الطريق السريعة قابس- قبلي- توزر- الحدود الجزائرية بطول 270 كلم سنة 2020 بكلفة 3 م.د.
التسريع بإحالة الاعتمادات لوكالة التصرف في النفايات للتسريع	تمت مراسلة الوزارة الغرض بتاريخ 04 سبتمبر 2019 لاحالة الاعتمادات	22 أوت 2019	الانطلاق في أشغال إنجاز مركز لتجميع ونقل الفضلات المنزلية مشترك بين بلديات قابس وتبلبو وذلك قبل شهر جوان 2020، الكلفة التقديرية حوالي 1 مليون دينار
دعوة الوزارة لتوفير الاعتمادات وبرمجة المشاريع بالميزانية	تم تقديم مقترحات العقارات من طرف البلديات المعنية لكن الوزارة لم تقم بتوفير الاعتمادات	22 أوت 2019	الانطلاق في تهيئة 9 ملاعب أحياء بكل من قابس الجنوبية، مطماطة، الحامة المدينة، الحامة أولاد سعيد، المطوية، قابس الغربية، مارث، وذرف وكتانة قبل موفى سنة 2019 بكلفة 1.6 م.د

المقترحات	المتابعة	تاريخ القرار	القرار
دعوة وزارة البيئة لتفعيل القرار	قرار معطل	22 أوت 2019	إحداث إدارة جهوية للبيئة وذلك في إطار مراجعة التنظيم الهيكلي الجديد لوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
دعوة وزارة النقل للتسريع في انجاز المشروع	تم انجاز دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية من طرف مكتب دراسات مختص في المجال وتم عرض التصور الأولي لمكونات المشروع خلال لجنة الاستثمار ويتم حاليا اعداد الإطار القانوني لإحداث ديوان المناطق اللوجستية	22 أوت 2019	الإسراع في تركيز المنطقة اللوجستية ببوشمة وتوفير اعتماد بقيمة 10 م.د لاقتناء قطعة الأرض لإقامة المشروع.
دعوة وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدفاع لإمضاء الاتفاقية وتفعيل القرار	معطل	22 أوت 2019	احداث مخزن للأدوية الخصوصية بالمستشفى العسكري



# ولاية تطاوين في أرقام

المؤشر	ولاية تطاوين	المستوى الوطني
المساحة (كلم2)	38889	163 610
عدد السكان (ألف ساكن)	151,3	11 732,9
المعتمديات	8	274
البلديات	7	350
العمادات	64	2085
النشيطون المشتغلون (ألف مشتغل)	35,4	3497,8
النسبة العامة للبطالة (2019)	% 28,7 (%32.4 سنة 2018)	% 15,3
نسبة بطالة مستوى التعليم العالي (2018)	% 49,3	% 28,3
نسبة الأمية (2018)	% 18,2	% 18,1
مؤشر التنمية الجهوية (من الرتبة 16 سنة 2015 الى الرتبة 12)	0,484 (من الرتبة 16 سنة 2015 الى الرتبة 12)	0,486
مؤشر جاذبية المجال 2018	2,88 (الرتبة 13)	3,18

# خصوصيات وميزات ولاية تطاوين

■ موقع جغرافي متميز وحدود دولية مع ليبيا و الجزائر

■ مناخ يشجع على الفلاحة البدرية و الآخر فصلية.

■ مائة مائة متوفرة و غير مستغلة حوالي 92,54 مليون متر مكعب منها 27 مليون متر مكعب مياه السيلان يتم استغلال 8,5 مليون متر مكعب سنويا أي ما يمثل 31,5% و 50,4 مليون متر مكعب مائة عميقة لا يستغل منها الا 24,33 مليون متر مكعب

■ أراضي فلاحية شاسعة: قرابة 1,708 مليون هكتارا منها 1,5 مليون هكتارا في شكل مراعي طبيعية و 200 ألف هكتارا أراضي صالحة للزراعة و الغراسة وحوالي 8000 هك من الغابات

■ آفاق واعدة في مجال الفلاحة البيولوجية

■ موارد طبيعية هامة كالمواد الإنشائية والأملاح الطبيعية والحقول النفطية والغازية وموائد المياه المعدنية

■ آفاق واعدة للاستثمار في الطاقة المتجددة (8-9 ساعات/ اليوم/ شمس)

■ مخزون تراثي و جيولوجي هام و معالم أثرية متعددة وفضاءات طبيعية متنوعة على غرار القصور الصحراوية والقرى الجبلية...

■ مخزون تقليدي ثري ومتنوع



# إشكاليات التنمية بولاية تطاوين

- هيمنة الصبغة الإستراتيجية على الرصيد العقاري وتشتت الملكية
- أنشطة اقتصادية غير مهيكلة وذات تشغيلية محدودة وهشة،
- محدودية جاذبية الجهة نظرا لضعف البنية الأساسية بها وبعدها عن مراكز الاقتصادية الكبرى
- ضعف نسب الاستغلال والتكثيف بالمناطق السقوية المتواجدة بالجهة،
- ضعف تثمين المدخرات الجهوية من المواد الإنشائية في اختصاصات مدعمة للنشاط الصناعي وخاصة في الجبس والرخام والطين....،
- ضعف احداثات الشغل التي يوفرها النسيج الإقتصادي وارتفاع نسبة البطالة وتزايد ظاهرة الحركات الاحتجاجية المطالبة بالتشغيل والتنمية،
- محدودية برامج واليات التكوين المهني وعدم استجابتها لمتطلبات الاقتصاد الجهوي،
- ضعف مساهمة الشركات البترولية العاملة بالولاية في التنمية الجهوية،
- فضاء صحراوي غني بالموارد الطبيعية ومكبل بالإجراءات الإدارية (منطقة عسكرية وأمنية) يحدّ من إمكانيات استغلاله في دعم تنمية الجهة،

# إشكاليات التنمية بولاية تطاوين

- تدني نتائج التعليم وخاصة في الامتحانات الوطنية (نسبة النجاح في البكالوريا لسنة 2018 بلغت 34.58%) وارتفاع نسبة الانقطاع المدرسي بالتعليم الثانوي (10.28% سنة 2018)
- عدد محدود لمراكز التكوين المهني (3 مراكز عمومية) ومؤسسات التعليم العالي (2 معاهد عليا) وعدم ملائمة الاختصاصات وخصوصيات الجهة
- غياب شبه كامل لطب الاختصاص (اختصاص التوليد وأمراض النساء، المجاري البولية، الصدرية، الأشعة، الانعاش...) وهو ما يحتم على المواطنين التنقل الى ولايات مجاورة للانتفاع بالخدمات الصحية العمومية.
- مؤسسات شبابية و ثقافية ذات جاذبية محدودة وضعف الاطار البشري بها
- نقص في التزود بالماء الصالح للشراب في مختلف مناطق الولاية وخاصة في فصل الصيف وتقدم الشبكة
- تنامي ظاهرة التصحر التي تزداد حدتها بفعل التغيرات المناخية الى جانب العوامل البشرية المرتبطة بالإفراط في استغلال الموارد الطبيعية فضلا عن التوسع العمراني،
- تفاقم ظاهرة الهجرة.

# الوضع التنموي بولاية تطاوين

## 1. متابعة تنفيذ المخطط الجهوي للتنمية 2016-2020

- بلغت الاستثمارات المدرجة بالمخطط التنموي الجهوي 2016 - 2020 حوالي 1900,4 مليون دينار منها 677 مليون دينار بالقطاع العمومي (35,6 %) و 1223,4 مليون دينار بالقطاع الخاص (64,4 %).
- قدرت الاستثمارات الجمالية المنجزة خلال الفترة 2016-2019 بحوالي 686,4 مليون دينار وبذلك بلغت نسبة الإنجاز 36 % من جملة الاستثمارات المبرمجة بالمخطط (46 % للقطاع العام و 31 % للقطاع الخاص).

نسبة الإنجاز %	تكلفة المخطط		
	الاستثمارات المنجزة 2016 - 2019 (م د)	2016-2020 (م د)	
46,1	312.357	676.990	القطاع العام
31,5	374,136	1223,4	القطاع الخاص
36,1	686,493	1900,4	المجموع

# الوضع التنموي بولاية تطاوين

2. متابعة تنفيذ المشاريع العمومية (متابعة المشاريع المدرجة بميزانيات سنوات 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020)

النسبة من الكلفة %	الكلفة (أ د)	النسبة من العدد %	عدد المشاريع	درجة النضج
30.55	111392	59.30	255	المشاريع المنجزة كلياً
51.40	187399	20.93	90	مشاريع بصدد الانجاز
6.17	22487	7.91	34	مشاريع في مرحلة طلبات العروض
6.90	25144	11.36	50	مشاريع بصدد الدراسة
0	0	0	0	مشاريع لم تنطلق
100	364610	100	430	المجموع
4.98	18187	0.23	1	منها مشاريع معطلة

علماً وأنه منذ سنة 2011 وإلى نهاية سنة 2019 تم انجاز 629 مشروعاً بكلفة 428,5 مليون دينار.

# الوضع التنموي بولاية تطاوين

## 3. أهم المشاريع التي هي في مراحل الإنجاز

المشروع	الكلفة (م د)	مرحلة الانجاز
انجاز وصلة الربط بين ولاية تطاوين والطريق السيارة 11 (تونس رأس جدير)	90	بصد الانجاز: بنسبة 10%
أشغال سد الثغرات ط و 19 ن ك 118 الى ن ك 138 (رمادة)	9.3	بصد الانجاز: بنسبة 85%
حماية مدينة تطاوين من الفيضانات (مواصلة تهيئة ضفاف وادي تطاوين وروافده/ تركيز منشآت عبور)	5	بصد الانجاز: بنسبة 50%
بناء قاعة للألعاب الفردية تطاوين الجنوبية	1.1	بصد الانجاز: بنسبة 25%
صيانة المسبح البلدي	3.9	بصد الانجاز: بنسبة 70%
تهيئة وتوسعة المنطقة السقوية بالسيوف (160 هك)	1.7	بصد الانجاز: بنسبة 90%
دراسة إحداث 1000 هك من الواحات والمناطق السقوية ببرج بوقبية	0.410	تم قبول المرحلة الثانية من الدراسة والمرور إلى المرحلة الثالثة
بناء مستشفى محلي بالصهار	3	بصد إعادة الإعلان عن طلب العروض
بناء معهد نموذجي بمبيت	3.7	تم الإعلان عن طلب العروض
هدم وإعادة بناء دار الثقافة برمادة	1.7	بصد إعداد المناظرة لاختيار المصممين
بناء مركب وفضاء طفولة مبكرة بالصهار	1.1	في طور الاعلان عن طلب العروض

# الوضع التنموي بولاية تطاوين

## 4. متابعة تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة

### أ- البرنامج الجهوي للتنمية

بلغت جملة الاعتمادات المفتوحة في إطار البرنامج الجهوي للتنمية بولاية تطاوين بالنسبة لسنوات 2016-2019 حوالي:

✓ 26.7 مليون دينار تعهدا

✓ و 18.6 مليون دينار دفعا

وقد ساهم البرنامج الجهوي للتنمية خلال سنوات 2011-2019 في تحسين ظروف العيش بالجهة حيث تمّ:

❖ انجاز 37.5 كلم من الطرقات والمسالك.

❖ تحسين 1262 مسكن.

❖ توفير منح في إطار دعم موارد الرزق لفائدة 1262 منتفع.

مع الإشارة إلى انه تمّ رصد اعتمادات بقيمة 6.1 مليون دينار لسنة 2020 وقد تمت المصادقة على البرنامج بكل مكوناته من طرف لجنة التخطيط والمالية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بتاريخ 12 جوان 2020.

### ب- برنامج التنمية المندمجة

شملت تدخلات هذا البرنامج مختلف معتمديات ولاية تطاوين

\*- القسط الاول: 03 مشاريع للتنمية المندمجة بمعتمديات غمراسن و تطاوين الجنوبية و تطاوين الشمالية

\*- القسط الثاني: مشروع واحد بمعتمدية رمادة


\*- القسط الثالث: 03 مشاريع بمعتمديات البئر الاحمر و ذهيبية والصمار

كما تمّ اقرار مشروع إضافي لفائدة معتمدية بني مهيبة المحدثة أخيرا (سنة 2017) وفي انتظار رصد الاعتمادات لهذا المشروع

# الوضع التنموي بولاية تطاوين

## 5. متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى

المشروع	انجاز وصلة ربط بين ولاية تطاوين والطريق السيارة مدنين راس جدير 11 على طول 50 كلم
أهداف المشروع	ربط ولاية تطاوين بالطريق السيارة أ1 ويندرج في إطار سياسة تنمية قطاع النقل الوطني وتطوير شبكة الطرقات.
صاحب المشروع	وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية
مكان المشروع	تطاوين الشمالية - غمراسن- البئر الاحمر
الكلفة الجمالية	90 مليون دينار
مكونات المشروع	<p><b>قسط عدد 1:</b> مضاغفة الط و 19 بطول 13.5 كلم. طريق حزامية لتطاوين الجديدة بطول 3.716 كلم. عدد المفترقات الدائرية: 05 وحدات. عدد المنشآت المائية: 32 وحدة كميات الخرسانة الاسفلتية: 3م 50000 GB 0/20 كميات الخرسانة الاسفلتية: 3م 305000 BB0/14 إضافة الى أشغال التنوير العمومي والتشوير الافقي والعمودي وتجهيزات السلامة وانجاز الارصفة ببعض الاماكن من المشروع.</p> <p><b>قسط عدد 2:</b> طول المشروع: 25.293 كلم. عدد المفترقات الدائرية: 06 وحدات عدد المنشآت المائية: 23 وحدة كميات التتريب : حوالي 650000 م3 كميات الخرسانة الاسفلتية: 3م 55000 GB 0/20 كميات الخرسانة الاسفلتية: 3م 380000 BB0/14 إضافة الى أشغال التنوير العمومي والتشوير الافقي والعمومي وتجهيزات السلامة و انجاز الارصفة ببعض الاماكن من المشروع</p>
ممول المشروع	البنك الدولي للتنمية
انطلاق الأشغال:	15 أبريل 2019
مدة الأشغال	30 شهرا
تاريخ انتهاء الاجال التعاقدية	15 افريل 2022
تقدم الانجاز	نسبة الانجاز: 10%

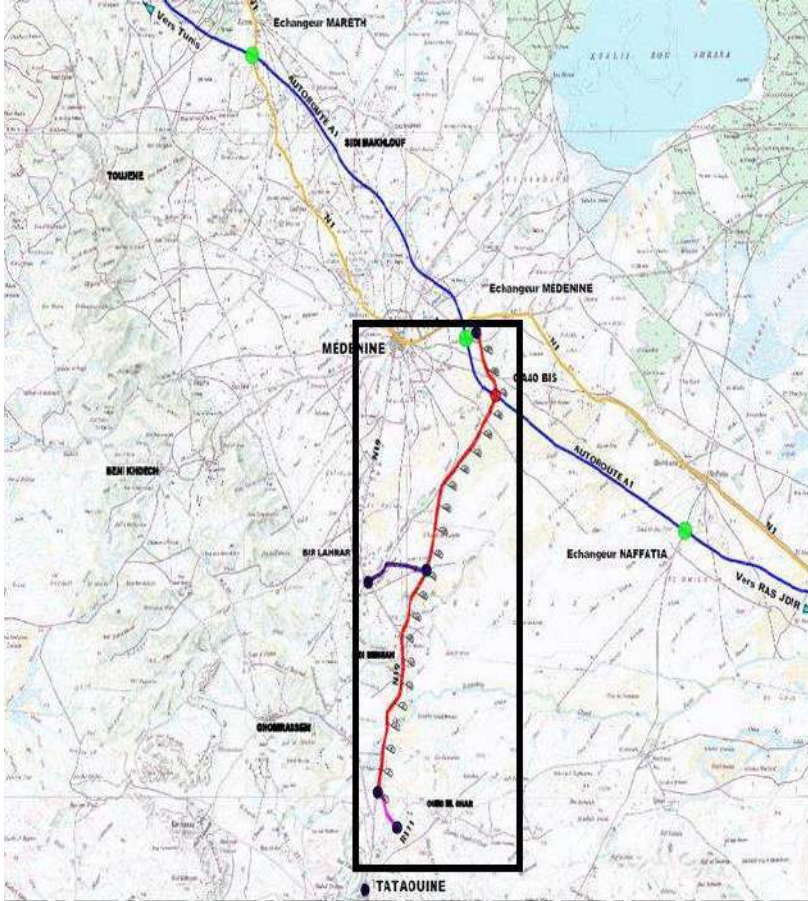

# الوضع التنموي بولاية تطاوين

## 5. متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى

### مشروع غاز الجنوب

#### الأهداف:

- تركيز وحدة معالجة لتوفير الغاز الطبيعي للاستعمال الصناعي والمنزلي.
- تركيز وحدة تعبئة قوارير الغاز المسال قصد تغطية حاجيات السوق المحلية في الجنوب التونسي.
- توفير مواطن شغل وديناميكية صناعية للمنطقة.

الكلفة: 150 مليون دولار امريكي

مصادر التمويل: المشروع ممول من طرف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بحساب 35% تمويل ذاتي و65% بواسطة قرض حسب اتفاقية تمويل مبرمة مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

#### الأطراف المعنية بالمشروع:

- المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ETAP بصفتها المسؤول الاول عن انجاز المشروع.
- الشركة التونسية للكهرباء والغاز STEG وهي المسؤولة عن توفير قنوات ايصال الغاز الطبيعي للاستعمال الصناعي والمنزلي.
- شركة اوام في ، الشركة المسؤولة عن تطوير حقل نوارة المصدر الاساسي للغاز لمشروع غاز تطاوين .
- المقاول المسؤول عن مد خط أنبوب الغاز RETEL
- المقاول المسؤول عن انشاء وحدة المعالجة
- المقاول المسؤول عن انشاء وحدة تعبئة القوارير

الأجال		المراحل المنجزة	
- مارس 2018 - اوت 2018		- طلب عروض مد خط أنبوب الغاز	
- مارس 2018 - جوان 2019		- طلب عروض انشاء وحدة المعالجة	
- اوت 2019 - ابريل 2020		- طلب عروض انشاء وحدة تعبئة قوارير	
آجال استكمال التنفيذ	المعني بالتنفيذ	المراحل في طور الإنجاز والمستقبلية	
جوان 2020	المقاول RETEL	مد خط أنبوب الغاز	
ديسمبر 2021	المقاول JEREH/EPPM	انشاء وحدة المعالجة	
ديسمبر 2021	المقاول المسؤول عن انشاء وحدة تعبئة القوارير	انشاء وحدة تعبئة قوارير GPL	
*- طلب عروض : سبتمبر 2018 *- انطلاق الأشغال : افريل 2019	افريل 2019 : احداث الشركة (SEREE) المشرفة على انجاز واستغلال المحطة	انجاز محطة إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بقدرة 10 ميغاواط بالقرضاب - غمراسن (في إطار الشراكة بين الشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) وشركة ايني الايطالية (ENI)	
خلال فترة الانتاج	خلال فترة الانجاز	الطاقة التشغيلية	
50- 40	100 - 80	مد خط أنبوب الغاز	
	200 - 150	انشاء وحدة المعالجة	
	100 - 80	انشاء وحدة تعبئة قوارير GPL	



# الوضع التنموي بولاية تطاوين

## 5. متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى

المشروع: **توسعة وتهئية معبر ذهبية**

يندرج انجاز هذا المشروع في إطار تعصير المعابر الحدودية في ولاية تطاوين

1. كلفة المشروع: 13.7 مليون دينار

2. المساحة الجملية المغطاة:

تبلغ المساحة الجملية المغطاة 8000 م<sup>2</sup>.

3. مكونات المشروع:

- مبنى للديوانة والشرطة،
- 17 مكتب وقاعة اجتماعات للديوانة
- 17 مكتب وقاعة اجتماعات للشرطة
- مبنى قاعة عمليات،
- مستودع تفتيش السيارات،
- مستودع المحجوزات،
- مبنى الأكشاك،
- مكاتب الفرقة التجارية دخول وخروج،
- المطعم والمبيت للأعوان (قسط أول)،
- الطابق الأرضي : استقبال و مطبخ و قاعتي أكل
- الطابق الأول : 16 غرفة نوم و جناح
- المطعم والمقهى للمسافرين،
- مباني مسقوفة ومفتوحة للتفتيش
- مبنى للفحص بالأشعة،
- الطرقات و الشبكات المختلفة.


4. تاريخ انطلاق الأشغال: أفريل 2016

5. التاريخ المتوقع لانهاء الاشغال: نوفمبر 2018

6. مدة الإنجاز: 540 يوما.

7. نسبة تقدم الانجاز: 85%

ضرورة تدخل وزارة التجهيز والاسكان مع المقاوله المكلفة بانجاز المشروع لتسريع بانتهاء الأشغال

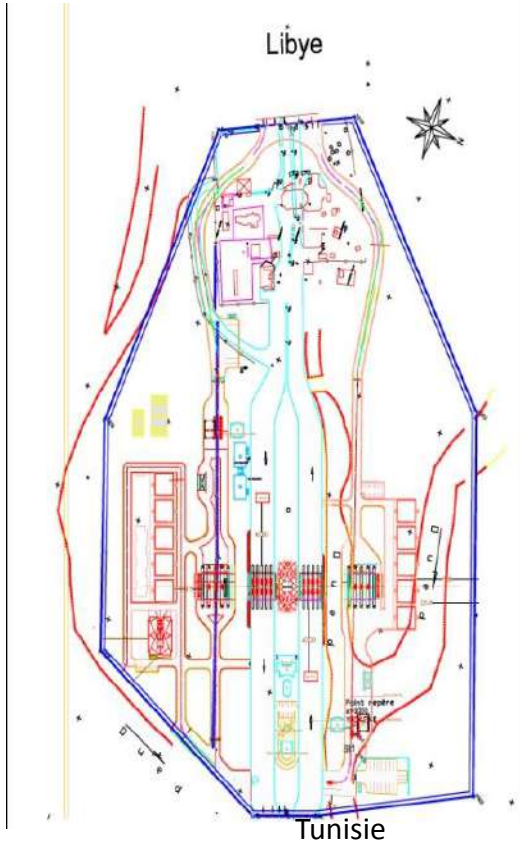

# الوضع التنموي بولاية تطاوين

## 5. متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى

المشروع	انجاز 1000 هك من المناطق السقوية والواحات ببرج بورقيبة -رمادة
صاحب المشروع	وزارة الفلاحة والموارد المائية
مكان المشروع	معمدية رمادة
أهداف المشروع	-تثمين الموارد المائية المنطقة الصحراوية - النهوض بالإنتاج الفلاحي -تنمية الصحراء -خلق مواطن شغل -خلق ديناميكية اقتصادية
الكلفة	100 مليون دينار
مكونات المشروع	-إحداث 580 هك بمنطقة برج بورقيبة كنقطة انطلاق وبداية الرفع الطبوغرافي ودراسة 420 هك بوادي زار ولرزط
تقدم المشروع	- في مرحلة الدراسات: تمّ قبول المرحلة الثانية من الدراسة والمرور إلى المرحلة الثالثة -بطئ في الانجاز -دعوة المركز الوطني للدراسات الفلاحية لإتمام الدراسة في اقرب الآجال و عرضها للتمويل

# الوضع التنموي بولاية تطاوين

## 5. متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى

المشروع	انجاز محطة إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط ببني مهيبة
<b>1- الخصائص التقنية للمشروع</b>	
قدرة الانتاج	50 ميغاواط
مكان المشروع	معتمدية بني مهيبة
الاحداثيات	32° 42'46.74"N;10°50'18.98"E
المساحة	100 هك
الملكية	ملك خاص (تفويت في شكل هبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز)
الطاقة المزعم انتاجها	90 جيغاواط/ ساعة/السنة
الربط بالشبكة	خط تطاوين - رويس 225 كيلو فولت (8 كلم)
<b>2- الخصائص الاقتصادية للمشروع</b>	
الكلفة	100 م د
تكلفة الربط بالشبكة	4 م د
عدد الوظائف المحدثة خلال مرحلة التشييد	500 وظيفة اثناء مرحلة التشييد (من 16 الى 24 شهرا)
تقدم المشروع	*- اتمام دراسة الجدوى: افريل 2018 *- اتمام ملف طلب العروض: سبتمبر 2018 *- تم ابرام عقد التفويت في قطعة الأرض المخصصة لانجاز المشروع *- في مرحلة البحث عن التمويل

المشروع	انجاز محطة إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط ببرج برفيية
<b>1- الخصائص التقنية للمشروع</b>	
قدرة الانتاج	200 ميغاواط
مكان المشروع	برج بورقبيية- معتمدية رمادة
الاحداثيات	30° 9'59'.03"N;9°59'14.40"E
المساحة	400 هك
الملكية	ملك عام
الطاقة المزعم انتاجها	360 جيغاواط/ ساعة/السنة
الربط بالشبكة	خط تطاوين - رويس 225 كيلو فولت(100 كلم)
<b>2- الخصائص الاقتصادية للمشروع</b>	
الكلفة	400 م د
تكلفة الربط بالشبكة	حوالي 30 م د
تقدم المشروع	*- طلب عروض تأهيلي: ماي 2017 - ضبط قائمة مصنعين مؤهلين لانجاز المشروع: نوفمبر 2018 *- طلب عروض نهائي: مارس 2019 *- تعيين الشركة المكلفة بالانجاز -شركة نرويجية- *- دعوة وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقى الى احكام التنسيق مع الشركة المكلفة للاسراع بالانجاز

# الوضع التنموي بولاية تطاوين

## 6. أهم المشاريع التي تشكو صعوبات

المشروع	الوضعية الحالية	المقترحات
احداث منطقة صناعية خاصة بالجبس على مساحة 50 هك بكلفة 18 م د	- تم اقتناء الجزء الأول على مساحة 25 هك - الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه: تم إقتناء القنوات و في طور الإعلان عن طلب العروض الخاص بأشغال تركيز القنوات - الشركة التونسية للكهرباء و الغاز : بصدد الانجاز - أشغال التهيئة: لم تنطلق بعد	- دعوة الوكالة العقارية الى اتمام الدراسات والانطلاق في تهيئة القسط الأول - الإسراع برصد الاعتمادات و اقتناء الأرض المخصصة للقسط الثاني على مساحة 25 هك
إنجاز مصب مراقب و 5 مراكز تحويل بكلفة 8 م د	- تم تحديد قطعتي أرض خاصة بالمصب ومركز تحويل ببلدية تطاوين واحالته الى وكالة التصرف في النفايات في إنتظار إتمام الدراسات	التدخل لدى مصالح وزارة البيئة للإسراع بانجاز المصب المراقب في مرحلة اولى
فتح مطار رمادة العسكري للطيران المدني	تم انجاز مهبط الطائرات من طرف وزارة الدفاع في انتظار انجاز محطة المسافرين	التعجيل بتخصيص الاعتمادات من طرف ديوان الموانئ الجوية لانجاز محطة المسافرين
إحداث وحدة الإسمنت بتطاوين	انتهاء الترخيص المسند من وزارة الصناعة لشركة اسمنت المستثمرين المتحدين	دعوة وزارة الصناعة للتمديد في الترخيص

# الوضع التنموي بولاية تطاوين

7. أهم المشاريع المدرجة بالمخطط 2016-2020 والتي لم تنطلق بعد (غير مرسمة بالميزانية)

## المشروع

إحداث 1000 هك من الواحات والمناطق السقوية

تأهيل المستشفى الجهوي عبر انجاز المخطط المديرى

إحداث قطب جامعي اقليمي في طب النساء والأطفال

إحداث مدرسة إعدادية بحي عباس

بعث وحدة للتصرف في النفايات المنزلية 6 بلديات

إحداث 3 مراكز إقامة ومطعم بكل دار الشباب البئر الأحمر والصمار وغمراسن

إحداث 3 قاعات رياضات فردية بكل من البئر الأحمر وغمراسن والصمار

بناء معهد جهوي للموسيقى وبناء مكتبة عمومية بقصر عون وحي البرّ

إحداث 2 قرى حرفية بكل من الصمار والبئر الأحمر ومركز تنمية الكفاءات بتطاوين

بناء 2 محطات تطهير بكل من ذهيبة ورمادة

انجاز الطريق الحدودية رقم 203 من حدود ولاية مدنين الى ذهيبة

# الوضع التنموي بولاية تطاوين

8. البرنامج الخصوصي لتنمية المناطق الحدودية: يهّم هذا البرنامج معتمديتي ذهبية ورمادة بكلفة 3 مليون دينار

## معتمدية رمادة

✓ دعم موارد رزق في قطاع الحرف:

الكلفة: 200 أ.د : تمّ الإنجاز

✓ دعم الأنشطة الفلاحية:

الكلفة: 50 أ.د : تمّ الإنجاز

✓ دعم موارد رزق في تربية الماشية:

الكلفة: 350 أ.د: تمّ الاتفاق على اقتناء رؤوس

الماشية من طرف المنتفعين مع تقديم 70 % من

المبلغ الجملي للمنتفع الواحد على أن يقع إتمام 30%

المتبقية بعد عملية الترقيم وموافقة اللجنة الفنية

✓ كهربية الآبار الفلاحية: (15 بئرا)

الكلفة: 400 أ.د : تمّ الإنجاز

✓ بناء فضاء للاقامة:

الكلفة: 500 أ.د : تمّ الإنجاز

## معتمدية ذهبية

✓ دعم موارد الرزق في قطاع الحرف:

الكلفة: 150 أ.د : تمّ الإنجاز

✓ دعم الأنشطة الفلاحية:

الكلفة: 70 أ.د : تمّ الإنجاز

✓ دعم موارد الرزق في تربية الماشية:

الكلفة: 280 أ.د تم توزيع عدد من رؤوس الماشية لـ 62 منتفعا

✓ كهربية الآبار الفلاحية: (8 آبار)

الكلفة: 500 أ.د: تمّ الإنجاز

✓ بناء محلات للحرف:

الكلفة: 500 أ.د: تمّ الإنجاز

# الوضع التنموي بولاية تطاوين

## 9. متابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية

— المجلس الوزاري بتاريخ 27 افريل 2017 بولاية تطاوين والذي تضمن 64 قرارا.

— 34 قرارا تمّ تنفيذه

— 17 قرارا بصدد التنفيذ

— 13 قرارا لم ينفذ

الملاحظات	القرارات التي لم تنفّذ
معطل في مستوى الدراسة من قبل المركز الوطني للدراسات الفلاحية (إحداث 580 هك بمنطقة برج بورقيبة كمنطقة انطلاق وبداية الرفع الطبوغرافي ودراسة 420 هك بوادي زار و لرزط): لم ينجز	1- إحداث قطب واحات بـرج بورقيبة بكلفة جمالية تساوي 100 مليون دينار على مساحة 1000 هكتار .
معطل في مستوى الدراسة المتعلقة ببناء محطة جوية جديدة من طرف ديوان الطيران المدني والمطارات	2- فتح مطار رمادة العسكري للطائرات المدنية و ذلك قبل 25 ماي 2018 بكلفة 13 م.د.
في طور اقتناء مقسم بالمنطقة الصناعية الخبطة	3- الانطلاق في بناء ورشة صموية لصيانة الحافلات سنة 2018 بكلفة 750 أ.د.
تم تحديد الأرض و اعداد دراسة تهيئة المقاسم والمصادقة عليه منذ سنة 2016 في انتظار رصد الاعتمادات والاذن بانطلاق الاشغال من طرف المصالح المركزية لوزارة التجهيز والاسكان	4- الانطلاق في انجاز 142 مسكنا اجتماعيا يتوزعون كما يلي : 45 مسكنا برمادة المطار و 72 مسكنا برمادة عين أم الطبول و 25 مسكنا بالذهبية- حي النصر-، موفى سنة 2018.
لم ينجز: دعوة وزارة الصحة للاسراع بانجاز المشروع	5- إطلاق أشغال تأهيل وتوسعة وتجهيز المستشفى الجهوي بتطاوين (عيادات خارجية، الاستعجالي، مبيت للأطباء، قطب جامعي إقليمي في طب النساء والأطفال، إحداث صيدلية) سنة 2018، بكلفة 13 م. د
لم ينجز: دعوة وزارة الصحة للاسراع بانجاز المشروع	6- إحداث وحدة طب استعجالي بالمركز الوسيط ببني مهيبة نهاية 2017 بكلفة 150أ.د.

# الوضع التنموي بولاية تطاوين

## 9. متابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية

الملاحظات	القرارات التي لم تنفذ
بطيء في إعداد الدراسات.	7- انطلاق أشغال إحداث مركز تكوين في الطاقة والمواد الانشائية في سبتمبر 2018، بكلفة 7.610 م. د
تم اقتناء قطعة الأرض من طرف بلدية تطاوين ووضعها على ذمة المشروع والانطلاق في الدراسات و لم ينجز لعدم توفر التمويلات	8- إحداث مسلخ بلدي بكلفة 4 م.د سنة 2018.
في انتظار القيام بالانتدابات اللازمة لسد الشغورات بالمكاتب المغلقة بكل من مكتب بريد رأس الوادي ومكتب بريد الحرية	9- إعادة فتح مكاتب البريد المغلقة بكل من رأس الواد - بئر عمير - بكريف- الحرية - قسوفة- واد الغار
بصدد إعداد المناظرة لاختيار المصممين	10- إعادة بناء دار الثقافة برمادة بكلفة 2 م.د سنة 2018.
تمت تسوية وضعية العقار(التخصيص) وفي انتظار القيام بالدراسات	11- إحداث متحف للتراث الثقافي والطبيعي بتطاوين بكلفة 1 م.د سنة 2018.
في انتظار انتهاء من الأشغال على مستوى محطة الغاز	12- تزويد وإتمام ربط مدينة تطاوين بالغاز الطبيعي خلال 2018
تم إمضاء عقد بيع قطعة الأرض المخصصة للمشروع بين مجلس تصرف زرقان بني مهيمة و الشركة التونسية للكهرباء و الغاز . لم ينجز	13- الانطلاق في أشغال مشروع محطات إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية photovoltaïque بعمدية بني مهيمة (بقدره 50 ميغاواط) على مساحة تقدر بـ 100 هكتار و بكلفة إنجاز تبلغ 125 م.د و بطاقة تشغيلية تساوي 400 موطن شغل.



# الوضع التنموي بولاية تطاوين

متابعة تطبيق بنود اتفاق 15 جوان 2017 (اتفاق الكامور)

الملاحظات	القرارات
<p>*- إنداب 70 إطارا بشركة SITEP: تم الإعلان عن النتائج النهائية وتمت المباشرة</p> <p>*- إنداب 20 عون و إطار مدار الخدمات البترولية: تم الإعلان عن النتائج النهائية وتمت المباشرة كما تم إنداب 15 عون اضافي</p> <p>*- إنداب 10 إطارات بشركة SODEPS production: تم الإعلان عن النتائج النهائية وتمت المباشرة كما الإعلان عن مناظرة لانداب 10 أعوان إضافيين وفي مرحلة دراسة الملفات</p> <p>*- إنداب 30 عون و إطار بشركة الملاحظات: تم الإعلان عن النتائج النهائية وتمت المباشرة</p> <p>*- إنداب 81 عون بشركة OMV (68 متريص بالأكاديمية+13عامل شركة وينستار): تم إنداب 81 عون</p> <p>*- إنداب 30 عون بشركة OMV: تم الاعلان عن النتائج النهائية بانداب 21 عوناً وتمت المباشرة و 09 اعوان: في مرحلة اجراء الاختبارات الشفاهية</p> <p>*- إنداب 340 عون بشركات الخدمات البترولية العاملة بالصحراء: تم إنداب 1530 عون من جملة 1899 عرض شغل.</p> <p>*- إنداب 70 عون بشركة SODEPS forage: تم الإعلان عن انداب 30 عون عن طريق الشركة التونسية للتنقيب وصدد الإعلان عن النتائج الأولية.</p> <p>*- إنداب 40 عون بشركة ENI: لم ينجز.</p> <p>*- إنداب 87 عون بالشركة التونسية للكهرباء و الغاز: لم ينجز.</p> <p>*- إنداب 300 عون بشركة الخدمات التي سنتولى إنجاز أنبوب الغاز: تم تعيين الشركة المكلفة بإنجاز المشروع.</p>	<p>1- إنداب 1500 عون بشركات الإنتاج والخدمات البترولية العاملة بالصحراء قبل موافق سنة 2017 .</p>
<p>*- 1500 عون بعنوان 2017: تم الإعلان عن نتائج المناظرة وتمت المباشرة يوم 2 جانفي 2018.</p> <p>*- 1000 عون بعنوان 2018: تم الإعلان عن نتائج المناظرة وابرام عقود العمل</p> <p>*- 500 عون بعنوان سنة 2019: لم ينجز</p>	<p>2- إنداب 3000 عون بشركة البيئة والغراسه والبستنة</p>
<p>*- تم إبرام اتفاقيات مع البنوك العمومية (البنك الوطني الفلاحي، بنك الإسكان، الشركة التونسية للبنك) وكذلك مع صندوق الودائع يوم 28 أوت 2018 بمقر وزارة الصحة</p> <p>*- تم الترفيع في رأس مال شركة التنمية والاستثمار بتطاوين بمبلغ 3.3 مليون دينار</p>	<p>3- تخصيص 80 م.د لصندوق التنمية و الإستثمار</p>

# الوضع التنموي بولاية تطاوين

## إنجازات القطاع الخاص لولاية تطاوين سنة 2019

- تطور حجم الاستثمار المصرح به في القطاع الصناعي بـ 98% (18.4 م د سنة 2019 مقابل 983 م د سنة 2018)،
- حسب متابعة المشاريع الصناعية المصرح بها خلال الأربع سنوات المنقضية، تم سنة 2019 إنجاز 44.4 % من حيث العدد، 2.8 % من حيث حجم الاستثمارات و 5.4 % من مواطن الشغل.
- بلغ عدد المشاريع المصادق عليها من لجنة اسناد الامتيازات منحة التنمية الجهوية 10 مشاريع بحجم استثمار 7.1 م د وبمنحة قدرها 2.1 م د سنة 2019،
- بلغ حجم الاستثمار المصرح به في القطاع الفلاحي سنة 2019 حوالي 18.8 م د مسجلا بذلك انخفاضا بـ 55 % مقارنة بسنة 2018،
- تم سنة 2019 في القطاع الفلاحي المصادقة على 118 مشروعا بحجم الاستثمارات 8 م د و 87 مواطن الشغل،
- تم سنة 2019 في القطاع الفلاحي إنجاز 173 مشروعا بحجم الاستثمارات 10.5 م د

# الوضع التنموي بولاية تطاوين

## إنجازات القطاع الخاص لولاية تطاوين سنة 2019

– تطور حجم الاستثمار المصرح به في القطاع السياحي بـ 173% (1.5 م د سنة 2019 مقابل 0.55 م د سنة 2018)،

– تمويل 317 مشروعا بحجم استثمار قدره 5.9 م د من طرف البنك التونسي للتضامن و 2 مشاريع بحجم استثمار قدره 1.7 م د من طرف بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة،

– انتفاع 120 باعثا بتدخل آلية اعتماد الانطلاق 1 باعتمادات قدرها 339.7 أد،

– انتفاع باعشرين اثنين بتدخل آلية اعتماد الانطلاق 2 باعتمادات قدرها 319 أد،

# الوضع التنموي بولاية تطاوين

## إنجازات القطاع الخاص لولاية تطاوين سنة 2019

المشروع	تكلفة المشروع (أ.د)
مشروع تربية دجاج البيض بتطاوين الشمالية	660
مشروع زياتين وأشجار مثمرة سقوي بتطاوين الشمالية	230
مشروع فلاحي مندمج يرتكز على غراسة الزياتين بالصمار	160

### القطاع الفلاحي

المشروع	تكلفة المشروع (أ.د)
وحدة لصناعة الهياكل المعدنية للبناء بالبئر الاحمر	110
وحدة لصناعة الأنابيب البلاستيكية بتطاوين الشمالية	190
وحدة للتركيب المعدني بتطاوين الشمالية	700
انجاز وحدة لصناعة الجبس	30000

### القطاع الصناعي

المشروع	مواطن الشغل (أ.د)
انجاز استضافة عائلية	100
تواصل انجاز نزل 3 نجوم	1100
تواصل انجاز محطة تنشيط سياحي	550

### القطاع السياحي

# المشاغل التنموية بولاية تطاوين

• تفعيل التمييز الايجابي على مستوى:

- قاعدة توزيع الاعتمادات المرصودة للجهات الداخلية

- نصيب الجهات الداخلية في المناظرات الوطنية

- منح البنوك امتيازات خصوصية لتمويل المشاريع بالمناطق الداخلية

• تكفل الدولة بتوجيه بعض الاستثمارات الخارجية ذات التشغيلية العالية الى الجهات الداخلية (قطاع النسيج، قطاع

تركيب السيارات، صناعة بعض مكونات السيارات...).

• الاسراع بانجاز مشروع 1000 هك من الواحات والمناطق السقوية بمعتمدية رمادة

• تصفية الأوضاع العقارية للأراضي الاشتراكية وتكوين مخزون عقاري صناعي بكافة معتمديات الولاية للحد من

التفاوت بينها.

• جعل الجهة قطبا للطاقة والطاقات المتجددة والصناعات الاستخراجية اعتبارا لمساهمة الجهة في انتاج الطاقة منذ

ستينات القرن الماضي إضافة إلى ميزاتها التفاضلية في الطاقات المتجددة وما تزخر به من مخزون هام من المواد

الانشائية على غرار مادة الجبس والرمال السيليسية والطين وغيرها...

• دعم البيئة الأساسية بالمناطق الصناعية وربطها بالغاز الصناعي و تعميم إحداث مناطق جديدة بالمعتمديات

الداخلية

# المشاغل التنموية بولاية تطاوين

❖ دعم نسيج مؤسسات التعليم العالي بإحداث مدرسة عليا للمهندسين في البترول والطاقات المتجددة وهو ما

يساهم في الرفع من عدد الطلبة وتحسين القدرة التشغيلية للاختصاصات المنبثقة عنه.

❖ إرساء منظومة جهوية صحية تمكّن من تقريب الخدمات الصحية وتحسين جودتها وتقلص من الفوارق بين

مختلف المعتمديات وذلك من خلال توفير طب الاختصاص بالمستشفى الجهوي والعمل على تعزيز قدرات

المستشفيات المحلية ومراكز الصحة الأساسية بتوفير الاختصاصات والموارد البشرية الضرورية لتحسين

الخدمات الصحية بتلك المناطق البعيدة عن مركز الولاية.

❖ ايجاد الحلول الجذرية لإشكالية الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب من أشغال تجديد الشبكة

وتحديثها والإسراع بإنجاز المشاريع المهيكلية لهذا القطاع من ذلك انجاز محطة التحلية بالزارات والقيام

بأشغال توسعة محطة التحلية بجربة

# المشاغل التنموية بولاية تطاوين

❖ الإسراع بانجاز مشاريع محطات الفوطوضوئية بكل من معتمدية بني مهيرة بقوة 50 ميغاواط و برج

بورقيبة من معتمدية رمادة بقوة 200 ميغاواط

❖ إحداث مدرسة عليا للمهندسين في البترول والطاقات المتجددة

❖ الإسراع بإنهاء أشغال تأهيل معبر ذهيبية من جهة واحداث نقاط عبور جديدة ومناطق للتبادل الحر خاصة

بمنطقة مشهد صالح على الحدود "التونسية-الليبية" ومن جهة الحدود الغربية مع الجزائر.

❖ الشروع في تهيئة المنطقة السياحية

❖ الإسراع بانجاز المشاريع المبرمجة في القطاع الصحي (تأهيل المستشفى الجهوي عبر انجاز المخطط

المديري و إحداث قطب جامعي اقليمي في طب النساء والأطفال)

❖ الإسراع برصد الاعتمادات الخاصة بمشروع التنمية المندمجة الذي وقع إقراره لفائدة معتمدية بني مهيرة

المحدثة،

# المشاغل التنموية بولاية تطاوين

❖ الإسراع بتلبية مطالب الحراك الاجتماعي بالجهة والمتمثلة في النقاط التالية:

- 1500 موطن شغل قار بالشركات البترولية،

- الإسراع بإعلان انتداب القسط الأخير بشركة البنية والغراسات والبستنة (500 بين عون وإطار)،

- تخصيص 80 مليون دينار سنويا للتنمية والاستثمار بالجهة،

- الإسراع بإصدار القانون الأساسي وتصنيف شركة البنية والغراسات والبستنة،

- تسوية وضعية الأعوان المسرحين من حقل نوارة،

- التسريع بإحداث الشركة الخاصة بالإشراف على حقل نوارة والتصرف فيه بموجب اتفاق الاستغلال

وتمسك الجهة باحتضان المقر الاجتماعي للشركة



شكرا على إنتباهكم  
صالح درمش المدير الجهوي للتنمية بتطاوين



ديوان تنمية الجنوب

الهاتف: (216) 75.640.363

الفاكس: (216) 75.641.747

E-mail: [odsud@mdci.gov.tn](mailto:odsud@mdci.gov.tn)

Site web: [www.ods.nat.tn](http://www.ods.nat.tn)



الجمهورية التونسية  
وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي  
ديوان تنمية الجنوب  
الإدارة الجهوية للتنمية بتطاوين



# متابعة المشاريع التي تواجه صعوبات بولاية تطاوين

جوان 2020

## قائمة المشاريع المعطلة بولاية تطاوين

المشروع	الوضعية الحالية والصعوبات المتعلقة بتنفيذ المشروع	الإجراءات المقترحة
احداث منطقة صناعية خاصة بالجبس على مساحة 50 هك بكلفة 18 م د	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم اقتناء الجزء الأول على مساحة 25 هك</li> <li>- الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه: تم إقتناء القنوات و في طور الإعلان عن طلب العروض الخاص بأشغال تركيز القنوات</li> <li>- الشركة التونسية للكهرباء و الغاز : بصدد الانجاز</li> <li>- أشغال التهيئة:لم تتطلق بعد</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- دعوة الوكالة العقارية لإلتام الدراسات والانطلاق في تهيئة القسط الأول</li> <li>- الإسراع برصد الاعتمادات واقتناء الأرض المخصصة للقسط الثاني على مساحة 25 هك</li> </ul>
انجاز 1000 هك من المناطق السقوية والواحات ببرج بورقيبة -رمادة	<ul style="list-style-type: none"> <li>- في مرحلة الدراسات: تمّ قبول المرحلة الثانية من الدراسة والمرور إلى المرحلة الثالثة</li> <li>- بطئ في استكمال الدراسات</li> </ul>	دعوة المركز الوطني للدراسات الفلاحية لإتمام الدراسة في اقرب الآجال و عرضها للتمويل
إنجاز مصب مراقب و5 مراكز تحويل بكلفة 8 م د	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم تحديد قطعتي أرض خاصة بالمصب ومركز تحويل ببلدية تطاوين وإحالتها إلى وكالة التصرف في النفايات في انتظار إتمام الدراسات</li> </ul>	التدخل لدى مصالح وزارة البيئة للإسراع بانجاز المصب المراقب في مرحلة أولى
توسعة وتهيئة معبر ذهيبية	<ul style="list-style-type: none"> <li>*- تاريخ انطلاق الأشغال: افريل 2016</li> <li>*- التاريخ المتوقع لانتهاء الاشغال: نوفمبر 2018</li> <li>*- نسبة الانجاز: 85%</li> </ul>	ضرورة تدخل وزارة التجهيز والاسكان مع المقاوله المكلفه بانجاز المشروع للتسريع بانتهاء الاشغال
فتح مطار رمادة العسكري للطيران المدني	معطل في مستوى الدراسة المتعلقة ببناء محطة جوية جديدة من طرف ديوان الطيران المدني والمطارات	التعجيل بتخصيص الاعتمادات من طرف ديوان الموانئ الجوية لانجاز محطة المسافرين
إحداث مركز تكوين في الطاقة والمواد الانشائية في بكلفة	- تمت المصادقة على المشروع وتحديد اختصاصات	دعوة وزارة التكوين المهني والتشغيل للاسراع باستكمال الدراسات

7.610 م . د	التكوين وتكفل المجلس الجهوي بوضع قطعة ارض على ذمة المشروع - بطى في اعداد الدراسات	والانطلاق في انجاز المشروع
انجاز معهد ثانوي بالمزطورية	ملف في طور الانتزاع للمصلحة العامة لدى وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية	دعوة وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية الى اصدار امر الانتزاع
تهيئة المنطقة السياحية ببياش	تم اعداد مثال التهيئة التفصيلي	دعوة الوكالة العقارية السياحية الى الإسراع بالانجاز
إحداث مركز مراقبة صحية بمعبر الذهبية بكلفة 600أ.د.	في انتظار إجراءات تخصيص قطعة الأرض بين الإدارة العامة للبنىات المدنية بوزارة التجهيزوديوان المعابر الحدودية البرية	الإسراع بإجراءات تخصيص قطعة الأرض وإبرام إتفاقية بين وزارة الصحة و الإدارة العامة للهندسة المدنية بوزارة التجهيز
إحداث متحف التراث الثقافي والطبيعي بتطاوين الجنوبية بكلفة 1700 أ.د.	تم تخصيص قطعة الأرض في انتظار رصد الاعتمادات والانطلاق في الانجاز	دعوة وزارة الثقافة الى استحداث انجاز المشروع
اعادة بناء مكتبة عمومية بالرقة بتطاوين الجنوبية بكلفة 400 أ.د.	تمت الموافقة على بناء طابق علوي على نفس البناية بناء على رأي مختلف المتدخلين - الملف لدى المصالح المركزية	التدخل لدى المصالح المركزية لوزارة الثقافة
بناء محطتي تطهير بكل من مدينتي رمادة و ذهبية وتطهير المدينتين بكلفة 9900 أ.د.	تم امضاء اتفاقية التمويل مع البنك الافريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاعمار والتنمية منذ جانفي 2019 ولم يتم الشروع في الانجاز	التدخل لدى الديوان الوطني للتطهير قصد إستكمال الدراسات والشروع في الانجاز

## أهم المشاريع الهيكلية المدرجة في المخطط 2016-2020 والتي لم تنطلق في الإنجاز

المشروع	الوضعية الحالية والصعوبات المتعلقة بتنفيذ المشروع	الإجراءات المقترحة
إحداث مدرسة إعدادية بحي عباس	غير مرسمة بالميزانية	
تأهيل المستشفى الجهوي عبر انجاز المخطط المديرية	غير مرسمة بالميزانية	
إحداث قطب جامعي اقليمي في طب النساء والأطفال	غير مرسمة بالميزانية	
بناء معهد جهوي للموسيقى وبناء مكتبة عمومية بقصر عون وحي البرّ	غير مرسمة بالميزانية	
إحداث 3 مراكز إقامة ومطعم بكل دار الشباب البئر الأحمر والصماروغمراسن	غير مرسمة بالميزانية	
إحداث 3 قاعات رياضات فردية بالبئر الأحمر وغمراسن والصمار	غير مرسمة بالميزانية	
إحداث 2 قرى حرفية بكل من الصمار والبئر الأحمر ومركز تنمية الكفاءات بتطاوين	غير مرسمة بالميزانية	

## القرارات الحكومية المعلن عنها لفائدة ولاية تطاوين بتاريخ 28 فيفري 2015

القرار	المتابعة	الإجراءات المقترحة
قرار عدد 6: إحداث وحدة الإسمنت بتطاوين	انتهاء الترخيص المسند من وزارة الصناعة	الإسراع في التمديد في الترخيص من طرف وزارة الصناعة
قرار عدد 24: تكليف وزارة الفلاحة بالنظر في سبل حماية مدينة تطاوين من سيلان المياه المتأتية من جبل "الصد" وجبل "تمزوت".	لم يتم التفعيل لعدم وضوح الجهة المكلفة	

## قرارات المجلس الوزاري بتاريخ 27 أفريل 2017 بولاية تطاوين والتي لم تنفذ

الملاحظات	القرار
في طور اقتناء مقسم بالمنطقة الصناعية الخبطة	- الانطلاق في بناء ورشة جهوية لصيانة الحافلات سنة 2018 بكلفة 750 أ.د.
تم تحديد الأرض واعداد دراسة تهيئة المقاسم والمصادقة عليها منذ سنة 2016 في انتظار رصد الاعتمادات والاذن بانطلاق الاشغال من طرف المصالح المركزية لوزارة التجهيز والاسكان	- الانطلاق في انجاز 142 مسكنا اجتماعيا يتوزعون كما يلي :45 مسكنا برمادة المطار و72 مسكنا برمادة عين أم الطبول و25 مسكنا بالذهبية- حي النصر-، موفى سنة 2018.
لم ينجز: دعوة وزارة الصحة للاسراع بانجاز المشروع	- إنطلاق أشغال تأهيل وتوسعة وتجهيز المستشفى الجهوي بتطاوين (عيادات خارجية، الاستعجالي، مبيت للأطباء، قطب جامعي إقليمي في طب النساء والأطفال، إحداث صيدلية) سنة 2018، بكلفة 13 م . د
لم ينجز: دعوة وزارة الصحة للاسراع بانجاز المشروع	- إحداث وحدة طب استعجالي بالمركز الوسيط ببني مهيبة نهاية 2017 بكلفة 150 أ.د.
تم اقتناء قطعة الأرض من طرف بلدية تطاوين ووضعها على ذمة المشروع والانطلاق في الدراسات و لم ينجز لعدم توفر التمويلات	- إحداث مسلخ بلدي بكلفة 4 م.د سنة 2018.
في انتظار القيام بالانتدابات اللازمة لسد الشغورات بالمكاتب المغلقة بكل من مكتب بريد رأس الوادي ومكتب بريد الحرية	- إعادة فتح مكاتب البريد المغلقة بكل من رأس الواد - بئر عمير - نكريف- الحرية - قطوفة- واد الغار
بصدد إعداد المناظرة لاختيار المصممين	- إعادة بناء دار الثقافة برمادة بكلفة 2 م.د سنة 2018 .
في انتظار انتهاء من الأشغال على مستوى محطة الغاز	- تزويد وإتمام ربط مدينة تطاوين بالغاز الطبيعي خلال 2018
تم إمضاء عقد هبة لقطعة الأرض المخصصة للمشروع بينمجلس تصرف زرقان بني مهيبة والشركة التونسية للكهرباء و الغاز . لم ينجز	- الانطلاق في أشغال مشروع محطات إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية photovoltaïque بيمعمدية بني مهيبة (بقدره 50 ميغاواط) على مساحة تقدر ب 100 هكتار و بكلفة إنجاز تبلغ 125 م.د و بطاقة تشغيلية تساوي 400 موطن شغل.

إطلاق الأشغال لمشاريع التنمية المندمجة بكل من: بئر الأحمر - ذهبية- صمار بكلفة جمالية تقدر بـ 30 مليون دينار




تم عرضها على لجنة القيادة بوزارة التنمية بتاريخ 27 فيفري 2018 وتمت المصادقة وفي انتظار رصد 10 م د إضافية لمعتمدية بني مهييرة

## إتفاق 15 جوان 2017 بولاية تطاوين القرارات التي لم تنفذ

القرار	الملاحظات
إنتداب 1500 عون بشركات الإنتاج والخدمات البترولية العاملة بالصحراء قبل موفى سنة 2017	إنتداب 40 عون بشركة ENI: لم ينجز. إنتداب 87 عون بالشركة التونسية للكهرباء والغاز: لم ينجز. إنتداب 70 عون بشركة SODEPS forage: تم الإعلان عن انتداب 30 عون عن طريق الشركة التونسية للتنقيب وبصدد الإعلان عن النتائج الأولية. *- إنتداب 300 عون بشركة الخدمات التي ستتولى إنجاز أنبوب الغاز: تم تعيين الشركة المكلفة بإنجاز المشروع.
إنتداب 3000 عون بشركة البيئة والغراسة والبستنة	1500 عون بعنوان 2017: تم الإعلان عن نتائج المناظرة وتمت المباشرة يوم 2 جانفي 2018. 1000 عون بعنوان 2018: تم الإعلان عن نتائج المناظرة وإبرام عقود العمل <b>500 عون بعنوان سنة 2019: لم ينجز</b>
تخصيص 80 م.د لصندوق التنمية و الإستثمار	تم إبرام اتفاقيات مع البنوك العمومية (البنك الوطني الفلاحي، بنك الإسكان، الشركة التونسية للبنك) وكذلك مع صندوق الودائع يوم 28 أوت 2018 بمقر وزارة الصحة تم الترفيع في رأس مال شركة التنمية والاستثمار بتطاوين بمبلغ 3.3 مليون دينار

## القرارات الحكومية المعلن عنها من طرف السيد رئيس الحكومة

## لفائدة ولاية تطاوين بتاريخ 27 أفريل 2017

قرارات تم تنفيذها (34 قرارا) قرارات بصدد التنفيذ (17 قرارا) قرارات لم تنفذ (13 قرارا) 

الملاحظات	القرارات	المجال
تم الإنجاز.	1- الإعلان عن تمويل 453 مشروعا (223 عن طريق البنك التونسي للتضامن ومؤسسات التمويل الصغير و بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة و40 مشروع فلاحى و190 مشروعا عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل).	التشغيل والتمويل الصغير
تم الإنجاز	2- الإعلان عن 350 انتداب في إطار عقد الكرامة (حصة تطاوين 1042).	
تم الإنجاز	3- افتتاح فضاء مبادرة يوم 15 ماي 2017.	
تم تكوين لجنة تتركب من ممثلين عن المصالح التالية: -المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، -المكتب الجهوي للصندوق الوطني للتقاعد و الحياطة الإجتماعية، -التفقدية الجهوية للشغل، -الإدارة الجهوية للتكوين المهني و التشغيل، - 2ممثلين عن الولاية.	4- تكوين لجنة بإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل تتولى إسناد البطاقة المتعلقة بالتشغيل في الصحراء.	
تم إنتداب 2500 عون بعنوان سنتي 2017 و2018	5- الانتداب الفوري لـ 3000 عون بشركة البيئة و	



المجال	القرارات	الملاحظات
	الغراسة و البستنة.	و في انتظار الترخيص لإنتداب 500 عون
	6- الترفيع الفوري في ميزانية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات إلى 5م.د.	تم الإنجاز
	7- تمويل 670 مشروعا صغيرا في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.	تم تمويل 703 مشروع صغير بحجم إستثمار قدره 2,907 مليون دينار
	8- تمويل 150 مشروعا في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة قبل موفى 2017.	تم تمويل 102 مشروع بكلفة 440أد
	9- توسيع مجال تدخل البنك التونسي للتضامن ليشمل تمويل المشاريع الفلاحية بما في ذلك المطالب المقدمة ابتداء من 02 جانفي 2017.	تم الانجاز و تمويل 103 مشروع بكلفة 825 أ.د.
	10- إحداث مركب للتشغيل والعمل المستقل سنة 2018 بكلفة 720 أ.د.	تم الإنجاز
	11-التسريع في مناظرة لانتداب 70 إطار سامي ( إطارات و مهندسين و تقنيين ساميين) في حقل البرمة (SITEP)و ذلك في غضون جويلية 2017 وإعطاء الأولوية القصى في الانتداب لأصلي الجهة و إنتداب 10 إطارات بشركة SODEPS و 20 إطار و عون بشركة الجنوب للخدمات	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ تم الإعلان عن النتائج النهائية لإنتداب 70عونا و تمت المباشرة.</li> <li>■ تم الإعلان عن النتائج النهائية لإنتداب 10 إطارات بالنسبة لشركة SODEPS و تمت المباشرة.</li> <li>■ تم الإعلان عن النتائج النهائية لانتداب 20 إطار و عون بشركة الجنوب للخدمات و تمت المباشرة.</li> </ul>
الفلاحة	12-انطلاق أشغال إعادة تهيئة المناطق السقوية بمعتديات رمادة والبئر الأحمر وغمراسن والذهبية سنة 2018 بكلفة 10 م . د.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ كمبوت 1: في انتظار فتح الإعتمادات.</li> <li>■ المزار-الفرش-بئر عمير (دراسة): بصد المصادقة على (APD définitif)</li> <li>■ أولاد يحي 02: بلغت نسبة تقد م الأشغال 80%</li> <li>■ البساتين: في انتظار فتح الإعتمادات</li> <li>■ أوني (أشغال): بلغت نسبة تقد م الأشغال 95</li> </ul>
	13-انطلاق أشغال حياية مدينة تطاوين من خطر الفيضانات بكلفة 5.4 م. د بداية من جوان 2018.	<p>❖ قسط 2018 :</p> <p>✓ الأشغال بالمقاولات: بلغت نسبة تقدم</p>

الملاحظات	القرارات	المجال
<p>الإنجاز 83%</p> <p>✓ الاشغال بالتفاوض المباشر مع شركة البيئية (بمبلغ 498 ألف دينار): بلغت نسبة تقدم الإنجاز 77%</p> <p>❖ <u>قسط 2019:</u></p> <p>✓ الأشغال بالمقاولات: بلغت نسبة تقدم الإنجاز 45%</p> <p>✓ الاشغال بالتفاوض المباشر مع شركة البيئية (بمبلغ 500 ألف دينار): بلغت نسبة تقدم الإنجاز 50% (ينجز ضمن البرنامج الوطني لاستيعاب أكثر عدد ممكن من العملة بالجهات)</p> <p>❖ <u>قسط 2020:</u></p> <p>✓ الأشغال بالمقاولات: بصدد إعداد طلبات العروض</p> <p>✓ الاشغال بالتفاوض المباشر مع شركة البيئية (بمبلغ 300 ألف دينار): بصدد إعداد طلبات العروض (ينجز ضمن البرنامج الوطني لاستيعاب أكثر عدد ممكن من العملة بالجهات)</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ قرار اللافي (أشغال): بلغت نسبة تقدم الأشغال 99 %</li> <li>■ المزيرع: دفع البئر ضعيف بعد الإنجاز و بالتالي ارجاء احداث المنطقة السقوية الى حين التعميق في دراسة الموارد المائية</li> <li>■ هيب: في طور تسجيل الصفقة</li> <li>■ الوديات: في انتظار فتح الإعتمادات</li> <li>■ كحيل (دراسة): بصدد انجاز الدراسة (APS définitif)</li> <li>■ كمبوت 3 (أشغال): نسبة الأشغال 25 %</li> </ul>	<p>14-إحداث مناطق سقويه جديدة بمعمديات غمراسن ورمادة والبئر الأحمر بكلفة 5 م. د سنة 2018.</p>	

المجال	القرارات	الملاحظات
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ نكريف 5 (دراسة): بصدد انجاز الدراسة) (APS définitif)</li> </ul>
	15-انطلاق أشغال تعزيز وتجديد قنوات الجلب بالجنوب الشرقي في موفى 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ اقتناء القنوات : تم الإقتناء</li> <li>■ الأشغال : بصدد الانجاز</li> </ul>
	16-انطلاق تدعيم التزويد بالماء الصالح للشرب بمنطقة تالنت من معتمدية تطاوين الشمالية والمناطق العليا من مدينة غمراسن ومنطقة قصر الحدادة من معتمدية غمراسن سبتمبر 2017 ، بكلفة 0.72 م.د.	تم الإنجاز و في طور الإستغلال.
	17- إحداث قطب واحات ببرج بورقيبة بكلفة جمالية تساوي 100 مليون دينار على مساحة 1000 هكتار .	<p>بصدد الدراسة من قبل المركز الوطني للدراسات الفلاحية في مرحلتها الثالثة مع تعهده بإتمام الدراسة في ظرف ثلاثة أشهر والتأكيد على إحداث 580 هك بمنطقة برج بورقيبة كنقطة انطلاق وبداية الرفع الطبوغرافي ودراسة 420 هك بوادي زار ولرزط طبقا للجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 2018/03/15 والتي تم فيها عرض تقدم الدراسة من طرف مكتب الدراسات وإحداث وحدة تصرف و إنجاز لتسيير المشروع على غرار ما تم بمشروع رجم معتوق</p>
النقل	18-فتح مطار رمادة العسكري للطائرات المدنية و ذلك قبل 25 ماي 2018 بكلفة 13 م.د.	<p>تم احداث لجنة فنية بوزارة النقل وتم اعداد الدراسة الفنية خلال ديسمبر 2017 تضمنت تقييم البنية التحتية الحالية للمطار والمتطلبات الدنيا لقابلية استغلاله للحركة الجوية بالإضافة الى دراسة تتعلق ببناء محطة جوية جديدة.</p>
	19-اقتناء 06 حافلات لتدعيم النقل بولاية تطاوين بكلفة 3.8 م د.	تم الانجاز.
	20-الانطلاق في بناء ورشة جموية لصيانة الحافلات سنة 2018 بكلفة 750 أ.د.	في طور اقتناء مقسم بالمنطقة الصناعية الخبطة
التجهيز	21-انطلاق الأشغال المتعلقة بوصلة الربط بين تطاوين و الطريق السيارة 11 بولايتي مدين و تطاوين وذلك بداية سنة 2018 بكلفة جمالية تساوي 180 مليون دينار.	بلغت نسبة تقدم الأشغال 10 %

المجال	القرارات	الملاحظات
	22-انطلاق أشغال تهذيب الطريق الجهوية رقم 111 بين الصمار وحدود ولاية مدين بطول 23 كلم، أوت 2017، بكلفة 15.5 م. د.	بلغت نسبة تقدم الأشغال 88 %
	23-انطلاق أشغال بناء جسر على وادي تلاليت بالطريق الوطنية رقم 19 جويلية 2017 بكلفة 3.5 م. د	هذا المشروع أدمج في الأشغال المتعلقة بوصلة الربط بين تطاوين و الطريق السيارة 11 بولايتي مدين و تطاوين.
	24-انطلاق أشغال تدعيم الطريق الجهوية رقم 115 الرابطة بين منطقة واد الغار وحدود ولاية مدين بطول 26 كلم ،سبتمبر 2017 ،بكلفة 5.5 م . د.	انتهت الأشغال.
	25-انطلاق أشغال تعصير وتدعيم الطرقات داخل المناطق البلدية بكل من بلدية تطاوين، بلدية غمراسن، بلدية الصمار ،جوان 2017 ، بكلفة 9 م . د.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ بلدية تطاوين:بلغت نسبة تقدم الأشغال 80 %.</li> <li>■ بلدية غمراسن: بلغت نسبة تقدم الأشغال 92 %.</li> <li>■ بلدية الصمار: بلغت نسبة تقدم الأشغال 99%.</li> </ul>
	26-الانطلاق في إنجاز 142 مسكنا اجتماعيا بتوترعون كما يلي 45 :مسكنا برمادة المطار و72 مسكنا برمادة عين أم الطبول و25 مسكنا بالذهبية- حي النصر، موفي سنة 2018.	تم تحديد الأرض و اعداد دراسة تهيئة المقاسم والمصادقة عليه منذ سنة 2016 في انتظار رصد الاعتمادات والاذن بانطلاق الاشغال من طرف المصالح المركزية لوزارة التجهيز والاسكان
	27-الانطلاق في تهذيب حي وسط المدينة ببلدية رمادة (طرقات-تنوير عمومي-ماء صالح للشرب). بكلفة 1 م . د بداية من جوان 2018	انتهت الأشغال
	28-تعبيد طريق جبل ماطوس لتسهيل عبور المعدات والعمال والعربات والامدادات عبر مدينة تطاوين وذلك بانطلاق الأشغال في مرحلة أولى بـ 10 كلم 30 نوفمبر 2017 وفي مرحلة ثانية بإتمام 80 كلم في نوفمبر 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ بلغت نسبة تقدم الأشغال 60 % بالنسبة للجزء الأول(في طول 20كلم).</li> <li>■ بالنسبة للأجزاء المتبقية ( 60 كلم) هناك إمكانية لإنجازها في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص.</li> </ul>
الصحة	29-إنطلاق أشغال تأهيل وتوسعة وتجهيز المستشفى الجهوي بتطاوين (عيادات خارجية، الاستعجالي، مبيت للأطباء، قطب جامعي إقليمي في طب النساء والأطفال، إحداث صيدلية) سنة 2018، بكلفة 13 م . د.	بلغت نسبة تقدم أشغال العيادات الخارجية 42 %
	30-إضافة آلة مفراس للمستشفى الجهوي بتطاوين بداية جانفي 2018 بكلفة 1.2 م. د	تم الإنجاز

المجال	القرارات	الملاحظات
	31-إطلاق استغلال مركز الصحة الأساسية بأولاد دباب من صف 3 إلى صف 4 المدرج في إطار برنامج دعم المناطق ذات الأولوية موفى 2017	حاليا المركز مستغل جزئيا و في إنتظار إستكمال التجهيزات و الإنتدابات
	32-انطلاق استغلال المركز الوسيط ببني مهيمة في إطار برنامج دعم المناطق ذات الأولوية موفى 2017.	تم تدشين المركز بتاريخ 01أوت2017
	33-إحداث وحدة طب استعجالي بالمركز الوسيط ببني مهيمة نهاية 2017 بكلفة 150أ.د.	في انتظار توفر الإعتمادات و موافاة الإدارة الجهوية للتجهيز بالبرنامج الوظيفي للمشروع من قبل المصالح المركزية لوزارة الصحة.
التكوين المهني	34-انطلاق أشغال إحداث مركز تكوين في الطاقة والمواد الانشائية في سبتمبر 2018، بكلفة 7.610 م . د	بطيء في إعداد الدراسات.
الصناعي والتجاري	35-إحداث المنطقة الصناعية بيونمشة بولاية تطاوين تمتد على 50 هكتار بكلفة 15م.د وانطلاق الأشغال في ماي 2018.	*- الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه : تم إقتناء القنوات من الحديد المصبوب و في طور الإعلان عن طلب العروض الخاص بأشغال تركيز القنوات *- الشركة التونسية للكهرباء و الغاز : انطلقت الأشغال . *- التهيئة ( البنية التحتية ) : لم تنطلق
	36-إحداث مسلخ بلدي بكلفة 4 م . د سنة 2018.	تم اقتناء قطعة الأرض من طرف بلدية تطاوين ووضعها على ذمة المشروع والانطلاق في الدراسات و لم ينجز لعدم توفر التمويلات
البيئي	37-انتهاء أشغال توسيع وإعادة تهيئة محطة التطهير لمدينتي تطاوين و غمراسن قبل موفى 2017 بكلفة 800 أ.د.	انتهت الأشغال
	38 -انتهاء أشغال تطهير 3 أحياء شعبية بتطاوين أفريل 2018 بكلفة 1.2 م.د.	انتهت الأشغال
	39-انطلاق توسيع شبكة التطهير بمدينة تطاوين قبل نهاية 2017 بكلفة 1.3 م . د.	تم تعيين المقاولات المكلفة بإنجاز الأشغال و في طور الإعداد للإنطلاق في الإنجاز
الشؤون الاجتماعية وتقريب الخدمات الإدارية للمواطن	40-إحداث مركز للدفاع الاجتماعي بتطاوين بداية من 2018.	تم الانجاز
	41-إحداث دار لخدمات الضمان الاجتماعي بمعمديتي الذهبية ورمادة بداية 2018.	تم الانجاز
	42-إحداث محكمة ناحية في غمراسن.	تم الإنجاز

الملاحظات	القرارات	المجال
	43-إحداث محكمة عقارية في تطاوين.	
تم الانجاز		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ تطاوين النور:تم الإنطلاق في الإستغلال</li> <li>■ تطاوين القصور: تم الإنطلاق في الإستغلال.</li> <li>■</li> </ul>	44-الإعلان عن إحداث 2 مكاتب بريد إضافية بكل من تطاوين القصور و تطاوين النور	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ في انتظار القيام بالانتدابات اللازمة لسد الشغورات بمكاتب رأس الوادي والحرية</li> <li>■ مكتب بئر عمير ونكريف وواد الغار : تم فتح المكاتب بصفة مسترسلة</li> <li>■ مكتب قطوفة : يتم فتحه كل ثلاثاء مع تغطيته بالبريد المتجول كل يوم اربعاء</li> </ul>	45-إعادة فتح مكاتب البريد المغلقة بكل من رأس الواد - بئر عمير - نكريف- الحرية - قطوفة- واد الغار	
تم اقتناء الارض وفي طور الإعلان عن استشارة لتعيين مصممين	46-بناء مقر جديد لمكتب بريد المهرجان بتطاوين خلال سنة 2018 بكلفة 600 ألف دينار.	
بصدد إعداد المناظرة لاختيار المصممين	47-إعادة بناء دار الثقافة برمادة بكلفة 2 م . د سنة 2018.	الثقافي
تم تخصيص العقار وفي انتظار القيام بالدراسات	48-إحداث متحف للتراث الثقافي والطبيعي بتطاوين بكلفة 1 م . د سنة 2018.	
بلغت نسبة تقدم الأشغال 52 % .	49-الشروع في الدراسات المتعلقة بتهيئة المسبح البلدي بتطاوين بتقديرات 3 م.د على أن يتم الإنطلاق في الإنجاز موفى 2018.	الشباب والرياضة
تم الإنجاز .	50-تهيئة مدارج المركب الرياضي نجيب الخطاب.	
تم تدشين المقر	51-تعزير تواجد الشركات البترولية بالجهة من خلال إحداث دار للمؤسسات البترولية وانطلاق نشاطها في جويلية 2017 وفتح في مرحلة أولى تمثليات للشركات البترولية في تطاوين بنفس مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية موفى جويلية 2017.	الطاقة والخدمات البترولية

الملاحظات	القرارات	المجال
تم الإعلان عن برنامج تكوين 309 شاب في الطاقة 143 شاب في الجبس و150 شاب في الفلاحة و210 شاب في اختصاصات اخرى ليصبح العدد الجملي للمتكوينين 812 غير أنه لم يلتحق بالتكوين سوى 374 شابة و شابة	52-الانطلاق في تكوين 100 منتفعا في المهن البترولية بالمعهد العالي للتكنولوجيا ISET بتطاوين بداية من سبتمبر 2017.	
تم الانطلاق في تفعيل هذا القرار	53-تفعيل الاتفاق المتعلق بإعطاء الأولوية لشركة الخدمات المنتصبة بتطاوين عند منح العقود من قبل الشركات البترولية، في إطار الشفافية، مع تعهد المجلس الجهوي بمراقبة تطبيق هذا الالتزام.	
إطلاق أشغال التهيئة على مستوى محطة الغاز	54-التأكيد على الانطلاق في أشغال مشروع غاز الجنوب - تطاوين قبل موفى 2017 والشروع في أشغال تركيز الأنبوب والهندسة المدنية و بناء مركزي المعالجة و التعبئة في نوفمبر 2017.	
في انتظار الانتهاء من الأشغال على مستوى محطة الغاز	55-تزويد وإتمام ربط مدينة تطاوين بالغاز الطبيعي خلال 2018	
تم إمضاء عقد بيع قطعة الأرض المخصصة للمشروع بين مجلس تصرف زرقان بني مهيمة و الشركة التونسية للكهرباء و الغاز .	56-الانطلاق في أشغال مشروع محطات إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية photovoltaïque في الصحراء بمنطقة بني مهيمة (بقدره 50 ميغاواط) على مساحة تقدر بـ 100 هكتار و بكلفة إنجاز تبلغ 125 م.د و بطاقة تشغيلية تساوي 400 موطن شغل.	
تم إلغاء 4 إمتيازات في قطاع الجبس بمقتضى القرارات الصادرة عن السيد وزير الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة بتاريخ 15 نوفمبر 2017	57-السحب الفوري لـ 3 إمتيازات استغلال في قطاع الجبس لم تحقق أي تقدم في نسبة الإنجاز و منح هذه الامتيازات من جديد بتقسيم أصغر للأراضي لتعزيز عدد المستثمرين في القطاع و تتعهد الإدارة بإسناد رخص البحث الجديدة في ظرف شهرين من تقديم الملف.	
تم الإنجاز	58-إعطاء الأولوية لانتداب أبناء الجهة في الشركات البترولية وذلك حسب الكفاءات المطلوبة على أن لا تقل نسبة المنتدبين من أبناء الجهة عن 70%.	

الملاحظات	القرارات	المجال
تم الإنجاز.	59-مراجعة وتعديل المنشور الصادر عن السيدة وزيرة الطاقة والمناجم والطاقت المتجددة بتاريخ 15 أفريل 2017 وإعادة إصداره في صيغته المعدلة قبل 01 ماي 2017.	
في طور الإنجاز .	60-تغطية مناطق بيضاء لـ 9 عمادات بالإنترنت	تكنولوجيا الاتصالات
تم الإنجاز.	61-إحداث معتمدية بني محيرة.	الحكومي
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ تم إمضاء عقود البرامج و بصدد الإنجاز حسب الرزنامة التنفيذية</li> <li>■ المصادقة من لجنة القيادة بوزارة التنمية على مشروع التنمية المندمجة لمعتمدية بني محيرة بكلفة 10 مليون دينارو في انتظار مصادقة الجهة الممولة.</li> </ul>	62-إنطلاق الأشغال خلال النصف الأول من سنة 2018 لمشروع التنمية المندمجة بكل من: بئر الأحمر - ذهبية- صمار بكلفة جمالية تقدر بـ 30 مليون دينار	
تم الانجاز	63-تكليف السيد وزير التكوين المهني والتشغيل بمهمة الإشراف على متابعة تنفيذ هذه القرارات في آجالها.	
تم الانجاز	64-تكوين لجنة مشتركة يعهد لها إعداد تقرير كل 03 أشهر لمتابعة مدى احترام كل طرف لتعهداته.	

**متابعة تطبيق بنود اتفاق 15 جوان 2017 (اتفاق الكامور)**

القرارات	الملاحظات
----------	-----------



<p>*- إنداب 70 إطارا بشركة SITEP: تم الإعلان عن النتائج النهائية وتمت المباشرة</p> <p>*- إنداب 20 عون و إطار بدار الخدمات البترولية:تم الإعلان عن النتائج النهائية وتمت المباشرة كما تم انتداب 15 عون اضافي</p> <p>*- إنداب 10 إطارات بشركة SODEPS production: تم الإعلان عن النتائج النهائية وتمت المباشرة كما الإعلان عن مناظرة لانتداب 10 أعوان إضافيين وفي مرحلة دراسة الملفات</p> <p>*- إنداب 30 عون و إطار بشركة الملاحات: تم الإعلان عن النتائج النهائية وتمت المباشرة</p> <p>*- إنداب 81 عون بشركة OMV(68 مترص بالأكاديمية+13عامل شركة وبستار):تم إنداب 81 عون</p> <p>*- إنداب 30 عون بشركة OMV: تم الاعلان عن النتائج النهائية بانتداب 21 عونا وتمت المباشرة و 09 اعوان: في مرحلة اجراء الاختبارات الشفاهية</p> <p>*- إنداب 340 عون بشركات الخدمات البترولية العاملة بالصحراء:تم إنداب 1530 عون من جملة 1899 عرض شغل.</p> <p>*- إنداب 70 عون بشركة SODEPS forage: تم الإعلان عن انتداب 30 عون عن طريق الشركة التونسية للتنقيب وبصدد الإعلان عن النتائج الأولية.</p> <p>*- إنداب 40 عون بشركة ENI:لم ينجز.</p> <p>*- إنداب 87 عون بالشركة التونسية للكهرباء و الغاز:لم ينجز.</p> <p>*- إنداب 300 عون بشركة الخدمات التي ستتولى إنجاز أنبوب الغاز:تم تعيين الشركة المكلفة بإنجاز المشروع.</p>	<p>1- إنداب 1500 عون بشركات الإنتاج والخدمات البترولية العاملة بالصحراء قبل موفى سنة 2017 .</p>
<p>*- 1500 عون بعنوان 2017: تم الإعلان عن نتائج المناظرة وتمت المباشرة يوم 2 جانفي 2018.</p> <p>*- 1000 عون بعنوان 2018: تم الإعلان عن نتائج المناظرة وإبرام عقود العمل</p> <p>*- 500 عون بعنوان سنة 2019: لم ينجز</p>	<p>2- إنداب 3000 عون بشركة البيئة والغراسة والبستنة</p>
<p>*- تم إبرام اتفاقيات مع البنوك العمومية (البنك الوطني الفلاحي، بنك الإسكان، الشركة التونسية للبنك) وكذلك مع صندوق الودائع يوم 28 أوت 2018 بمقر وزارة الصحة</p> <p>*- تم الترفيع في رأس مال شركة التنمية والاستثمار بتطاوين بمبلغ 3.3 مليون دينار</p>	<p>3- تخصيص 80 م.د لصندوق التنمية والاستثمار</p>

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

الإدارة الجهوية للتنمية بتطاوين



## متابعة تنفيذ توصيات لجنة التنمية الجهوية

المنبثقة عن زيارة ولاية تطاوين بتاريخ 19 جاني 2018

جوان 2020

قرارات تمّ تنفيذها (24 قرارا)

قرارات بصدد التنفيذ (35 قرارا)

قرارات لم تنفّذ (36 قرارا)

الملاحظات	التوصيات	المجال
تمّ التوقف عن الدراسة لعدم توفر الاعتمادات	التسريع في توفير الاعتمادات لاستكمال توسعة مقر المحكمة الابتدائية بتطاوين	وزارة العدل
في طور الانجاز نسبة تقدّم الاشغال: 51 %	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة بتوسعة وتهيئة مقر محكمة الناحية	
تمّ الانجاز	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة باحداث محكمة الناحية بغمراسن	
تم التوقف عن الدراسة لعدم توفر الاعتماد	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة بصيانة التكييف المركزي ومعدات الوقاية من الحرائق بالمحكمة الابتدائية	
تمّ تعيين كاتب عام للولاية يوم 14 فيفري 2018	الإسراع بتعيين كاتب عام للولاية	وزارة الداخلية
تمّ تعيين معتمد وتمت نقلته والمنصب حاليا في حالة شغور	الإسراع بتعيين معتمد لمعمدية بني محيرة	
تمّ تغيير البرنامج الوظيفي واستبداله بمنطقة الحرس الوطني لعدم توفر الاعتمادات اللازمة وهو في طور اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة ببناء مقر ادارة اقليم الحرس الوطني	
تمّ الانجاز	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة باقتناء وتركيز مولد كهربائي بمنطقة الامن الوطني	
في طور الانجاز نسبة تقدّم الاشغال: 85 %	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة ببناء القسط الثاني من منطقة الحرس الوطني برمادة	
تمّ الانجاز	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة باعادة بناء مركز الحدود البرية بمغني	
قسط عدد1 بناء سياج وخفارات: تمّ الانجاز	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة ببناء مقر فوج التدخل بتطاوين	
لم ينجز	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة بتهيئة منتزه غرغار	
في طور الانجاز نسبة تقدّم الاشغال: 75 %	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة بتوسعة المجلس الجهوي	
- تم اقتناء قطعة الأرض من طرف بلدية تطاوين ووضعها على ذمة المشروع والانطلاق في الدراسات - لم ينجز لعدم توفر التمويلات	التسريع في اجراءات اقتناء قطعة الارض لاحداث مسلخ بلدي بتطاوين	
تم احداث لجنة فنية بوزارة النقل وتم اعداد الدراسة الفنية خلال ديسمبر 2017 تضمنت تقييم البنية التحتية الحالية للمطار والمتطلبات الدنيا لقبالية استغلاله للحركة الجوية بالإضافة الى دراسة تتعلق ببناء محطة جوية جديدة.	التسريع في اعداد دراسة اولية لاحداث محطة جوية بالمطار العسكري برمادة لفتحه للطائرات المدنية	النقل

الملاحظات	التوصيات	المجال
- التعجيل بتخصيص الاعتمادات من طرف ديوان الموائج الجوية لانجاز محطة المسافرين		
تم تخصيص مقسم بالمنطقة الصناعية الحطة و بصدد إتمام إجراءات التفويت مع الوكالة العقارية الصناعية	التسريع في اتمام اجراءات التفويت لانطلاق اشغال بناء ورشة جھوية لصيانة الحافلات	
لم ينجز	برمجة احداث شركة جھوية للنقل بتطاوين وفك الارتباط عن مدين	
لم ينجز	تمتع المكفوفين بالجهة من الانتفاع بحقهم في ادخال وسيلة نقل خاصة بهم والمنصوص عليه بالقانون	
لم ينجز	مراجعة القوانين المنظمة لهيكل التمويل والمساندة خاصة في علاقة بالبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف التسريع في الاجراءات والتقليص من الوثائق الادارية واختصار الاجال، إضافة الى ضرورة اعطاء صلاحيات الموافقة على مطالب التمويل للجهة وليس للفروع المركزية لهذين البنكين بالعاصمة للمساهمة في تشجيع الشباب على الانتصاب للحساب الخاص	وزارة المالية
تم رصد الاعتمادات وفي طور القيام بالدراسات	التسريع في رصد الاعتمادات المخصصة للقسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة الذي يشمل معتمديات الصمار والبئر الاحمر وذهبية	وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
لم ينجز	ادراج معتمدية الصمار ضمن البرنامج الاستثنائي لتنمية المناطق الحدودية الخاص بمعتمدية ذهبية	
في طور المصادقة على دراسة المؤثرات على البيئة واعداد الملف الوقي لطلب العروض	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة ببناء مسلخ عصري برمادة (مشروع في اطار التعاون الدولي)	
لم ينجز	الاسراع ببعث ادارة للملكية العقارية بالجهة	وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية
- تم تحديد قطعتي أرض خاصة بالمصب ومركز تحويل بلدية تطاوين وحالته الى وكالة التصرف في النفايات في إنتظار إتمام الدراسات - التدخل لدى مصالح وزارة البيئة للإسراع بانجاز المصب المراقب في مرحلة اولى	التسريع في استكمال دراسات برمجة انجاز مصب مراقب و5 مراكز تحويل في اطار برنامج "مصبات مراقبة"	وزارة الشؤون المحلية والبيئة
تم الانتهاء من الدراسات وانجاز المشروع	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة بمشروع تطهير 3 احياء شعبية بتطاوين	
تم تعيين المقاولات المكلفة بإنجاز الأشغال وفي طور الإعداد للإنطلاق في الإنجاز	التسريع في استكمال اجراءات طلب العروض المتعلقة بتوسيع شبكة التطهير بمدينة تطاوين	
* كمبوت 1: في انتظار فتح الإعتمادات. * المزار-الفرش-بئر عمير (دراسة): بصدد المصادقة على (APD définitif)	التسريع في انطلاق اشغال مشروع اعادة تهيئة المناطق السقوية بمعتمديات رمادة والبئر الاحمر وغمراسن وذهبية	وزارة الفلاحة

الملاحظات	التوصيات	المجال
<p>* أولاد يحيى 02: بلغت نسبة تقدم الأشغال 80%</p> <p>* البساتين: في انتظار فتح الإعتمادات</p> <p>* أوفي (أشغال): بلغت نسبة تقدم الأشغال 95%</p>		
<p><b>قسط 2018 :</b></p> <p>الأشغال بالمقاولات: بلغت نسبة تقدم الإنجاز 83%</p> <p>الأشغال بالتفاوض المباشر مع شركة البيئة (بمبلغ 498 ألف دينار): بلغت نسبة تقدم الإنجاز 77%</p> <p><b>قسط 2019:</b></p> <p>الأشغال بالمقاولات: بلغت نسبة تقدم الإنجاز 45%</p> <p>الأشغال بالتفاوض المباشر مع شركة البيئة (بمبلغ 500 ألف دينار): بلغت نسبة تقدم الإنجاز 50% (ينجز ضمن البرنامج الوطني لاستيعاب أكثر عدد ممكن من العملة بالجهات)</p> <p><b>قسط 2020:</b></p> <p>الأشغال بالمقاولات: بصدد إعداد طلبات العروض</p> <p>الأشغال بالتفاوض المباشر مع شركة البيئة (بمبلغ 300 ألف دينار): بصدد إعداد طلبات العروض (ينجز ضمن البرنامج الوطني لاستيعاب أكثر عدد ممكن من العملة بالجهات)</p>	<p>التسريع في انطلاق اشغال مشروع حاية مدينة تطاوين من خطر الفيضانات</p>	
<p>* اقتناء القنوات : تم الإقتناء</p> <p>* الأشغال : بصدد الانجاز</p>	<p>التسريع في اجراءات طلب العروض لانطلاق اشغال تعزيز وتجديد قنوات الجلب بالجنوب الشرقي</p>	
<p>تم انجاز المشروع</p>	<p>التسريع في الاجراءات لانطلاق اشغال مشروع تدعيم التزود بالماء الصالح للشرب بمنطقة تالالت من معتمدية تطاوين الشبالية والمناطق العليا من مدينة غمراسن ومنطقة قصر الحدادة بغمراسن</p>	
<p>* قرار اللافي (أشغال): بلغت نسبة تقدم الأشغال 99%</p> <p>* المزروع: دقق البئر ضعيف بعد الإنجاز و بالتالي ارجاء احدات المنطقة السقوية الى حين التعميق في دراسة الموارد المائية</p> <p>* ههب: في طور تسجيل الصفقة</p> <p>* الوديات: في انتظار فتح الإعتمادات</p> <p>* كحيل (دراسة): بصدد انجاز الدراسة ( APS définitif )</p> <p>* كمبوت 3 (أشغال): نسبة الأشغال 25 %</p> <p>* نكريف 5 (دراسة): بصدد انجاز الدراسة ( APS définitif )</p>	<p>التسريع في الاجراءات لانطلاق أشغال أحداث مناطق سقوية جديدة بمعمديات غمراسن والبئر الاحمر ورمادة</p>	
<p>لم ينجز</p>	<p>طلب رفع التحجير عن حفر الابار العميقة</p>	
<p>في طور الانجاز</p>	<p>توسيع غرسات الزيتون</p>	
<p>* بطى في استكمال الدراسات</p> <p>* دعوة المركز الوطني للدراسات الفلاحية لإتمام الدراسة في</p>	<p>التسريع في استكمال المرحلة الثالثة من الدراسات لانطلاق اشغال مشروع احدات قطب واحات بربح</p>	

الملاحظات	التوصيات	المجال
اقرب الآجال و عرضها للتمويل	بورقيبة وبرج الخضراء	
*- تم إقتناء الجزء الأول على مساحة 25 هك *- الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه: تم إقتناء القنوات و في طور الإعلان عن طلب العروض الخاص بأشغال تركيز القنوات *- الشركة التونسية للكهرباء و الغاز : بصدد الانجاز *- أشغال التهيئة: لم تنطلق بعد	التسريع في تهيئة المنطقة الصناعية "الشهيد الشمالي" بني مهيمة (50هك)	وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى
لم ينجز الملف لدى وزارة التجارة	برمجة احداث منطقة للتبادل الحر بذهبية	وزارة التجارة
في طور الانجاز نسبة تقدم الأشغال: 10 %	التسريع في اتمام اجراءات طلب العروض لانطلاق انجاز الاشغال المتعلقة بوصلة الربط بين الطريق السيارة 1 بولايتي مدينين وتطاوين	وزارة الاسكان والتجهيز و التهيئة ترابية
في طور الانجاز نسبة تقدم الأشغال: 88 %	التسريع في انطلاق اشغال تهييب الطريق الجهوية رقم 111 بين الصار و حدود ولاية مدين بطول 23 كلم	
تم انجاز المشروع	التسريع في انطلاق اشغال تدعيم الطريق الجهوية رقم 115 الرابطة بين منطقة وادي الغار و حدود ولاية مدين بطول 26 كلم	
*- بلدية تطاوين: بلغت نسبة تقدم الأشغال 80 %. *- بلدية غمراسن: بلغت نسبة تقدم الأشغال 92 %. *- بلدية الصهار: بلغت نسبة تقدم الأشغال 99 %.	التسريع في نسق اشغال مشروع تعصير وتدعيم الطرقات داخل المناطق البلدية بكل من بلديات تطاوين وغمراسن والصهار	
تم تحديد الأرض و اعداد دراسة تهيئة المقاسم والمصادقة عليه منذ سنة 2016 في انتظار رصد الاعتمادات والاذن بانطلاق الأشغال من طرف المصالح المركزية لوزارة التجهيز والاسكان	التسريع في انطلاق انجاز 142 مسكن اجتماعي برمادة وذهبية	
تم انجاز المشروع	التسريع في نسق انجاز اشغال مشروع تهييب حي وسط المدينة ببلدية رمادة	
*- بلغت نسبة تقدم الأشغال 60 % بالنسبة للجزء الأول(في طول 20كلم). *- بالنسبة للأجزاء المتبقية ( 60 كلم) هناك إمكانية لإنجازها في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص	التسريع في انطلاق اشغال تعبيد طريق جبل ماطوس لتسهيل عبور المعدات والعربات والامدادات عبر تطاوين	
لم ينجز	التسريع في استكمال اجراءات تسوية ملكية المساكن الاجتماعية بالذهبية بعد انتهاء الاشغال الميدانية من طرف ديوان قيس الاراضي	
في طور الانجاز نسبة تقدم الأشغال: 50 %	التسريع في الدراسات لانطلاق اشغال حماية مدينة تطاوين من خطر الفيضانات	

الملاحظات	التوصيات	المجال
لم ينجز	إعادة تأهيل استراتيجية التنمية السياحية لحسن تبيين المخزون السياحي المتنوع الذي تزخر به الجهة وإدماجه في الدورة الاقتصادية	وزارة السياحة والصناعات التقليدية
في طور الإستغلال.	التسريع في اشغال تهيئة الفضاء المكثري لإحداث مكتب بريد إضافي في تطاوين القصور	وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي
* في انتظار القيام بالانتدابات اللازمة لسد الشغورات بمكتب رأس الوادي والحرية * مكتب قطوفة : يتم فتحه كل ثلاثاء مع تغطيته بالبريد المتجول كل يوم اربعاء	التسريع بإتمام اجراءات الانتداب لاعادة فتح مكاتب البريد المغلقة بكل من راس الواد وقطوفة والحرية	
تم اقتناء الأرض وفي طور الإعلان عن استشارة لتعيين مصممين	التسريع في استكمال الدراسات لانطلاق أشغال بناء مقر جديد لمكتب بريد المهرجان بتطاوين	
في طور الإنجاز	التسريع في اجراءات إسناد الصفقة إلى شركة اتصالات تونس للانطلاق في أشغال تغطية مناطق بيضاء لـ 9 عمادات بالانترنات	
* إطلاق أشغال التهيئة على مستوى محطة الغاز * مد الانابيب: بصدد الانجاز * بناء مركزي المعالجة والتعبئة: بصدد اعداد المناقصة	التسريع في اجراءات إسناد صفقة القسط المتعلق بتركيز انبوب الغاز والهندسة المدنية وبناء مركزي المعالجة والتعبئة وذلك لتسريع الانطلاق في اشغال مشروع غاز الجنوب	وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
في انتظار الانتهاء من الأشغال على مستوى محطة الغاز	التسريع في مشروع إتمام ربط مدينة تطاوين وتزويدها بالغاز الطبيعي (سيتم تزويد مدينة تطاوين في مرحلة اولى من الأنبوب المنتجه نحو جرجيس على مستوى منطقة الغرابيات في انتظار جاهزية محطة القرضاب)	
* 1000 عون بعنوان 2018: تم الإعلان عن نتائج المناظرة و ابرام عقود العمل * 500 عون بعنوان سنة 2019: لم ينجز	التسريع في دراسة الملفات للإعلان عن نتائج مناظرة انتداب 1000 عون بعنوان سنة 2018 بشركة البستنة والبيئة والغراسية	
انجاز محطة إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط ببحر بريقية انجاز محطة إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط ببني محيرة	التسريع في الانطلاق في أشغال مشروع محطات للانتاج الكهربائي بواسطة الطاقة الشمسية في الصحراء	
تم انجاز المشروع	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة بتتوير ملعب البئر الاحمر	
لم ينجز	إحداث شركة وطنية لاستغلال وتثمين مادة الجبس	
لم ينجز	إحداث إدارة جمهورية للطاقة والمناجم	
تم انجاز المشروع	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة بإحداث مركب للطفولة بنادي الأطفال بالذهبية	وزارة المرأة والأسرة والطفولة
تم انجاز المشروع	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة بإحداث فضاء للطفولة المبكرة بنادي الأطفال بالذهبية	

الملاحظات	التوصيات	المجال
تم إنجاز المشروع	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة بإحداث فضاء للطفولة المبكرة بنادي الأطفال بغمراسن	
في طور اعداد تقرير تقييم العروض	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة بإحداث مركب وفضاء للطفولة المبكرة بالصمار	
تم إنجاز المشروع	الإسراع بصرف الاعتمادات اللازمة لاستكمال تهيئة الدراسات وتوسعة ملعب "نجيب الخطاب" خاصة بعد اتمام الدراسات	وزارة الشباب والرياضة
تم استكمال الدراسات وانجاز المشروع	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة بتهيئة السياج والمدخل الرئيسي بالمركب الرياضي "نجيب الخطاب"	
في طور الانجاز نسبة تقدم الأشغال: 25 %	التسريع في استكمال الدراسات لانطلاق بناء قاعة الالعب الفردية بتطاوين الجنوبية	
في طور المصادقة على تقرير تقييم العروض	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة باحداث مضمار اصطناعي للالعب القوى بتطاوين	
تم إنجاز المشروع	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة بتهيئة دار الشباب بالذهبية	
في طور تقييم العروض	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة بمواصلة تهيئة المركب الشبائي بتطاوين	
تم إنجاز المشروع	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة بتهيئة دار الشباب بتطاوين	
تم إنجاز المشروع	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة بتهيئة القاعة المغطاة بتطاوين	
في طور الانجاز نسبة تقدم الأشغال: 70 %	الإسراع بصرف الاعتمادات اللازمة لانطلاق في انجاز صيانة المسبح البلدي بتطاوين نظرا لانهاء الدراسات	
تم الانجاز	التسريع في استكمال بناء الملعب الفرعي بالصمار	
لم ينجز	الاسراع بتوفير الموارد البشرية اللازمة لضمان الحد الادنى من الخدمات بالمنشآت التابعة للوزارة	
لم ينجز	اعادة تاهيل استراتيجية التنمية الثقافية لحسن تهمين المخزون الثقافي المتنوع الذي تزخر به الجهة وادماجه في الدورة الاقتصادية	وزارة الشؤون الثقافية
تم تخصيص العقار وفي انتظار القيام بالدراسات	التسريع في اجراءات تسوية وضعية العقار لاحداث متحف التراث الثقافي والطبيعي	
بصدد إعداد المناظرة لاختيار المصممين	التسريع في اجراءات تحديد العقار لانطلاق اشغال مشروع اعادة بناء دار الثقافة برمادة	
تمت الموافقة على إقتناء قطعة أرض من طرف الوزارة وتم الحصول على وعد بالبيع وإحالته إلى إدارة أملاك الدولة للقيام بإختبار تحديد الثمن	بناء مكتبة عمومية بقصر الحدادة	



الملاحظات	التوصيات	المجال
في طور الانجاز نسبة تقدّم الأشغال: 50 %	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة ببناء القسط الثاني من العيادات الخارجية للمستشفى الجهوي بتطاوين	وزارة الصحة
لم ينجز في انتظار توفير الاعتمادات	التسريع في توفير الاعتمادات المخصصة للقسط الثاني من مشروع اعادة بناء مجمع الصحة الاساسية بتطاوين (بناء المخبر الجهوي للصحة والمركز الجهوي للطب المدرسي ووحدة تأهيل المعوقين)	
في طور اعداد البرنامج الوظيفي	التسريع في اتمام اعداد البرنامج الوظيفي لانطلاق اشغال تاهيل وتوسعة وتجهيز المستشفى الجهوي بتطاوين للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالجهة	
تم اقتناء آلة المفراس	التسريع في اجراءات اعداد طلب العروض لاقتناء آلة مفراس للمستشفى الجهوي بتطاوين	
في انتظار توفر الإعتمادات و موافاة الإدارة الجهوية للتجهيز بالبرنامج الوظيفي للمشروع من قبل المصالح المركزية لوزارة الصحة.	التسريع في استكمال اجراءات انطلاق اشغال احدات وحدة طب استعجالي بالمركز الوسيط ببني مهيمة (وطلب تحويل هذا المركز الى مستشفى محلي)	
*- مركز الصحة الأساسية الزهرة: تقدم الأشغال 5% *- مركز الصحة الأساسية المزطورية: تقدم الأشغال 10% *- مركز الصحة الأساسية رأس الوادي: 25% (مقترح لفسخ الصفقة) *- مركز الصحة الأساسية قصر أولاد سلطان: تمت المصادقة على تقرير الاختبار الفني من طرف اللجنة الجهوية للبنابات المدنية والملف لدى الإدارة الجهوية للصحة	التسريع في استكمال الدراسات المتعلقة بصيانة مراكز الصحة الأساسية بالزهرة والمزطورية وقصر أولاد سلطان ورأس الوادي	
بصدد إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية	التسريع في صيانة المستشفى المحلي بالصهار	
تمت الموافقة على تجهيز المركز (أشعة، مخبر، طب اسنان) *- الانتدابات لم تنجز	التسريع في استكمال التجهيزات والانتدابات اللازمة لانطلاق استغلال مركز الصحة الأساسية بأولاد دباب من صنف 3 الى صنف 4	
لم ينجز	توفير اطباء الاختصاص	
في طور الانجاز	الإسراع بتوفير المعدات والتجهيزات الطبية والاطر البشري اللازم للمؤسسات الصحية بالجهة	
لم ينجز	تدعيم دور الخدمات الاجتماعية المتواجدة حاليا او التي تنتظر انتهاء الأشغال بالإطار البشري اللازم لضمان انطلاقها الفعلي في اسداء خدماتها في اقرب الاجال	وزارة الشؤون الاجتماعية
في طور الإعلان عن طلب العروض.	التسريع في توفير الاعتمادات اللازمة لبناء معهد نموذجي بميت في تطاوين الشالية	وزارة التربية
في طور اجراءات الانتزاع	التسريع في اجراءات انتزاع الأرض المخصصة لبناء معهد بالمزطورية	

الملاحظات	التوصيات	المجال
لم ينجز	توفير التمويلات اللازمة لتفعيل مشروع احداث قطب تكنولوجي متعدد الاختصاصات بالجهة	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
تم انجاز المشروع	التسريع في انطلاق أشغال إحداث مركز للتشغيل والعمل المستقل	وزارة التكوين المهني والتشغيل
بطئ في استكمال الدراسات	التسريع في استكمال الدراسات لانطلاق اشغال احداث مركز التكوين في الطاقة والمواد الانشائية	
تم التوقف عن اعداد الدراسات لعدم توفر الاعتمادات وعدم تبني قطب الغزالة للمشروع	التسريع في الاجراءات لانطلاق بناء مركز العمل عن بعد برمادة	
مكتب التشغيل بالصمار: في طور النشاط مكتب التشغيل برمادة: في طور النشاط مكتب التشغيل بالبئر الاحمر: في طور النشاط	توفير الاطارات والموارد البشرية اللازمة لمكتب التشغيل المنجزة بكل من الصمار وبئر الاحمر ورمادة حتى تتمكن من الانطلاق في اسداء خدماتها	

# جلسة لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب

## الوضع التنموي بولاية مدين



19 جوان 2020

# المحور الأوّل: ولاية مدنين في أرقام

# ولاية مدنين في أرقام

ولاية مدنين  
خارطة النمو السكاني



نسبة النمو	
أقل من ضعف	Light Blue
من 0 إلى 0,80	Medium Blue
من 0,81 إلى 1,30	Dark Blue
من 1,31 إلى 2	Very Dark Blue
2 فما فوق	Dark Blue

09 معتمديات

10 بلديات

94 عمادة

السكان

516.8 ألف  
ساكن

29,8% من  
سكان الجنوب

4,3% من  
سكان البلاد

المساحة

9167 كلم<sup>2</sup>


10% من  
مساحة الجنوب

5,6% من  
مساحة البلاد

# ولاية مدنين في أرقام



# ولاية مدنين في أرقام

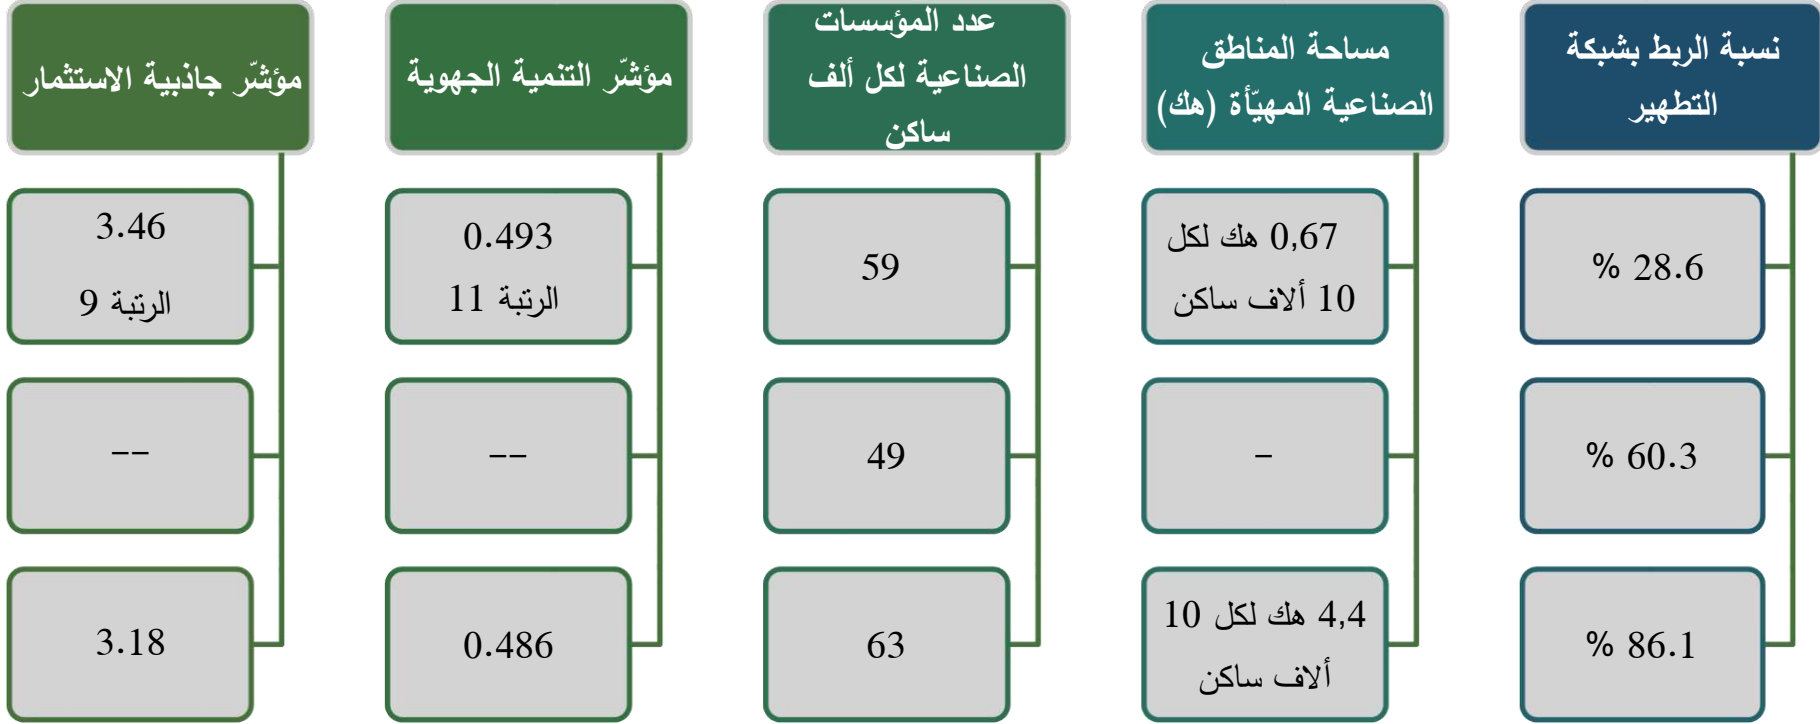

# المحور الثاني: خصوصيات وميزات ولاية مدنين



# خصوصيات وميزات ولاية مدنين

## البنية الأساسية واللوجيستية



البنية الأساسية	
مستشفى جامعي	الطريق سبارة فاباس رأس الجدير
مركز تخميم وإستقطاب	الطيار الدولي جزيرة جرجيس
مركز قطاعات في التكوين المهني	البنية التجارية بجرجيس
مراكز عمل عن بعد	موانئ صيد بحري
معهد البلطوق القاحلة	مناطق صناعية
القطب التكنولوجي للجنوب	معبر حدودي رأس جدير
مركز إداري	مستشفى جهوي

## الخصائص الاقتصادية الهامة



الخصائص الاقتصادية	
مناطق سياحية	صيد بحري
زيتان	مراشي
تربية صائحية	فخار
صناعات تقليدية	مركز إداري

## الموقع الجغرافي المتميّز



Aéroport International  
Djerba Zarzis



Port commercial de  
Zarzis



Le passage frontalier de Ras  
Jedir

# المحور الثالث: الإشكالية العامة للتنمية بولاية مدنين

# بكل المقاييس ولاية مدنين جهة المفارقات التنموية :[Région des Paradoxes]

ولاية ساحلية في وضعية تنموية متناقضة



مؤهلات وإمكانات تنموية مميزة وتفاضلية  
ولكن

بمستوى استغلال لا يسمح بالاستجابة لمقتضيات  
الوضع الراهن ولا بتثبيت مسار تنموي دامج  
ومستدام، شامل وعادل

# وكنتيجة لهذه الوضعية التتموية المتناقضة والمختلة:

عرفت الجهة تفاوتا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا بين شريطها الساحلي الجذاب وعمقها الداخلي في مستوى المؤشر بين معتمدية بني خداش في أسفل الترتيب ومعتمدية حومة السوق الساحلية في الصدارة، كما بين المعتمديات الساحلية نفسها بين معتمدية سيدي مخلوف من جهة ومعتمدية حومة السوق من جهة أخرى:

•السياحة في معتمديات جربة حومة السوق وجربة ميدون : قطب سياحي ذي إشعاع عالمي والفلاحة والصيد البحري والصناعات التقليدية بجربة أجيم: مهد الفخار التقليدي بالبلاد،

•نواة لقطب اقتصادي متكامل فلاحي وصناعي وخدماتي بجرجيس لم تتوفر له إلى حد الآن الظروف الأساسية لأداء وظيفته الجهوية والإقليمية والوطنية استثمارا وتشغلا وتصديرا،

• مركز إداري وخدماتي جهوي ونواة لقطب تكنولوجي متخصص في  
تثمين ثروات الصحراء والطاقات الكامنة فيها ومجمع لصناعات مواد  
البناء والخزف بمدنين الكبرى، الجنوبية والشمالية، والتي لا تزال تبحث  
عن المعادلة التي تسمح لها بلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي  
واستقطاب مجالها الجهوي والإشعاع على محيطها،

• التجارة والفلاحة والصيد البحري والصناعات التقليدية بينقردان: الواجهة  
الرئيسية للبلاد على حدودها الجنوبية الشرقية والمنطقة الواعدة للتجارة  
الدولية الحرة والتي لا تزال تشكو التهميش وضعف النسيج الاقتصادي  
[المبني بصفة تكاد تكون كلية على التجارة الحدودية الذي تتحكم فيه  
طبيعة العلاقات ومجريات الأحداث مع ليبيا وفي مرتبة ثانية وثالثة  
الفلاحة المطرية والصيد البحري] ،

■ الفلاحة والصناعات التقليدية وعلى ما تيسر من العائدات المالية للهجرة ببني خدّاش وسيدي مخلوف المنطقتان الأقل نموا في الولاية واللّتان تشهدان ظاهرة ملفّقة للنزوح والهجرة الداخلية بما يهدّد إفراغهما من السكّان تدريجيا. وتعتبر آفاق التنمية بالمعتمديّتين محدودة في ظل غياب مشاريع وبرامج خصوصية متكاملة تمكنها من تقليص حدة التفاوت التتموي مع بقية المعتمديات ومن الاندماج الفعلي في محيطهما.

■ لم يتسنى للولاية استثمار موقعها المميّز والاستراتيجي في فك ارتباطها بالأقطاب التتموية الكبرى بالوسط والشمال وخاصة في مجالات الصّحة والتعليم العالي والإدارة والإشعاع على محيطها الإقليمي،


■ بقيت نسبة الربط بشبكة التطهير في أدنى المعدّلات الوطنية  
[28.6% مقابل 86% وطنيا]،

■ واستأثرت قطاعات التجارة والسياحة والإدارة والأشغال العامة بنسبة  
75% من العدد الجملي للنشأطين المشغولين مقابل 9% فقط بقطاع  
الصناعات المعملية [20% على المستوى الوطني] و 10% بقطاع  
الفلاحة والصيد البحري،

■ واحتلّت المرتبة الأخيرة من حيث مساحة المناطق الصناعية المهيأة  
لكل 10 آلاف ساكن بمؤشّر 0,67 هك مقابل 4,4 هك على  
المستوى الوطني.

# المحور الرابع: الرؤية المستقبلية للتنمية بولاية مدنين





# إستراتيجية التنمية تهدف إلى جعل ولاية مدنين:

**قطبا صحياً**  
يشع على ولايات الجنوب الشرقي

**قطباً تنموياً**  
علمياً وبحثياً  
مختصاً في فلاحه المناطق الجافة وشبه الجافة ذي إشعاع عالمي وموطناً للمشاريع المجددة المثمرة لثروات الصحراء والطاقات الكامنة فيها

**قطبا**  
**صناعياً**  
متطوراً قادراً على استقطاب الجزء الأهم من مخزون البطالة

**قاعدة إقليمية للتصدير**  
ومركزاً دولياً للتجارة الحرة



# المحور الخامس: مدى تقدّم انجاز الخطة التنموية بولاية مدنين

## الاستثمارات المدرجة بالمخطط التنموي الجهوي 2016 – 2020 لولاية مدنين: 3360,29 م.د.

### توزيع كلفة المخطط 2016 – 2020 بين القطاع العام والقطاع الخاص

المتدخل	تكلفة المخطط 2016-2020 (م.د.)	الاستثمارات المنجزة 2016 - 2019 (م.د.)	نسبة الإنجاز %
القطاع العام	1360,29	751	55,21
القطاع الخاص	2 000	858,4	43
المجموع	3360,29	1 609,4	48

■ القطاع الخاص ■ القطاع العام

# 1. متابعة أداء القطاع العام


## توزيع استثمارات وانجازات القطاع العام بالمخطط للفترة 2016/2019 حسب طبيعة المشاريع

النسبة (%)	الاستثمارات المنجزة (د.م)	التكلفة المحيطة بالمخطط (د.م)	القطاعات
21%	156.401	298.056	مشاريع قطاعات الإنتاج
73%	549.454	893.156	مشاريع البنية الأساسية والمرافق الجماعية
06%	45.205	169.080	مشاريع التنمية البشرية
100%	751.060	1360.292	المجموع

نسبة الانجاز المالي للاستثمار الجهوي 2019-2016 : 55% :  
المرتبة الخامسة وطنيا

## 2. متابعة أداء القطاع الخاص

مجموع الاستثمارات المنجزة : 858 م.د.  
احداثات مواطن الشغل: 7477

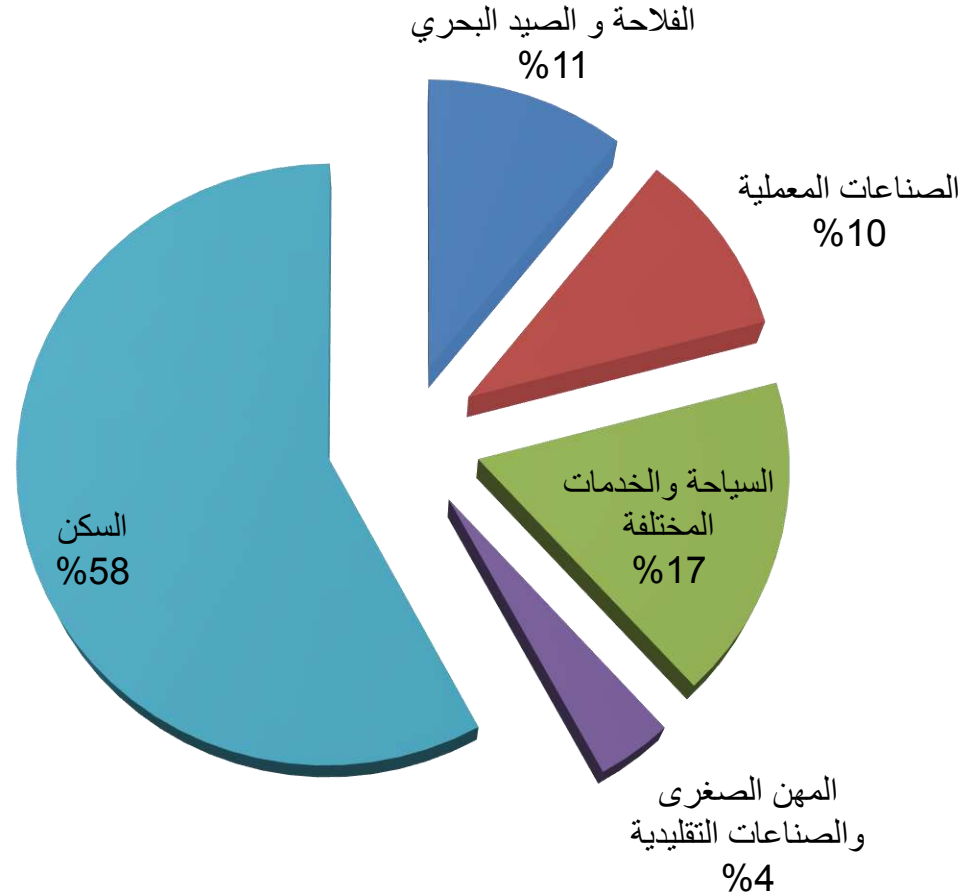

حوصلة انجازات القطاع  
الخاص خلال الفترة  
2016/2019

## متابعة تنفيذ المشاريع العمومية

النسبة من الكلفة %	الكلفة (أ د)	النسبة من العدد %	عدد المشاريع	درجة النضج
7	49 304	20	94	المشاريع المنجزة كلياً
50	377 246	35	165	مشاريع بصدد الانجاز
29	218 861	13	61	مشاريع في مرحلة إعداد طلبات العروض
10	76 450	27	126	مشاريع بصدد الدراسة
2	15 775	3	16	مشاريع لم تنطلق
2	17 466	1	4	مشاريع معطلة
<b>100</b>	<b>755 102</b>	<b>100</b>	<b>466</b>	<b>الجملة</b>

علما وأنه منذ سنة 2011 والى نهاية سنة 2019 تم انجاز 803 مشروعا بكلفة 845 مليون دينار.



# متابعة سير أهم المشاريع الكبرى



# الطريق السيارة قابس مدنين

■ الطول الجملي للطريق السيارة : 84.320 كم وتضعيف الطريق

الوطنية عدد 1 على طول 6.5 كم

■ مدة الإنجاز : 36 شهرا

■ الكلفة الجمالية للمشروع : 550 م.د

مشروع الطريق السيارة قابس -مدنين	القسط عدد4	القسط عدد3	القسط عدد2	القسط عدد1	تقدم الأشغال: ماي 2020
78.26 كم - % 93	16.240 كم - % 76	20.750 كم - % 99	21 كم - % 100	21 كم - % 100	فتح حوزة الطريق
359 331 957.487	105 289 664 .365	91 548 338,746	73 347 812,765	97022415, 392	المبلغ (د.ت باعتبار الأداءات)
94%	% 80	% 99	% 99	% 100	التقدم في الدراسات
% 68	% 40	% 90	% 45	% 99	الطريق
% 87	% 60	% 93	% 97	% 99	التتريب
% 89	% 70	% 99	% 90	% 99	المنشآت
% 78.75	% 46	% 93	% 77	% 99	المشروع

■ عدد الأقساط : 04

■ مصدر التمويل : 50 %

الدولة التونسية --

50 % : الوكالة

اليابانية للتعاون

الدولي

■ بداية الأشغال :

04 أوت 2014 للأقساط

1 و 2 و 3

التقدم  
المادي  
للأشغال



# الطريق السيارة مدنين - رأس جدير

■ الطول الجملي للطريق السيارة : 92 كم و تضعيف الطريق

الوطنية عدد 1 على طول 12 كم

■ مدة الإنجاز : 36 شهرا

■ الكلفة الجمالية للمشروع : 450 م.د.

مشروع الطريق السيارة مدنين - رأس الجدير	القسط عدد 9	القسط عدد 8	القسط عدد 7	القسط عدد 6	القسط عدد 5	تقدم الأشغال ماي 2020
104 كم - 100%	24 كم - 100%	20 كم - 100%	20 كم - 100%	20 كم - 100%	20.080 كم - 100%	فتح حوزة الطريق
367 276677.831	70 342718.230	78 799251.978	89 423995.123	66 149067.996	62 561644.504	المبلغ (د.ت. باعتبار الاداءات)
398 362 546.321	72 795 869.656	88 243 490.930	92 355 231.629	70 352 864. 162	64 615 089.944	المبلغ باعتبار الملاحق (د.ت. باعتبار الاداءات)
98%	100%	95%	100%	100%	95%	التقدم في الدراسات
مدة الانجاز 36 شهرا 100% (07-14) (2013)	مدة الانجاز 24 شهرا 100% (07-05) (2017-07-05)	مدة الانجاز 36 شهرا 100% (07-14) (2013)	مدة الانجاز 36 شهرا 100% (07-14) (2013)	مدة الانجاز 36 شهرا 100% (07-14) (2013)	مدة الانجاز 36 شهرا 100% (07-14) (2013)	التقدم في الاجال
97%	100%	85%	100%	100%	100%	التقدم المادي للأشغال
97%	100%	85%	100%	100%	100%	المنشآت
97%	100%	85%	100%	100%	100%	المشروع
368.941 م.د.	74.854 م.د.	73.034 م.د.	92.420 م.د.	64.876 م.د.	59.757 م.د.	التقدم المالي
92.6%	100%	82.8%	100%	92.21%	92.5%	م.د (مليون دينار)

■ عدد الأقساط : 05

■ مصدر التمويل : 50%

الدولة التونسية

: 50%

البنك الإفريقي للتنمية

■ بداية الأشغال : 13

جوان 2013

محول  
الراقوبة  
بسيدي  
مخوف  
ومحول بنيري  
بينقردان

تم التعهد بانجاز هذه  
المحاولات من طرف  
الرئيس المدير العام  
لشركة تونس  
للطرقات السيارة  
وهناك محاضر  
جلسات ممضاة في  
الغرض

الإسراع  
بتنفيذ  
التعهدات  
وانجاز  
المحاولات

الإسراع  
بخلاص  
مستحيي  
القطع  
المنتزعة

تأخير في تسديد  
أثمان القطع  
المنتزعة

العمل على  
الإشكال

بطئ في البت في القضايا  
التي بها ترفيع في قيمة  
الأرض المنتزعة

# مضاعفة الطريق الرومانية



الإسراع بفتح  
الاعتمادات  
والانطلاق في  
الانجاز

نسبة تقدم الأشغال 11%  
مشروع إحداث فتحة ثانية :

تم تحديد حجم الفتحة الثانية المزمع إنجازها والمقدر بـ 200 متر وموقعها قبالة الوادي "الصغير".

مصالح وزارة الفلاحة بالتعاون مع مصالح وزارة التجهيز بصدد إعداد الخطوط المرجعية و ملف طلب العروض لإنجاز الدراسة التنفيذية المعمقة، وسيتم الإعلان عن طلب العرض في أقرب الآجال.

- تمت مراسلة السيد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتاريخ 23 سبتمبر 2019 حول إنجاز الدراسة التنفيذية للفتحة و التعهد بتمويل إنجازها في إطار إعادة إستغلال بقايا تمويلات المشاريع وذلك تبعا لما تم الإتفاق عليه في جلسة العمل الوزارية المنعقدة برئاسة الحكومة بتاريخ 02 نوفمبر 2018.

الجمهورية التونسية  
وزارة التجهيز و الإسكان وتهيئة الترابية  
الطريق الجهوية عدد 117

مشروع تضاعف الطريق الجهوية عدد 117  
من 21 كم إلى 27.300 كم

موقع موقع

مناطق مشروع

المصالح المشرفة: وزارة التجهيز و الإسكان وتهيئة الترابية  
الولاية: الجهة الشمالية

تاريخ الصيغة: 48 055 447.183

التصميم: المسوق العربي للإدارة و مخرجة الوثائق التونسية

المعملة: SOBIT - SOBATRAF - SOBATRAF

مكتب الدراسات: BEST CONSEILS - MARSTEC

مكونات المشروع

- مضاعفة الطريق الجهوية رقم 117 على طول 6.300 كلم
- مخاضة الجسر المائي الستة على طول 160 متر على مستوى 24 X
- التطوير العمومي للمشروع
- التكاليف بالخراسة الإسفلتية
- التدخل التشغيلي الإقليمي و العمودي و تجهيزات السلامة

Profil en travers type

COUPE LONGITUDINAL  
Au niveau de l'ouvrage

# تهذيب الطريق الجهوية 118 من ن ك 0 إلى ن ك 46



المعتمدة	جرجيس
نسبة تقدم الانجاز	80%
أهداف المشروع	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تعصير الطريق الجهوية الرابطة بين مدينين و جرجيس و تدعيم السلامة المرورية لمستعملي الطريق</li> <li>- دفع نسق التنمية بالجهة من خلال دعم الأنشطة التجارية عبر ميناء جرجيس</li> <li>- التشجيع على الإستثمار بمعتمدة جرجيس و جربة</li> </ul>
مكونات/وصف المشروع	<p>توسعة الطريق [7.6 م طريق + (2.75 x 2) حواشي]</p> <p>أشغال التتريب -إعادة بناء جسم الطريق - بناء المعابر المائية -تهيئة مفترقات</p> <p>تركيز الإشارات المرورية العمودية والأفقية و تجهيزات السلامة المرورية</p>
كلفة المشروع (م. د)	38م.د
مدة الانجاز	720 يوما
بداية الأشغال	10/04/2018

# أشغال انجاز وصلة الربط تطاوين بالطريق السيارة أ1 قسط عدد 03



نسبة تقدم الانجاز	21%
كلفة المشروع (م. د)	31,6 م.د
مدة الانجاز	24 شهرا
بداية الأشغال	15 ماي 2019



# تهذيب الطريق المحلية 969 من ن ك 0 إلى ن ك 18 و الطريق المحلية 967 من ن ك 26 إلى ن ك 30 (22 كلم) على أن تنطلق الأشغال في السادسة الثانية لسنة 2018 كأجل أقصى

الإسراع  
والانطلاق في  
انجاز المشروع

الولاية	مدنين
المعمدية	سيدي مخلوف
صاحب المشروع	الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان و التهيئة الترابية
اسم المشروع	تهذيب الطريق المحلية 969 من ن ك 0 إلى ن ك 18 و الطريق المحلية 967 من ن ك 26 إلى ن ك 30 (22 كلم)
أهداف المشروع	- تعصير الطريق الرابطة بين مدنين و سيدي مخلوف و تدعيم السلامة المرورية لمستعملي الطريق - دعم الأنشطة السياحية و التجارية بجزيرة جربة
مكونات/وصف المشروع	توسعة الطريق [7.6 م طريق + (2.75 x 2) حواشي] أشغال التتريب إعادة بناء جسم الطريق بناء المعابر المائية تهيئة مفترقات تركيز الإشارات المرورية العمودية والأفقية و تجهيزات السلامة المرورية
كلفة المشروع (م. د)	17 م.د
تقدم إعداد المشروع	بصدد تقييم العروض بالإدارة العامة




# الانطلاق في إنجاز الطريق الحزامية بمدينة جرجيس بكلفة 53 مليون دينار على أن تنطلق الأشغال في السادسة الثانية لسنة 2018 كأجل أقصى

الإسراع في  
طلب العروض  
والانطلاق في  
الإنجاز

الولاية	مدنين
المعمدية	جرجيس
صاحب المشروع	الإدارة الجهوية للتجهيز والاسكان و التهيئة الترابية
اسم المشروع	الانطلاق في إنجاز الطريق الحزامية بمدينة جرجيس بكلفة 53 مليون دينار على أن تنطلق الأشغال في السادسة الثانية لسنة 2018 كأجل أقصى.
أهداف المشروع	<p>تعصير شبكة الطرقات وتسهيل المرور من جرجيس</p> <p>- تسهيل المرور على الطرقات الوطنية والجهوية</p> <p>- الحد من الاكتظاظ المروري بوسط مدينة جرجيس</p> <p>- دفع نسق التنمية بالجهة من خلال دعم نشاط الميناء التجاري</p>
كلفة المشروع (م. د)	53 م.د
تقدم إعداد المشروع	<p>- كلفة المشروع 57.6 م.د و بطول 21 كلم</p> <p>- الدراسات جاهزة</p> <p>- تم إعداد المثل العام للقطع المزمع اقتناؤها (plan d'ensemble)</p> <p>- بصدد التصفية العقارية : بصدد الإشهار</p>

**تدعيم الموارد المائية بمدينة بن قردان وتحسين نوعيتها - إنجاز محطة لتحلية المياه الجوفية بطاقة إنتاج تقدر ب 9000 م<sup>3</sup> في اليوم**  
**(إنجاز محطة لتحلية المياه الجوفية بطاقة إنتاج 9000 متر مكعب في اليوم، إقتناء أرض بمساحة 2 هكتار، إنجاز 04 خزانات نصف مغمورة، حفر و تجهيز و كهربية عدد 08 آبار، وضع قنوات، إنجاز عدد 02 محطة ضخ، إنجاز عدد 02 محطة معالجة).**

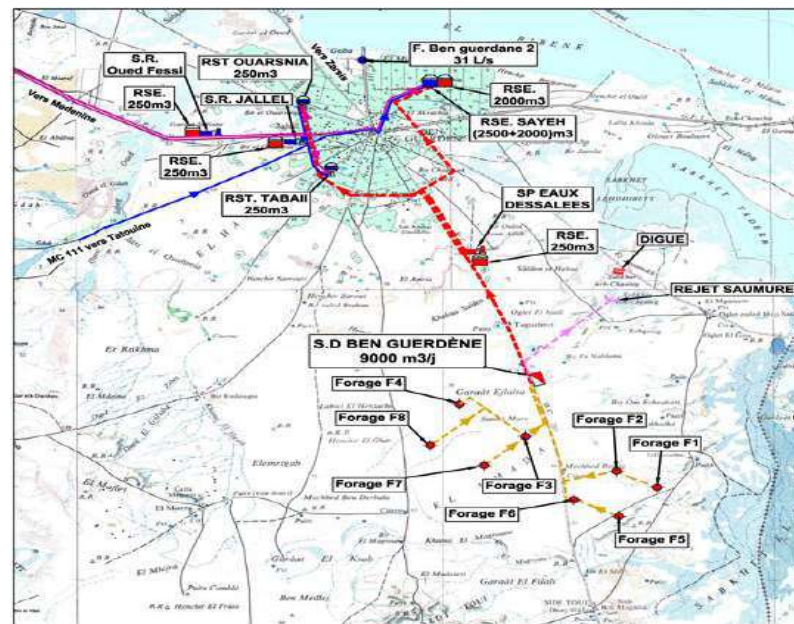

الولاية	مدنين
المعتمدية	بنقردان
صاحب المشروع	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
أهداف المشروع	1- تأمين حاجيات معتمدية بن قردان من مياه الشرب الى سنة 2035 2- تحسين نوعية المياه الموزعة والتقليل من درجة الملوحة الى أقل من 1.5 غ/ل
كلفة المشروع (م.د)	42م.د
تقدم إعداد المشروع	- تم تركيز الحاضرة لحفر البئر العميقة "رواق 2" لاستكشاف الطبقة المائية من طرف شركة EQUIPEMENTS HYDRAULIQUE و بصدد إعداد طلب عروض لحفر بئر ثانية. - سيتم نشر طلب عروض للمرة الثانية للتقييم الأولي لإنجاز محطة التحلية حال الإنتهاء من حفر البئر العميقة "رواق 2".



**الإسراع في  
استكمال  
الدراسات  
والانطلاق في  
الانجاز**



الولاية	مدنين
صاحب المشروع	الشركة الوطنية للسكك الحديدية
اسم المشروع	<b>مد السكة الحديدية من قابس الى مدنين</b>
أهداف المشروع	يعتبر هذا الخط امتداد للخط تونس قابس وهو ما سيمكن من توفير خدمات نقل و تحسين المردودية الاقتصادية لجهة مدنين وتطاوين.
مكونات/وصف المشروع	<p>يتمثل المشروع في إحداث خط حديدي جديد على امتداد 74 كم مع الإشارة إلى انه وقع استكمال أشغال البنية التحتية بما في ذلك تحديد المسار و الجسور منذ سنة 1985 .</p> <p>الأشغال التي سيقع انجازها تتمثل في :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- إعادة تهيئة المسار المتواجد و الجسور الصغيرة التي تم إحداثها</li> <li>- إحداث الجسور الكبرى</li> <li>- إنشاء مباني محطات كتانة و مارث و سيدي مخلوف و مدنين</li> <li>- أشغال وضع السكة على الخط وفي المحطات</li> </ul>
تكلفة المشروع (م.د)	240 م.د
تقدم إعداد المشروع	<p>بالنسبة للمرحلة الأولى المتعلقة بالدراسات التمهيديّة APS (في أجل 06 أشهر) فقد تمت المصادقة من طرف مصالح ولاية مدنين خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2019،</p> <p>(في أجل 06 APD بالنسبة للمرحلة الثانية المتعلقة بالدراسات التفصيلية أشهر) فهي في انتظار المصادقة على ملف المرحلة الأولى من طرف الشركة و كل المتدخلين.</p>

# تزويد مدينة مدين بالغاز الطبيعي

## بيانات حول خصائص المشروع

- 1- الإدارة المكلفة بالإشراف على المشروع : إدارة إنتاج و نقل الغاز / إدارة بناء منشآت الغاز
- 2- محتوى المشروع : تزويد مدينة مدين بالغاز الطبيعي.
  - ✳ مد و بناء أنبوب من الفولاذ قطره 12 بوصة طوله 14,4 كلم و تحت ضغط 76 بار.
  - ✳ مد و بناء أنبوب من الفولاذ قطره 8 بوصة طوله 4,2 كلم و تحت ضغط 20 بار.
  - ✳ بناء (1) محطة لتخفيض الضغط 76/20/4 بار.
  - ✳ بناء (2) محطتين لتخفيض الضغط 20/4 بار.
- 3- الكلفة الجمالية للمشروع : 4,5م دت.
- 4- كيفية تمويل المشروع : من طرف الشركة التونسية للكهرباء و الغاز.
- 5- رقم الصفقة : G 15 D 0135 بتاريخ 21/08/2012
- 6- المؤسسة المكلفة بإنجاز الصفقة : SOMMI
- 7- مبلغ الصفقة : 254 472.000 دت
- 8- المدة التعاقدية لإنجاز المشروع : 13 شهرا بداية من تاريخ الإذن بانطلاق الأشغال.

**بيانات تخص تقدم إنجاز المشروع : تم التزويد**

## تزويد المناطق السياحية بجزيرة جربة و منطقة جرجيس بالغاز

### الطبيعي.

- 1- الإدارة المكلفة بالإشراف على المشروع : إدارة إنتاج و نقل الغاز / إدارة بناء منشآت الغاز
- 2- محتوى المشروع : تزويد المناطق السياحية بجزيرة جربة و منطقة جرجيس بالغاز الطبيعي
  - ✳ مد و بناء أنبوب من الفولاذ قطره 12 بوصة، طوله 160 كلم و تحت ضغط 76 بار.
  - ✳ مد و بناء أنبوب من الفولاذ قطره 8 بوصة، طوله 59 كلم تحت ضغط 20 بار لتزويد المناطق السياحية جربة و جرجيس.
  - ✳ بناء محطتين لتخفيض الضغط 76/20 بار.
  - ✳ بناء 4 محطات لتخفيض الضغط 20/4 بار.
- 3- الكلفة الجمالية المحينة للمشروع : 110م دت
- 4- كيفية تمويل المشروع : الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OFID - Fonds OPEC pour le développement international).
- 5- رقم الصفقة :
  - ✳ الجزء 1 و 2 : قابس رأس القسيم : G 15 D 0084
  - ✳ الجزء 3 : الجزء الذي سيمرّ بأعماق البحر : G 15 I 6470
  - ✳ الجزء 4 : جزء جزيرة جربة : الشركة الجزائرية G 15 D 0083
- 6- المؤسسة المكلفة بإنجاز الصفقة :
  - ✳ الجزء 1 و 2 : قابس رأس القسيم : مقاولات البوشماوي
  - ✳ الجزء 3 : الجزء الذي سيمرّ عبر البحر : بيروكو "PIRECO"
  - ✳ الجزء 4 : جزء جزيرة جربة : الشركة الجزائرية "HAYATCOM/TMCA"
- 7- مبلغ الصفقة :
  - ✳ الجزء 1 : 262 362,711 دت (HTVA).
  - ✳ الجزء 2 : 8 000 305,280 دت (HTVA).
  - ✳ الجزء 3 : 4 151 283,255 دت (HTVA) و 4 491 145,83 € (HTVA).
  - ✳ الجزء 4 : 5 551 000,000 دت (HTVA).
- 8- المدة التعاقدية لإنجاز المشروع : تم تقسيم المشروع إلى 4 أجزاء آجال تنفيذ الأشغال : 16 شهرا لكل جزء بدون تجميع الآجال.

- تم مد الأنابيب الناقلة للغاز (ضغط مرتفع 76 بار وضغط متوسط 20 بار بالنسبة لكل الأقساط (100%)، وتسريح الغاز بالأنبوب الرئيسي تم بجزيرة جربة تشغيل الأنبوب ضغط متوسط 20 بار بالغاز الطبيعي بتاريخ 10 ديسمبر 2019 - تم الانطلاق في إنجاز محطة خفض الغاز بسيدي منصور بجزيرة ميدون
- تم مد كل قنوات الضغط المتوسط بجرجيس، وتم تحديد المقاول لمحطتي خفض الضغط بصانغو والظويهر
- مشروع تزويد المنطقة السياحية صانغو-جرجيس: تقدم الإنجاز 85%.

## المنطقة التجارية واللوجستية بينقردان

الإسراع بتكوين الشركة و  
إصدار القانون الأساسي  
للمنطقة التجارية  
واللوجستية وإيجاد التمويل  
اللازم للانطلاق في انجاز  
مكونات المشروع من  
مستودعات وإدارة ومركز  
حياة



الملاحظات	نسبة تقدّم الإنجاز (%)	كافة المشروع (م.د)
أشغال التهيئة الخارجية	تهيئة الفضاء الخارجي ب 2.2 م د تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب ب 8.5 م د الربط بشبكة الكهرباء ب 1.7 م د الربط بشبكة التطهير ب 2.5 م د الطرق : 21.3 م د	34

# الوضع البيئي ومشروع النموذجي للتصرف في النفايات بجزيرة جربة

ضرورة حل  
الإشكالية وانجاز  
المصب النهائي  
للنفايات.

- بصدد إستصلاح موقع خزن لفائف النفايات المنزلية بالمصب  
الوقتي (منطقة تالبت) بسيدويكش وذلك عن طريق تغطيتها  
بالأتربة.

- تم إحداث خانة لردم النفايات بالمصب الوقتي بسيدويكش.

تم إبرام إتفاقية بين وزارة السياحة و وزارة الشؤون المحلية و البيئة  
لإعتماد الفرز الإنتقائي من المصدر داخل النزل السياحية و 30  
أحياء نموذجية (حي نموذجي بكل بلدية).

- تم تكليف مقاولة جديدة بداية من 01 ماي 2019 للمعالجة  
اليومية للنفايات بمصب سيدويكش.

- تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 هك من المدخر  
الصناعي بمنطقة سيدويكش لفائدة وزارة الشؤون المحلية والبيئة  
لإنجاز المشروع النموذجي و حاليا في مرحلة إخراج العقار من  
الملك العمومي للمياه من قبل مصالح الوكالة العقارية الصناعية.

## المناطق الصناعية

المناطق الصناعية		
%100	2,6	AFI المنطقة الصناعية تاجرة قسط 2
%100	4	المنطقة الصناعية بنقردان 15.5 هك
تم استكمال انجاز الدراسات الفنية	4,7	المنطقة الصناعية سيدي مخلوف
"شركة المركب الصناعي والتكنولوجي"	7,3	المنطقة الصناعية قصر الجديد
	3.8	المنطقة الصناعية بني خداش
بصدد انجاز الدراسة المائبة AFI	-	المنطقة الصناعية سدويكش بميدون
لم تنطلق بعد AFI	-	المنطقة الصناعية القريبس جرجيس

ضرورة حل  
الإشكالية العقارية  
للمنطقة الصناعية  
بنقردان خصوصا  
بعد استكمال

تهيئتها

دعم مالي لشركة  
المركب الصناعي  
والتكنولوجي  
بمدنيين للانطلاق  
في أشغال التهيئة

الإسراع في  
انطلاق أشغال  
التهيئة  
AFI



# مشروع إعادة هيكلة مركز تكوين الفتاة الريفية ببني خداش + وحدة مبيت


ب240 سيرير

- الإسراع باستكمال الدراسات والانطلاق في انجاز المشروع خصوصا بعد فض الإشكال العقاري جهويا

- تم اختيار مجمع الدراسات وتم الانطلاق في إنجاز الدراسات الهندسية في 01 مارس 2018 (في طور الدراسة الأولية)،
- ينتظر مراجعة مكونات المشروع في إطار رؤية جديدة لمراكز الفتاة الريفية،
- سنة الإدراج في الميزانية : سنة 2012،
- الكلفة : 5100 أ.د.

## القطب الاقتصادي بجرجيس

- دعم  
المشروع  
والإسراع  
بالانجاز

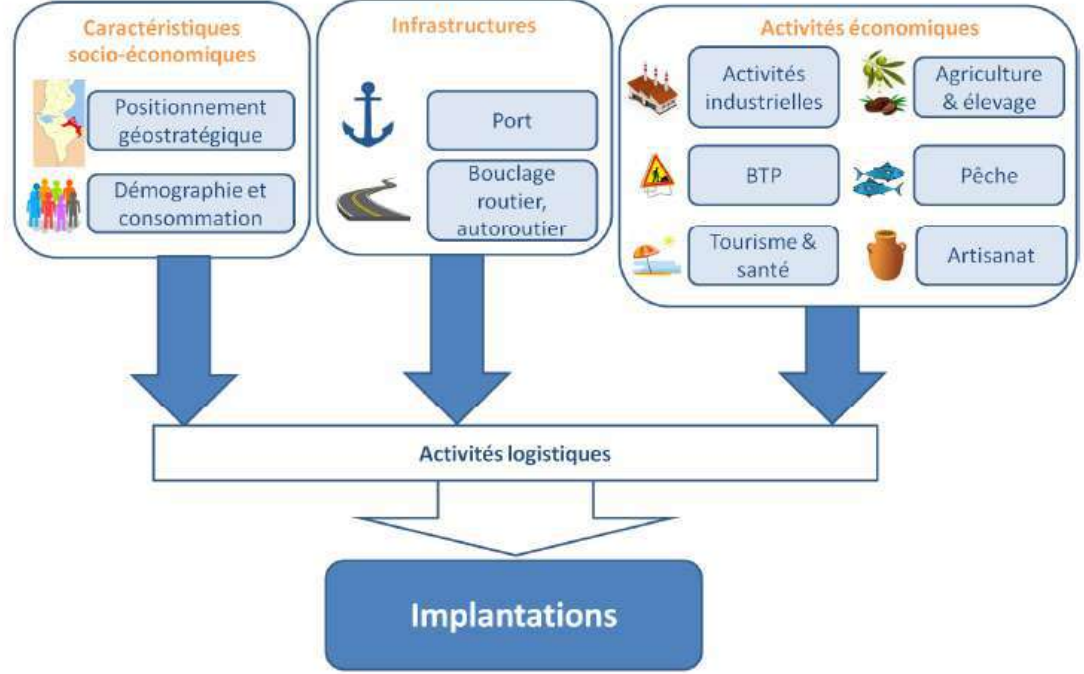

50- مليون دينار الاعتمادات التي تم صرفها لتأهيل ميناء جرجيس،  
-الرصيد العقاري المتوفر في حدود 1000 هكتار،  
-تم انجاز الدراسات المتعلقة بإحداث المنطقة اللوجستية والتي تمسح 200  
هكتار (35 هك قسط أول)

# مشروع القرية الشمسية للبيئة بجرجيس

## القطب التكنولوجي بجرجيس SOLARTECH-SUD

دعم المشروع  
والتدخل لدى  
الهيئة التونسية  
للاستثمار ودعوة  
الوكالة العقارية  
الصناعية للقيام  
بأشغال التهيئة

- حصل على الاعتماد (Accréditation) في الدورة الأخيرة للجنة العليا للإستثمار المنعقدة بتاريخ 07 فيفري 2018. كما تم تصنيفه كمشروع ذو أهمية وطنية من قبل المجلس في دورته المنعقدة بتاريخ 20 جوان 2019. عقدت عديد الإجتماعات بالهيئة كان آخرها يوم 11 مارس 2020 لحث الوكالة العقارية الصناعية على البدء بإجراءات إدخال الأرض في حوزتها العقارية بمراسلة وزارة أملاك الدولة في الغرض. غير أن الوكالة تراجعت بدعوى ضرورة فرز المكون الفلاحي عن المكونات الصناعية والخدماتية وهو موقف وزارة الفلاحة كذلك، إلا أن ذلك لم يقنع المستثمر الذي يعتبر أنه طور مفهوما جديدا للأقطاب التكنولوجية وأن مكوناته في درجة من التكامل والاندماج بما لا يسمح بفرز المكونات الفلاحية عن المكونات الأخرى،

## مقترحات لتجاوز الصعوبات التي تحد من النهوض بالاستثمار الخاص

- الإسراع بإصدار دليل الإجراءات الخاص بالتعهد في ملفات الاستثمار الخاص في الصناعة والخدمات المرتبطة بها على غرار دليل الإجراءات في القطاع الفلاحي،
- الإسراع بإصدار كراسات الشروط للأنشطة الاقتصادية التي تم حذف تراخيصها، الملحق عدد 2 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
- كيفية معالجة مشاريع الصناعات التقليدية التي تفوق طاقة تشغيلها الخمس مواطن شغل،
- تأخر الاعتمادات لصرف المنح والامتيازات،
- التشجيع على تربية الأحياء المائية والقشريات على غرار تربية القمبري وسمك البلطي النيلي والبوري في السباح والأحواض المائية في الأراضي الفلاحية ذات الموارد المائية المرتفعة الملوحة، تسهيل الإجراءات الإدارية في علاقة مع وكالة حماية المحيط،
- مساعدة الجهة على إعداد دراسات إستراتيجية حول المواقع الجديدة لتربية الأسماك والأحياء المائية ووضعها على ذمة الباعثين Prospection des sites marins pour l'élevage des poissons،
- تسهيل النفاذ الى التمويل وخاصة للمشاريع التي تفوق استثماراتها 150 ألف دينار...

## 4. أهم المشاريع التي لم يتم بعد الانطلاق في انجازها

المشاريع	المحتوى المادي	الكلفة (د.ا)	النتائج المرتقبة
<b>القطاع الفرعي : الطرقات والجسور والمسالك</b>			
تهذيب الطريق الجهوية 209 (الماي - ميدون)	12 كلم	7 000	تنمية الحركة الاقتصادية والتجارية
تهذيب الطريق الجهوية 111 (بنقردان - تطاوين)	12 كلم	7 000	
تهذيب الطريق المحلية 970 (مدنين - الساقية)	20 كلم	15 000	
تهذيب الطريق المحلية 942 (والغ-الرياض-تلات-قلالة-سدويكش-المحبوبين)	26 كلم	16 000	
تهيئة و تعبيد الطرق المحلية 970 (بوغرارة الساقية - كروبوب - الرصيفات) في اطار برنامج سد الثغرات	30,5 كلم	23 000	
تدعيم الطريق الجهوية 113 (مدنين- بني خداش)	36 كلم	14 000	
تدعيم الطريق الوطنية 20 (ام التمر توجان)	20 كلم	8 000	
تدعيم الطريق المحلية 971 (بوغرارة - السويطير)	17 كلم	6 500	

## 4. أهم المشاريع التي لم يتم بعد الانطلاق في إنجازها

المشاريع	المحتوى المادي	الكلفة (د.ا)	النتائج المرتقبة
<b>القطاع الفرعي : تهيئة مداخل المدن</b>			
تحسين مدخل الموانسة على الطريق المحلية 946 والطريق المحلية 975	7 كلم	2 000	
تحسين مدخل مدينة بني خداش على الطريق المحلية 964 (بني خداش قصر المحاضرة)	3 كلم	2 000	
<b>القطاع الفرعي: حماية المدن من الفيضانات</b>			
انجاز مشروع حماية مدينة بنقردان من الفيضانات		6 000	
<b>القطاع الفرعي : التهذيب و التجديد العمراني</b>			
تهذيب حي الأنوار ببينقردان		8000	إدماج الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية المرتفعة في محيطها وتدعيم البنية الأساسية والمرافق الجماعية وتقريب الخدمات والارتقاء بجودة الحياة بالعناية بالبيئة والمحيط
تهذيب حي الملعب - النجاح ببينقردان		7 450	

## 4. أهم المشاريع التي لم يتم بعد الانطلاق في انجازها

المشاريع	المحتوى المادي	الكلفة (د.ا)	النتائج المرتقبة
<b>القطاع الفرعي : الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري</b>			
توسعة ميناء حومة السوق من الجهة الشرقية		8 000	توسعة ميناء حومة السوق من الجهة الشرقية
حماية ميناء بوغرارة من التموجات البحرية		3 000	حماية ميناء بوغرارة من التموجات البحرية
<b>القطاع الفرعي: النقل الحديدي</b>			
مد خط السكة الحديدية من قابس الى مدين	إحداث خط حديدي على امتداد 74 كم 200,000	240,000	تسريع الانطلاق في الانجاز خاصة بعد أن تم الانتهاء من الدراسات

## 4. أهم المشاريع التي لم يتم بعد الانطلاق في إنجازها

- ✓إحداث أقسام جديدة بالمستشفى الجامعي بمدنين (الأمراض النفسية وأقسام المسالك البولية والمعدة وإدارة جديدة)
- ✓بناء مبيت للأطباء المستشفى الجامعي بمدنين
- ✓تهيئة مخبر التحاليل الطبية بالمستشفى الجامعي بمدنين
- ✓تهيئة المقر القديم للإستعجالي بالمستشفى الجهوي بجربة لتهيئة قسم العمليات الجراحية والإنعاش + 05 قاعات عمليات + وحدة تعقيم + 15 أسرة إنعاش
- ✓توسيع قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بجربة
- ✓تهيئة مقر وحدة الإسعاف الطبي الإستعجالي بالمستشفى الجهوي جربة
- ✓بناء قسم إنعاش (10 أسرة) بالمستشفى الجهوي بجرجيس
- ✓بناء أقسام للصدرية والقلب والعيون والأنف والحلق والحنجرة بالمستشفى الجهوي بجرجيس
- ✓إحداث مستشفى محلي بأجيم
- ✓إعادة بناء مركز سدويكش بميدون
- ✓بناء قسم الإنعاش الطبي بمستشفى بن قردان
- ✓إحداث قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بين قردان



# الحركة الاقتصادية

## الزراعة والصيد البحري



انجاز **240** مشروعا فلاحيا بكلفة استثمار قدرت بـ **14,4 م.د.** وبطاقة تشغيل تبلغ **252 موطن شغل** ومجموع منح استثمار قدرت بـ **8,7 م.د.**

انجاز **1734** عملية استثمارية فلاحية من صنف أ بكلفة استثمار قدرت بـ **9,9 م.د.** و **4,8 م.د.** منحة استثمار

**403** مشروعا مصرح به بحجم استثمار قدر بـ **50 م.د.**

**260** مشروعا مصادقا عليه بحجم استثمار قدر بـ **24,4 م.د.** و **89** موطن شغل محدث

## الصناعات المعملية والخدمات المرتبطة بها

✓ دخول **15** مشروعا في الانتاج بكلفة استثمار قدرت بـ **38 م.د.** وبطاقة تشغيل تقدر بـ **158 موطن شغل**

✓ تمويل **402** مشروعا في قطاع المهن الصغرى والصناعات التقليدية بكلفة استثمار قدرت بـ **9 م.د.** وبطاقة تشغيل تبلغ **846 موطن شغل**

✓ **90** مشروعا مصرحا به في قطاع الصناعات المعملية بحجم استثمار قدر بـ **65 م.د.** منها **4** مشاريع مصدرة كليا

✓ **837** مشروعا مصرح به في قطاع الخدمات الصناعية وبحجم استثمار قدر بـ **63 م.د.** منها **45** مشروعا مصدرا كليا

✓ انتفاع **8** مشاريع بمنحة التنمية الجهوية (**2,5 م.د.**) وتوفير **105 موطن شغل**

## السياحة

**133** نزل

**49920** سرير

**1.2** مليون وافد

**7.2** ليلة مقضاة

**56 %** نسبة  
ايواء سياحي

بلغ حجم الإستثمارات المصرح بها **129,3 م.د.**  
**97,4 %** منه يهم مشاريع الإيواء السياحي

✓ تمت المصادقة على **10** مشاريع في الإيواء السياحي بحجم استثمارات **10 م.د.** و **76** موطن شغل مقدر  
✓ تمت المصادقة على **50** مشروعا في التنشيط والترفيه السياحي بحجم استثمارات **0,9 م.د.**

## التمويل البنكي وآليات المساهمة في التمويل الذاتي

✓ تمويل **04** مشاريع بطاقة تشغيلية قدرت بـ **10 موطن شغل** وحجم استثمار **3,6 م.د.** من طرف بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة


✓ تمويل **402** مشروعا عن طريق البنك التونسي للتضامن في قطاع المهن الصغرى والصناعات التقليدية بكلفة استثمار قدرت بـ **9 م.د.** وبطاقة تشغيل تبلغ **846** موطن شغل.

✓ تحصل **112** باعث مشروع على التمويل الذاتي من طرف ألية اعتماد الانطلاق وبمبلغ قدر بـ **1 م.د.**

✓ تحصل **02** باعثين على التمويل الذاتي من طرف ألية اعتماد الانطلاق **2** وبمبلغ قدره **0,35 م.د.**

# متابعة إنجاز المشاريع

COVID-19

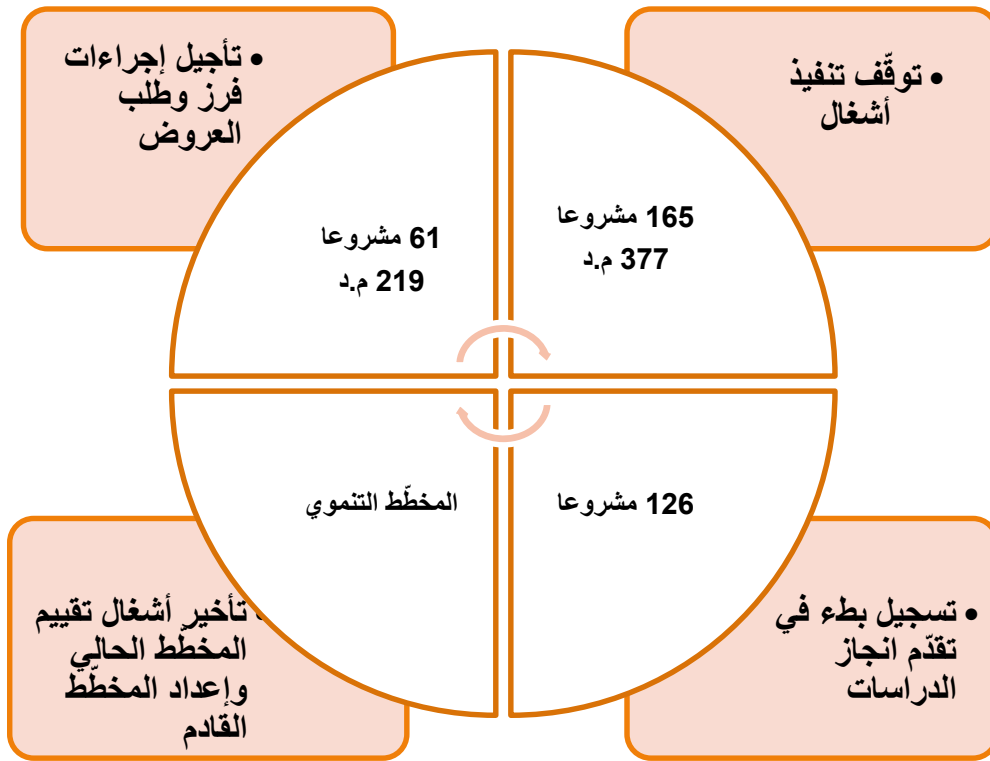

# الاستثمار الخاص

COVID-19



77%

- نسبة تراجع في  
حجم الاستثمار  
المصرّح به في  
قطاع الخدمات  
المرتبطة بالصناعة  
خلال الأربعة أشهر  
الأولى لسنة 2020  
6,6 مليون دينار  
حجم استثمارات  
مقابل 28,7 مليون  
دينار خلال نفس  
الفترة من سنة  
2019



45%

نسبة تراجع  
حجم الاستثمار  
المصرّح به  
في قطاع  
الصناعات  
المعملية خلال  
الأربعة أشهر  
الأولى لسنة  
2020



24,3%

نسبة تراجع  
حجم الاستثمار  
المصرّح به  
في قطاع  
الفلاحة  
والصيد  
البحري خلال  
الأربعة أشهر  
الأولى لسنة  
2020



42.3%

نسبة تراجع  
في حجم  
الاستثمار  
المصرّح به  
في قطاع  
الفلاحة  
الصغرى  
خلال الأربعة  
أشهر الأولى  
لسنة 2020



# الاستثمار الخاص

COVID-19

## COVID-19

- 
- 
- 
- 

غلق **2828** مؤسسة صناعية

تواصل نشاط **17** مؤسسة بعد الحصول على ترخيص والمتعلقة بقطاع الصناعات الغذائية مع انخفاض رقم معاملاتها ومبيعاتها

تعليق نشاط جميع مراكب الصيد بالجر والصيد بالشباك الدائرة نظرا لطبيعة العمل في فضاء ضيق ومغلق لا يمكن من تفادي العدوى والزام مراكب الصيد الساحلي على ألا تتجاوز رحلة الصيد اليوم الواحد من الساعة السادسة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

صعوبة في ترويج المنتجات البحرية بحكم انعدام التنقل بين معتمديات الولاية وخارجها وإعلان جزيرة جربة منطقة موبوءة،  
تأثر نشاط مؤسسات تحويل وتكييف منتجات الصيد البحري (حوالي **12** مؤسسة)  
تأثر **9000** عامل في القطاع

توقف نشاط **1806** وحدة سياحية (ايواء وتنشيط وخدمات)  
إحالة أكثر من **19936** ناشط مشغل على البطالة الفنية



# الاستثمار الخاص

COVID-19

## COVID-19

- 
- 
- 
- 


تأثر القطاع التجاري بالجائحة باستثناء تجارة المواد الغذائية بالتفصيل والجملة والمغازات الكبرى وتجارة الخضر والغلل والصيدليات وغيرها مما له علاقة بإعاشة المواطنين



توقف نشاط **5298** وحدة في قطاع خدمات النقل وخاصة النقل البحري بجرجيس والجوي بمطار جربة جرجيس الدولي، باستثناء قطاع التاكسي

تواصل نشاط القطاع الفلاحي بالمستغلات الفلاحية السقوية المنتجة للخضروات والغلل والمستغلات المطرية إلا أن قطاع تربية الماشية شهد عدم تمكن المربين من ترويج رؤوس الماشية بحكم غلق أسواق الدواب والحد من التنقلات مما نتج عنه ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء

ارتفاع في أسعار أغلب المواد الاستهلاكية خاصة اللحوم البيضاء والخضر والغلل والبيض في علاقة مع تزايد الطلب وارتباط الجهة بالتزويد من مناطق أخرى بالجمهورية التونسية



# الشؤون الاجتماعية

COVID-19




عدد السكان المتأثرين بصفة كبرى من الجائحة بسبب تأثر أرباب العائلات الذي يشتغلون في القطاع الخاص الغير المنظم والقطاع الموازي والقطاعات التي توقفت كلياً عن النشاط كالسياحة وخدمات رياض الأطفال والمقاهي والبناء والأشغال العامة

230 الف ساكن

9028 عائلة معوزة

منتفعة ببطاقة العلاج المجاني ولا يتوفر لديها دخل قار تمتعت بمساعدة نقدية استثنائية بقيمة 50 دينار كإجراء إضافي للمنحة القارة والمقدّرة بـ 180 دينار



7000 مساعدة عينية



21000 عائلة محدودة الدخل



و منتفعة ببطاقة علاج بالتعريف المنخفضة تمتعت بمنحة 200 دينار لكل عائلة. كما تم قبول حوالي 8000 شخص تقدم بمطلب للانتفاع بمنحة المساعدة الاجتماعية والمقدّرة بـ 200 دينار

قدّمتها اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي للحد من تداعيات الأزمة الصحية على العائلات المعوزة و إضافة 400 مساعدة إلى جزيرة جربة و حوالي 65 مساعدة لفائدة اللاجئين المتواجدين بالجهة

# أهم المشاغل التّمْوِيّة

## أولاً: استكمال تنفيذ المخطط 2016-2020 بانجاز أهم المشاريع التالية:

- تهذيب أحياء الملعب- النجاح والأنوار بمعتمدية بنقردان،
- إحداث أقسام جديدة بالمستشفى الجامعي بمدنين (الأمراض النفسية وأقسام المسالك البولية والمعدة وإدارة جديدة)،
- بناء قسم الإنعاش الطبي بمستشفى بن قردان،
- إحداث مستشفى محلي بأجيم،
- حماية مدينتي بنقردان ومدنين من الفيضانات،
- انجاز الطريق الحزامية بمدنين،
- إعادة تهيئة الطريق الرابطة بين مدنين وسيدي مخلوف بطول 22 كلم،
- التسريع بانجاز أشغال جهر ميناء بوغرارة،
- التسريع بانجاز محطة التطهير الريفي ببني خداش.



## **ثانياً: دعم المسار التنموي بالجهة من خلال:**

■ ربط الميناء التجاري وفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس والمنطقة التجارية واللوجستية بينقردان بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية مما يساعد على دعم قطاع النقل العمومي للأشخاص والبضائع والمحافظة على الشبكة الطرقية التي تأكلت بحكم كثافة الحركة من وإلى ولاية مدنين وخاصة مع الجارة ليبيا،

■ دعم نشاط الميناء التجاري بجرجيس وتطويره وذلك بربطه بالشبكة الوطنية والعالمية للنقل البحري للبضائع ليغطي إقليم الجنوب الشرقي وليبيا والجنوب الجزائري وتثمينه في دعم السياحة الساحلية والسياحة الصحراوية بإدراجه كوجهة منتظمة للرحلات السياحية البحرية [croisières]،

■ استكمال ربط المنطقة الصناعية بتاجرة بمدنين الشمالية وفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس والمنطقة التجارية واللوجستية بينقردان بشبكة الغاز الطبيعي،

■ استقطاب المشاريع الكبرى ذات القدرة التشغيلية العالية لفائدة الجهة خاصة وأنها تتوفر على كافة الشروط الموضوعية لذلك بما يحد من معضلة البطالة وبخاصة أصحاب الشرائح العليا،

■ إعادة تهيئة الطريق الرابطة بين مركز الولاية والجرف بتحويلها إلى طريق سريعة ذي اتجاهين بما يساعد على تحسين التنقل من وإلى جزيرة جربة والمطار،

■ دعوة الوكالة العقارية الصناعية لتعزيز تدخلها بالجهة بانجاز المنطقتين الصناعيتين بكل من سدويكش (45 هك) والقريبس بجرجيس (155 هك)،

■ إضافة قسط ثان من برنامج تنمية المناطق الحدودية إلى معتمدية بنقردان،

■ إعادة النظر في خارطة استغلال المياه الجوفية بمنطقة بني خدّاش السفلى المخصّصة للشرب وذلك بالترخيص في حفر الآبار بعد دخول مشروع تحلية مياه البحر حيز الاستغلال،

■ المساعدة على تسريع انجاز مشروع المحطة الكهربائية الهوائية بعين العنبة من معتمدية بني خدّاش،

■ تركيز تمثيلات جهوية لكل من إدارة المياه العمرانية ومركز النهوض بالصادرات،

■ استكمال منظومة القطب التكنولوجي لتنمين ثروات الصحراء بإحداث مؤسسة جامعية هندسية في علاقة باختصاصات معهد المناطق القاحلة والقطب التكنولوجي للجنوب.

■ إحداث كلية الطب،

■ الإسراع بإحداث جامعة للتعليم العالي بمدنين،

■ معالجة الوضع البيئي بجزيرة جربة والتسريع بانجاز المشروع النموذجي للتصرف في النفايات بالجزيرة،

■ برمجة وإنجاز المرحلة الثالثة من مشروع التصرف في الموارد الطبيعية،

■ برمجة إحداث منطقة سقوية بالمياه المعالجة حول محطة التطهير ببنقردان،

■ إحداث وكالة للتصرف في البطاقات.

■ التسريع في إنجاز مشروع الجسر الثابت الرابط بين الجرف وأجيم والذي سيمكن من سهولة التنقل وتحسين ظروف العمل وفك العزلة عن الجزيرة،

■ التسريع بالمصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات مدنين وبنقردان وجرحيس،

■ التسريع بانجاز التطهير الريفي بسيدي مخلوف وحسي عمر،

■ توفير طب الاختصاص والإمكانات البشرية والتجهيزات الطبية اللازمة للمستشفى الجامعي بمدنين بما يتلاءم مع تصنيفه كمستشفى جامعي،

■ توفير وتدعيم المستشفيات الجهوية والمحلية بالإمكانات البشرية والتجهيزات والمعدات الطبية اللازمة ووسائل النقل وسيارات الإسعاف للإرتقاء بجودة الخدمات الصحية ونظرا أيضا لخصوصيات الولاية الحدودية.

الجمهورية التونسية  
وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي  
ديوان تنمية الجنوب  
الإدارة الجهوية للتنمية بمدنين



## قائمة في مشاريع ولاية مدنين والتي تلاقي صعوبات



ماي 2020

المشروع	مكان المشروع	الكلفة (أ.د.)	نسبة الإنجاز	الإشكالية	الطول المقترحة
<b><u>المشاريع المدرجة بالمخطط والتي تلاقى صعوبات في الإنجاز</u></b>					
إنجاز مشروع السكك الحديدية الرابطة بين قابس ومدنين	مدنين - قابس	240000	بالنسبة للمرحلة الأولى المتعلقة بالدراسات التمهيدية APS (في أجل 06 أشهر) فقد تمت المصادقة من طرف مصالح ولاية مدنين خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2019،	في انتظار المصادقة على ملف المرحلة الأولى من طرف مصالح ولاية قابس (الرغبة في تغيير مسار السكة الحديدية القديم واخراج محطة النقل البري الحديدي من وسط مدينة قابس وهو ما يتطلب التغيير الجزئي للمسار القديم والمتعلق بالحدود الترابية لولاية قابس).	العمل على المصادقة على ملف المرحلة الأولى والإسراع بانجاز المرحلة الثانية المتعلقة بالدراسات التفصيلية APD. كما يمكن الانطلاق في الانجاز من ولاية مدنين في انتظار تجاوز الاشكال.
مضاعفة الطّريق الرّومانية بجرية وإحداث فتحة ثانية بها	جرية	48000	8%	تم انطلاق الأشغال 11% - مشروع إحداث فتحة ثانية : ✓ تم تحديد حجم الفتحة الثانية المزمع إنجازها والمقدر بـ 200 متر وموقعها قبالة الوادي "الصغير" ✓ تقوم مصالح وزارة الفلاحة بالتعاون مع مصالح وزارة التجهيز بإعداد الخطوط المرجعية	الاسراع في المصادقة على احداث الفتحة الثانية وايجاد التمويلات اللازمة لها للشروع في الانجاز

المشروع	مكان المشروع	الكلفة (أ.د.)	نسبة الإنجاز	الإشكالية	الحلول المقترحة
				وملف طلب العروض لإنجاز الدراسة التنفيذية المعمّقة، وسيتم الإعلان عن طلب العروض في أقرب الآجال.	
الوضع البيئي والمشروع النموذجي للتصرف في النفايات بجزيرة جربة	جربة	-	بصدد استصلاح موقع خزن لفائف النفايات المنزلية بالمصب الوقتي (منطقة تالبت) بسيدويكش وذلك عن طريق تغطيتها بالأتربة. تم إحداث خانة لردم النفايات بالمصب الوقتي بسيدويكش. تم إبرام اتفاقية بين وزارة السياحة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة لاعتماد الفرز الانتقائي من المصدر داخل النزل السياحية و30 أحياء نموذجية (حي نموذجي بكل بلدية).	ما تم انجازه هو حلول وقتية للخروج من أزمة منظومة التصرف في النفايات المنزلية وماشابهها بجزيرة جربة.	ضرورة إيجاد حل نهائي لأزمة النفايات بالجزيرة والإسراع بإحداث المشروع النموذجي خصوصا بعد حل الإشكال العقاري وتوفير أرض بمساحة حوالي 15 هك بمنطقة سيدويكش بمعتمدية ميدون.
			تم تكليف مقاوله جديدة بداية من 01 ماي 2019 للمعالجة اليومية للنفايات بمصب سيدويكش. تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 هك من المدخر الصناعي بمنطقة سيدويكش		

المشروع	مكان المشروع	الكلفة (أ.د.)	نسبة الإنجاز	الإشكالية	الخطوات المقترحة
			لفائدة وزارة الشؤون المحلية والبيئة لإنجاز المشروع النموذجي وحاليا في مرحلة إخراج العقار من الملك العمومي للمياه من قبل مصالح الوكالة العقارية الصناعية		
إعادة تهيئة الطريق الرابطة بين مدين سيدي مخلوف وسيدي مخلوف بطول 22 كلم (الطريق المحلية 969 في طول 18 كلم والطريق المحلية 967 في طول 4 كلم).	سيدي مخلوف	17000	في مرحلة طلب العروض	طلب العروض يتم على مستوى مركزي	الاسراع بمد المقاول بوثيقة الانطلاق في الاشغال ORDRE DE SERVICE
إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني في الحرف التقليدية بجزيرة وبناء مبيت	جزيرة	3861	تم اقتناء التجهيزات بقيمة 1 مليون دينار	في مرحلة تخصيص قطعة الأرض لفائدة الوكالة التونسية للتكوين المهني لبناء مبيت	
بناء مدرسة إعدادية بمدنين الشمالية	مدنين الشمالية	2300	الدراسة	إشكال عقاري	في انتظار تسوية الملف العقاري لقطعة الأرض المقترحة

المشروع	مكان المشروع	الكلفة (أ،د)	نسبة الإنجاز	الإشكالية	الخطوات المقترحة
المنطقة الصناعية بنقردان	بنقردان	9500	13%	إشكال عقاري	في انتظار البت النهائي في قرار المحكمة العقارية
المنطقة الصناعية بنقردان بمساحة 15.5 هك	بنقردان	4000	100	عهد لإنجازها لشركة المركب الصناعي والتكنولوجي وبعد استقاء كافة الإجراءات الإدارية من دراسات مائية وتحويلها من ملك عمومي للمياه الى ملك الدولة الخاص ونشر والتفويت فيها للشركة بالدينار الرمزي واستكمال تهيئتها فوجئت الجهة بقيام مواطن بقضية يدعي فيها بملكية الأرض وتم البت فيها قضائيا لفائدة في الطور الابتدائي	التسريع في البت القضائي في بقية المراحل
المنطقة الصناعية سيدي مخلوف	سيدي مخلوف	4700	بصد استكمال انجاز الدراسات الفنية	- تم فض إشكال على مستوى استكمال الدراسات الفنية بخصوص الربط بشبكة التطهير بحكم غياب منظومة التطهير في هذه المناطق - تم التعهد بتهيئة هذه المناطق إلى شركة المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين	الإسراع بإيجاد الدعم المالي للشركة للانطلاق في أشغال التهيئة خصوصا بعد إيقاف عملية البيع لمقاسم بنقردان
المنطقة الصناعية قصر الجديد	قصر الجديد	7300			
المنطقة الصناعية بني خداش	بني خداش	3800			
المنطقة	جربة	-	بصد انجاز الدراسة المائية	-	الإسراع في انجاز



المشروع	مكان المشروع	الكلفة (أ.د.)	نسبة الإنجاز	الإشكالية	الحلول المقترحة
الصناعية سدويكش بميدون					الدراسات والانطلاق في الانجاز خصوصا وأنه تمّ التعهد للسكان المحليين بانجاز المشروع بحكم موافقتهم على انجاز المشروع النموذجي في التصرف في النفايات
المنطقة الصناعية القريبية جرجيس	جرجيس	-	لم تتطرق بعد	تمّ إسناد مدخّر عقاري صناعي حذو منطقة مشروع القرية الشمسية بجرجيس والمرغوب الإسراع في تغيير صبغة الأرض والانطلاق في الدراسات	الإسراع في انجاز الدراسات والانطلاق في الانجاز
الانطلاق في إنجاز الطريق الحزامية بمدينة جرجيس بكلفة 53 مليون دينار على أن تتطرق الأشغال في السداسية الثانية لسنة 2018 كأجل أقصى.	جرجيس	57600	- الدراسات جاهزة - تم إعداد المثل العام للقطع المزمع اقتناؤها (plan d'ensemble) - بصدد التصفية العقارية : بصدد الإشهار		الإسراع في طلب العروض والانطلاق في الانجاز

المشروع	مكان المشروع	الكلفة (أ.د.)	نسبة الإنجاز	الإشكالية	الحلول المقترحة
الطريق السيارة قابس مدنين راس جدير	مدنين	1000	تتراوح بين 79 و 97 % حسب الأقساط	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تطبيق التعهدات المدرجة في محاضر الجلسات بخصوص محول بنيري ببنقردان والراقوبة بسيدي مخلوف</li> <li>- الإسراع بتسديد قيمة الأراضي المنتزعة لمستحقيها</li> <li>- الإسراع في البت في القضايا التي تم رفعها من مالكي الأراضي المنتزعة للترفيح في قيمتها</li> </ul>	

**المشاريع المدرجة بالمخطط والتي لم تنطلق بعد**

تهذيب أحياء الملعب- النجاح والأنوار	بن قردان	15000			الإسراع في إنجاز المشروع
إحداث أقسام جديدة بالمستشفى الجامعي بمدنين (الأمراض النفسية وأقسام المسالك البولية والمعدة وإدارة جديدة)	مدنين				
بناء قسم الإنعاش الطبي بمستشفى بن قردان	بن قردان				

الحلول المقترحة	الإشكالية	نسبة الإنجاز	الكلفة (أ.د.)	مكان المشروع	المشروع
				جربة	احداث مستشفى محلي بأجيم
				بنقردان ومدنين	حماية مدينتي بنقردان ومدنين من الفيضانات
					تهذيب أحياء الملعب النجاح والأنوار
				مدنين	إحداث أقسام جديدة بالمستشفى الجامعي بمدنين (الأمراض النفسية وأقسام المسالك البولية والمعدة وإدارة جديدة)
الإسراع في انجاز المشروع				بن قردان	بناء قسم الإنعاش الطبي بمستشفى بن قردان
				جربة	احداث مستشفى محلي بأجيم
الإسراع في انجاز المشروع		تم انجاز الدراسات		مدنين	استكمال الطريق الحزامية بمدنين

المشروع	مكان المشروع	الكلفة (أ.د.)	نسبة الإنجاز	الإشكالية	الحلول المقترحة
<b><u>المشاريع المقترحة من طرف رئاسة الحكومة والتي تشهد صعوبات</u></b>					
الترفيه في عدد الرحلات الجوية الداخلية تونس/ جربة خلال موسم الذروة	جربة		تم تنظيم رحلات وقتية خلال الموسم الصيفي 2019		

وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

الإدارة الجهوية للتنمية بمدنين



# متابعة تنفيذ قرارات زيارة السيّد رئيس الحكومة إلى ولاية مدنين يومي 6 و7 مارس 2017



## ماي 2020

عدد القرارات المنجزة	عدد القرارات التي بصدد الإنجاز	عدد القرارات التي تشهد صعوبات	العدد الجملي للقرارات
21	18	03	42
%50	%42.8	%7.2	%100

### 1.2. القرارات المنجزة

- 1- دعوة وزارة الصناعة والتجارة إلى تسوية وضعية مشروع بورقومول.
- 2- الموافقة على إعلان بنقردان بلدية سياحية.
- 3- تعزيز دار الخدمات بينقردان بطبيب مراقب و فتح مكتب محلي لصندوق التأمين على المرض.
- 4- الترفيع في الاعتمادات المخصصة لبرامج التنمية المندمجة بـ 60 مليون دينار.
- 5- تحويل المستشفى الجهوي بمدنين إلى مستشفى جامعي خلال سنة 2017.
- 6 - الإنتهاء مع نهاية شهر أفريل 2017 من عزل وتغطية المكعبات في موقع سيدويكش حسب الكمية المبرمجة في الصفقة مع المقاول.
- 7- إعطاء كل التراخيص الضرورية للانطلاق في مشروع إقامة وحدات صناعية لإستخراج مادة كلورير البوطاس وغيره من المشتقات المماثلة بكلفة 16 مليون دينار.
- 8- إعطاء الموافقة لحوالي 450 طلب تمويل مشروع صغير لجهة مدنين لإحداث مواطن شغل.
- 9- إحداث فرع للوكالة العقارية الصناعية بمدنين.
- 10- تخصيص إعتمادات قدرها 450 أ.د لإعادة تهيئة قاعة السينما بمدنين لتحتضن الأنشطة الثقافية متعددة الاختصاصات بالجهة (تمت الموافقة المبدئية على مبلغ 1036 أ.د).
- 11- التسريع في إستكمال أشغال تهيئة المركب الرياضي والثقافي بينقردان.
- 12- إنتداب فرد عن عائلة كل شهيد وتوفير الدعم المادي للجرحى إعترافا لهم بالجميل.
- 13- عرض مشروع الأمر الحكومي المتعلق بإسناد الديوان التونسي للتجارة الإمتيازات المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الإستثمارات على مجلس الوزراء القادم بعد تعديل الفصل 4 منه طبقا لمقترح السيد وزير الصناعة و التجارة (تم صدور أمر تخصيص 32.7 م.د لتهيئة الشبكات العمومية بالمنطقة اللوجستية بينقردان).
- 14- تحويز الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بقطعة أرض تمسح 05 هك لتركيز محطة تحويل لربط المنطقة اللوجستية بالتيار الكهربائي (تم التحويز الوقتي).
- 15- تتكفل الدولة بكلفة إنجاز النصب التذكاري لساحة الشهداء كمشروع وطني للإعتراف بتضحيات المواطنين من المدنيين في الدفاع عن حرمة الوطن (100%).
- 16- إنهاء أشغال مركز الفحص الفني بينقردان.

- 17- تمتيع ولاية مدنين بأكثر من 1000 موطن شغل في إطار مبدأ التمييز الإيجابي وضمن برنامج عقد الكرامة.
- 18- إقرار تخطيط وتهذيب طرقات 3 بلديات بولاية مدنين وهي مدنين وجربة أجيم وجرجيس بتكلفة 9 مليون دينار .
- 19- إحكام التنسيق ومتابعة أشغال محطة تحلية مياه البحر ودخولها طور النشاط بصفة تجريبية خلال شهر جوان 2017 وتدعيم شبكة تزويد معتمديتي جرجيس وبنى خداش بالماء الصالح للشرب.
- 20- عرض مشروع القرية الشمسية بجرجيس على أنظار اللجنة العليا للإستثمار للبت في مطالب المستثمر - رفع كل العراقيل أمام مشروع القرية الشمسية و توفير كل التشجيعات الممكنة لأجل إنطلاقه في أسرع وقت وهو مشروع ذي قدرة تشغيلية عالية وقيمة مضافة مرتفعة.
- 21- تأهيل محطات التطهير بجرجيس المدينة وحومة السوق وسيدي محرز وجربة أغير وجرجيس السويحل بكلفة 8 م.د.

## **2.2. القرارات التي يصدد الانجاز**

- 01- عرض مشروع تنقيح إتفاقية النقل الجوي المبرمة بين تونس و الجزائر على اللجنة المشتركة بين البلدين في إجتماعها القادم، وذلك بهدف الترفيع في عدد الرحلات التونسية نحو المطارات الجزائرية.
- 02- مضاعفة الطريق الرومانية و إحداث فتحة ثانية.
- 03- تطوير ميناء جرجيس والعمل على تحفيز تحويل جزء من الرحلات البحرية و التجارة الدولية إليه. مع إنطلاق خط بحري تجاري يربط جرجيس بمرسليلا بداية من شهر جويلية 2017 لتعزيز الحركة التجارية و أيضا لتيسير التنقل لأبناء الجهة بالخارج.
- 04- إنجاز أشغال جهر ميناء بوغرارة : تم اقتراح انجاز فتحات تحت الطريق المؤدية لميناء بوغرارة و حماية حوض الميناء من الجهة الغربية (تخصيص إعتمادات للدراسات 140 أ.د).
- 05- الموافقة على مشروع إحداث فرع لشركة سباق الخيل ببنقردان والتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية لإتمام إجراءات تخصيص قطعة الأرض لفائدته.
- 06- توفير الإعتمادات الضرورية لإنجاز أشغال تأهيل السوق المغاربية ببنقردان على موارد صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية - إسناد أرض مقامة عليها السوق المغاربية بالدينار الرمزي لبلدية بنقردان (تم الإسناد بالدينار الرمزي، مصالح البلدية بصدد إعداد ملف دراسة الجدوى الإقتصادية).
- 07- إنجاز مشروع تطهير مدينة بنقردان.
- 08- تزويد جربة و مدنين وجرجيس بالغاز الطبيعي قبل موفى سنة 2017.
- 09- إستكمال حماية مدينة جرجيس من الفيضانات بتكلفة تبلغ 4 مليون دينار .
- 10- إعادة تعبيد الطريق عدد 118 الرابطة بين مدنين وجرجيس بكلفة جمالية تبلغ 48 مليون دينار .

- 11- الإنطلاق في إنجاز الطريق الحزامية بمدينة جرجيس بكلفة 53 مليون دينار على أن تتطلق الأشغال في السداسية الثانية لسنة 2018 كأجل أقصى.
- 12- الموافقة على إحداث مسلخ جديد ببقردان، على أن تتولى السلط الجهوية توفير قطعة أرض لفائدته.
- 13- إعادة تهيئة الطريق الرابطة بين مدينين و سيدي مخلوف بطول 22 كلم.
- 14- التسريع في إنجاز مشروع السكك الحديدية (تم إنطلاق الدراسات).
- 15- 16- المشروع النموذجي لتحلية المياه المالحة للري الفلاحي بمنطقة بنيري ببقردان.
- 16- إنشاء قاعة متعددة الإختصاصات ببقردان.
- 17- التسريع في حفر آبار عميقة بمنطقة التوي لتحسين نوعية مياه الشرب لمدينة ببقردان.
- 18- بعث مؤسسات صغرى في إطار التشغيل البيئي للجمع و الرسكلة بحوالي 400 نقطة فرز إنتقائي للنفايات من المصدر.

### **3.2. القرارات التي تشهد صعوبات**

- 1- الترفيع في عدد الرحلات الجوية الداخلية تونس/ جربة خلال موسم الذروة (تم تنظيم رحلات وقتية خلال الموسم الصيفي).
- 2- إيجاد حل نهائي للوضع البيئي بجزيرة جربة و إحداث لجنة مشتركة تضم جميع الأطراف المعنية و ممثلين عن ولايتي مدينين و تطاوين لدراسة المواقع المختلفة التي يمكنها احتضان مشروع إحداث وحدة مشتركة بين الولايتين لمعالجة و تثمين النفايات و تقديم مقترحات في الغرض في أقرب الآجال.
- 03- إحداث قسم للحقوق بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدينين.



ع/ر	نص القرار	الهيكل المعني بالتنفيذ	المتابعة على مستوى الجهة	
			حالة التنفيذ	الملاحظات
01	عرض مشروع تنقيح اتفاقية النقل الجوي المبرمة بين تونس والجزائر على اللجنة المشتركة بين البلدين في اجتماعها القادم، وذلك بهدف الترفيع في عدد الرحلات التونسية نحو المطارات الجزائرية.	رئاسة الحكومة وزارة النقل	بصدد الإنجاز	- من أنظار اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية. - توجد حاليا 21 رحلة منظمة بين تونس و الجزائر وقد تم الإنفاق على أن تكون الرحلة عدد 22 مخصصة لمطار جربة.
2	الترفيع في عدد الرحلات الداخلية تونس/جربة خلال موسم الذروة (حوالي 65 رحلة إضافية خلال فصل الصيف) وبرمجة رحلة صباحية (07.00 صباحا) جربة/تونس إنطلاقا من شهر ماي 2017.	وزارة النقل	غير منجز	- إنطلاق الرحلات 15 جوان 2017 بمعدل 03 رحلات أسبوعيا، على الساعة 06.00 صباحا عوضا عن الساعة 07.00 صباحا ولكن وقع الرجوع في القرار بعد الموسم الصيفي. - ضرورة تنظيم رحلات بصفة منتظمة على مدار السنة نظرا لحاجة المواطنين و القطاع السياحي لذلك.
03	إحكام التنسيق و متابعة أشغال محطة تحلية مياه البحر ودخولها طور النشاط بصفة تجريبية خلال شهر جوان 2017 و تدعيم شبكة تزويد معتمديتي جرجيس و بني خداش بالماء الصالح للشرب.	+ وزارة الفلاحة	منجز	- تم انطلاق التشغيل الشبه صناعي لمحطة التحلية بجربة في 20 أفريل 2018 و هي الآن بصدد الإنتاج. - تم تدعيم شبكة تزويد معتمديتي جرجيس و بني خداش بالماء الصالح للشرب .
04	دعوة وزارة الصناعة و التجارة إلى تسوية وضعية مشروع بورقومول بجربة ميدون في إنتظار المصادقة النهائية على مثال التهيئة العمرانية للمدينة.	+ وزارة التجارة	منجز	- تمت تسوية وضعية مشروع بورقومول.
05	مضاعفة الطريق الرومانية بجربة وإحداث فتحة ثانية بها.	+ وزارة التجهيز والإسكان + وزارة الفلاحة	بصدد الإنجاز	1- مشروع مضاعفة الطريق الرومانية : - حاليا تم انطلاق الأشغال 8% و بكلفة 48 مليون دينار . 2- مشروع إحداث فتحة ثانية : - تم تحديد حجم الفتحة الثانية المزمع إنجازها والمقدر بـ 200 متر وموقعها قبالة الوادي "الصغير".

<p>- مصالح وزارة الفلاحة بالتعاون مع مصالح وزارة التجهيز بصدد إعداد الخطوط المرجعية و ملف طلب العروض لإنجاز الدراسة التنفيذية المعمقة، وسيتم الإعلان عن طلب العرض في أقرب الأجل.</p> <p>- تمت مراسلة السيد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتاريخ 23 سبتمبر 2019 حول إنجاز الدراسة التنفيذية للفتحة و التعهد بتمويل إنجازها في إطار إعادة إستغلال بقايا تمويلات المشاريع وذلك تبعاً لما تم الإتفاق عليه في جلسة العمل الوزارية المنعقدة برئاسة الحكومة بتاريخ 02 نوفمبر 2018.</p>				
<p>1- الوضع البيئي بجزيرة جربة :</p> <p>- بصدد إستصلاح موقع خزن لفائف النفايات المنزلية بالمصب الوقتي (منطقة تالبت) بسيدويكش وذلك عن طريق تغطيتها بالأتربة.</p> <p>- تم إحداث خانة لردم النفايات بالمصب الوقتي بسيدويكش.</p> <p>- تم إبرام إتفاقية بين وزارة السياحة ووزارة الشؤون المحلية و البيئة لإعتماد الفرز الإنتقائي من المصدر داخل النزل السياحية و 30 أحياء</p> <p>- نموذجية (حي نمودجي بكل بلدية).</p> <p>- تم تكليف مقاوله جديدة بداية من 01 ماي 2019 للمعالجة اليومية للنفايات بمصب سيدويكش.</p> <p>- تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 هك من المدخر الصناعي بمنطقة سيدويكش لفائدة وزارة الشؤون المحلية و البيئة لإنجاز المشروع النمودجي و حالياً في مرحلة إخراج العقار من الملك العمومي للمياه من قبل مصالح الوكالة العقارية الصناعية.</p> <p>- تم عرض المشروع النمودجي للتصرف في النفايات بجرية للتمويل خلال المنتدى الدولي للشراكة بين القطاع العام و الخاص المنعقد بتونس بتاريخ 18 سبتمبر 2018.</p> <p>- الصعوبات : ضرورة حل إشكالية تحديد موقع للمصب النهائي للنفايات.</p>	<p>صعوبات في التنفيذ</p>	<p>وزارة الشؤون المحلية و البيئة</p>	<p>إيجاد حل نهائي للوضع البيئي بجزيرة جربة و إحداث لجنة مشتركة تضم جميع الأطراف المعنية و ممثلين عن ولايتي مدينين و تطاوين لدراسة المواقع المختلفة التي يمكنها احتضان مشروع إحداث وحدة مشتركة بين الولايتين لمعالجة و ترميم النفايات و تقديم مقترحات في الغرض في أقرب الأجل.</p>	<p>06</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- وقع المصادقة صفة قطب لهذا المشروع .</li> <li>- تم تنفيذ تعهد الدولة بخصوص تدليل الصعوبات.</li> </ul>	<p>منجز</p>	<p>+ رئاسة الحكومة + اللجنة العليا للإستثمار</p>	<p>07</p> <p>عرض مشروع القرية الشمسية للبيئة بجرجيس على أنظار اللجنة العليا للإستثمار للبت في مطالب المستثمر.</p> <p>- رفع كل العراقيل أمام مشروع القرية الشمسية وتوفير كل التشجيعات الممكنة لأجل إنطلاقه في أسرع وقت وهو مشروع ذي قدرة تشغيلية عالية وقيمة مضافة مرتفعة.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم جهر الميناء ليصبح بعمق 11 متر وهو قادر لاستقبال بواخردات حمولة عالية تصل إلى 25 ألف طن.</li> <li>- تم الإنتهاء خلال سنة 2019 من إنجاز مطرف ثاني.</li> <li>- تم تأمين 10رحلات خلال سنة 2018 و 11رحلة سنة 2019.</li> <li>- دعوة الشركة التونسية للملاحة للعمل على برمجة رحلات على كامل السنة بالتنسيق الكامل مع إدارة الميناء وربطها بميناء مرسيليا و جنوة من خلال كراء باخرة للغرض.</li> <li>- دعوة الشركات الخاصة مثل GNV و GRIMALDI لفتح خطوط للمسافرين بين ميناء جرجيس والموانئ الإيطالية.</li> <li>- تم بتاريخ 02 فيفري 2019 إنطلاق الخط التجاري المنتظم الذي سيربط ميناء جرجيس بميناء "دي كارارا" الإيطالي.</li> <li>- تمت مراسلة السيد وزير التجارة حول العمل على تحويل جزء من التجارة الدولية إلى ميناء جرجيس وذلك في مرحلة أولى في مجال توريد الأعلاف وبعض المواد الأساسية الأخرى.</li> <li>- دعوة ديوان التجارة و ديوان الزيت بالجنوب و أصحاب مقاطع الجبس بتطاوين لتأمين رحلات توريد و تصدير السلع عبر ميناء جرجيس.</li> <li>- إقتراح برمجة رحلات سياحية و إحداث خط بحري يربط ميناء جرجيس بالموانئ</li> </ul>	<p>بصدد الإنجاز</p>	<p>+ وزارة النقل + وزارة التجارة + إدارة الميناء التجاري بجرجيس</p>	<p>08</p> <p>- تطوير ميناء جرجيس و العمل على تحفيز تحويل جزء من الرحلات البحرية و التجارة الدولية إليه.</p> <p>- إنطلاق خط بحري تجاري يربط جرجيس بمرسيليا بداية من شهر جويلية 2017 لتعزيز الحركة التجارية وأيضا لتيسير التنقل لأبناء الجهة بالخارج.</p>

<p>الأوروبية.</p> <p>- العمل على تسريع إنجاز القطب الإقتصادي لميناء جرجيس و الذي يضم الميناء التجاري والمنطقة الحرة والمنطقة اللوجستية.</p>				
<p>- تحصل المشروع على الموافقة المبدئية من الصندوق بكلفة 1036 أ.د بتاريخ 05 ديسمبر 2018.</p> <p>- انطلقت أشغال الهيئة و بلغت نسبة 20%.</p> <p>- طلب تمويل إضافي من قبل البلدية بقيمة 400 أ.د لتجهيز القاعة بالمقاعد.</p>	<p>منجز</p>	<p>+ وزارة الشؤون المحلية و البيئة</p>	<p>تخصيص إعتمادات قدرها 450 أ.د لإعادة تهيئة قاعة السينما بمدنين لتحتضن الأنشطة الثقافية متعددة الإختصاصات بالجهة.</p>	<p>09</p>
<p>- تم برمجة إنجاز الدراسة سنة 2020 بكلفة 140 أ.د</p> <p>- لم يقترح إنجاز أشغال جهر ميناء بوغرارة بل تم اقتراح إنجاز فتحات تحت الطريق المؤدية لميناء بوغرارة و حماية حوض الميناء من الجهة الجنوبية.</p>	<p>بصدد الانجاز</p>	<p>+ وزارة التجهيز و الإسكان + وزارة الفلاحة</p>	<p>إنجاز أشغال جهر ميناء بوغرارة (تم اقتراح إنجاز فتحات تحت الطريق المؤدية لميناء بوغرارة و حماية حوض الميناء).</p>	<p>10</p>
<p>- تم تمكين الديوان التونسي للتجارة من إمتياز تحمل الدولة لمصاريف البنية الأساسية الخارجية للمشروع المنصوص عليه بالفصل 52 من مجلة تشجيع الإستثمارات بمقتضى أمر حكومي عدد 346 لسنة 2017 بتاريخ 09 مارس 2017 بمبلغ قدره 32.7 م.د (خال من القيمة المضافة) والتي تشمل الربط بالشبكات العمومية للمنطقة لحررة للأنشطة التجارية و اللوجستية بينقردان.</p> <p>- إنطلقت أشغال البنية الأساسية لمشروع المنطقة التجارية و اللوجستية بينقردان بعد أن تم وضع حجر أساسها بتاريخ 07 مارس 2019.</p>	<p>قرار منجز</p>	<p>+ رئاسة الحكومة + وزارة التجارة</p>	<p>عرض مشروع الأمر الحكومي المتعلق بإسناد الديوان التونسي للتجارة الإمتيازات المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الإستثمارات على مجلس الوزراء القادم بعد تعديل الفصل 4 منه طبقا لمقترح السيد وزير الصناعة و التجارة.</p>	<p>11</p>

<p>- تم التحويل وقي بقطعة أرض (5 هك بسبخة المنيخة طريق رأس جدير) موضوع الطلب ليتسنى لها الشروع في تركيب المحطة موضوع الطلب و ذلك في إنتظار استكمال الإجراءات المستوجبة لإنجاز عملية التفويت المذكورة.</p> <p>- المشروع في مرحلة الدراسة و ضمن مشاريع نقل الكهرباء للمخطط الثالث عشر للشركة التونسية للكهرباء و الغاز.</p>	<p>قرار منجز</p>	<p>+ وزارة الصناعة</p>	<p>2 تحويل الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقطعة أرض تسمح 5 هك بالمنطقة اللوجستية بين قردان في الإبان لتركيب محطة تزويد المنطقة بالطاقة الكهربائية (تركيب محطة كهرباء لتحويل الكهرباء ذات الجهد العالي).</p>
<p>- تم رصد اعتماد مالي بقيمة 1 مليون دينار لفائدة شركة سباق الخيل.</p> <p>- تم صدور أمر الحكومي يتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه إلى ملك الدولة الخاص و المساحة 42 هك 30 آر 98 ص لوضعه على ذمة شركة سباق الخيل لاستغلالها كميدان لسباقات الخيل.</p> <p>- تم الإعلان على طلب العروض.</p> <p>- برمجة فتح العروض 30 ديسمبر 2019.</p>	<p>بصدد الإنجاز</p>	<p>+ وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري</p>	<p>13 الموافقة على مشروع إحداث فرع لشركة سباق الخيل بين قردان و التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية لإتمام إجراءات تخصيص قطعة الأرض لفائدته.</p>
<p>- بعد مصادقة مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط على الملف الفني للمشروع من المبرمج الإعلان عن طلب العروض قبل موفى سنة 2019 بعد إعداده من طرف المصممين و المهندسين المستشارين.</p> <p>- تم التحويل الوقي لبلدية بنقردان في قطعة الأرض موضوع المشروع النموذجي على مساحة 3 هكتار و 50 آر (بين طريق المقسيم و طريق جميلة).</p> <p>- تمويل المشروع (7 مليون دينار):</p> <p>* قسط 1: ممول من قبل صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية بقيمة 1.5 مليون دينار في شكل منحة للبلدية.</p> <p>* قسط 2: ممول من الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية FIDA بقيمة 5.5 مليون دينار و ذلك في إطار مشروع التنمية الزراعية و الرعوية PRODEFIL.</p>	<p>بصدد الإنجاز</p>	<p>+ وزارة الشؤون المحلية و البيئة + وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري + وزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية + بلدية بنقردان</p>	<p>14 الموافقة على إحداث مسلخ جديد بينقردان، على أن تتولى السلط الجهوية توفير قطعة الأرض لفائدته.</p>

15	الموافقة على إعلان بنقردان بلدية سياحية.	+ وزارة الشؤون المحلية + وزارة السياحة	قرار منجز	- تم صدور الأمر الحكومي المتعلق بإعلان بنقردان بلدية سياحية.
16	تعزيز دار الخدمات ببنقردان بطبيب مراقب إبتداءا من شهر مارس 2017 وفتح مكتب محلي لصندوق التأمين على المرض في غضون 6 أشهر، وذلك بهدف مزيد تقرب الخدمات من المواطن.	+ وزارة الشؤون الإجتماعية	تم تنفيذ القرار	- تم إفتتاح المركز المحلي للصندوق الوطني للتأمين على المرض ببنقردان في يوم 03 جويلية 2017.
17	توفير الإعتمادات الضرورية لإنجاز أشغال تأهيل السوق المغربية ببنقردان على موارد صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية. - إسناد أرض مقامة عليها السوق المغربية بالدينار الرمزي لبلدية بنقردان.	+ وزارة الشؤون المحلية و البيئة	بصدد الإنجاز	- تم التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية مقامة عليها السوق المغربية لفائدة بلدية بنقردان. - بصدد إعداد ملف الموافقة المبدئية على التمويل من قبل البلدية. - إعداد ملف الجدوى الإقتصادية و المالية للمشروع شهد صعوبات في إمضاء عقود الكراء مع أصحاب الفضاءات التجارية بالسوق .
18	إنجاز مشروع تطهير مدينة بنقردان.	وزارة الشؤون المحلية و البيئة	بصدد الإنجاز	- تقدم الإنجاز 95%.
19	الحرص على إنهاء أشغال مركز الفحص الفني في الأجال المحددة (جوان 2017).	وزارة النقل	قرار منجز	- تم افتتاح المركز للعموم.
20	الموافقة على المشروع النموذجي لتحلية المياه المالحة للري الفلاحي بمنطقة بنيري ببنقردان.	+ وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري	بصدد الإنجاز	- وقع نشر طلب عروض جديد بتاريخ 01 جويلية 2019 وتمت مرحلة الفرز لاختيار مكتب دراسات مختص يشرف على إعداد الدراسة و ملف طلب العروض تبعا لتوصيات الإدارة العامة للهندسة الريفية بوزارة الفلاحة و ذلك لإنجاز محطة التحلية (هندسة مدنية و تجهيزات) على موارد وزارة الفلاحة التي رسمت مبلغ 1000 أ.د (ميزانية 2018) لتمويل هذا المشروع. - قامت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على مواردها الذاتية بتمويل و إنجاز البئر العميقة بإعتماد مالي يناهز 90 أ.د : تقدم الإنجاز 100%.

21	الترفيه في الإعتمادات المخصصة لبرامج التنمية المدمجة بـ 60 م.د.	+ وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي	منجز	- برنامج يشمل 06 معتمديات (مدنين الجنوبية، بنقردان، جرجيس، جربة حومة السوق، جربة أجيم، جربة ميدون). - تم إمضاء عقود برامج التنمية المدمجة يوم 17 أفريل 2018 و الانطلاق في إعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع.
22	تتكفل الدولة بكلفة إنجاز النصب التذكري لساحة الشهداء كمشروع وطني للإعتراف بتضحيات المواطنين من المدنيين في الدفاع عن حرمة الوطن .	+ رئاسة الحكومة	منجز	- القسط الأول و الثاني للمشروع منجز: 100% على ميزانية المجلس الجهوي بمدنين
23	تزويد جربة ومدنين و جرجيس بالغاز الطبيعي قبل موفى سنة 2017.	+ وزارة الصناعة	بصدد الإنجاز	- تم مد الأنابيب الناقلة للغاز (ضغط مرتفع 76 بار و ضغط متوسط 20 بار) بالنسبة لكل الأقسام (100%)، و تسريح الغاز بالأنبوب الرئيسي. - تم الانطلاق في إنجاز محطة خفض الغاز بسيدي منصور بجربة ميدون. - تم تشغيل الأنبوب بالغاز بتاريخ 20 سبتمبر 2018 بالنسبة لقسط مدنين. - تم مد كل قنوات الضغط المتوسط بالنسبة لقسط جرجيس، و في مرحلة متابعة إنجاز محطتي خفض الضغط بصانغو و الظوهر نظرا لتأخر إنجازهما.
24	التسريع في إنجاز مشروع السكك الحديدية الرابطة بين قابس ومدنين بتكلفة جملية تقدر بـ 200 مليون دينار مع التعهد بإستكمال كل الإستعدادات للإنطلاق في الأشغال. الكلفة المحيئة : 240 م.د	+ وزارة النقل	بصدد الإنجاز	- تشرف مصالح الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على إنجاز مراحل المشروع و قد انطلقت الدراسات الفنية للخط الرابط بين مدنين و قابس (طول السكة 74 كلم) خلال شهر مارس 2018 لمدة 14 شهرا دون اعتبار آجال المصادقة وهي كالتالي : ➤ بالنسبة للمرحلة الأولى المتعلقة بالدراسات التمهيديّة APS (في أجل 06 أشهر) فقد تمت المصادقة من طرف مصالح ولاية مدنين خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2019، في حين لا تزال مصالح ولاية قابس رافضة للمسار المقترح و يجري حاليا النظر في جدوى مقترح تحويل محطة القطار خارج مدينة قابس تبعا للقرار الصادر عن المجلس الوزاري المضيق المتعلق بولاية قابس المنعقد في 23 أوت 2019 .

<p>➤ بالنسبة للمرحلة الثانية المتعلقة بالدراسات التفصيلية APD (في أجل 06 أشهر) فهي في انتظار المصادقة على ملف المرحلة الأولى من طرف الشركة والسلط الجهوية وكل المتدخلين.</p> <p>➤ بالنسبة للمرحلة الثالثة المتعلقة بإعداد طلب العروض (في أجل 02 شهر) فهي مرتبطة بدورها بالمصادقة على ملف المرحلة الثانية.</p> <p>➤ الأجال المحتملة لإنطلاق الأشغال تضبط بالتدقيق حسب نتائج الدراسات.</p> <p>- تم عقد اللجنة الجهوية للشبكات بتاريخ 28 مارس 2019 بمقر الولاية حول "الدراسة التمهيدية و برمجة إنطلاق الأشغال بداية من مدينة مدينين" وذلك تبعا لما تم إقتراحه في الجلسة المنعقدة بمقر وزارة النقل بتاريخ 22 فيفري 2019 بخصوص إنطلاق أشغال المشروع بداية من مدينين في إتجاه قابس.</p> <p>- ملاحظة: تم موافقتنا من قبل وزارة النقل بتاريخ 11 أكتوبر 2019 بنسخة للدراسة الفنية و الإقتصادية (Etude de préféabilité الخاصة بمشروع الخط الحديدي قابس-مدينين-جرجيس التي تم إنجازها في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الجمهورية التونسية و جمهورية الصين الشعبية بتاريخ 04 سبتمبر 2018.</p>				
<p>- تم الإنجاز.</p> <p>- الكلفة: 9 مليون دينار</p>	منجز	+ وكالة التهذيب والتجديد العمراني	إقرار تبليط و تهذيب طرقات 3 بلديات وهي مدينين و جربة أجم و جرجيس.	25
<p>- إذن بداية الأشغال للمقاوله بتاريخ 26 جويلية 2018.</p> <p>- حاليا الأشغال بصدد الإنجاز (70%)</p>	بصدد الإنجاز	+ وزارة التجهيز والإسكان	إستكمال حماية مدينة جرجيس من الفيضانات بتكلفة تبلغ 4 مليون دينار و إنطلاق الأشغال في الثلاثي الأول من سنة 2018.	26



27	إعادة تعبيد الطريق عدد 118 الرابطة بين مدينين و جرجيس.	+وزارة التجهيز والإسكان	بصدد الإنجاز	- نسبة تقدم أشغال التعبيد : (70%) و بكلفة 38 م.د - إنجاز منشأة فنية على مستوى وادي بوحامد : منجزة 100% بكلفة 8.2 م.د
28	الانطلاق في إنجاز الطريق الحزامية بمدينة جرجيس بكلفة 53 مليون دينار على أن تنطلق الأشغال في السداسية الثانية لسنة 2018 كأجل أقصى.	+وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	بصدد التنفيذ	- كلفة المشروع 57.6 م.د و بطول 21 كلم - الدراسات جاهزة - تم إعداد المآل العام للقطع المزمع اقتناؤها (plan d'ensemble). - بصدد التصفية العقارية : بصدد الإشهار
29	إعادة تهيئة الطريق الرابطة بين مدينين و سيدي مخلوف بطول 22 كلم (الطريق المحلية 969 في طول 18 كلم و الطريق المحلية 967 في طول 4 كلم).	+وزارة التجهيز والإسكان	بصدد الإنجاز	- بصدد إعداد ملف الصفقة بالمصالح المركزية لوزارة التجهيز. - كلفة المشروع : 17 مليون دينار
30	إحداث فرع للوكالة العقارية الصناعية بمدينين لحل المشاكل العقارية التي تعيشها الجهة و تذليل الصعوبات و الضعف في الرصيد العقاري الصناعي لدفع الإستثمار.	+وزارة الصناعة +الوكالة العقارية الصناعية	منجز	- تم عرض ملف إحداث فرع للوكالة العقارية الصناعية بمدينين على مجلس الإدارة و المصادقة عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2017. - تم تسونغ مقر بمدينة مدينين و تعيين ممثل جهوي للوكالة.
31	إحداث قسم للحقوق بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدينين.	+وزارة التعليم العالي والبحث العلمي + جامعة قابس	صعوبة في الإنجاز	- إنعقد المجلس العلمي للمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتاريخ 06 جويلية 2018 و تمت الموافقة على إحداث شعبة الحقوق في السنة الجامعية 2019-2020 على أن تتم مراعاة النقاط التالية : ▪ تغيير إسم المؤسسة بما يتناسب مع مضامين اختصاصاتها كأن يكون " المعهد العالي للعلوم الإنسانية و القانونية بمدينين". ▪ تعيين إطار تدريس قار من السلك الجامعي في اختصاص الحقوق. ▪ النظر في توفير فضاء تدريس وظيفي لشعبة الحقوق حيث أن الفضاء الحالي لا يمكن أن يستوعب أعدادا كبيرة من الطلبة. - تبعا لجلسة العمل الوزارية المنعقدة برئاسة الحكومة بتاريخ 02 نوفمبر 2018 ، تمت دعوة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي إلى أخذ كل التدابير اللازمة لإحداث قسم للحقوق بالمعهد العالي للعلوم

				الإنسانية بمدنين خلال السنة الجامعية المقبلة 2019-2020 من خلال توفير العنصر البشري و اللوجستي.
32	إتخاذ كل الإجراءات و الإستعدادات لتحويل المستشفى الجهوي بمدنين إلى مستشفى جامعي خلال سنة 2017.	+ وزارة الصحة	منجز	- تم صدور القرار المتعلق بتحويل المستشفى الجهوي بمدنين إلى مستشفى جامعي.
33	تأهيل محطات التطهير بجرجيس المدينة وحومة السوق وسيدي محرز وجربة أغبر و جرجيس السويحل بكلفة 8 م.د.	+ وزارة الشؤون المحلية والبيئة	منجز	- تقدم الإنجاز: 100%.
34	الإنهاء مع نهاية شهر أفريل 2017 من عزل و تغطية المكعبات في موقع مصب سيدويكش مع إيجاد حل في ظرف الأشهر القليلة المقبلة لهذا المصب لمعالجة النفايات.	+ وزارة الشؤون المحلية و البيئة	منجز	- تم استعمال 30 ألف متر مربع من الغشاء العازل حسب الصنف المبرمة.
35	بعث مؤسسات صغرى في إطار التشغيل البيئي للجمع و الرسكلة بحوالي 400 نقطة فرز إنتقائي للنفايات من المصدر. (منها 05 مؤسسة بولاية مدنين).	+ وزارة الشؤون المحلية و البيئة	بصدد الإنجاز	- برنامج وطني (startup green) بالتعاون بين وزارة الشؤون المحلية و البيئة و وزارة التكوين المهني و التشغيل. - تم إضافة عدد 02 نقطة إيكولف خاصة ببنقردان و عدد 01 نقطة إيكولف خاصة بجربة حومة السوق لتصبح ثمانية نقاط حاليا بكامل الولاية (جمع النفايات البلاستيكية القابلة للرسكلة).
36	إعطاء كل التراخيص الضرورية للانطلاق في مشروع إقامة وحدات صناعية لمعالجة مياه الرجيع لإستخراج مادة كلورير البوطاس و غيره من المشتقات المماثلة بكلفة 16 م.د.	+ وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة	منجز	- مشروع تحصل على التراخيص الضرورية و قد بلغت كلفة المشروع 18240 أ.د.
37	تمتع ولاية مدنين بأكثر من 1000 مواطن شغل في إطار مبدأ التمييز الإيجابي و ضمن برنامج عقد الكرامة.	+ وزارة التكوين و التشغيل	منجز	- 1155 منتفع
38	المشروع : إعطاء الموافقة لحوالي 450 طلب تمويل مشروع صغير لجهة مدنين لإحداث مواطن شغل	+ رئاسة الحكومة	منجز	- تم تمكين كل أصحاب المشاريع الصغرى من القروض المطلوبة.

			بشكل فوري و مباشر بقيمة 5.6 مليون دينار.	
39	انتداب فرد عن عائلة كل شهيد و توفير الدعم المادي للجرحى إعترافا لهم بالجميل.	+ وزارة الشؤون الإجتماعية	منجز	- تم تشغيل فرد من كل عائلة شهيد. - تم صرف إتمادات التعويض لكل عائلات الشهداء. - تم صرف إتمادات التعويض بالنسبة للجرحى.
40	إنشاء قاعة متعددة الإختصاصات بينقردان.	+ وزارة الشباب و الرياضة	بصدد الإنجاز	- كلفة المشروع : 4330 أ.د - بصدد إعادة الصفقة نظرا لعدم إيفاء المقاول بتعهداته.
41	التسريع في إستكمال أشغال تهيئة المركب الرياضي و الثقافي بينقردان . (موقع الأشغال : أرض بمعهد بنقردان)	وزارة التربية	منجز (القسط الأول)	- تم إنجاز القسط الأول بكلفة 1.2 مليون دينار - الكلفة الجمالية للمشروع : 4 مليون دينار. - ضرورة الإسراع في إنجاز القسط الثاني.
42	التّسريع في حفر آبار عميقة بمنطقة التوي لتحسين نوعية مياه الشرب لمدينة بنقردان. (إنجاز محطة لتحلية المياه الجوفية بطاقة إنتاج 9000 متر مكعب في اليوم، إقتناء أرض بمساحة 2 هكتار، إنجاز 04 خزانات نصف مغمورة، حفر و تجهيز و كهربة عدد 08 آبار، وضع قنوات، إنجاز عدد 02 محطة ضخ، إنجاز عدد 02 محطة معالجة).	وزارة الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري	بصدد الإنجاز	- تم تركيز الحضيرة لحفر البئر العميقة "رواق 2" لاستكشاف الطبقة المائية من طرف شركة EQUIPEMENTS HYDRAULIQUE و بصدد إعداد طلب عروض لحفر بئر ثانية. - سيتم نشر طلب عروض للمرة الثانية للتقييم الأولي لإنجاز محطة التحلية حال الإنهاء من حفر البئر العميقة "رواق2".

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

ديوان تنمية الجنوب

الإدارة الجهوية للتنمية مدين



تقرير حول متابعة توصيات لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب إثر الزيارة  
الميدانية لولاية مدين بتاريخ 19 جانفي 2018



مارس 2020

## تمهيد

يهتم هذا التقرير بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب في دورته الرابعة (2017-2018) إثر الزيارة الميدانية إلى ولاية مدين بتاريخ 19 جانفي 2018 للوقوف على حقيقة الوضع التنموي بالجهة وتحديد المعوقات التي تعترض تنفيذ المشاريع والبرامج العمومية والخصوصية بالجهة.

التوصيات	متابعة التنفيذ
<b>وزارة النقل</b>	
<p>ربط الميناء التجاري وفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس والمنطقة التجارية واللوجستية ببنقردان بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح المشاريع الكبرى ودعم قطاع النقل العمومي للأشخاص والبضائع والمحافظة على الشبكة الطرقية التي تأكلت بحكم كثافة الحركة من ولاية مدينين وبخاصة مع ليبيا.</p>	<p>تم إمضاء مذكرة تفاهم بين الحكومة التونسية وجمهورية الصين الشعبية لإنجاز 3 دراسات جدوى لمشاريع كبرى بولاية مدينين ومن بينها دراسة ربط الشبكة الوطنية للسكك الحديدية قابسمدينين-جرجيس، وقد تم انجاز الدراسة</p>
<p>دعم نشاط الميناء التجاري جرجيس وتطويره وذلك بربطه بالشبكة الوطنية والعالمية للنقل البحري للبضائع ليغطي إقليم الجنوب الشرقي وليبيا والجنوب الجزائري.</p>	<p>تم بتاريخ 02 فيفري 2019 انطلاق الخط التجاري المنتظم الذي سيربط ميناء جرجيس بميناء "ديكارارا" الإيطالي.</p> <p>- تمت مراسلة السيد وزير التجارة حول العمل على تحويل جزء من التجارة الدولية إلى ميناء جرجيس وذلك في مرحلة أولى في مجال توريد الأعلاف وبعض المواد الأساسية الأخرى.</p> <p>- دعوة ديوان التجارة وديوان الزيت بالجنوب وأصحاب مقاطع الجبس بتطاوين لتأمين رحلات توريد وتصدير السلع عبر ميناء جرجيس.</p>
<p>التسريع في انطلاق دراسات مشروع مد شبكة السكة الحديدية إلى مدينة مدينين.</p>	<p>تشرف مصالح الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على إنجاز مراحل المشروع وقد انطلقت الدراسات الفنية للخط الرابط بين مدينين وقابس (طول السكة 74 كلم) خلال شهر مارس 2018 لمدة 14 شهرا دون اعتبار آجال المصادقة وهي كالتالي:</p> <p>➤ بالنسبة للمرحلة الأولى المتعلقة بالدراسات التمهيديّة APS (في أجل 06 أشهر) فقد تمت المصادقة من طرف مصالح ولاية مدينين خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2019، في حين لا تزال مصالح ولاية قابس رافضة للمسار المقترح ويجري حاليا النظر في جدوى مقترح تحويل محطة القطار خارج مدينة قابس تبعا للقرار الصادر عن المجلس الوزاري المضيق المتعلق بولاية قابس المنعقد في 23 أوت 2019.</p> <p>➤ بالنسبة للمرحلة الثانية المتعلقة بالدراسات التفصيلية APD (في أجل 06 أشهر) فهي في انتظار المصادقة على ملف المرحلة الأولى من</p>

<p>طرف الشركة والسلط الجهوية وكل المتدخلين.</p> <p>➤ بالنسبة للمرحلة الثالثة المتعلقة بإعداد طلب العروض (في أجل 02 شهر) فهي مرتبطة بدورها بالمصادقة على ملف المرحلة الثانية.</p> <p>➤ الأجال المحتملة لانطلاق الأشغال تضبط بالتدقيق حسب نتائج الدراسات.</p> <p>- تم عقد اللجنة الجهوية للشبكات بتاريخ 28 مارس 2019 بمقر الولاية حول "الدراسة التمهيدية وبرمجة انطلاق الأشغال بداية من مدينة مدينين" وذلك تبعا لما تم اقتراحه في الجلسة المنعقدة بمقر وزارة النقل بتاريخ 22 فيفري 2019 بخصوص انطلاق أشغال المشروع بداية من مدينين في اتجاه قابس.</p> <p>ملاحظة: قامت وزارة النقل بتاريخ 11 أكتوبر 2019 بتوجيه نسخة من الدراسة الفنية والاقتصادية (Etude de préféabilité الخاصة بمشروع الخط الحديدي قابس- مدينين- جرجيس التي تم إنجازها في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية بتاريخ 04 سبتمبر 2018 إلى الجهة.</p>	
<p>- من أنظار اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية. توجد حاليا 21 رحلة منظمة بين تونس والجزائر وقد تم الإنفاق على أن تكون الرحلة عدد 22 مخصصة لمطار جربة.</p>	<p>تسريع تفعيل قرار العمل بنظام السماء المفتوحة وتعزيز ربط الجهة بالأسواق السياحية العالمية وفي مقدمتها السوق الجزائرية وذلك بإحداث خط جوي منتظم بين جربة وعاصمة الجزائر طبقا لاتفاق النقل الجوي المبرم بين الدولتين سنة 2015.</p>
<b>وزارة المالية</b>	
<p>تم توفير آلية اعتماد الانطلاق 1 و 2 لتوفير التمويل الذاتي للباعثين، وتم التعهد للجنة الجهوية يرأسها المدير الجهوي للتنمية للتصرف في آلية اعتماد الانطلاق 1 وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتصرف بألية اعتماد الانطلاق 2.</p>	<p>مراجعة القوانين المنظمة لهياكل التمويل والمساندة خاصة في علاقة بالبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدفع وتحفيز الانتصاب للحساب الخاص والاستثمار بالجهة.</p>
<b>وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</b>	
	<p>استحداث نسق عمليات المسح العقاري.</p>
<b>وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي</b>	
<p>توجد العديد من البرامج الخصوصية كالبرنامج الجهوي للتنمية، وبرنامج التنمية المندمجة وهو ويصدد الإنجاز للجيل</p>	<p>برمجة وضع استراتيجية للنهوض بالاستثمار الداخلي الضعيف والتنمية الجهوية.</p>

<p>الثالث ب6معمديات وهي بنقردان ومدنين الجنوبية وجرجيس ومعمديات جزيرة جربة بكلفة 60 م د والعمل على تدعيم مشاريع الجيل الأول للمعمديات بني خداش وسيدي مخلوف ومدنين الشمالية بكلفة استثمار في حدود 10 مليون دينار</p>	
<p>تم الانطلاق في انجاز مكونات البرنامج المخصص لمعمديات مدنين الجنوبية وأجيم وميدون وحومة السوق وجرجيس وبنقردان</p>	<p>التسريع في انط لاق إنجاز برنامج التنمية المندمجة المخصص ل6معمديات بقيمة 60م.د.</p>
<p>تم انجاز القسط الأول ولم يبرمج انجاز قسط ثان.</p>	<p>إضافة قسط ثان من برنامج تنمية المناطق الحدودية إلى معمديّة بنقردان.</p>
<p><b>وزارة الشؤون المحلية والبيئة</b></p>	
<p>منجز</p>	<p>دعم العمل البلدي في مستوى العناية بالبيح والمحيط.</p>
<p>1- الوضع البيئي بجزيرة جربة :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- بصدد استصلاح موقع خزن لفائف النفايات المنزلية بالمصب الوقتي (منطقة تالبت) بسيدويكش وذلك عن طريق تغطيتها بالأتربة.</li> <li>- تم إحداث خانة لردم النفايات بالمصب الوقتي بسيدويكش.</li> <li>- تم إبرام اتفاقية بين وزارة السياحة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة لاعتماد الفرز الانتقائي من المصدر داخل النزل السياحية و30 أحياء</li> <li>- نموذجية (حي نموذجي بكل بلدية).</li> <li>- تم تكليف مقابلة جديدة بداية من 01 ماي 2019 للمعالجة اليومية للنفايات بمصب سيدويكش.</li> <li>- تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 هك من المدخر الصناعي بمنطقة سيدويكش لفائدة وزارة الشؤون المحلية والبيئة لإنجاز المشروع النموذجي وحاليا في مرحلة إخراج العقار من الملك العمومي للمياه من قبل مصالح الوكالة العقارية الصناعية.</li> <li>- تم عرض المشروع النموذجي للتصرف في النفايات بجزيرة للتمويل خلال المنتدى الدولي للشراكة بين القطاع العام والخاص المنعقد بتونس بتاريخ 18 سبتمبر 2018.</li> </ul> <p>الصعوبات: ضرورة حل إشكالية تحديد موقع للمصب النهائي للنفايات.</p>	<p>استحداث انجاز وحدة التصرف في النفايات جزيرة جربة.</p>



تم التخلي عن المشروع نظرا لاعتراض المواطنين	-استكمال إنجاز مركز تحويل النفايات بحسي الجربي.
برنامج وطني (startup green) بالتعاون بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة و وزارة التكوين المهني والتشغيل. تم إضافة عدد 02 نقطة إيكولف خاصة ببنقردان و عدد 01 نقطة إيكولف خاصة بحومة السوق لتصبح ثمانية نقاط حاليا بكامل الولاية (جمع النفايات البلاستيكية القابلة للرسكلة).	التسريع في إجراءات إعادة طلب العروض لبعث مؤسسات صغرى في إطار التشغيل البيئي للجمع والرسكلة بحوالي 400 نقطة فرز انتقائي للنفايات من المصدر.
غير منجز	الإسراع بإحداث إدارة جهوية للمياه العمرانية بمدنين خاصة وأن الأمطار الأخيرة أظهرت العديد من العيوب في مجال تصريف مياه الأمطار والأودية.
<b>وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري</b>	
بصدد الإنجاز	التسريع في تركيز رافعة بميناء الصيد البحري بحومة السوق.
	وضع برنامج يُعيد مكانة قطاع الفلاحة بما أنه ذي أولوية كقطاع السياحة واتخاذ إجراءات لدفع الاستثمار الفلاحي بالجهة.
غير مبرمج	برمجة إنجاز المرحلة الثالثة من مشروع التصرف في الموارد الطبيعية.
بصدد اعداد فلم ترويجي للقطب التكنولوجي للجنوب من طرف ديوان تنمية الجنوب	دعوة الوزارة لدعم القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء والطاقات الكامنة فيها على استغلال الفضاء الصناعي الممتد على مساحة 40 هك وذلك بوضع خطة تدخل للغرض والمساعدة على تنفيذها.
- انتهت أشغال البناء الخزاناتو المبانيفي جويلية 2017	تعزيز طاقة الخزن وتحسين تزويد مدينة مدنين وأحوازها بالماء الصالح للشرب.
- تم تحسين تزويد منطقة قصر الجديد: حفر بئر عميقة وبناء خزان ومد 4200 متر من القنوات - تعزيز طاقة الخزن وتحسين تزويد مدينة مدنين وأحوازها بالماء الصالح للشرب: *بناء عدد 2 خزان بسعة 1500 م <sup>3</sup> وعدد 2 بيتسكور وعدد 2 مبنية تقويم عدد 1 مبنية للحراسة واقتناء ووضع 10700 متر من قنوات متعدد الاثلي بقطر لا يتعدى 400 مم ونقل ووضع 12250 متر من قنوات الخرسانة سابقة الاجهاد قطر 600 مم و 500 مم - ربط مدينة بنقردان بشبكة جرجيس عن طريق مشروع الجدارية (اقتناء وتجريب ووضع 31 كلم قنوات قطر 315 مم وانجاز محطة للضخ)	استحداث نسق مشاريع تحسين نوعية مياه الشرب بمختلف المعتمديات.

تم الدخول في الاستغلال في أبريل 2017	التسريع في انطلاقة استغلال محطة تحلية المياه جربة في أقرب الآجال.
- غير مبرمج	التسريع في انطلاق إنجاز مشروع محطة التحلية جرجيس.
- وقع نشر طلب عروض جديد بتاريخ 01 جويلية 2019 وتمت مرحلة الفرز لاختيار مكتب دراسات مختص يشرف على إعداد الدراسة وملف طلب العروض تبعا لتوصيات الإدارة العامة للهندسة الريفية بوزارة الفلاحة وذلك لإنجاز محطة التحلية (هندسة مدنية وتجهيزات) على موارد وزارة الفلاحة التي رسمت مبلغ 1000 أ.د. (ميزانية 2018) لتمويل هذا المشروع. قامت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على مواردها الذاتية بتمويل وإنجاز البئر العميقة باعتماد مالي يناهز 90 أ.د. تقدم الإنجاز 100%.	التسريع في إجراءات إعادة طلب العروض لانطلاق في تنفيذ المشروع النموذجي لتحلية المياه المالحة للري الفلاحي بينينري بينقردان.
- غير مبرمج	إعادة النظر في خارطة استغلال المياه الجوفية بمنطقة بني خداش السفلى المخصصة للشرب وذلك بالترخيص في حفر الآبار بعد دخول مشروع تحلية مياه البحر حيز الاستغلال.
تم تركيز الحضيرة لحفر البئر العميقة“ رواق 2” لاستكشاف الطبقة المائية من طرف شركة EQUIPEMENTS HYDRAULIQUE و بصدد إعداد طلب عروض لحفر بئر ثانية. سيتم نشر طلب عروض للمرة الثانية للتقييم الأولي لإنجاز محطة التحلية حال الانتهاء من حفر البئر العميقة “رواق 2”.	التسريع في إجراءات مرحلة التسوية العقارية للتسريع في حفر آبار عميقة بمنطقة “التوي” لتحسين نوعية مياه الشرب بمدينة بنقردان.
منجز	الإسراع في إحداث بئير تعويضية عمرة 3
غير مبرمج	برمجة إحداث منطقة سقوية حول محطة التطهير بينقردان.
العمل على إنجاز مشروع في مجال تصدير سلطعون البحر مع مستثمر كوري الجنسية بفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس	دعوة المصالح المعنية لمقاومة الصيد العشوائي وتوفير مناخ ملائم للمستثمر الأجنبي في مجال تصدير سلطعون البحر.
<b>وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة</b>	
	ضرورة الإسراع بإنجاز المناطق الصناعية المبرمجة بالمخطط.
تمت المصادقة والمطلوب الإسراع بالإنجاز عن طريق الوكالة العقارية الصناعية	الإسراع بعرض مشروع المنطقة الصناعية بسدويكش علنا أنظار مجلسالوزراء للمصادقة.
تمت المصادقة والمطلوب الإسراع بإنجاز أشغال التهيئة الخارجية عن طريق الوكالة العقارية الصناعية	دعوة للجنة الوطنية للمدخرات العقارية الصناعية للإسراع بعناية العقار المقترح من الجهة بالقرب بيسلا عماده كمنطقة صناعية كبرى بتوسط جرجيس وجربة.

	دعوة الدولة من خلال الوكالة العقارية الصناعية لتعزيز تدخلها بالجهة بتب نيا للمنطقة الصناعية عيتينيكما للشهبانية ببنقردان ) 150 هك) والقرييس جرجيس 155 هك) .
غير منجز	التسريع إجراء اتال تسجيلا لعقاريلا استكما لإحداثا للمنطقة الصناعية ببنقردان.
منجز	التسريع إجراء اتتمثيلية لجهة لوكالة العقارية الصناعية ببنقردان ذلكا حسبنا البنية التحتية ودفعنا سقا لاستثمار الخاص .
<b>وزارة التجارة</b>	
بصد الانجاز (أشغال التهيئة الخارجية)	استحاثا انجاز المنطقة التجارية واللوجستية ببنقردان .
بصد الدراسة بالنسبة للمنطقة اللوجستية جرجيس	استحاثا انجاز المنطقة الاقتصادية للمنطقة اللوجستية جرجيس .
غير منجز	تركيز تمثيلية لجهة لمركز النهوض بالصادرات .
<b>وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية</b>	
غير منجز	إحداث وكالة للتصرف في البطاحات .
-	ضرورة توفير اعتمادات إضافية لصيانة الطرقات المرقمة والطرقات البلدية.
تمت البرمجة	إضافة وصلات للطريق السيارة مدنين- رأس جدير لربط كل من مدن مدنين انطلاقا من الطريق الحزامية وجرجيس وجزيرة جربة.
غير مبرمج	إعادة تهيئ الطريق الرابطة بين مركز الولاية والجرف بتحويلها إلى طريق سريعة ذاتاهين بما يساعد على تحسين التنقل من وإلى جزيرة جربة والمطار .
بصد الانجاز	دعوة السلط الجهوية لحل المشاكل العقارية في بعض أجزاء مشروع الطريق السيارة قابس-مدنين وذلك في أقرب الآجال .
دراسات متوقفة	الإسراع في إنجاز مشروع السكة الحديدية المبرمج بالمخطط .
تم انجاز الدراسة عن طريق التعاون الصيني	التسريع في انجاز دراسة مشروع الجسر الثابت الرابط بين الجرف وأجيم والذيس يمكن من سهولة التنقل وتحسين ظروف العمل وفك العزلة عن الجزيرة.
غير منجز	تسريع المصادقة على أمثلة التهيئ العمرانية .
غير منجز	تركيز تمثيلية لجهة لإدارة المياه العمرانية .
<b>وزارة السياحة والصناعات التقليدية</b>	
غير منجز	تثمين نشاط الميناء التجاري جرجيس لعمال السياحة الساحلية والصحراوي قبإدراجها كجهة منتظمة للرحلات للسياحية البحرية (croisières)
-	ضرورة متابعة ملف مشروع أفوسال سياحي جربة أجيم .

وزارة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة	
لم يتحصل على الترخيص من طرف اللجنة الوطنية	أسباب تعطل انطلاق مشروع إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الهوائية المقترح إنجازها من قبل الشركة الألمانية التونسية للطاقات المتجددة.
	ربط المناطق الصناعية المبرمجة بشبكة الغاز الطبيعي.
بصدد استكمال الانجاز	التسريع في ربط مدن جرجيس وجربة ومدنين بالغاز الطبيعي في أقرب الآجال.
بصدد الانجاز	ربط المنطقة الصناعية بتاجرة بمدنين الشمالية وفضاء الأنشطة الاقتصادية جرجيس والمنطقة التجارية واللوجستية ببقردان بشبكة الغاز الطبيعي.
بصدد الانجاز	ربط الميناء التجاري جرجيس بشبكة الغاز الطبيعي.
-	التسريع في إنطلاق إنجاز مشروع القرية الشمسية جرجيس
منجز	التسريع في إيصال شبكة التتوير لعائلات بحق المقارين.
منجز	التسريع في إيصال شبكة التتوير الريفي لمجموعة الطوايشة الطوهر.
وزارة الشباب والرياضة	
غير مبرمج	التسريع في تمويل القسط الثاني للقاعة المغطاة جرجيس
وزارة الصحة	
-	الارتقاء بجودة الخدمات الصحية بمختلف المؤسسات الاستشفائية بالجهة.
غير منجز	التمسك بإحداث كلية الطب بمدنين وطلب الإعلان عن القرار خاصة وأنه تمتسوية وضعيتها العقارية.
لا يفي بالحاجة	توفير طب الاختصاص والإمكانات البشرية والتجهيزات الطبية اللازمة للمستشفى الجامعي بمدنين بما يتلاءم مع تصنيفه كمستشفى جامعي طبقا لقرار السيد رئيس الحكومة خلال زيارته الأخيرة لولاية مدنين وحتى يكون جاهزاً للمتطلبات كلية الطب.
لا يفي بالحاجة	توفير وتدعيم المستشفيات الجهوية والمحلية بالإمكانات البشرية والتجهيزات والمعدات الطبية اللازمة ووسائل النقل وسيارات الإسعاف للارتقاء بجودة الخدمات الصحية ونظرا أيضا لخصوصيات الولاية الحدودية.

وزارة التربية	
بصدد الانجاز	التسريع في توفير اعتمادات الدفع اللازمة لاستكمال تنفيذ إحداث المعهد الثانوي بسدويش.
بصدد الانجاز	استكمال إنجاز مشروع المدرسة الإعدادية النموذجية بجزيرة.
إشكال عقاري	استكمال إنجاز المدرسة الإعدادية بمدنين الشمالية.
بصدد الانجاز	استكمال إنجاز المعهد الثانوي الشماخرجيس.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	
غير منجز	الإسراع بإحداث جامعة للتعليم العالي بمدنين لمعالجة تدني خدمات مؤسسات التعليم العالي المحدودة العدد.
غير منجز	طلب توضيحات حول تعطل إنجاز كلية الطب بمدنين خاصة وأن الجنوب الشرقي منفتح على إفريقيا والخارج.
غير مبرمج	إحداث مؤسسة جامعية هندسية في علاقة باختصاصات معهد المناطق القاحلة والقطب التكنولوجي للجنوب وذلك لاستكمال منظومة القطب التكنولوجي لثروات الصحراء.
تم رصد مبلغ 4 مليون دينار لإنجاز مقر للمعهد العالي للإعلامية وللإعلامية وتجاوز الأشكال العقاري حيث تم رصد قطعة أرض كهبة من طرف بلدية مدنين	طلب رصد اعتمادات إضافية لإنجاز مقر للمعهد العالي للإعلامية ومقر للمعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين وذلك لتقادي كلفة الكراء السنوية المرتفعة والتي تقدر ب 318أ.د.
وزارة التكوين المهني والتشغيل	
تماقتناء التجهيزات. بالنسبة لبناء المبيت في انتظار توفير قطعة أرض من طرف الجهة - تتمعاينة عددة مواقع اقترحتها الجهة لبناء المبيت	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني في الحرف التقليدية بجزيرة وبناء مبيت خاص بهذا المركز.

# المنذوبية العامة للتنمية الجهوية : الهيكل، المهام، المسار، الأنشطة، الإنجازات

تونس، الإثنين 22 جوان 2020

# المحتوى

1. من التأسيس إلى الهيكلية : المسار...
2. من التأسيس إلى الهيكلية : المهام...
3. التنظيم والموارد
4. أنشطة وإنجازات وبرامج خصوصية للتنمية...
6. الحوكمة ودعم القدرة والشراكة
7. إصدارات

# من التأسيس إلى الهيكلية : المسار والمهام



# من التأسيس إلى الهيكلة : المسار ... (1)

## التأسيس (1981-1985)

• القانون عدد 77 لسنة 1981 المؤرخ في 09 أوت 1981 كمؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية والإستقلالية المالية تخضع لإشراف وزارة التخطيط والمالية.

## المهام :

- المساندة في بلورة السياسة الوطنية للتنمية الجهوية وتقييم النتائج (دراسات، احصاء جهوي...)
- مساندة السلطات الجهوية والبلدية في إعداد برامج التنمية.
- وضع وإدارة ومتابعة وتقييم برامج التنمية الريفية والجهوية.

# من التأسيس إلى الهيكلة : المسار ... (2)

## توسيع المشمولات (1986-1988)

• دمج الإدارة العامة للتهيئة الترابية بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية (القانون عدد 34/1986 المؤرخ في 09 ماي 1986) وتلازم مهمة التهيئة الترابية بمهمة دفع التنمية الجهوية (" المندوبية العامة

للتنمية الجهوية والتهيئة الترابية "

• ضبط سياسة التهيئة الترابية والعمرانية وإعداد المثل الوطني للتهيئة الترابية والأمثلة الجهوية لتهيئة الترابية وأمثلة التهيئة العمرانية.

## عودة للمهمة الأساسية (1988-1994)

• فصل بين التهيئة الترابية والتنمية الجهوية

(المندوبية العامة للتنمية الجهوية)

## إعادة الهيكلة وتطوير المهام (1994-...)

• إعادة هيكلة المندوبية العامة للتنمية الجهوية تزامنا مع إحداث دواوين التنمية الجهوية لتتحول لمؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية ذات مهام على الصعيدين الوطني والجهوي

(القانون عدد 82 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994)

# من التأسيس إلى الهيكلة : المهام... (1)


## مهام وطنية :

- المساهمة في إعداد وبلورة وإنجاز ومتابعة سياسات التنمية الجهوية.
- تصميم أدوات تخطيط التنمية الجهوية ورصد التحولات الهيكلية بالجهات.
- المساعدة على إعداد البرامج التنموية الخصوصية التي تقتضي تنسيقا وطنيا و متابعة تنفيذها بالتعاون مع المصالح الجهوية المعنية .
- مساندة المجتمع المدني بالجهات على تشخيص وإنجاز تدخلات تنموية تتكامل مع المشاريع والبرامج العمومية.

## مهام جهوية (المجال الترابي : ولايات تونس، إريانة، بن عروس، منوبة، بنزرت، نابل، زغوان، سوسة، المنستير ، المهدية، صفاقس)

- مساندة مسار إعداد المخطط الجهوي مع متابعة التنفيذ بشراكة مع الهياكل العمومية.
- مساندة الاستثمار الخاص لباعثي المشاريع، خصوصا بالمناطق ذات الأولوية
- إعداد دراسات استراتيجية جهوية ووطنية
- دراسة وإنجاز مشاريع خصوصية لفائدة الولايات
- تشخيص مجالات واعدة للإستثمار بالجهات والتسويق المجالي
- إعداد خارطة الأولويات الجهوية، مونوغرافيا الولايات، لوحة القيادة الجهوية، ”ولاية ...

# مجال التدخل الترابي (11 ولاية)

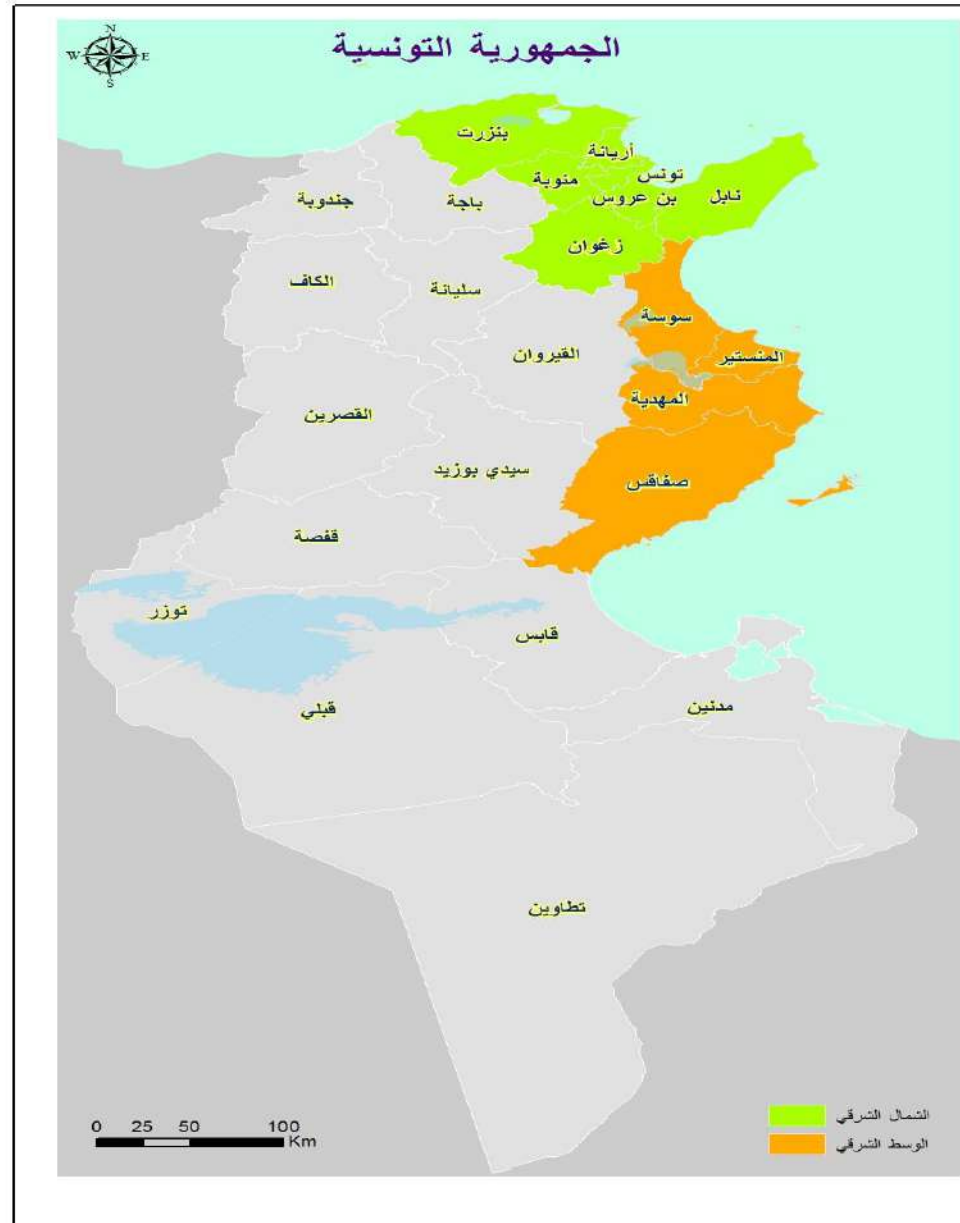


# التنظيم والموارد

## مجلس المؤسسة

- يرأسه المدير العام
- ويتركب من ممثلين عن :
  - وزارة المالية
  - 11 ولاية (الكاتب عام)
- يحضر الجلسات الدورية (كل ثلاثة أشهر) مراقب دولة والمديرين المركزيين وكل من يقتضي جدول الأعمال حضوره.

# الهيكل التنظيمي

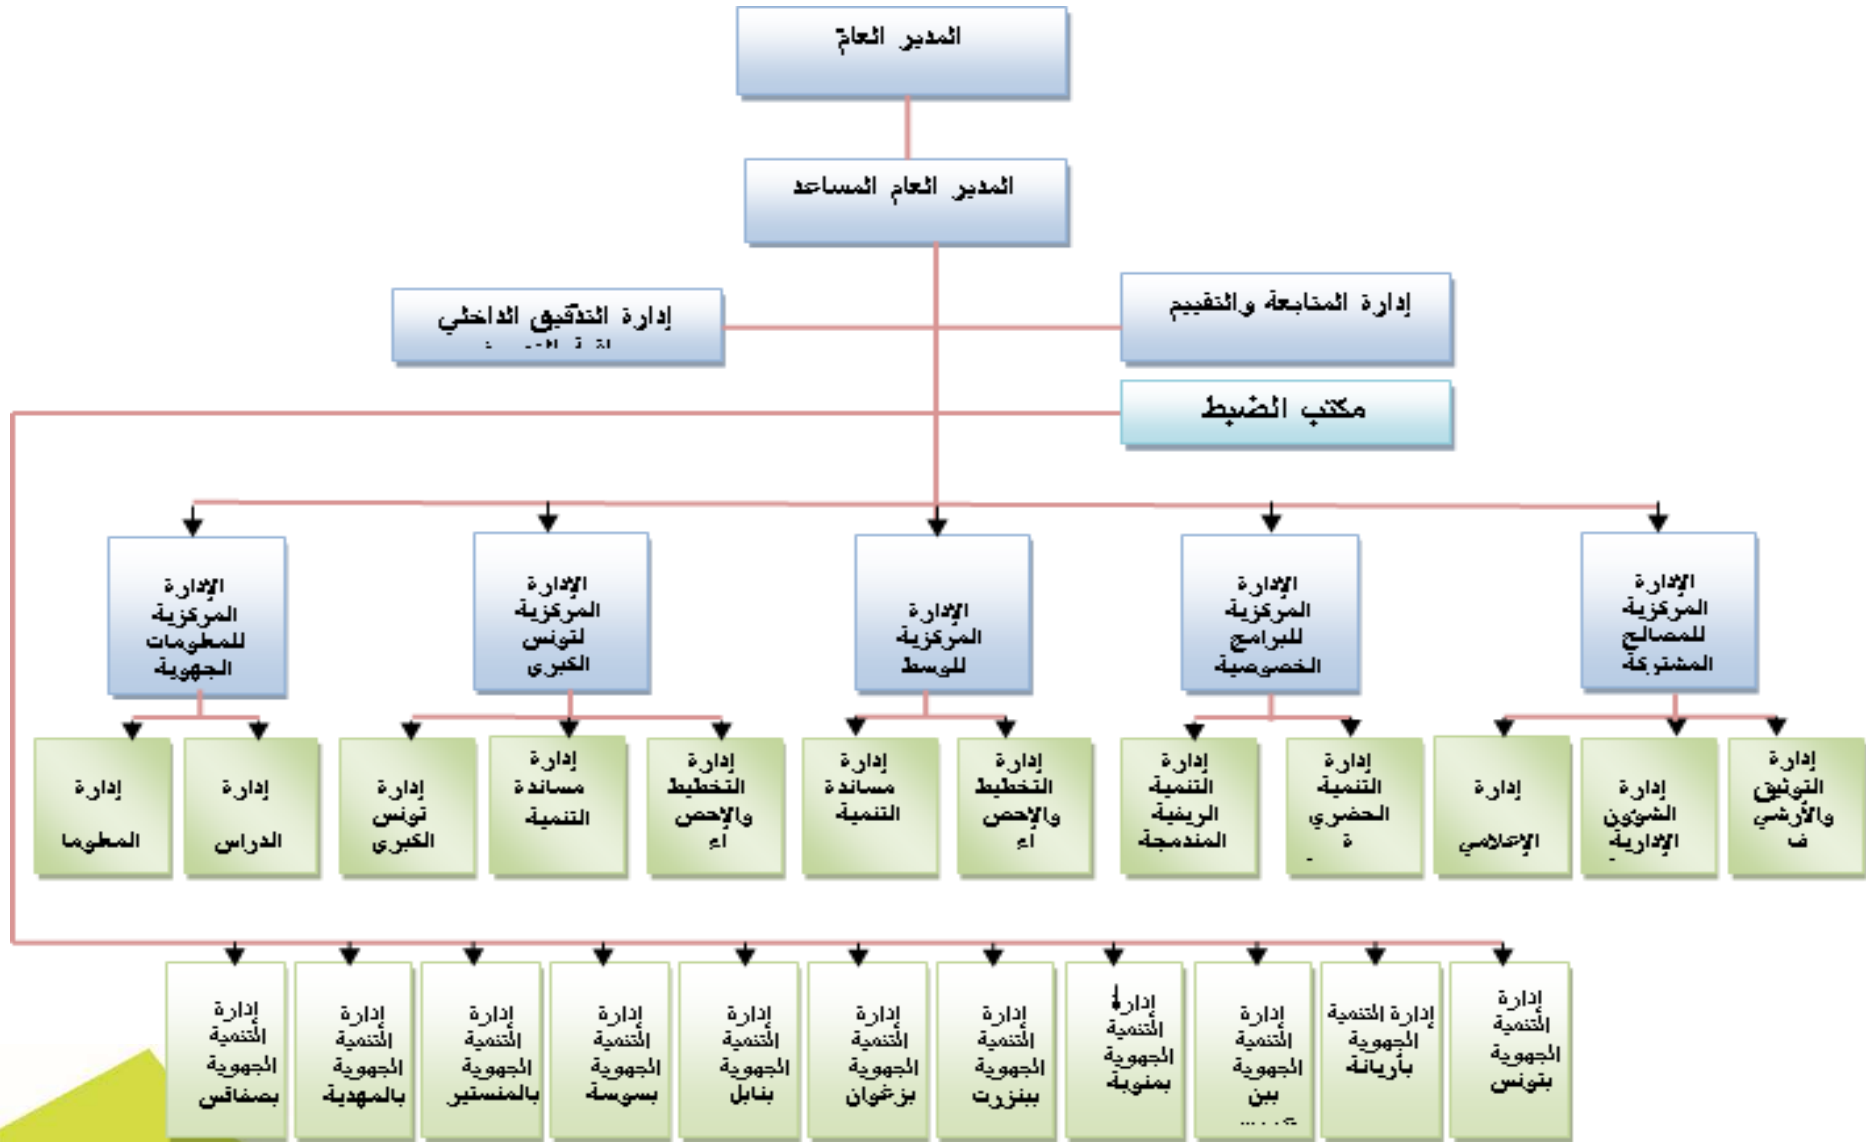

# الموارد البشرية للمؤسسة (1)

العدد	%	
285	100.0	الأعوان
127	44.6	مركزيا
158	55.4	جهويا
(88)	(30.9)	إدارة التنمية الجهوية (11 ولاية)
(70)	(24.5)	منسقي ورؤساء مشاريع المندمجة التنمية
(49)	(17.2)	(الإلحاق)
(40)	-	الإحالة على التقاعد (2019-2016)
لاشيء	-	إنتدابات (منذ 2014)



## الموارد البشرية للمؤسسة (2)

المؤشر	%
نسبة التأطير (شهادت علمية)	74.0 (75.0)
معدل العمر (سنة)	48.0
الفئة الشبابية (دون 40 سنة)	22.5
النوع الإجتماعي (إناث)	46.0

### توزيع الإيعوان حسب الإدارة :



- إدارة جهوية
- إدارة مركزية

# أنشطة وإنجازات وبرامج خصوصية للتنمية...

# أنشطة وإنجازات (1)

## السياسات والتخطيط

- تقييم إنجازات مخطط التنمية (2016-2019) لولايات الشمال الشرقي والوسط الشرقي
- متابعة تنفيذ المشاريع العمومية (الجديدة والمتواصلة) مع رصد المشاريع المتعثرة بهدف إيجاد حلول لتسريع الإنجاز .
- المساهمة الفنية في الإعداد للوثيقة التوجيهية لل عشرية القادمة (أفق 2030) وللمخطط التنموي 2021-2025.
- المساهمة الفنية في قيادة منظومة " إنجاز " لمتابعة وتقييم البرامج والمشاريع العمومية وفي توحيد المصطلحات والمفاهيم المعتمدة
- المساهمة الفنية في الإعداد لإنجاز دراسة حول تحسين نجاعة سياسات التنمية الجهوية في تونس (مشروع "تصميم وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لنمو شامل في تونس")
- المساهمة الفنية (المنهجية، الرزنامة، المراحل) في الإعداد لإستراتيجية وطنية للتنمية الجهوية.

## أنشطة وإنجازات (2)

### دراسات :

إنجاز دراسات إستراتيجية للتنمية في أفق 2030 (ولايات المهدية، منوبة، زغوان، بنزرت) باعتماد مقاربة تشاركية ...

**بصدد الإعداد :** دراسة الإستراتيجية لتنمية ولاية سوسة لأفق 2030

دراسة إستراتيجية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمناطق الحدودية في أفق 2030 (21 معتمدية بالولايات الحدودية - 08)

**في طور طلب العروض :** دراسة إستراتيجية لتنمية إقليم تونس الكبرى - أفق 2050

### مساندة العمل التنموي بالجهات :

إعداد تقارير حول الوضع التنموي بالجهات لسنة 2018 في شراكة فنية بين وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي ووكالة التعاون الفني (ألمانيا)

■ متابعة (سداسية) للظرف الإقتصادي بإقليمي الشمال الشرقي والوسط الشرقي (تطور مؤشرات الإستثمار والإنتاج والتشغيل...)

■ متابعة دورية لوضع الإستثمار الخاص بالجهات (المناطق الصناعية، مراكز الأعمال ومحاضن المؤسسات، الإستثمار المباشر وبمناطق التنمية الجهوية، مؤسسات متعثرة ...)

■ الإشراف على اللجان الجهوية المكلفة بآلية **إعتماد الإنطلاق 1-2**

# أنشطة وإنجازات (3)

## الإحصاء الجهوي والتسويق للجهات

- إصدار سنوي لوثيقة "ولاية... في أرقام" وتتضمن معطيات إحصائية (ديمغرافية وإقتصادية وإجتماعية، لإستثمار...) بالولاية وبالمعتمدية
- اعتماد "منظومة المعلومات الجغرافية" لإنتاج خرائط مواضيعية تتعلق بمؤشرات جهوية لرصد تطور التنمية (البنية الأساسية، التنمية الإجتماعية، البيئة، الحوكمة) ...
- الشروع في مبادرة لإرساء "مرصد التنمية الجهوية" يستند إلى مؤشرات جهوية لرصد تطور الظرف التنموي (البنية الأساسية، التنمية الإجتماعية، البيئة، الحوكمة) بما يساهم في اسناد تنافسية وجاذبية الجهة للاستثمار
- المساهمة الفنية في تطوير الإحصائيات الجهوية مع المجلس الوطني للإحصاء.
- الاعداد التشاركي مع الجهات لمحتوى فني جديد لدعائم التسويق للجهات للترويج لمزاياها التفاضلية بما يستقطب الإستثمار ويفتح آفاقا للتعاون الدولي اللامركزي .
- تنشيط تظاهرات لدعم المبادرة (صالون ريادة الأعمال، صالون المؤسسة (صفاقس)، صالون المبادرة، صالون الصناعات التقليدية...)


# البرامج الخصوصية للتنمية

- **البرامج الخصوصية للتنمية المندمجة** : آلية لمعاودة الجهود التتموي لفائدة الـ24 ولاية قصد تعزيز مقومات التنمية بالجهات وبالمناطق ذات الأولوية بالوسطين الريفي والحضري.
- برنامج استثمار عمومي أفقي يتكامل مع البرامج والمشاريع القطاعية وينفذ من قبل الجهة.
- **التدخلات** : إنجاز مشاريع مدمجة (بنية أساسية ومنتجة) بتهيئة مناطق سقوية وفضاءات للانتصاب الحرفي والصناعي وإحداث مشاريع فردية منتجة.
- تتولى **المندوبية العامة للتنمية الجهوية** الإشراف على **تنفيذ** البرنامج و**التنسيق** بين المتدخلين، وطنيا وجهويا،
- **يُنزل ضمن تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي** (الدستور سنة 2014 - الفصل 12)

# البرامج الخصوصية للتنمية : من جيل الى آخر...

البرنامج	مدة التنفيذ	عدد المشاريع	السكان (م. ساكن)	الكلفة (م.د)
التنمية الريفية المندمجة	2007-1984	333	1.7	671.7
التنمية الحضرية المندمجة	2007-1993	37	0.3	100.0
التنمية المندمجة	2023-2011	190	6.6	1520.0

# برنامج التنمية المندمجة (2011-2023)

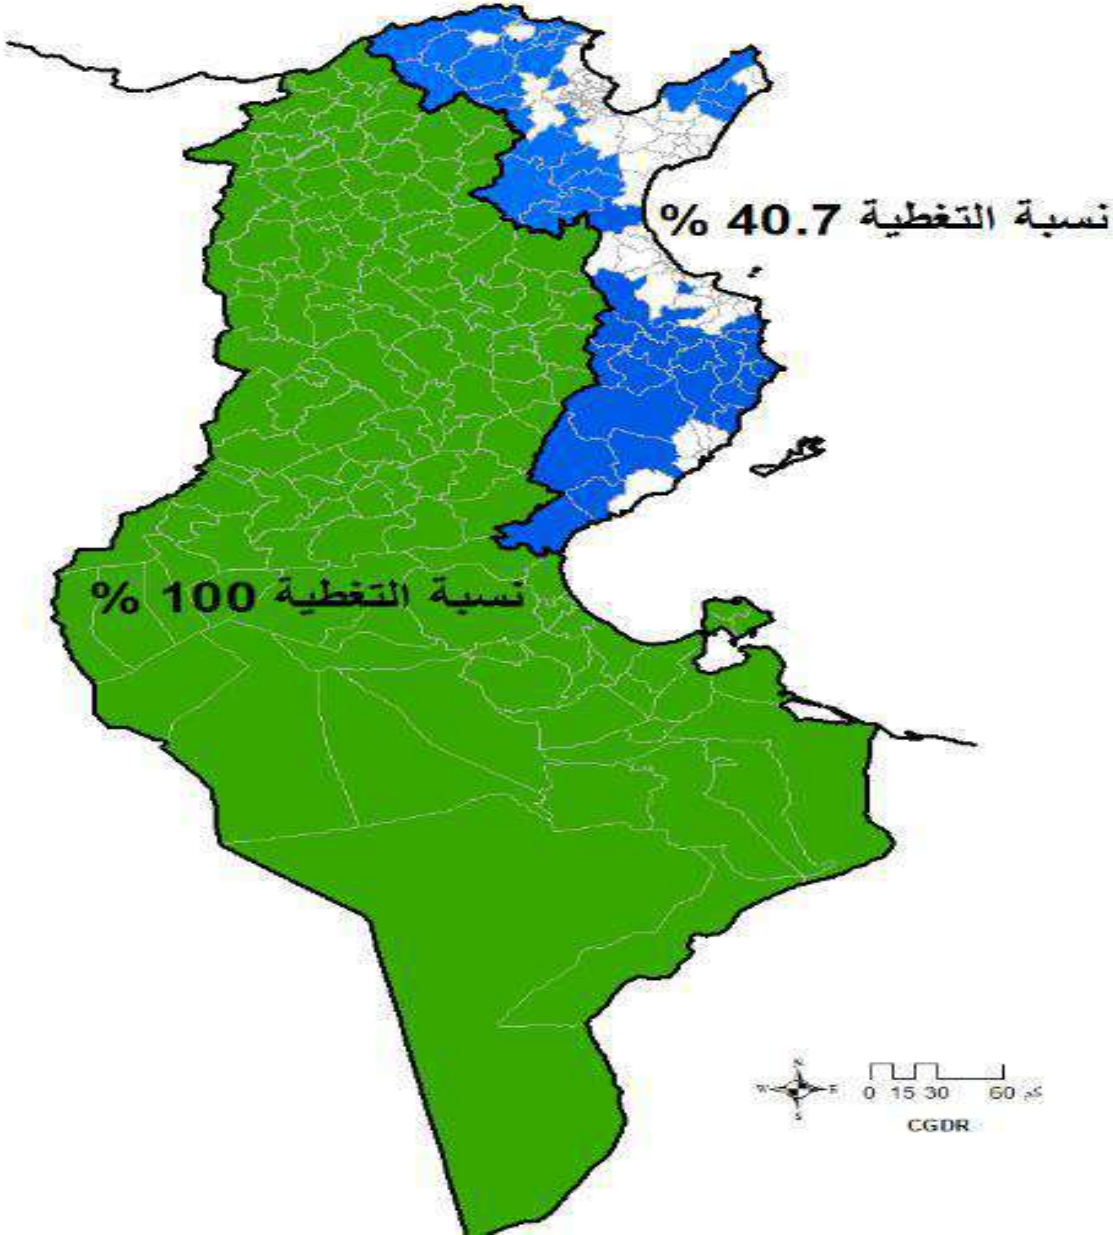

**190 معتمدية**

**1520.0 م.د.**  
**(الكلفة الجمالية)**



# برنامج التنمية المندمجة : الاشراف والتنفيذ

## المجلس المحلي للتنمية :

تحديد الحاجيات والأولويات مع تشخيص الإمكانيات المتاحة

المستوى المحلي

## المجلس الجهوي للتنمية :

دراسة المقترحات المحلية - إبرام الصفقات وتنفيذ المشاريع - تسليم المنشآت إلى المصالح المعنية

المستوى الجهوي

## وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

- تعبئة الموارد المالية
- المصادقة والمتابعة (لجنة القيادة)

## المندوبية العامة للتنمية الجهوية

- إجراءات السحب من الأطراف الأجنبية الممولة
- توفير الإعتمادات للمجالس الجهوية
- متابعة التنفيذ
- دراسات التقييم

المستوى المركزي

# برنامج التنمية المندمجة : مبادئ الأعداد

- **التشاركية** : توسعة دائرة المشاركة لتشمل الأطراف المعنية (سلط محلية و جهوية، نواب الشعب، منظمات غير حكومية، مصالح فنية جهوية ومركزية، هيكل مساندة وتمويل ...)
- **اللامركزية** : استنباط وضبط الأولويات ومناطق التدخل جهويا مع مراعاة قابلية الإنجاز الفني والانصهار ضمن الإستراتيجيات القطاعية
- **التكامل** مع برامج قطاعية ومخططات تنمية لتفادي ازدواجية التدخل مع الحرص على مراعاة
- **الاندماجية** بين مكونات المشروع

# الحوكمة ودعم القدرة والشراكة

# الحوكمة ودعم القدرة والشراكة

■ تحرص المندوبية العامة للتنمية الجهوية على **الانفتاح** على محيطها المؤسساتي والمدني، جهويا ووطنيا ودوليا، بالتواصل مع الفاعلين في الشأن التنموي والجامعة و**بالشراكة اللامركزية** مع مثيلاتها من هيكل مساندة التنمية الأجنبية...

تهدف المندوبية العامة للتنمية الجهوية من خلال هذا التمشي لتفعيل ولتطوير **القدرة المؤسساتية والبشرية** على تجسيم مهامها، جهويا ووطنيا،

■ عديد الأنشطة تم انجازها واخرى مبرمجة للغرض (2020)...

■ أفق تعمل المندوبية العامة للتنمية الجهوية على تجسيمه :  
**لامركزية التكوين**

# الحوكمة بالمؤسسة

■ إحداث " **خلية الحوكمة** " (2017)

■ التعريف بدور " **خلية الحوكمة** " لفائدة الأعوان وأعضاء مجلس المؤسسة :

تنظيم ندوات دراسية (2019) حول آليات الحوكمة نشاطها خبراء في المجال

وتحسيسية بالمسألة " لقاء الإربعاء " لفائدة الأعوان (2017)

**دعم القدرة** : بالمشاركة في دورات تكوين حول " دليل الحوكمة " تنظمها الهيآت

المعنية (الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة،

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد...)

■ **مسار جديد** : المندوبية العامة للتنمية الجهوية كهيكل نموذجي لترسيخ مبادئ

النزاهة والحوكمة الرشيدة في إطار إتفاقية شراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة

الفساد ووزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي (09 أوت 2019) للتشاور

والاستفادة من تجارب وخبرات بما يرتقي بالمرادودية والقدرات في مجال الحوكمة

الرشيدة.

■ **النفاذ إلى المعلومة** : تعيين المكلفين بالمؤسسة للتجاوب مع طلبات المواطن

وغيره من الباحثين عن المعطيات...

# دعم القدرات البشرية للمؤسسة

- التكوين الدوري
- التربصات بالخارج
- تبادل وتمرير المعلومة حول مسائل تنموية بتنشيط من إطارات مركزية وجهوية وخبراء وجامعيين...

المجموع	(2019- 2012)	(2010- 1992)	التكوين : المعدل السنوي
8.3	14.1	5.5	نشاط تكوين
75.9	76.8	75.5	يوم تكوين
100.6	219.7	44.2	مشاركين
-	5 (1282 مشاركة)	-	" لقاء الإربعاء "

# الشراكة المؤسسية

## ■ إتفاقيات

الشراكة	العدد (إتفاقية)	%
وطنية	19	90.0
دولية لامركزية	2	10.0
<u>المجموع</u>	<u>21</u>	<u>100.0</u>

# الشراكة المؤسسية الوطنية

## هياكل حكومية

- ✓ مركز التكوين ودعم اللامركزية (2014)
- ✓ الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (2019)
- ✓ المعهد الوطني للإحصاء (2015)
- ✓ القطب التكنولوجي - برج السدرية (2015)
- ✓ مركز " إفادة " (2014)
- ✓ مؤسسات بنكية (03) - 2020
- ✓ هياكل المساندة (07) - 2020

## هياكل جامعية

- ✓ المدرسة العليا للتجارة بتونس – جامعة منوبة (2012)
- ✓ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس – جامعة تونس (2015)
- ✓ الجامعة المركزية لتونس " جامعة خاصة " (2015)

## منظمات مدنية

- ✓ الجمعية التونسية لتطوير وتحديث الإدارة العمومية (2019)
- ✓ الجمعية التونسية للإفراق والتنمية (2020)



## شراكة دولية لامركزية

### هياكل حكومية

■ وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال (المملكة المغربية) - 2019 - وتهدف لتبادل التجارب والخبرة في مجال تنشيط التنمية بالجهات وتنفيذ البرامج الخصوصية  
(برنامج عمل 2021-2022)

■ الوكالة الوطنية للتنافسية الجهات (فرنسا) - ANCT/DIACT (2009)  
في نطاق التوأمة الادارية بين هياكل مماثلة (مفعلة)

# مشاريع التعاون اللامركزي (منتهية - بصدد الانجاز)

## المحتوى الفني/الأهداف

## المشروع

- تنسيق تنفيذ المكونات الفنية باعتماد تكنولوجيات للطاقة المتجددة
- تنمية الوسط الريفي باعتماد الطاقة المتجددة في الانتاج الزراعي والغذائي بمنطقة نموذجية (معتمدية "شربان" - ولاية المهدية)
- **الشراكة والتمويل :**

"المبادرة الإقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية

**REGEND**

(2021-2019)

- الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
- لجنة الامم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا "ESCWA"

- يشمل 8 ولايات منها ولايتي صفاقس وبنزرت
- تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتحسين جودة ونجاعة التكوين المهني

المبادرة الجهوية لدعم التنمية الإقتصادية المستدامة "إرادة"

(2023-2018)

- **الشراكة والتمويل :** الإتحاد الأوروبي

مقاربة تشاركية لتعزيز  
الإقتصاد البحري  
والريفي بجزيرة قرقنة  
بالتثمين المستدام  
للموارد المحلية  
**DEVLOK**  
(2021-2016)

- المساهمة في التنفيذ
- **الشركاء** : المركز الدولي المتوسطي للدراسات الفلاحية (فرنسا)-  
جمعية الشبان والعلم بقرقنة (تمويل الإتحاد الأوروبي - 1 م.د.)
- إنجاز مشاريع صغرى : مزرعة ألبان، التحويل الغذائي، تنشيط  
سياحي شاطئي بديل، حرف تقليدية محلية...
- **التمويل** : الإتحاد الأوروبي

إستعمال اليد العاملة  
المكثفة في التنمية  
المحلية  
**(HIMO)**  
(2019-2013)

- تنفيذ منشآت جماعية وعمومية تعتمد تقنيات مكثفة في استعمال  
اليد العاملة المحلية
- تنفيذ منشآت في تكامل مع المكونات الفنية لمشاريع التنمية  
المندمجة (ولايات : **سليانة، الكاف، جندوبة، القصرين، سيدي  
بوزيد، تطاوين، قفصة**)
- مساهمة تنظيمية في عقد الندوة الدولية الدورية الدراسية حول  
الممارسات والتجارب العملية حول الإستعمال المكثفة لليد العاملة  
(2019)
- **الشراكة الفنية** : المكتب الدولي للعمل

برنامج التنمية المندمجة : 100 معتمدة منتقاة بكامل ولايات الجمهورية...



PDI :  
 Lancement de  
 nouveaux projets




S TUNISIENS :  
 pement Régional

# إصدارات

المجلة الجديدة  
 للجماعات المحلية :  
 مه أجل إنجاز الحكم  
 المحلي وضمان هبة الدولة  
 ومناعتها



ولاية به عروسك :  
 قطب تنموي مندمج  
 باقليم تونس الكبرى...



INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL :  
 Importance de la dimension géospatiale  
 et des systèmes d'aide à la décision

PERIPHERAL VISION :  
 How Europe can help preserve  
 Tunisia's fragile democracy...







Dites oui à **Sfax**  
 Dites oui à l'innovation



**CCER**  
 25 bis, Rue Astrubal-Lafayette - 1002 Tunis  
 Tél : 71 789 200 - 71 789 454 - Fax : 71 787 234  
 cgr@mdc.gov.tn / www.cgr.tn

www.cgr.tn



A **Mahdia**, des opportunités  
 d'investissement



**CCER**  
 25 bis, Rue Astrubal-Lafayette - 1002 Tunis  
 Tél : 71 789 200 - 71 789 454 - Fax : 71 787 234  
 cgr@mdc.gov.tn / www.cgr.tn

www.cgr.tn



Vivre à **Zaghouan**  
 c'est cultiver sa curiosité



**CCER**  
 25 bis, Rue Astrubal-Lafayette - 1002 Tunis  
 Tél : 71 789 200 - 71 789 454 - Fax : 71 787 234  
 cgr@mdc.gov.tn / www.cgr.tn

www.cgr.tn



Cap sur le Cap Bon  
**Nabeul** vous attend




**CCER**  
 25 bis, Rue Astrubal-Lafayette - 1002 Tunis  
 Tél : 71 789 200 - 71 789 454 - Fax : 71 787 234  
 cgr@mdc.gov.tn / www.cgr.tn


www.cgr.tn



# شكرا

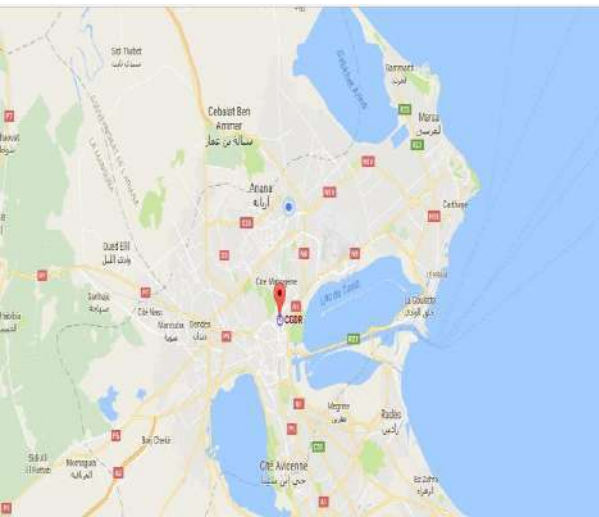

## الوضع التتموي بإقليم الوسط الشرقي

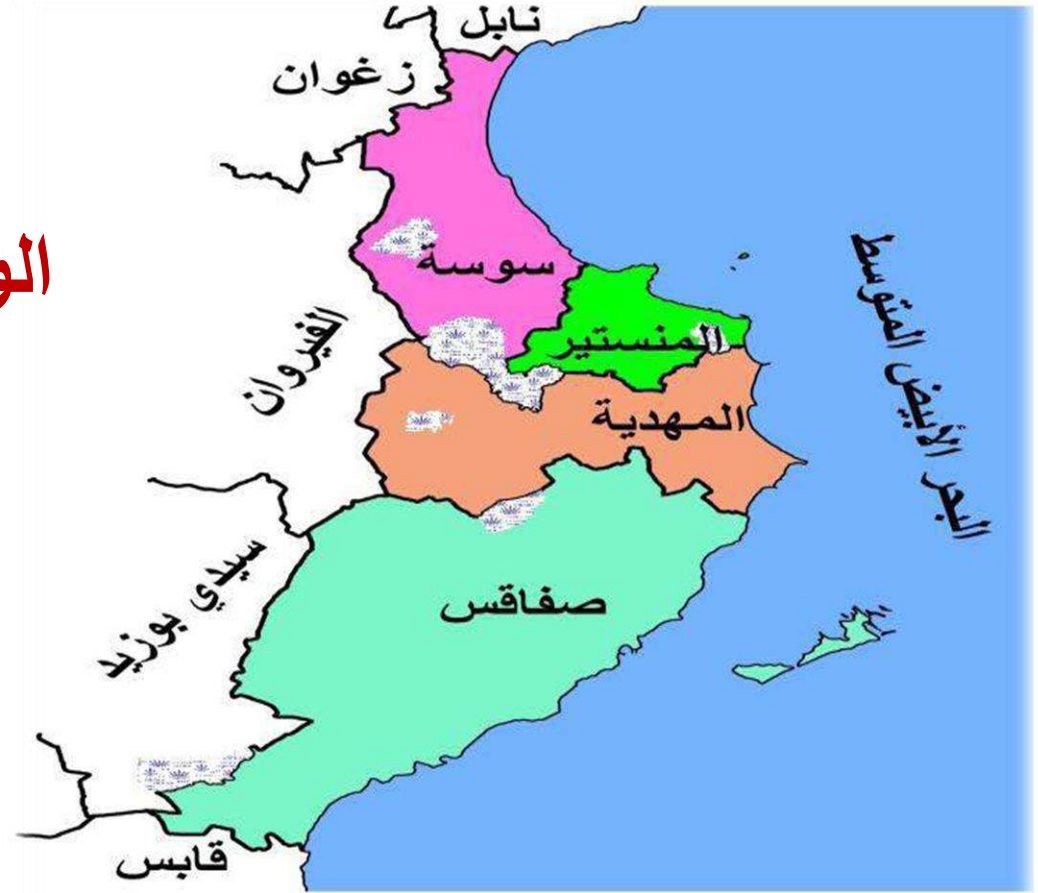

جوان 2020



# المحتوى

المؤشرات التنموية، الموارد والثروات بإقليم الوسط الشرقي

متابعة تقدم انجاز المخطط 2016-2020

المشاريع المعطلة بإقليم الوسط الشرقي

متابعة قرارات المجالس الوزارية لفائدة الجهات



المنذوبة العامة للتنمية الجهوية  
Commissariat Général au  
Développement Régional

# المؤشرات التنموية، الموارد والثروات بإقليم الوسط الشرقي



## كامل البلاد

24 ولاية

274 معتمدية

350 بلدية

2073 عمادة

## الوسط الشرقي

4 ولايات

86 معتمدية


90 بلدية

406 عمادة


كامل البلاد	الوسط الشرقي	
11800 ألف ساكن	2773 ألف ساكن (%23,5)	عدد السكان (2019)
75	195	الكثافة السكانية (ساكن/كلم 2)
% 1,03	%1,5	نسبة النمو (2014 / 2004)
0	24745 ساكن	صافي الهجرة الداخلية (2014-2009)

كامل البلاد	الوسط الشرقي	
<b>نسبة السكان المشتغلين حسب القطاع (2014)</b>		
%10,5	%6,4	- الفلاحة والصيد البحري
%18,3	%26,4	- الصناعات المعملية
%16,2	%16,1	- الصناعات غير المعملية
%54,9	%51,0	الخدمات

## نسبة الأمية حسب الولاية 2014 (%)

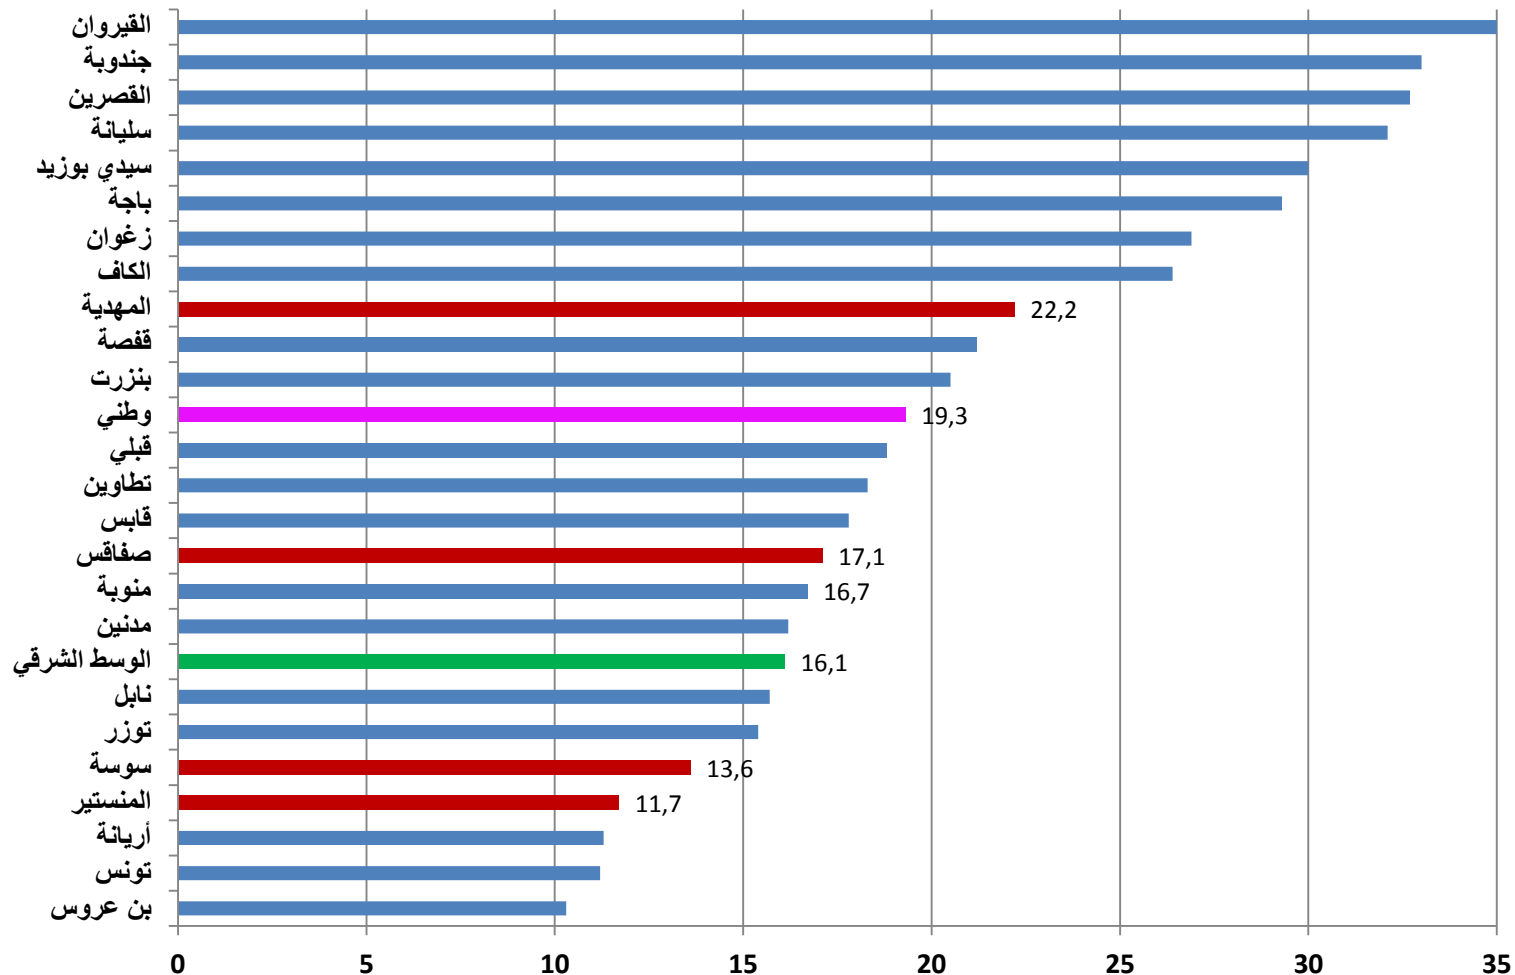


## نسبة البطالة سنة 2019 (%)

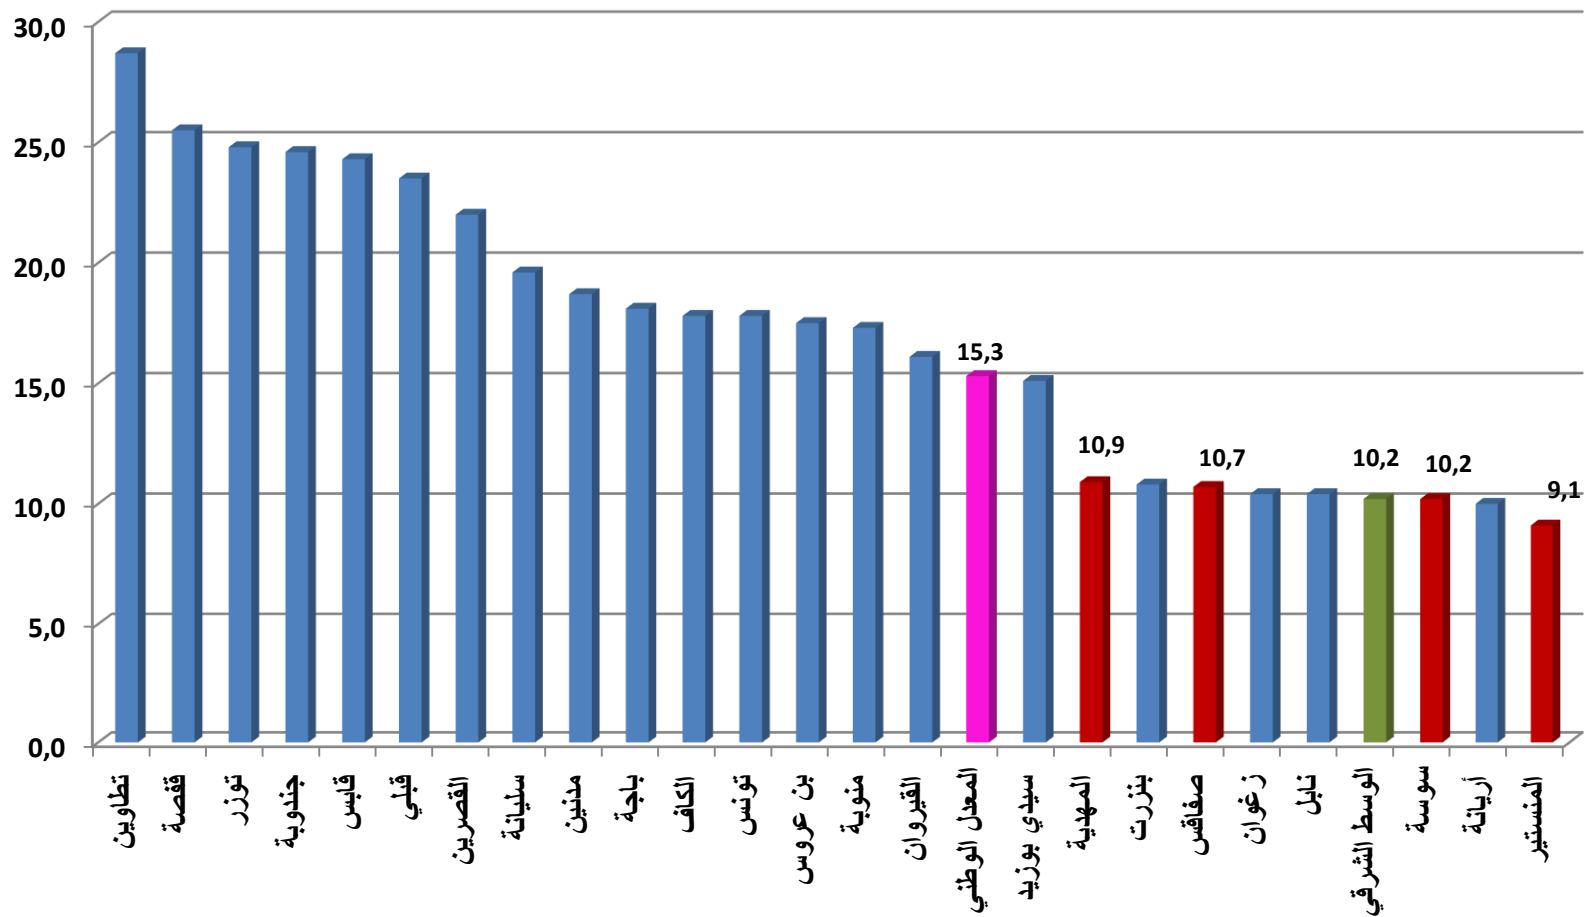





## نسبة الفقر سنة 2015

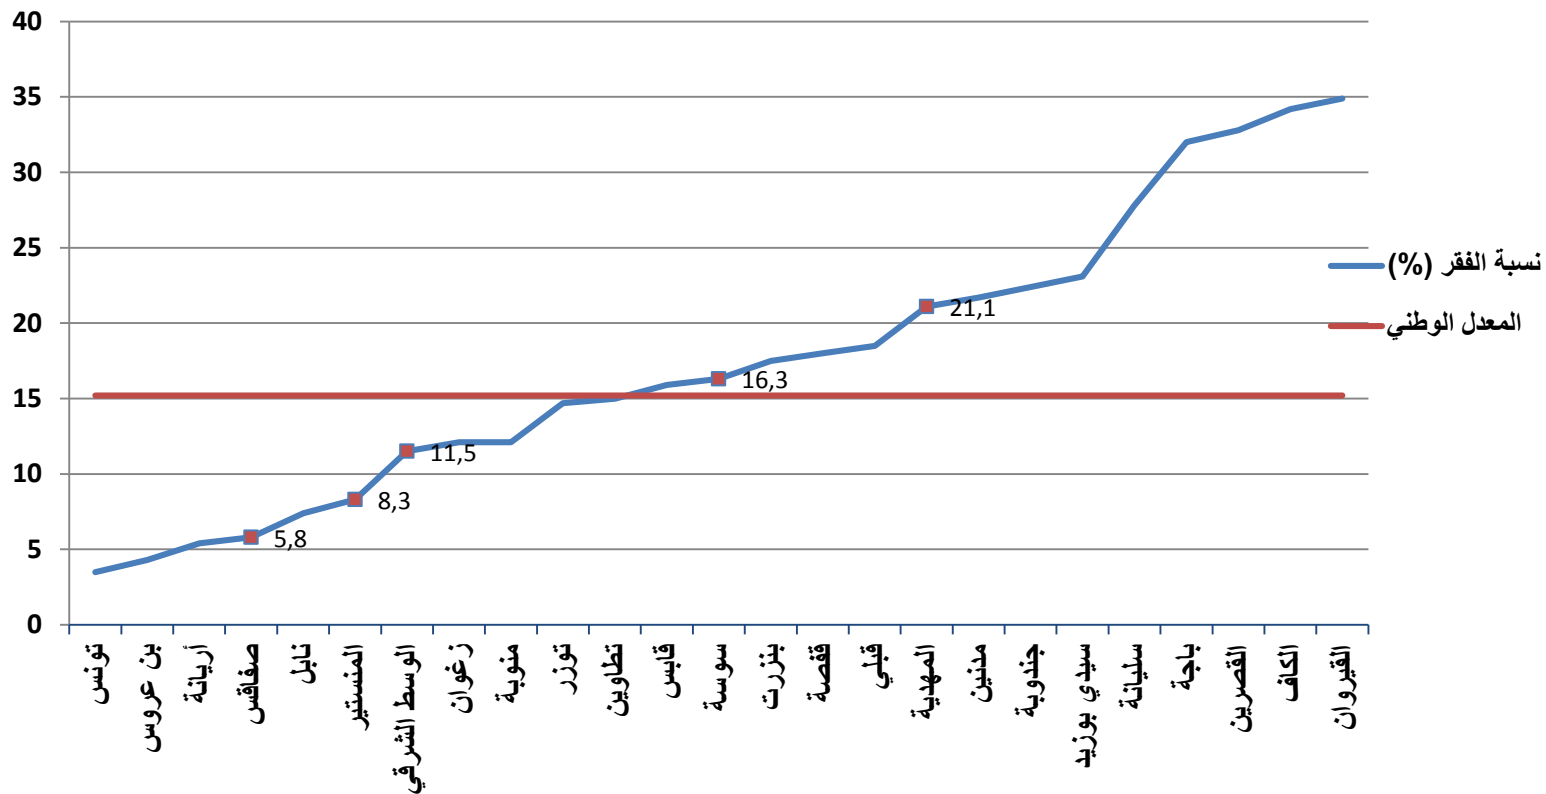

## الكثافة الهاتفية القارة وكثافة الأنترنات القارة سنة 2017

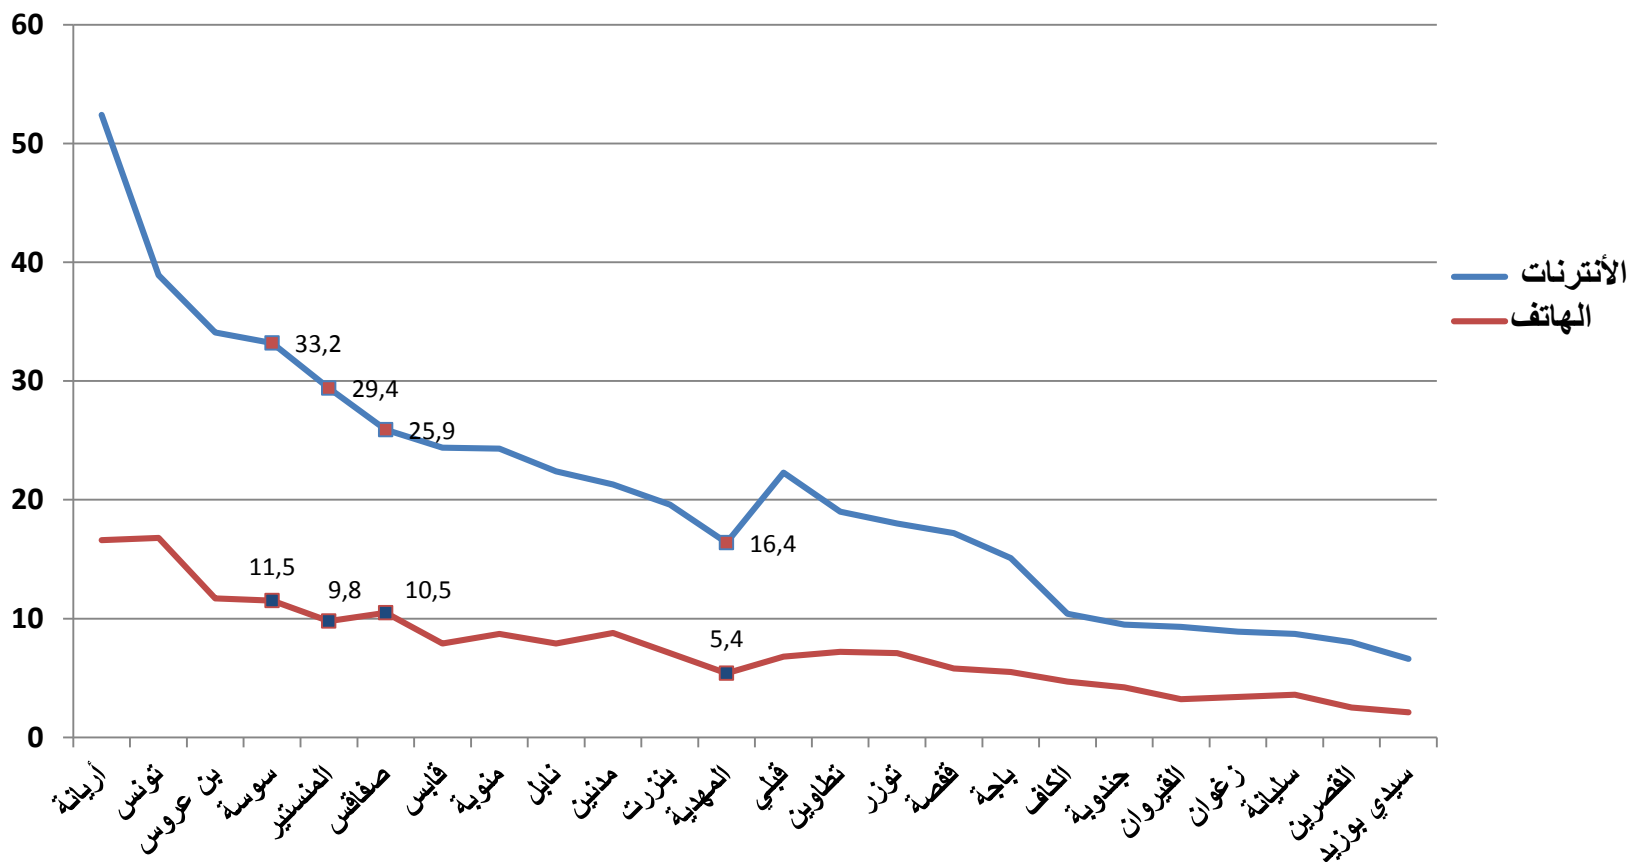

## مؤشر التنمية الجهوية 2018

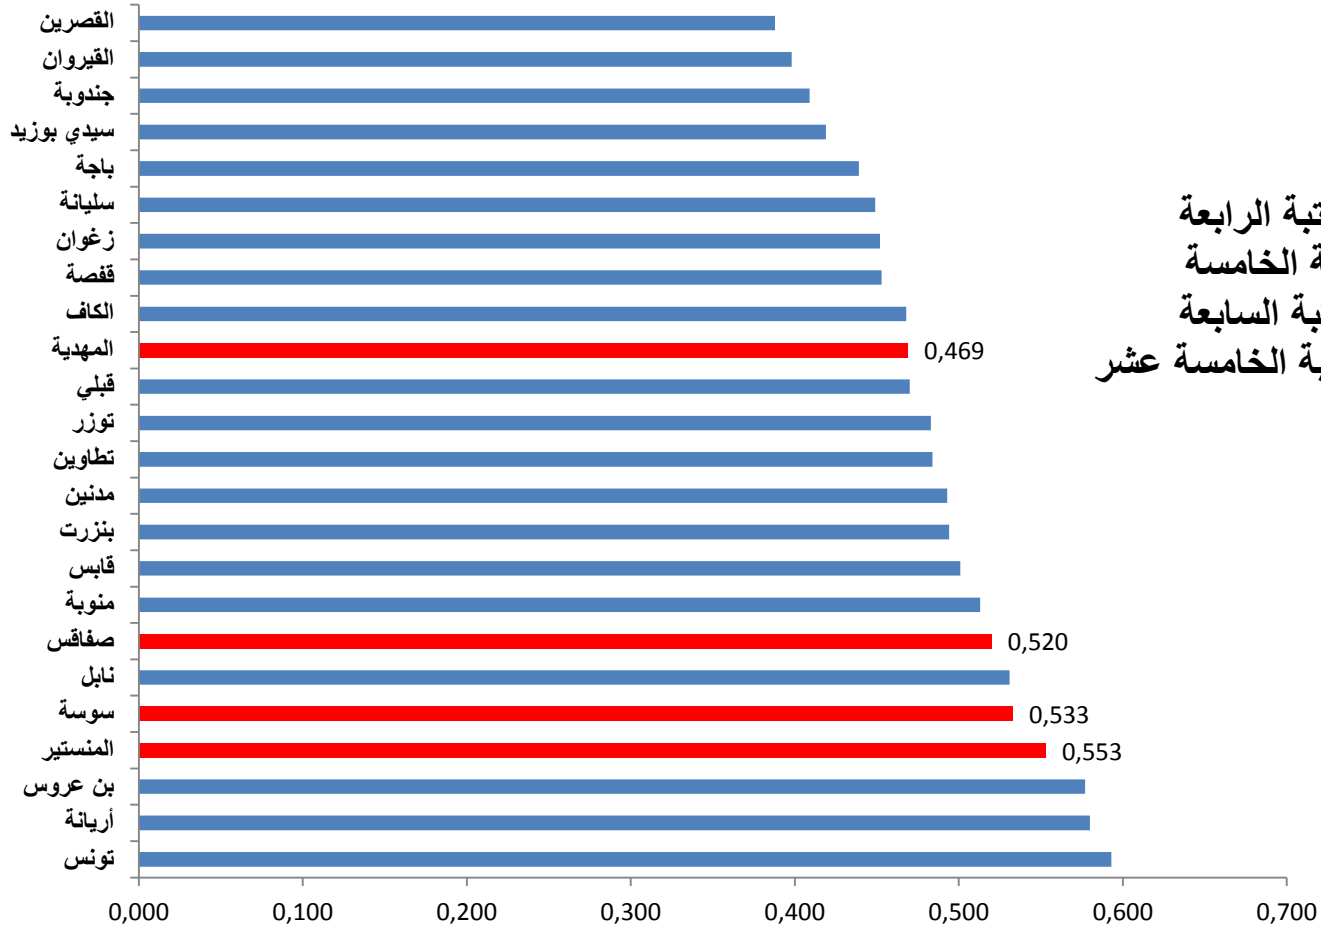

المرتبة الرابعة: المنستير  
المرتبة الخامسة: سوسة  
المرتبة السابعة: صفاقس  
المرتبة الخامسة عشر: المهدية


## اقتصاد متنوع

يتسم إقليم الوسط الشرقي بنسيج اقتصادي متنوع ويرتكز أساسا على:

### الصناعات المعملية :

إذ يستقطب حوالي 35 % من مجموع المؤسسات الوطنية المشغلة لـ 10 عمال فما فوق (1973 مؤسسة سنة 2017 منها 960 مصدرة كليا).

و يختص قطاع الصناعة في النسيج والملابس وفي الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية والصناعات الغذائية والفلاحية و الصناعات الكيمائية

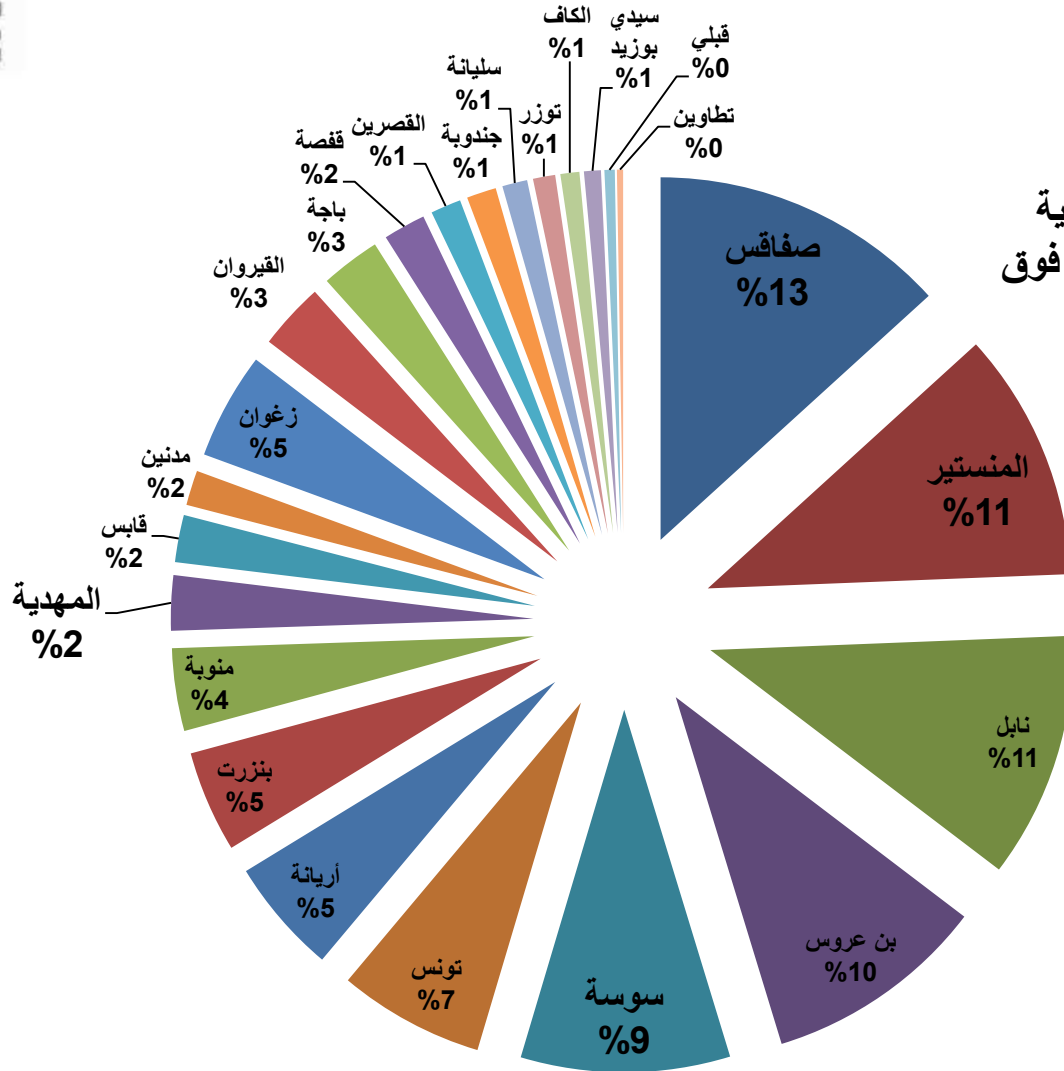

توزيع المؤسسات الصناعية  
التي تشغل 10 أشخاص فما فوق  
سنة 2017

كما يعتبر إقليم الوسط الشرقي قطبا سياحيا هاما حيث يضم 210 وحدة فندقية سنة 2018 تنتصب جلها بولايتي سوسة والمنستير بطاقة إيواء تقدر بـ 83640 سرير وهو ما يمثل 35,6 % من طاقة الإيواء بالبلاد، إضافة إلى تواجد قطاع صناعات تقليدية ثري ومتنوع الاختصاصات.

### **الفلاحة والصيد البحري:**

يتميز القطاع الفلاحي بإقليم الوسط الشرقي بتنوع مجالاته ومساهمته المعتبرة في الإنتاج الوطني.

985.9 ألف هك مساحة مخصصة للزراعة.

14,6 ألف هك مساحات سقوية.

498 ألف هك من الزياتين.

775 معصرة (حوالي 40% من المستوى الوطني).

قاربة 30 % من الانتاج الفلاحي المعد للتصدير على المستوى الوطني

قاربة 45 % من انتاج الزيت على المستوى الوطني سنة 2019.

المرتبة الأولى على المستوى الوطني في انتاج الزيتون البيولوجي خاصة  
بالمهدية و صفاقس.

المرتبة الأولى على المستوى الوطني في انتاج الصيد البحري.

حوالي 22 % في انتاج الحليب.

## بنية أساسية متطورة:

- ✚ مطار دولي بالنفیضة بطاقة استيعاب تقدر بخمسة مليون مسافر سنويا.
- ✚ مطار المنستير الدولي بطاقة استيعاب تتجاوز 4,3 مليون مسافر سنويا.
- ✚ مطار دولي "صفاقس طينة" بطاقة استيعاب مليون مسافر سنويا.
- ✚ ميناءين تجاريين بكل من سوسة وصفاقس وميناء للمواد النفطية والكيميائية بالصخرة.
- ✚ خط حديدي نشيط لنقل المسافرين والبضائع يربط العاصمة بقابس مرورا بسوسة وصفاقس، و"مترو الساحل" يربط مدينة سوسة بمدينة المنستير والمهدية.
- ✚ شبكة هامة من الطرقات المهيكلية والسريعة على طول 1970 كلم (671.8 كلم من الطرقات الوطنية و221.2 كلم من الطرقات السيارة وحوالي 1077 كلم من الطرقات الجهوية).



- ✚ شبكة اتصالات عصرية مواكبة لحاجيات الاتصال والمعلوماتية للمؤسسات الاقتصادية.
- ✚ 29 منطقة صناعية تمسح حوالي 833 هك.
- ✚ 10 محاضن مؤسسات بطاقة استيعاب تقدر بـ 190 مشروع.
- ✚ 3 أقطاب تكنولوجية (في الإعلامية والملتيميديا بصفاقس، في الميكانيك والإلكترونيك بسوسة وفي النسيج والملابس بالمنستير).
- ✚ 55 مؤسسة جامعية في اختصاصات متنوعة (طب، صيدلة، طب أسنان، هندسة، علوم، حقوق، اقتصاد، آداب وإعلامية...)،
- ✚ جهاز تكوين مهني متعدد الاختصاصات يتكون من 43 مركز تكوين وتدريب عمومي سنة 2018 من جملة 198 مركزا على المستوى الوطني (21,7 %)
- ✚ مواني ترفيهية مرسى القنطاوي، المارينا بالمنستير، مرسى ياسمين الحمامات)
- ✚ 6 مستشفيات جامعية و6 مستشفيات جهوية.
- ✚ موارد نفطية تقدر بـ 40% من الإنتاج الوطني من النفط متأتية من حقول عشروت والمعمورة وسيدي اليتيم بصفاقس وكذلك حقل البترول بسيدي الكيلاني من معتمدية السواسي بالمهدية

75 % من الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي متأتية من حقل ميسكار بالمرحس وحقل الغاز بقرقنة.

35 % من الإنتاج الوطني للطاقة المتجددة.

مواقع متعددة لتربية الأسماك (هرقلة، المنستير، صيادة، البقالطة، طبلبة، قصبية المديوني، الشابة).

تقاليد في السياحة الشاطئية والخدمات السياحية ومهارات في الصناعات التقليدية

5 مناطق سياحية وهي سوسة والمنستير وياسمين الحمامات والمهدية وقرقنة.

مخزون ثقافي وحضاري (قرية تكرونة البربرية ودواميس مدينة سوسة ورباط سوسة والمنستير والقصر الروماني بالجلم والسقيفة الكحلاء وبرج المهدية ومواقع أثرية بلمطة وطينة والمدن العتيقة بسوسة و صفاقس والمنستير وأسوارها...).

تجذر ثقافة المبادرة الفردية والأعمال بالإقليم.

تقاليد عريقة في مجال النسيج وصناعة الخيط والملابس بالمناطق الساحلية

## مناطق التنمية الجهوية في مجال دفع الاستثمار الخاص بالإقليم

توجد 13 منطقة تنمية جهوية بإقليم الوسط الشرقي وتنقسم إلى مجموعتين:

### المجموعة الثانية :

تضم 4 معتمديات (أولاد الشامخ والسواسي وهبيرة وشريان) من ولاية المهدية (30% من كلفة الاستثمار المصادق عليها مع سقف 3 مليون دينار).

### المجموعة الأولى :

تضم 9 معتمديات (الحنشة وجبianaة والعامرة ومنزل شاكر وعقارب ويئر علي بن خليفة والغربية والصخيرة) من ولاية صفاقس، ومعتمدية سيدي الهاني من ولاية سوسة. (15% من كلفة الاستثمار المصادق عليها مع سقف بـ 1,5 مليون دينار).





المنذوبة العامة للتنمية الجهوية  
Commissariat Général au  
Développement Régional

# متابعة تقدم انجاز المخطط 2020-2016

## برنامج الاستثمار خلال المخطط التنموي 2016-2020

قدرت كلفة المشاريع بالمخطط التنموي 2016-2020 بإقليم الوسط الشرقي بـ **14839,4** مليون دينار في القطاع العام والخاص، في حين بلغت جملة الاستثمارات المنجزة خلال الفترة 2016-2019 حوالي **8286,4** مليون دينار أي ما يمثل نسبة **56%** من تقديرات 2016-2020.

وتتوزع الاستثمارات المنجزة حسب المتدخل كما يلي:


الاستثمارات المنجزة (م د)		الكلفة المبرمجة (م د)	المتدخل
نسبة الانجاز (%)	2019-2016		
38,6	1942,2	5034,9	القطاع العام
64,7	6344,2	9804,4	القطاع الخاص
55,8	8286,4	14839,3	الجملة

## القطاع العام

بلغت جملة الاستثمارات العمومية المنجزة على المستوى الجهوي خلال الفترة 2016 - 2019 حوالي 1942,2 م د، أي ما يمثل نسبة 38,6% من تقديرات 2016-2020 والمقدرة بـ 5034,9 م د. وتتوزع الاستثمارات العمومية المنجزة خلال الفترة 2016 - 2019 حسب الولايات كالاتي:

الولاية	الكلفة المبرمجة (م د)	الاستثمارات المنجزة (م د)	
		2016-2019	نسبة الانجاز (%)
سوسة	830,6	269,9	32,5
المنستير	756,4	298,5	39,4
المهدية	1143,0	420,7	36,8
صفاقس	92304,	953,0	41,3
الإقليم	5034,4	1942,1	38,6
الوطني	28165	12710	45,1

## الاستثمارات العمومية المنجزة خلال الفترة 2016 - 2019

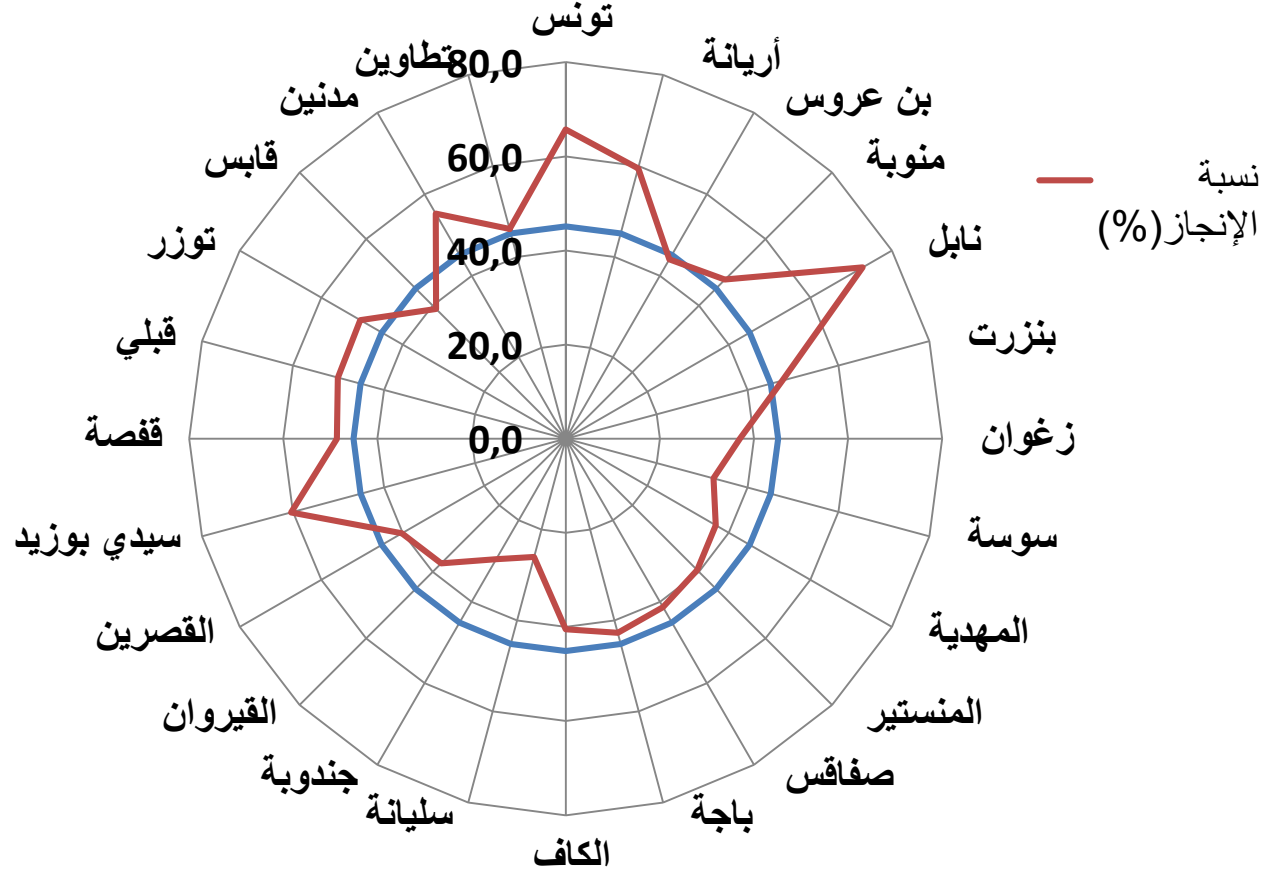



## أهم المشاريع العمومية المنجزة خلال الفترة 2019-2016 و التي يتواصل إنجازها خلال سنة 2020

### ولاية سوسة:

- تهيئة المنطقة السقوية القلعة الكبرى على مساحة 540 هك بكلفة 3,5 مليون دينار(منجز)
- بناء محطة تطهير سوسة حمدون وتهذيب محطة سوسة الجنوبية بكلفة 49,4 مليون دينار(منجز)
- بناء مركز وسيط بحي الرياض سوسة بكلفة 1,1 مليون دينار(منجز)
- توسعة الملعب الأولمبي بسوسة بكلفة 32 مليون دينار ( نسبة انجاز 30 %)
- تهيئة وتجديد كلية الحقوق والعلوم الإنسانية بسوسة بكلفة 3 مليون دينار ( نسبة انجاز 15 %)
- بناء المحكمة الابتدائية بسوسة بكلفة 10,5 مليون دينار ( نسبة انجاز 10 %).
- إحداث فتحات بالطريق السيارة عدد 1 على مستوى القلعة الكبرى و الكنايس بكلفة 100 مليون دينار

- انجاز خزان ماء بالقلعة الكبرى بكلفة 93 مليون دينار (نسبة انجاز 40%)
- انجاز محطة لتحلية مياه البحر بكلفة 127 مليون دينار (نسبة انجاز 7%)
- المنطقة الصناعية النفيضة 3 ( 35 هك ) بكلفة 20,3 مليون دينار (نسبة انجاز 75 %)
- اتوسعة المنطقة الصناعية ببوفيشة (15 هك) بكلفة 9 مليون دينار (نسبة انجاز 90 %)

### ولاية المنستير:

- توسيع ميناء الصيد البحري بطبلبة بكلفة 53 م د (نسبة انجاز 40%)
- مضاعفة الخط الحديدي بين المكنين والمهدية بطول 25 كلم منها 13 كلم بولاية المنستير وتبلغ الكلفة 152 م د (في طور الدراسات)
- استصلاح القسط الأول من مشروع تهيئة خليج المنستير بكلفة 20 م د على مساحة 74 هك بين خنيس وقصيبة المديوني (نسبة إنجاز 10 %)

- حماية فالاز المنستير من الانجراف البحري (القسط الثالث) بكلفة 4.8 م د (نسبة إنجاز 5 %).
- حماية المنطقة السياحية بالمنستير من الانجراف البحري بكلفة 20.5 م د (في طور الدراسات).
- ربط المنستير بالطريق السيارة بكلفة 15 م د (انطلاق الدراسة).
- مضاعفة مدرجة الساحل بطول 36.5 كلم بكلفة 75 م د ( في طور الدراسات).

### ولاية المهدية:

- تهذيب الطريق الجهوية رقم 93 من الجم إلى بومرداس بكلفة 9,1 مليون دينار (نسبة إنجاز 74%)
- بناء جسر على مستوى وادي شيبة بالطريق الجهوية رقم 191 بكلفة 5,5 مليون دينار (نسبة إنجاز 65 %)
- بناء معهد نموذجي بالمهدية بكلفة 4,2 مليون دينار (نسبة إنجاز 45 %)
- إحداث مركب شبابي برجيش بكلفة 2,9 مليون دينار (الإعداد لانطلاق الأشغال)

## ولاية صفاقس:

- تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس ( تبرورة) على مساحة 420 هك بكلفة 73 م د (تم إعداد التقرير المتعلق بالمرحلة الثانية من الدراسة)
- إحداث محطة لتحلية المياه بصفاقس بكلفة 957 مليون دينار (بصد فتح العروض) .
- إنجاز 8 ممرات علوية على الطريق الحزامية كلم 4 بصفاقس بكلفة 140 م د (الجزء الأول: 4 منشآت ، تقدم الانجاز % 60) - (الجزء الثاني: 4 منشآت ، تقدم الانجاز %10)
- إنجاز الطريق السريعة صفاقس-سيدي بوزيد-القصرين على طول 200 كم بكلفة 800 م د (تم نشر طلب العروض لإعداد الدراسات التفصيلية )
- تهيئة المدخل الشمالي-الجنوبي لمدينة صفاقس بكلفة 150 م د (القسط الأول نسبة انجاز 20%)

□ إحدات مكتبة رقمية بولاية صفاقس بكلفة 18,5 مليون دينار (نسبة إنجاز 15% )

□ توسيع وتهذيب شبكات التطهير بمدن ساقية الزيت الشحيحة، المحرس، ساقية الدائر، الحنشة، عقارب و جبنيانة بكلفة 37 مليون دينار ( الإعداد لانطلاق الأشغال بالنسبة للقسط الأول: 30 كلم)

□ إحدات منطقة لوجستية بصفاقس بكلفة 85 مليون دينار (الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع بصدد المصادقة )

□ إنجاز القسط الأول (13.5 كلم ) من شبكة للنقل الجماعي (مترو صفاقس 70 كم) بكلفة 2800 مليون دينار (تقدم إنجاز الدراسات 40%)

□ إحدات مدينة رياضية بصفاقس بكلفة 350 مليون دينار (بصدد إعداد دراسة الجدوى )



المنذوبة العامة للتنمية الجهوية  
Commissariat Général au  
Développement Régional

# المشاريع المعطلة بإقليم الوسط الشرقي

يبلغ عدد المشاريع التي تشكو صعوبات بإقليم الوسط الشرقي 31 مشروعاً بتكلفة جمالية تقدر بحوالي 172,4 مليون دينار .

و تتوزع هذه المشاريع على ولايات الإقليم كما يلي:

الولاية	العدد	التكلفة (ألف دينار)
سوسة	7	6535
المنستير	6	80660
المهدية	6	35037
صفاقس	12	50169
مجموع ولايات الإقليم	31	172401

الملاحظات	سنة الادراج في الميزانية	الكلفة المحينة (أ د)	بيان المشروع
<b>القطاع: الصحة</b>			
لم ينجز لعدم توفر الاعتمادات اللازمة و المقدرة بـ 1800 الف دينار	2013	1800	بناء قسم طب الاسنان بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد
لم ينجز لان المساحة المخصصة للمشروع ضيقة ولا تفي بالحاجة.	2011	300	تهيئة و توسيع قسم مغلق للأمراض النفسية بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد
<b>القطاع: التربية</b>			
تعطل إنطلاق الأشغال لوجود مشاكل عقارية / وقع فسخ الصفقة	2017	400	- بناء المدرسة الابتدائية بئر الحلو بالزاوية
إشكال عقاري وفني يهم موقع الأرض المخصصة للمشروع المحاذي لمجرى وادي.	2017	2500	بناء مدرسة إعدادية بئر الحلو
<b>القطاع: البريد</b>			
ملكية مشتركة مع اتصالات تونس تمت إحالة الموضوع للمستوى المركزي	2012	1035	بناء مكتب بريد الصفايا
ملكية مشتركة مع اتصالات تونس تمت إحالة الموضوع للمستوى المركزي	2012	200	تهيئة مكتب بريد هرقله
<b>القطاع: التنمية المندمجة</b>			
اعتراض مواطنين حول ملكية الأرض الراجعة بالنظر للمجلس الجهوي - وطلب المقاول خلال سنة 2017 تحيين الأسعار.	2015	300	تهيئة منطقة حرفية (10 محلات) بأولاد علي بالهاني بسيدي الهاني
		<b>6535</b>	<b>المجموع</b>



الملاحظات	سنة الإدراج بالميزانية	الكلفة المحيئة (أ.د.)	بيان المشروع
<b>القطاع: التوزيع</b>			
الإشغال متوقفة لوجود إشكال عقاري بالطريق الجهوية 92	2016	290	تجديد خط جهد متوسط ومنخفض ( بالطريق الجهوية 92 )
<b>القطاع: الإتصالات</b>			
اعتراض الاجوار و في مرحلة التقاضي	2017	150	تطوير و تكثيف شبكة الهاتف الجوال بمنزل النور
<b>القطاع: التطهير</b>			
تم إيقاف الأشغال منذ جانفي 2018 لعدم توفر التمويل وعدم خلاص المقاوله .	2013	30350	محطة التطهير الصناعية بالقطب التكنولوجي بالمنستير
بصدد القيام بإجراءات فسخ الصفقة لأن المقاوله عبرت عن عدم استعدادها مواصلة الأشغال التي توقفت منذ جانفي 2014	2012	2054	ربط وقتي لفضاء القطب التكنولوجي بمحطة التطهير الفرينة
إشكال عقاري لبناء محطة ضخ ببئر الطيب : تم اقتراح موقع جديد .	2013	2511	ربط القنوات المستعملة لمدينة منزل الكامل وبئر الطيب بمحطة التطهير بجمال
<b>القطاع: الطرق والمسالك</b>			
وجود بعض العراقيل العقارية . طلب المقاول فسخ الصفقة بالتراضي نظرا لطول مدة التوقف (منذ 30/12/2019)	2009	45305	منعرج الطريق الجهوية 92 بالمنستير-خنيس بطول 10 كلم
		80660	<b>المجموع</b>

الملاحظات	سنة الإدراج بالميزانية	الكلفة المحينة (أ.د.)	بيان المشروع
<b>القطاع: الثقافة</b>			
إشكال عقاري (في انتظار النظر في الشكوى المرفوعة في المحكمة الإدارية)	2008	7000	مركب ثقافي عصري بالمهدية
في طور تخصيص الأرض .	2013	400	إحداث مكتبة عمومية أولاد صالح بقصور الساف
<b>القطاع: الصحة</b>			
إشكال مالي ، كلفة المشروع فاقت الاعتمادات المبرمجة .	2017	1200	تهيئة قسم أمراض النساء و التوليد بمستشفى المهديّة
<b>القطاع: التجهيز</b>			
تم فسخ الصفقة بتاريخ 04 أكتوبر 2017 لوجود إشكاليات عقارية .	2017	25000	منعرج ط ج 82 بالمهدية (7 كلم)
تم ايقاف المشروع و ذلك بسبب رفض المجتمع المدني	2015	504	حماية الشريط الساحلي للمهدية من الانجراف البحري .
<b>القطاع: الشؤون الدينية</b>			
إشكال عقاري		933	بناء مقر الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالمهدية
		35037	<b>المجموع</b>

الملاحظات	سنة الادراج في الميزانية	الكلفة المحينة (أ د)	بيان المشروع
<b>القطاع: الفلاحة والصيد البحري</b>			
تم إعطاء الإذن الإداري ببدء الأشغال بتاريخ 07/09/2019 وفي انتظار توفير آلة حفر. رفض الوكالة الوطنية لحماية المحيط لنوعية المياه الحالية من محطة معالجة المياه بطينة	2019	800	أنجاز أشغال حفر بئر أنبوبية تعويضية بوجمل بمنزل شاكر
موافقة مبدئية للمواطنين تركيز خزان مائي بلاستيكي سعة 5000م3 بالمنطقة السقوية شريطة تغطيته بغطاء واقى	2016	12000	توسعة المنطقة المروية بالمياه المعالجة بالحاجب بطينة
تعطيل من طرف المواطنين لتمكينهم من الربط بالتيار الكهربائي للمنازل والآبار الخاصة	2014	120	كهربة محطات الضخ عيثة الشلايا بالمحرس
<b>القطاع: المناطق الصناعية</b>			
تم إقرار التخلي عن الموقع المبرمج لإنجاز المنطقة الصناعية عقارب "القنة" و تعويضه بضيعة زروق على مساحة جمالية تقدر ب 310 هكتار (معاينة بتاريخ 29 أفريل 2018). ولتفادي تعطل إنجاز المشاريع، ارتأت الإدارة العامة للوكالة تشريك الجهات في إعداد وضبط برنامج الوكالة للفترة 2021-2025.	2008	12161	إحداث منطقة صناعية بالقنة عقارب - القنة- (10 هك) بعقارب

الملاحظات	سنة الادراج في الميزانية	الكلفة المحينة (أ د)	بيان المشروع
<b>القطاع: النقل</b>			
توقف إنجاز الدراسة بسبب إحتجاجات عمال شركة ترابسا و مطالبتهم بضرورة تجديد اللزمة لإستغلال الميناء البترولي التي إنتهت في 2008 تم بتاريخ 30 جانفي 2020. عقد جلسة عمل بمقر الولاية للنظر في جملة الإشكاليات المطروحة فيما يتعلق بتمديد أو تجديد عقد اللزمة بنفس الشروط وعدم المساس بمكتسبات شركة الترابسا أو إدخال أي عنصر من عناصر إرباك المؤسسة	2016	2700	دراسة تنمية منشآت ميناء الصخيرة
<b>القطاع: الصحة</b>			
المطلوب الإسراع في رفع التحفظات طبقا لما تم الاتفاق عليه خلال جلسة 19 ماي 2020	2013	5190	تهيئة و توسعة المستشفى الجهوي بئر علي بن خليفة
تم اختيار المقاول. تسلم مجمع الشركات المكلفة بالإنجاز بطاقة الإذن بالإنجاز بتاريخ 16 أوت 2019 بأجال تعاقدية 10 أشهر.	2018	3498	أشغال ربط المستشفى الجامعي الجديد بطينة بشبكة التطهير
<b>القطاع: التكوين المهني</b>			
بصدد الدراسة للأقساط الفنية ، تأخر صدور قرار تخصيص قطعة الأرض.	2013	8670	إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالمحرس (مبيت 340 سرير)

الملاحظات	سنة الادراج في الميزانية	الكلفة المحينة (أ د)	بيان المشروع
اشغال متوقفة منذ 2019/06/21(وجود بعض الإشكالات على مستوى هيكل المبنى)	2015	750	تهيئة مركز التكوين المهني للصيد البحري بصفاقس المدينة
في انتظار عقد جلسة مع اللجنة المركزية لمراكز التكوين لتغيير صبغة المركز	2013	3400	إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببوئدي بمنزل شاكر
<b>القطاع: الشباب والرياضة</b>			
وضعية البنية الأساسية للمؤسسة الحالية خطير. وقد أصدرت الوزارة قرار غلق في الغرض للنظر في إمكانية توفير إعمادات لإحداث دار شباب جديدة	2017	200	تهيئة دار الشباب السلطانية بساقية الدائر
<b>القطاع: الطفولة</b>			
تتمثل الإشكالية في تخصيص قطعة ارض بـ1500م <sup>2</sup> لإنجاز المشروع .	2015	680	إحداث مركب طفولة بالحزق بجبنيانة
		<b>50169</b>	<b>المجموع</b>
		<b>172401</b>	<b>المجموع العام للإقليم</b>



المندوبية العامة للتنمية الجهوية  
Commissariat Général au  
Développement Régional

# متابعة قرارات المجالس الوزارية لفائدة الجهات

## متابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية لفائدة الولايات

الجملة	قرارات لم تنفذ أو تشهد صعوبات	قرارات بصدد الدراسة أو طلب العروض	قرارات منجزة أو بصدد الإنجاز	
82	10	62	10	المنستير
59	22	23	14	المهدية
60	4	26	30	صفاقس
201	36	111	54	الجملة

## أهم قرارات المجالس الوزارية التي لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ

### ولاية المنستير (تاريخ الجلسة: 1 مارس 2019)

✓ إنجاز محطة التطهير الصناعية بالقطب التكنولوجي بالمنستير بكلفة 27590 ألف دينار

✓ تأهيل مركز التكوين المهني في الصيد البحري بطبلبة بكلفة 3500 ألف دينار

✓ إحداث مركز تكوين في مهن البحار بطبلبة بكلفة 3000 ألف دينار

✓ مشروع بناء ثلاثة أقسام جديدة للطب والجراحة والأمراض النفسية للأطفال بمركز التوليد وطب  
الولدان بالمنستير بكلفة 13000 ألف دينار



✓إعادة توظيف الفضاءات المخصصة حاليا للأقسام المذكورة لوحدة زرع الكبد للأطفال وقسم أمراض الغدد بالمستشفى الجامعي بالمنستير بكلفة 3400 ألف دينار

✓مشروع إحداث وحدة لتصفية الدم بالمستشفى الجهوي بالمكنين بكلفة 800 ألف دينار

✓إحداث منطقة للحرس الوطني بزرمدين (في إنتظار قرار إحداث المنطقة من الإدارة العامة للحرس الوطني)

### ولاية المهدية (تاريخ الجلسة: 22 جوان 2019)

✓إحداث معتمديتين بكل من رجيش والبرادعة

✓إعداد دراسة شاملة لقطاع السكك الحديدية والمترو بالجهة بكلفة 1 م د لربط المهدية بالجم وكركر.

✓ إعداد دراسة لإحداث رصيف خاص بالرحلات الدولية السياحية بين ميناء المهديّة وسبخة بن غياضة في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص

✓ إنجاز دراسة لإحداث ميناء تجاري بالعالية من معتمدية قصور الساف .

✓ إعداد دراسة لتهيئة مرفأ الصيد البحري المرسي بالشابة (بكلفة 300 ألف دينار) ومرفأ الصيد البحري بملولش (بكلفة 400 أ.د.)

✓ تخصيص 2 م.د لإتمام الدراسات وإنجاز مشروع تربية القمبيري بملولش

✓ إنجاز دراسة جدوى لإحداث محطة لتحلية مياه البحر بالعالية بطاقة إنتاج بين 100 و 200 ألف متر مكعب في اليوم في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص.

✓إحداث مخبر إقليمي لمنظومة الألبان بكلفة 700 أ.د.

✓إحداث منطقة صناعية جديدة بالمسلان على مساحة 50 هك كمرحلة أولى بكلفة 15 م.د .

✓إعداد الدراسات الخاصة بتهيئة 03 مناطق صناعية بكل من أولاد الشامخ وهبيرة والبرادعة بكلفة  
1 م د

✓إحداث منطقة سياحية ايكولوجية بالعالية .

✓دراسة وبناء قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بكلفة 11م.د .

✓تأهيل المستشفى المحلي ببومرداس بكلفة 1,5 م.د .

✓تطوير المستشفى المحلي بالسواسي إلى مستشفى جهوي صنف " ب "

✓ إنجاز تقاسيم للسكن الاجتماعي لفائدة حوالي 104 منتفع على مساحة 19 هك بكل من كركر وهبيرة وسمرة أولاد الشامخ.

✓ إحداث مسرح للهواء الطلق بالمهدية


ولاية صفاقس (تاريخ الجلسة: 20 و 21 أبريل 2017 )

✓ إحداث دار للخدمات الإدارية بالصخيرة (تم رصد 500 ألف دينار بميزانية 2019)

✓ اقتناء آلة العلاج الإشعاعي الموضعي Curiethérapie لفائدة قسم الأمراض السرطانية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بكلفة 1,1 مليون دينار.

✓ إحداث وحدتين طبيتين متنقلتين للإسعاف والإنعاش (SMUR) بكلفة 1 مليون دينار

✓ إنجاز دراسات لتهيئة شط القراقنة بصفاقس بكلفة 100 ألف دينار.



وشكرا

# متابعة قرارات المجالس الوزارية بولايات إقليم الوسط الشرقي



جوان 2020

متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الجلسة الممتازة  
للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي المنعقدة برئاسة  
السيد رئيس الحكومة  
يوم 01 مارس 2019  
بمقر ولاية المنستير

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (د)	المشروع
						<b>مجال التطهير والبيئة</b>
تم ايقاف الأشغال منذ جانفي 2018 لعدم توفر التمويل وعدم خلاص المقاوله مبلغ التسبقة. بعدها تقدمت الشركة بطلب تعويضات عن ايقاف الأشغال وهو بصدد الدرس بعد أن تمت إحالته على اللجنة العليا للصفقات		2021 أبريل	أفريل 2019		27590	محطة التطهير الصناعية بالقطب التكنولوجي بالمنستير
تمت المصادقة على ملف الإنتقاء الأولي للمقاولات تمت إستشارة الشركات التي وقع إنتقاءها في المرحلة الأولي آخر اجل لقبول العروض 21 جانفي 2020 تم الإنتهاء من دراسة المشروع خلال شهر ماي 2019 تم تمديد آجال فتح العروض إلى 07 فيفري 2020.		الثلاثية الأولى لسنة 2022	الثلاثية الأولى لسنة 2020		30000	محطة التطهير الصناعية بالمكنين



الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ) (د)	المشروع
<p>-تم الإعلان عن طلب العروض المتعلق بالدراسة أفريل 2019.</p> <p>-في طور تقييم العروض</p> <p>-تاريخ إنطلاق دراسة المشروع نوفمبر 2019</p>		أوت 2023	أوت 2021		16600	محطة التطهير المنزلية بمنزل الحياة
<p>-الإعلان عن طلب العروض مرتبط بتقدم إنجاز محطة التطهير الممكنين</p> <p>-تاريخ إنطلاق دراسة المشروع جانفي 2020</p> <p>-تاريخ الإنتهاء من دراسة المشروع نهاية سنة 2020.</p>		الثلاثية الثالثة لسنة 2023	الثلاثية الرابعة لسنة 2021		16700	ربط مدينتي سيدي بنور وعميرة الحجاج بشبكة التطهير ONAS

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ) (د)	المشروع
*بالنسبة لتهديب مجمع سالم بشير وحي الحمادة إنتهت الأشغال *بالنسبة للقسط الذي يشمل تهديب 53 كلم بطبابة والمكنين ;وزرمدين ومنزل النور وبنبله وتمديد 7 كلم ببنبله وبنان: في طور نشر ملف طلب العروض		مارس 2022	الثلاثية الأولى لسنة 2020		41000	مشروع تجديد 100 كلم من شبكات التطهير الرئيسية والثانوية وتمديد قنوات الشبكة على طول 75 كلم ONAS
في طور المصادقة على ملف طلب العروض من طرف اللجنة العليا للصفقات		الثلاثية الأولى لسنة 2022	الثلاثية الأولى لسنة 2020		15000	مشروع تهديب منظومة تحويل المياه المستعملة بمدينة تيطي طبابة والبقالطة ONAS

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
- قامت الوكالة بإعلان طلب العروض بتاريخ 16 أفريل 2019 لإعداد دراسة في الغرض والآن بصدد فرز العروض على أن تتطلق هذه الدراسة في النصف الأول من شهر جانفي 2020 كما أن مدة هذه الدراسة مقدره بخمسة عشر شهرا (15 شهرا). (تم تخصيص 500اد للدراسة و 20000أد للقسط الأول كاعتماد اولي)			سيتم الإنطلاق في الأشغال قبل موفى سنة 2020		20500	حماية الشريط الساحلي من الإنجراف
تم عقد عديد الجلسات خصصت للغرض وهي كالاتي: -جلسة اللجنة الفنية الإستشارية للصندوق بمقر وزارة السياحة يوم 27 أفريل 2019. -جلسة بمقر بلدية المنستير يوم 13 جوان 2019 للنظر في مكونات المشروع.			-		2500	تهيئة كرنيش القراعية بالمنستير من طرف صندوق حماية المناطق السياحية.

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
<p>جلسة اللجنة الفنية الإستشارية للصندوق يوم 15 ماي 2019.</p> <p>-جلسة اللجنة الفنية الإستشارية للصندوق يوم 22 نوفمبر 2019 حيث تمت المصادقة على تمويل المشروع عن طريق صندوق حماية المناطق السياحية في حدود 2.5 م.د مع تحويل الإعتمادات على أقساط حسب مقتضيات كراس شروط الصفقة ودعوة بلدية المنستير لموافاة وزارة السياحة بملف تفصيلي لطلب العروض.</p> <p>وقد قامت وزارة السياحة بتاريخ 20 ديسمبر 2019 بمراسلة بلدية المنستير لمدها بالملف التفصيلي لطلب العروض ونسخة من محضر اللجنة الوزارية للصفقات العمومية.</p> <p>-سيتم موافاة السيد وزير السياحة بملف طلب العروض بعد الحصول على مصادقة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على دراسة قسط الكهرباء وذلك في أقرب الآجال.</p>						

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
إنطلقت الدراسة منذ 29 أفريل 2019 وهي الآن على وشك الإنتهاء من المرحلة الأولى، علما أن مدة الدراسة مقدرة بإثني عشر شهرا..					800	-تخصيص إعتماذ قدره 800 أ.د. للإنطلاق الفوري في إعداد دراسة مشروع تهيئة وإستصلاح القسط الثاني من خليج المنستير على أن ينطلق إنجاز الأشغال قبل موفي سنة 2020.

### في مجال التهيئة الترابية والبنية التحتية

*مقترح بمشروع ميزانية الوزارة لسنة 2020 * دراسة مضاعفة مدركة الساحل: بصدد المصادقة على الدراسة النهائية. * التصفية العقارية: تم الإنطلاق في الإستشارة الخاصة في التخطيط العملي لإعادة التوطين من طرف مكتب الدراسات					75000	مشروع مضاعفة مدركة الساحل على طول 36.5 كلم
--	--	--	--	--	-------	--

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
دراسة جاهزة: الإعلان عن طلب العروض خلال الثلاثية الأولى لسنة 2020			الثلاثية الثانية 2020		15000	مشروع تهذيب الطريق المحلية 857 الرابطة بين صيادة والشرف على طول 19.5 كلم
بصدد إعداد ملف الصفقة وتنطلق الأشغال 10 فيفري 2020			بداية 2021		15000	ممشروع ربط ولاية المنستير بالطريق السيارة
في طور الأشغال	35%		16 جويلية 2018	14 شهرا	6500	إنجاز عدد 03 منشآت فنية على مستوى "وادي المالح" بالطريق الجهوية 93

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
إعداد ملف طلب العروض بالإدارة العامة للجسور والطرق. *مشروع مركزي مقترح بمشروع ميزانية الوزارة لسنة 2020					11200	مشروع تدعيم الطريق المحلية 854 الرابطة بين منزل حرب ومنزل خير وبئر الطيب وجمال على طول 16 كلم والطريق الجهوية 82 على مستوى مدينتي بنبله والمنارة
*مشروع مركزي انطلقت الدراسة ( و تم الرفع الطبوغرافي من طرف مكتب الدراسات ) *تاريخ الإنتهاء من الدراسة الثلاثية الثانية 2020(إنطلاق الدراسة ماي 2019)			موفي الثلاثية الثالثة 2020		4500	تهيئة 15 كلم من المسالك الريفية بمختلف معتمديات ولاية المنستير
بصدد إعداد الملفات التنفيذية للمشروع	5%	20 أوت 2020	14 أكتوبر 2019		5000	مشروع حماية مدينة المكنين من الفيضانات

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
-----------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	--------------	---------

## وكالة التهذيب والتجديد العمراني

<p>يتم إنجاز المشاريع على أقساط خلال الفترة (2019-2024)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● قسط 1 (2019-2021) يضم حي سيدي مأمون والزامرين بالمكنين وتم الإعلان على طلب لقبول ترشحات التعبير عن الرغبة في المشاركة لإختيار مكتب الدراسات وحدد آخر أجل لقبول العروض يوم 13 جانفي 2020.</li> <li>● قسط 2 (2020-2022) يضم حي برج القاضي والمنطقة عدد 3 بقصر هلال.</li> <li>● قسط 3 (2021-2023) يضم حي الهادي شاكر و 20 مارس ببنان بوضر.</li> </ul>		أكتوبر 2021	أكتوبر 2020		15000	مشروع تهذيب وإدماج الأحياء السكنية سيدي مأمون والزامرين بالمكنين وبرج القاضي والمنطقة عدد 3 بقصر هلال والهادي شاكر و 20 مارس والشراقي ببنان
---	--	-------------	-------------	--	-------	---



الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
<p>- قررت الجهة تخصيص التدخل لفائدة بلديات قصر هلال و جمال والوردانين و بنبله المنارة بالإتفاق مع بلدية طبلبة وذلك لمحدودية الإعتمادات المرصودة لحي الحلية مقارنة بالحاجيات على أن يتم النظر في إمكانية إدراج حي الحلية ضمن البرامج التي تم إقرارها.</p> <p>- تم تعيين المقاوله لبلديات قصر هلال وجمال والوردانين وبنبله المنارة ومن المنتظر إنطلاق الأشغال خلال شهر ديسمبر 2019</p>		أكتوبر 2020	أكتوبر 2019		4700	مشروع تعبيد الطرقات ببلديات قصر هلال وجمال والوردانين وبنبله المنارة .
<p>تم الإعلان على طلب العروض للأشغال وحدد آخر أجل لقبول العروض يوم 22 جانفي 2020 على أن تنطلق الأشغال خلال شهر مارس 2020 وذلك بعد أن تم رصد تمويلات إضافية بقيمة 2 مليون دينار على حساب الموارد العامة لميزانية الدولة وسيتم ترسيمها بعنوان ميزانية 2020</p>		ديسمبر 2020	ديسمبر 2019		4500	مشروع تهذيب وإدماج حي النزهة وحي الرياض بالمنستير (تصريف مياه الأمطار)

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
تم إعطاء الإذن بانطلاق الدراسة بتاريخ 16 ديسمبر 2019. - من المتوقع الإعلان على طلب العروض للأشغال خلال شهر جويلية 2020. ملاحظة: التسمية المعتمدة ضمن برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية هي الشرقي وسيدي بوعثمان بالوردانين					1000	مشروع تهذيب وإدماج حي الشرقي بالوردانين والحي الشعبي ببوعثمان
<b>في مجال الفلاحة والصيد البحري</b>						
في إنتظار إتمام إجراءات تخصيص قطعة الأرض لصالح المشروع التي إنطلقت بالتنسيق مع الإدارات المعنية (وكالة حماية الشريط الساحلي / الإدارة الجهوية للتجهيز والتهيئة الترابية بالمنستير)		أكتوبر 2023	سبتمبر 2020		3500	تأهيل مركز التكوين المهني في الصيد البحري بطبلبة

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
إعتماد مبدئي في إنتظار ما ستحدده الدراسة ككلفة					2000	حماية وتوسعة ميناء الصيد البحري بصيادة
في طور تسجيل الصفقة			فيفري 2020		1400	إعادة تهيئة المسالك الفلاحية بمختلف المناطق السقوية على طول 35 كلم (9 مناطق)
تم في هذا الإطار عقد جلستي عمل بمقر وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي بإشراف من السيد المدير العام وبحضور ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري ووزارة التكوين المهني والتشغيل الولاية والإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالمنستير وذلك يومي 30 ماي 2019 و25 جوان 2019 تم الإتفاق على تكليف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمتابعة تنفيذ قرار السيد رئيس الحكومة.					3000	إحداث مركز تكوين في مهن البحار بطبلبة

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
					13000	مشروع بناء ثلاثة أقسام جديدة للطب والجراحة والأمراض النفسية للأطفال بمركز التوليد وطب الولدان بالمنستير - إعادة توظيف الفضاءات المخصصة حاليا للأقسام المذكورة لوحدة زرع الكبد للأطفال وقسم لأمراض الغدد بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير
في انتظار ترسيم المشروع ضمن ميزانية 2020					3400	
باشرت المصالح الفنية للمستشفى بتعيين المصممين والانطلاق في الدراسات حيث تمت المصادقة على الدراسة التمهيديّة المفصلة بالنسبة للهندسة المعمارية بتاريخ 01 أكتوبر 2019. بصدد اعداد ملف طلب العروض					1000	مشروع تهيئة قسم "ب" لأمراض القلب والشرابين بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
تم ترسيم مشروع إحداث وحدة تصفية الدم بالمستشفى الجهوي بالمكنين بميزانية سنة 2020 بتاريخ 06/09/2019 وفي انتظار ترسيم الاعتمادات.					800	مشروع إحداث وحدة لتصفية الدم بالمستشفى الجهوي بالمكنين
أحيل مشروع تحويل المصحة الى مؤسسة عمومية للصحة منذ تاريخ 27/03/2019 إلى المصالح المختصة برئاسة الحكومة وذلك قصد عرضه على الإمضاء والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ .						إصدار الأمر الحكومي المتعلق بتحويل مصحة طب وجراحة الأسنان بكلية طب الأسنان بالمنستير إلى مؤسسة عمومية للصحة (EPS)
تم منح الصبغة الجامعية لقسم التصوير الطبي وقسم المخبر بتاريخ 22 أوت 2019.						إضفاء الصبغة الجامعية لقسمي المخبر والأشعة بالمستشفى الجهوي بقصر هلال

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
تم عرض الملف على اللجنة الجهوية للصفقات بالولاية بتاريخ 10 جانفي 2020					960	استكمال تهيئة وتجهيز قسم الجراحة العامة وقاعات العمليات بالمستشفى المحلي بجمال وتوفير الموارد البشرية
تم توفير الموارد البشرية						توفير الإطار الطبي وشبه الطبي الضروري لمختلف المؤسسات الصحية بولاية المنستير
<b>في المجال الثقافي</b>						
- تمت أشغال الرفع الطبوغرافي - تمت الدراسة الجيوتقنية - تم فتح مناظرة تصميم المثل الهندسي للمشروع. - تم المصادقة على المثل الهندسي الفائز في المناظرة. - الإعداد لانطلاق الدراسات الأولية.					1700	مشروع تهيئة شاملة لدار الثقافة جمال

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
تقرر بعد جلسة يوم 21 جوان 2019. بالإدارة الجهوية للتجهيز إعداد الاستشارات الخاصة بأشغال الرفع الطبوغرافي و الدراسة الجيوتقنية للمشروع. في انتظار تحويل اعتمادات الدراسات من طرف الوزارة إلى المجلس الجهوي بالمنستير. ( 6328 د للدراسة الجيوتقنية و 1017 د لأشغال الرفع الطبوغرافي)					2500	مشروع بناء مركب ثقافي بقصر هلال
متابعة المشروع من طرف المعهد الوطني للتراث					1200	مشروع إحداث المركز الدولي للدراسات: مركز الزعيم الحبيب بورقيبة الدولي للفكر والتحديث بالمنستير

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
<p>- تم تحويل اعتماد 500 أ د من وزارة الشؤون الثقافية إلى المجلس الجهوي بالمنستير للشروع في انجاز الدراسات..</p> <p>- التنسيق مع بلدية المنستير و الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بخصوص التفويت في العقار لتخصيصه لوزارة الشؤون الثقافية.</p> <p>- تم استكمال ملف تخصيص العقار.</p> <p>- التنسيق بين الوزارة ( إدارة البناءات ) و الإدارة الجهوية للتجهيز للإعداد لانطلاق الدراسات.</p>					500	دراسة مشروع بناء مسرح الهواء الطلق بساحة 3 أوت بالمنستير
<p>بصدد إعداد ملف التمويل العمومي</p>					200	دعم الدورة الأولى للمهرجان الدولي للسينما بالمنستير الفيلم الأول



الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
-----------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	--------------	---------

### في مجال التكوين المهني والتشغيل

*تم الإعلان من طرف الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالمنستير عن طلب العروض لاختيار المقاولات بالصحافة المكتوبة وذلك يوم 16 نوفمبر 2019 . *في مرحلة فتح طلب العروض واختيار المقاولات .			خلال سنة 2020		7000	مشروع إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بطبلبة
-أعدت الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالمنستير مشروع دراسة أولية حول تطوير جهاز التكوين المهني بالجهة وقامت بمد كافة الإدارات ذات العلاقة بنسخة منها لإبداء الرأي واقتراح التحويلات الضرورية وذلك بتاريخ 12 جوان 2019 . -بصدد القيام بتحيين المعطيات اللازمة الخاصة بمشروع الدراسة الأولية .			خلال سنة 2021		7000	الإذن بتسريع تحديد الاختصاصات الجديدة لتأهيل المركز القطاعي للتكوين في الزرد والإكساء ببنبلبة لتستجيب لحاجيات الجهة من المهارات والكفاءات وتخصيص 7 مليون دينار

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
في طور المصادقة على الخطوط المرجعية المعدة من قبل وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي			قبل موفى سنة 2019			الإذن بالشروع في إعداد دراسة لإحداث مركز تكوين مهني في مهن البحار بطبلة

### في مجال النقل

بناء محطة فرعية بالمكينين و تزويد مترو الساحل بالكهرباء :في طور الدراسة بناء جسور: في طور الدراسة اقتناء 6 قطارات مكهربة: بصدد اعداد كراس الشروط (في إنتظار إنتداب خبير في إبرام الصفقات طبقا لتوصيات البنك الأوربي للإتشاء والتعمير) مضاغفة الخط الحديدي 22 المكينين: في طور الدراسة (إنطلقت الدراسة في أكتوبر 2018 ومن المتوقع الإنتهاء في الثلاثي الأول من سنة 2020) التشوير: في طور الدراسة		اخر 2023	الثلاثي الاخير لسنة 2020		150000	مضاغفة الخط الحديدي 22 في جزئه الرابط بين المكينين والمهدية
---	--	----------	--------------------------	--	--------	---

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
-----------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	--------------	---------

### في المجال الصناعي

بصدد فرز العروض					2900	ربط المنطقة الصناعية بمنزل الحياة بالغاز الطبيعي
الأشغال جارية	60%	موفى شهر سبتمبر 2020	9 سبتمبر 2019		2100	ربط المنطقة الصناعية بمنزل الحياة بالتيار الكهربائي

### بنايات وزارة الداخلية

إنطلاق الدراسة في 19/03/2019 بصدد إعداد ملف طلب العروض (التجهيز)					2350	أشغال بناء مقر جديد لمنطقة الأمن الوطني ومركز الأمن الوطني بقصر هلال
--	--	--	--	--	------	--

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنهاء الأشغال	تاريخ إطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
تمّ الإعلان عن طلب العروض (القسط الرابع) إطلاق الدراسة في 21/03/2019					2000	أشغال تهيئة وتوسيع مقر الفوج الجهوي لحفظ النظام بالمستير
القسط الثاني: بصدد إعداد ملف طلب العروض لكل الأقساط (التجهيز) إطلاق الدراسة في 26/03/2019					1600	بناء مقر جديد لمنطقة الأمن الوطني بالمكئين
في إنتظار الإعلان عن طلب العروض (الملف جاهز) تمت مراسلة الوزارة تحت عدد 4304 بتاريخ 03/05/2019 حول تغيير المشروع من بناء منطقة حرس بحري إلى بناء منطقة حرس وطني					1080	بناء مقر جديد لمنطقة الحرس الوطني بالمستير
بصدد إعداد ملف طلب العروض) التجهيز) إطلاق الدراسة في 21/03/2019					750	بناء مقر جديد لمركز الأمن العمومي للحرس الوطني قصر هلال المكئين

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
في مرحلة إعداد الدراسة التمهيديّة الموجزة (التجهيز)					650	بناء الفضاء الأول بمركز التكوين المختص للحرس البحري بالمنستير
تمّ تعيين المقاول والإذن بإنطلاق الأشغال					650	بناء مقر جديد لمعمدية والمسكن الوظيفي بالمكنين
في إنتظار الدراسة التمهيديّة الموجزة المنقحة إنطلاق الدراسة في 21/03/2019					650	بناء مجمع أمني للحرس الوطني بزاوية قنطش
في إنتظار الحصول على قرار إحداث المنطقة من الإدارة العامة للحرس الوطني						إحداث منطقة للحرس الوطني بزرمدين

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنهاء الأشغال	تاريخ إطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
<b>بنايات وزارة المالية</b>						
بصدد المصادقة على قانون المناظرة(التجهيز) إطلاق الدراسة خلال سنة 2020					1620	بناء مجمع مالية بنبله ومركز أرشيف جهوي
<b>البرنامج الجهوي للتنمية</b>						
تم فتح 9.9 م.د وبصدد تحويل بقية الإعتمادات المقدرة بـ 6.2 م.د					16100	تخصيص إعتماد قدره 16.052 مليون دينار ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لإنجاز جملة من التدخلات المتعلقة بالبنية الأساسية وتحسين ظروف العيش

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
<b>في مجال البنية التحتية ودفع الاستثمار</b>						
تركيز مصطبة: أعدت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي استشارة لدراسة الجدوى لإنجاز مصطبة عائمة وقابلة للتفكيك. تم الإعلان عن طلب العروض للدراسة يوم 22 جانفي 2020 وآخر أجل يوم 12 فيفري 2020 وإنطلاق الدراسة متوقع في أفريل 2020 والإنجاز مرتبط بتوفير التمويل			لم تنطلق الأشغال إلى حد التاريخ		100	وضع برنامج لتثمين جزيرة "قوريا" وتركيز مصطبة عائمة لتسهيل تنقل الزوار من المراكب بالبحر إلى الجزيرة
بصدد انتظار تحويل اعتماد من وزارة المالية إلى الديوان قدره 60 أ.د لإنجاز الدراسة الفنية والهندسية تم طلب تبويب المشروع ضمن ميزانية التنمية للديوان الوطني للصناعات التقليدية لسنة 2020 كما تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتنمية بولاية المنستير لإدراجه ضمن مقترحات الجهة لميزانية التنمية لسنة 2020			2021		4500	إعداد دراسة فنية وهندسية لإحداث قطب تنموي للتجديد وتطوير المنتج الحرفي بمدينة بوججر

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
<b>في مجال المبادرة الخاصة وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتمكين الاقتصادي للمرأة</b>						
قام المكتب الجهوي لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالمنستير بتمويل عدد 05 مشاريع خلال سنة 2019 بمبلغ 5.6 مليون دينار وبحجم مصادقات قدر ب 3.8 مليون دينار ومكنت هذه المشاريع من إحداث 42 موطن شغل.					13000	تخصيص اعتماد قدره 13 مليون دينار لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة بالجهة
تم عقد 10 جلسات للجنة الجهوية لاعتماد الانطلاق كالتالي: ( 04 مارس و 08 أفريل و 02 ماي و 21 ماي و 02 جويلية و 23 جويلية و 27 أوت و 11 أكتوبر و 20 نوفمبر و 16 ديسمبر 2019 ). بلغ عدد المشاريع الممولة عن طريق آلية اعتماد الانطلاق بولاية المنستير إلى غاية شهر ديسمبر 2019 حوالي 176 مشروعا بكلفة تناهز 7 مليون دينار واعتماد انطلاق يقدر ب 1.3 م د مكنت من توفير 386 موطن شغل					29000	الإذن بالإسراع في صرف اعتماد الانطلاق للباعثين المتحصلين على الموافقة المبدئية من البنك التونسي للتضامن



الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
وهي اعتمادات مبرمجة خلال سنة 2020 لتمكين حوالي 50 أسرة منتفعة حسب خصوصية كل مشروع.					200	تخصيص اعتماد قدره 200 ألف دينار لبرنامج التمكين الإقتصادي للأسر ذات الوضعية الخاصة بالجهة والترفيغ في عدد المنتفعين به
تم تمويل 78 مشروعا ومرافقة الباعثات من خلال التكوين والتأطير بالتنسيق مع مختلف هياكل المساندة والمرافقة بولاية المنستير.					1237	تمويل 65 مشروعا ضمن برنامج رائدة للتمكين الاقتصادي للمرأة

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنهاء الأشغال	تاريخ إطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
<b>في مجال التربية والتعليم</b>						
مدرسة ابتدائية بالحي السادس بالمستير: بكلفة تقدر بـ 650 أ.د *انطلقت الأشغال في 11/11/2019: نسبة تقدم الأشغال 15% معهد ومدرسة إعدادية العمران بالمستير: بصدد تعيين مصممين للإنطلاق في الدراسات مدرسة إعدادية بالبقالطة: بصدد تعيين مصممين للإنطلاق في الدراسة مدرسة إعدادية منزل حياة: بصدد تعيين مصممين للإنطلاق في الدراسة معهد بطوزة: بصدد الإعداد لطلب العروض					14100	الإذن بانطلاق إحداث 06 مؤسسات تربوية بولاية المستير (مدرسة ابتدائية بالحي السادس بمدينة المستير ومدرسة إعدادية بالبقالطة ومعهد ومدرسة إعدادية العمران بالمستير ومعهد بطوزة ومدرسة إعدادية بمنزل حياة) مع إعطاء أولوية الإنجاز للمشاريع التي تم فض إشكالياتها العقارية
انطلقت الأشغال لجل المؤسسات التربوية وتراوحت نسبة تقدم الأشغال بين 5 و 30%					8000	تخصيص اعتماد قدره 8 مليون دينار لتوسعة وصيانة 25 مؤسسة تربوية بمختلف معتديات الولاية

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
<b>في المجالات الخصوصية وتقريب الخدمات الإدارية من المواطن</b>						
تمت مناقشة الدراسة التمهيديّة APS بإدارة التجهيز بتاريخ 06/12/2019					170	بناء وحدة محلية للنهوض الاجتماعي بزرمدين
بنان: * تم الإعلان عن طلب العروض وإختيار المقاول * في إنتظار إنطلاق الأشغال وفتح الإعتمادات بني حسان: * في طور تخصيص الأرض * الدراسات اللازمة تنطلق سنة 2020 عميرة التوازرة: * في طور تخصيص الأرض * الدراسات اللازمة تنطلق سنة 2020					2130	إحداث ثلاثة نوادي أطفال بكل من بنان وبني حسان وعميرة التوازرة
مشروع مبرمج للإنجاز سنة 2020 دراسة وبناء					1500	بناء مقر للمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالمنستير

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
بالنسبة لدار خدمات بكل من الوردانيين وزرمدين في مراحل تحضيرية بالتنسيق مع البلديات المعنية وكل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وإتصالات تونس بالنسبة لبنيلة: وجود تعهد مبدئي لرئاسة الحكومة من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في هذا الخصوص			قبل موفى 2020			إحداث دور خدمات إدارية بكل من الوردانيين وبنيلة وزرمدين
التنسيق متواصل بين رئاسة الحكومة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بخصوص توفير وسائل النقل الضرورية وذلك في إطار التعاون مع البنك الدولي.			خلال سنة 2021			إحداث دور خدمات متنقلة لتقريب الخدمات الإدارية بمناطق عميرة الحجاج وعميرة الفحول وعميرة التوازة ومنزل فارسي وسيدي بنور وشراجيل

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
<b>الشباب</b>						
في انتظار إعداد تقرير الختبار الخاص بالبنية من قبل مكتب المراقبة	5% دراسات	موفى سنة 2020			200	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب بالحلية
في طور إعداد الدراسة التمهيدية الموجزة المنقحة	70% دراسات	خلال سنة 2021			200	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب بالمكينين
في طور إعداد الدراسة التمهيدية المفصلة.	50% الدراسات	خلال سنة 2020			200	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب ببقالطة
تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة لكل الأقسام حسب الاعتماد الإضافي بتاريخ 24/09/2019. تم ضمه مع مشروع سنة 2018 لتصبح القيمة الجمالية للمشروع 700أ.د وهو في طور إعداد ملف طلب العروض	90% دراسات	بداية سنة 2021			200	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب بجمال

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
في طور إعداد ملف طلب العروض	15% در اسات	موفى سنة 2020			200	تهيئة دار الشّباب بمنزل كامل
في طور إعداد الملف المرجعي للمشروع (مناظرة وطنيّة). وتمّت إحالة البرنامج الوظيفي لمصالح التجهيز والولاية وقد تمت إحالة نسخة من الملف العقاري، الوارد علينا من البلدية، إلى مصالح التجهيز في 30/04/2019. وقد تم تنقيح مثال الأشغال المختلفة من طرف بلدية المكان لوجود بعض الاخلالات في المثال المقدم و تمت إحالته من طرف البلدية إلى مصالح التجهيز بتاريخ 02 ديسمبر 2019 مع الإشارة أنه تم برمجة 1000د (2020) لإنجاز أشغال مشروع بناء دار الشباب بعميرة الحجاج	25% دراسات	خلال سنة 2021			1000	بناء دار الشّباب بعميرة الحجاج
* 70 أ.د. دراسة (تقدمت بنسبة 25%).						

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
بصدد إعداد مسودة ملف طلب العروض لكل الأقسام	95%دراسات	موفى سنة 2020			500	تهيئة و توسيع مركز التّخيم والإصطياف بالبقالطة
في انتظار تقرير الإختبار الفني بالنسبة للسياج الخارجي للمؤسسة.	5%دراسات	خلال سنة 2020			50	إتمام تهيئة دار الشباب بطوزة
<b>في مجال الرياضة</b>						
في طور إعداد ملف طلب العروض علما وانه تم ادراج اشغال تهيئة السياج الداخلي المتضرر من الامطار	90%دراسات	خلال سنة 2020			600	تعشيب ملعب منزل كامل
في طور إعداد الدراسة التمهيدية المفصلة والمنقحة.	20%دراسات	خلال سنة 2020			600	تعشيب ملعب البقالطة
بصدد إعداد الدراسة التمهيدية المفصلة	20%دراسات	خلال سنة 2020			700	تعشيب الملعب البلدي بزرمدين

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
تمت المصادقة على ملحق الصفقة (تم توفير الإعتماد الإضافي من طرف الوزارة و البلدية) وقريبا تستأنف الأشغال بتاريخ 2020-01-29	100% دراسات	خلال سنة 2020			792	ملحق مشروع بناء قاعة الرياضة بالمكئين
في طور إعداد ملف طلب العروض. تم ضمه مع مشروع تهيئة حجرات الملابس بملعب الوردانيين المبرمج على حساب برنامج التنمية المندمجة لسنة 2014 لتصبح القيمة الجمالية 421 أد ( وقد تعهدت البلدية بتوفيرالفارق في الاعتمادات بعد الاعلان على طلب العروض) .	90% دراسات	خلال سنة 2020			350	إعادة بناء حجرات الملابس بملعب الوردانيين
في طور إعداد الدراسة التمهيديّة المفصلة المنقحة (كانت البلدية ستوفر اعتماد اظافي يقدر ب 100 أد وحاليا لن تساهم الا ب 30أد حسب علمنا)	75% دراسات	خلال سنة 2020			250	تهيئة قاعة الرياضة مصطفى بن جنّات بالمنستير
مشروع تم إدراجه ضمن ميزانية التنمية لسنة 2020					250	إتمام تهيئة ملاعب التنس بالمنستير



الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	تاريخ إنتهاء الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	الآجال التعاقدية للأشغال	الكلفة (أ د)	المشروع
في طور إعداد الدراسة التمهيديّة الموجزة بعد أن حددت البلدية نوعية التدخل حسب المراسلة الموجهة الى التجهيز بتاريخ 25 نوفمبر 2019).	10% دراسات	خلال سنة 2020			200	تهيئة الملعب البلدي ببنان
بصدد اعداد الدراسة التمهيديّة المفصلة والمنقحة	80% دراسات	خلال سنة 2020			140	إستكمال تهيئة ملعب لمطة
تم إنطلاق الدراسة	10% دراسات	خلال سنة 2020			100	تهيئة قاعة الرياضة بصيادة
بصدد إعداد الدراسة التمهيديّة المفصلة	10% دراسات	خلال سنة 2020			150	تجديد أرضية قاعة الرياضيّة بطبلبة
تم الإعلان عن طلب الإستشارة و آخر اجل لقبول العروض 2020/01/29	90% دراسات	خلال سنة 2020			100	مواصلة تهيئة مقر المندوبيّة الجهويّة بالمنستير

متابعة القرارات  
المعلن عنها من طرف السيد رئيس الحكومة  
بتاريخ 22 جوان 2019

ولاية المهديّة

نص القرار	الهيكل المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	التوصيات
إحداث معتمديتين بكل من رجيش والبرادعة	وزارة الداخلية ولاية المهديّة	إجرائي في إنتظار صدور الأمر الخاص بالإحداث بالرائد الرسمي	تم عقد جلسة عمل بمقر ولاية المهديّة بتاريخ 16 / 10 / 2019 بحضور جميع الأطراف المتدخلة تم خلالها تحديد وضبط العقارات المزمع إستغلالها. - رجيش: تم إقتراح مقر على وجه الكراء - البرادعة: تم إقتراح مقر واختيار قطعة أرض دولية كما تمت مراسلة وزارة الداخلية في الغرض.	- الإسراع بإصدار الأمر الخاص بالإحداث.
تخصيص مساحة 6 هكتارات من حوزة مشروع بن غياضة غير مطلة على البحر لتكون حيا إداريا للجهة وقصرا للمعارض	وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. شركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة. الإدارات والهياكل الجهوية	بصدد التنفيذ	تم توجيه مراسلة في الغرض من السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى السيد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتاريخ 24 جويلية 2019 لاقتراح تخصيص قطعة أرض دولية تمسح 55121م <sup>2</sup> كما تم جهويا مراسلة الوزارات والإدارات والهياكل الوطنية بتاريخ 12 نوفمبر 2019 لمدنا بحاجياتها وقد ورد علينا رد العديد منها (وزارة شؤون المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن-وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية-البنك المركزي- وزارة شؤون الشباب والرياضة-اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية- المعهد الوطني للإحصاء-وزارة العدل-الشركة التونسية للكهرباء والغاز...).	تقترح الجهة إحداث مركب إداري مندمج (بناء عمودي) يحتوي على كل الإدارات والهياكل العمومية لإستثمار المساحة المتوفرة مع إمكانية أفراد بعض الهياكل الخصوصية على غرار المحكمة والمعرض بمقاسم فردية. خاصة أن <u>الطلبات إلى حد اليوم تجاوزت 4,56417م<sup>2</sup></u>

نص القرار	الهيكل المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	التوصيات
إدراج إحداث 04 دور للخدمات بكل من ملولش وشريان وأولاد الشامخ و بومرداس ضمن قائمة دور الخدمات التي ستحدث على المستوى الوطني.	رئاسة الحكومة الشركة التونسية للكهرباء والغاز الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الإدارات و الهياكل الجهوية المعنية	بصد التنفيذ	تم عقد جلسة عمل بمقر ولاية المهدي بتاريخ 16 / 10 / 2019 بحضور جميع الأطراف المتدخلة تم خلالها تحديد وضبط العقارات المزمع إستغلالها. - ملولش: بناية على وجه الكراء. - بومرداس: بناية على ملك البلدية تمسح 120 م <sup>2</sup> - أولاد الشامخ : مقر على ملك المجلس البلدي يمسح 350 م <sup>2</sup> . - شريان :مقر على ملك البلدية أسند من طرف هيئة الأموال والقيم لحزب التجمع المنحلّ.	-الإسراع بتوفير الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة.
إحداث إدارة جهوية للملكية العقارية على أن تنطلق في تقديم خدماتها موفى سنة 2019	وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حافظ الملكية العقارية	بصد الإنجاز	تم تنظيم زيارة ميدانية من طرف السيد الوالي لحث صاحب البناية على الإسراع بإتمامها كما تم تذليل الإشكاليات الخاصة بربط بالكهرباء... تقدم إنجاز يقدر بـ 90 % بعد تلافي إشكال في الربط مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز الطبيعي وتوفير محول كهربائي خاص بالإدارة ، ومن المتوقع الانطلاق في العمل بداية من شهر أفريل 2020 بعد تحديد القيمة النهائية وإتمام إجراءات التعاقد مع المسوغ.	- الإسراع بتوفير الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة.
دخول إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالجزم حيز الإستغلال.	الشركة التونسية للكهرباء والغاز وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية	أنجز	المقر الإداري جاهز منذ جانفي 2019 تمت تسمية رئيس إقليم بتاريخ 1 سبتمبر 2019 -بصد تخصيص 2 مقاسم (مقر فني ومغارة ) من قبل الوكالة العقارية الصناعية (لجنة فنية ).	دعم الفرع بالموارد البشرية والتجهيزات اللازمة.

نص القرار	الهيكل المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	التوصيات
إحداث 2 لجان إضافية لتكثيف أعمال المسح الإجمالي لتسوية الوضعيات العقارية لحبس عزيزة عثمانة ولحوزة بعض المشاريع العمومية مع توفير الوسائل اللوجستية والتجهيزات الإدارية الضرورية.	وزارة العدل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية "ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري"		تمت مراسلة السيد وزير العدل حول القرار بتاريخ 08 جويلية 2019 تحت عدد 8014, كما تمت مراسلة السيد رئيس المحكمة العقارية بالجهة.	الإسراع بتوفير الوسائل اللوجستية والتجهيزات الإدارية الضرورية.
تسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية المقامة على عقارات دولية بولاية المهديّة على مساحة 3,975 ألف هكتار لحوالي 184 تجمع سكني ولفائدة حوالي 21,5 ألف ساكن.	وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري	بصدد الإنجاز	تم الشروع فعليا في عملية التسوية بمعتمديتي السواسي والمهدية لتشمل الى حدود هذا التاريخ حوالي 60 حالة.	الإسراع بتفعيل الإتفاقية المزمع إبرامها مع ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري لتشمل التسوية كامل التجمعات السكنية بمختلف معتمديات الولاية
تسوية وضعية المتحورين للعقارات الدولية الفلاحية الراجعة للدولة من الاحباس أو أحباس الزوايا على غرار حبس عزيزة عثمانة بالجهة.	وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري		تمت مراسلة الوزارة قصد الإسراع بإصدار الأمر الذي يضبط ثمن بيع العقارات التابعة لحبس عزيزة عثمانة	-الإسراع بإصدار الأمر الذي يضبط ثمن بيع العقارات التابعة لحبس عزيزة عثمانة.

نص القرار	الهيكل المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	التوصيات
<b>النقل</b>				
الانطلاق في أشغال مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية بكلفة 50 م.د بداية من سنة 2020.	وزارة النقل والشركة التونسية للسكك الحديدية الإدارات و الهياكل الجهوية	تمت المرحلة الأولى من الدراسة		
إعداد دراسة شاملة تؤسس لإعداد رؤية إستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد لقطاع السكك الحديدية والمترو بالجهة بكلفة 1 م د (تأخذ بعين الإعتبار ربط المهديّة بالجم والمهدية بركر لتصبح محطة لوجستية خاصة تزامنا مع إنجاز المشروع المندمج بالمرسلان ) منطقة صناعية وحي سكني للوكالة العقارية للسكنى ومدرسة لضباط الديوانة... ) وربط المهديّة بالشابة (خط حديدي ساحلي).	وزارة النقل وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية الشركة التونسية للسكك الحديدية الإدارات و الهياكل الجهوية المعنية		تمت مراسلة الوزارة والشركة في الغرض بتاريخ 08 جويلية 2019 تحت عدد 8014	- رصد الإعتمادات و إفادة الجهة بما تم في الغرض.
الانطلاق خلال شهر جويلية 2019 في دراسة لإحداث رصيف خاص لإرساء الرحلات الدولية السياحية بين ميناء المهديّة وسبخة بني غياضة في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص.	رئاسة الحكومة " الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص" وزارة النقل ووزارة السياحة والصناعات وكالة مواني و التجهيزات الصيد البحري ديوان البحرية التجارية والمواني		تمت مراسلة وزارة النقل وديوان البحرية التجارية بتاريخ 08 جويلية 2019 تحت عدد 8014	رصد الإعتمادات و إفادة الجهة بما تم في الغرض

نص القرار	الهيكل المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	التوصيات
انجاز دراسة لإحداث ميناء تجاري بالعالية من معتمدية قصور الساف قبل موفى سنة 2019.	وزارة النقل وزارة التجارة ديوان البحرية التجارية والمواني الإدارات و الهياكل الجهوية	-	تمت مراسلة وزارة النقل وديوان البحرية التجارية بتاريخ 08 جويلية 2019 تحت عدد 8014	- مدّ الجهة برزنامة تنفيذية مرفقة للقرار.
إعداد دراسة إستشرافية لقطاع النقل بولاية المهديّة خلال سنتي (2019-2020)	وزارة النقل الإدارات و الهياكل الجهوية المعنية	-	تمت مراسلة وزارة النقل وديوان البحرية التجارية بتاريخ 08 جويلية 2019 تحت عدد 8014	- مدّ الجهة برزنامة تنفيذية مرفقة للقرار.

### الطرق والجسور وتصريف مياه الأمطار

إعداد دراسة جدوى لإحداث طريق سريعة تربط معتمديات ولاية المهديّة بالطريق السيارة بكلفة 350 أ. د.	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية الإدارات و الهياكل الجهوية المعنية	بصدد إعداد كراس طلب العروض	بصدد إعداد الضوابط المرجعية للدراسة موفى سنة 2019.	-الإسراع بإعداد الدراسة وتعبئة الموارد المالية لتحرير حوزة المشروع وإعتمادات الإنجاز خلال المخطط 2021-2025
الانطلاق في تهيئة و تصريف مياه الأمطار بجزء من الطريق الجهوية رقم 191 من ن ك 30 إلى ن ك 500+32 ( طريق/ شارع تونس) بمدينة المهديّة بكلفة 4.9 م د خلال سنة 2019.	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية الإدارات و الهياكل الجهوية المعنية	بصدد إعداد كراس طلب العروض	- الدراسة جاهزة. تم إدراجها ضمن مشروع ميزانية 2020 منها 2م.د تعهدا ودفعاً.	رصد الإعتمادات و إفادة الجهة بما تم في الغرض

التوصيات	المتابعة	حالة التنفيذ	الهيكل المعني بالتنفيذ	نص القرار
	دراسة التصفية العقارية من قبل اللجنة الجهوية. تم تكليف مجمع مكتب الدراسات SAT+CEP بكلفة جمالية بلغت حوالي 147,8 أ.د. للقيام بالدراسة حيث تم إعداد الدراسة التمهيدية المفصلة على أن يتم الشروع في إجراءات إقتناء الأراضي لتحرير الحوزة العقارية خلال 2020.	الدراسة 90%	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية الإدارات و الهياكل الجهوية المعنية	الانطلاق في تهيئة الطريق الجهوية رقم 191 الذي يربط ولاية المهدية بالطريق السيارة مع انجاز شبكة التنوير العمومي الى مفترق سيدي بنور المهدية.
الإسراع في التنفيذ	تم فتح العروض في 9/7/2019 وفي مرحلة فرز العروض.	في مرحلة طلب العروض	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	الشروع في انجاز الطريق المحلية 860 على طول 38 كلم بكلفة 20 م د تربط سيدي علوان مروراً بزالبة الى حدود ولاية صفاقس.
<b>الفلحة والصيد البحري</b>				
رصد الإعتمادات و إفادة الجهة بما تم في الغرض	تمت موافاة الإدارات المركزية المعنية بمحتوى القرارات المعن عنها من طرف السيد رئيس الحكومة لفائدة ولاية المهدية خلال زيارته إلى ولاية المهدية بتاريخ 22 جوان 2019 للقيام بما يتعين ومد المندوبية بما تم إنجازه في الغرض.	-	وزارة الفلحة والموارد المائية والصيد البحري وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية الادارة العامة للمصالح الجوية والبحرية وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري	إعداد دراسة لتأهيل وتهيئة مرفأ الصيد البحري المرسي بالشابة بكلفة 300 الف دينار والإنطلاق في الإنجاز سنة 2021. إعداد دراسة لتأهيل وتهيئة مرفأ الصيد البحري بملولش بكلفة 400 أ.د. و الإنطلاق في الإنجاز سنة 2021.



نص القرار	الهيكل المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	التوصيات
تخصيص 2 م.د لإتمام الدراسات وإنجاز مشروع تربية القمبري بملولش لفائدة شباب الجهة من ذوي الإختصاص، بعد نجاح التجارب النموذجية التي قامت بها وكالة حماية الشريط الساحلي تحت إشراف المركز الفني لتربية الأحياء المائية على مساحة 19 هكتار.	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المركز الفني لتربية الأحياء المائية وكالة حماية الشريط الساحلي الإدارات والهيكل الجهوية المعنية		- بصدد انجاز الدراسة لتركيز أحواض على مساحة 19 هك (سبتمبر 2019-أفريل 2020). - الشروع في تركيز القسط الأول من الأحواض (12 حوض للتسمين و 02 لمعالجة المياه وحوض لتنقية مياه التربية) خلال سنة 2020.	الوزارة والمركز الفني مطالبان بمدّ الجهة برزنامة مفصلة لتنفيذ القرار.
الانطلاق في دراسة جدوى لإحداث محطة تحلية لمياه البحر بالعالية بطاقة إنتاج من 100 الى 200 ألف متر مكعب في اليوم في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص.	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه.		- تمت مراسلة مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والشركة الوطنية لتوزيع وإستغلال الموارد المائية بتاريخ 08 جويلية 2019 لمدنا برزنامة التنفيذ	الوزارة والشركة مطالبة بمدّ الجهة برزنامة تنفيذية دقيقة للقرار.
إحداث مخبر إقليمي لمنظومة الألبان بكلفة 700 أ.د.	وزارة الفلاحة		تم إعداد إستشارة وفي إنتظار رصد الاعتمادات	رصد الإعتمادات و إفادة الجهة بما تم في الغرض

نص القرار	الهيكل المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	التوصيات
إتمام الدراسة الخاصة بمشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية المهدية سنة 2019 والاعلان عن طلب العروض سنة 2020 لفائدة معتمديات(أولاد الشامخ، هبيرة، شريان، السواسي، بومرداس) بكلفة 100 م. د	وزارة الفلاحة	85 % من الدراسة	على وشك إتمام انجاز المرحلة الأولى من الدراسة .	المطلوب الإسراع بإعداد الدراسة لتتمكن من تعبئة الموارد المالية للمشروع في الإنجاز سنة 2021,
إحداث 02 آبار للاستغلال المزاهدة 2 والمعايزة 3 بشريان بكلفة 1.1 م.د قبل موفى سنة 2020.	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المنذوبية الجهوية للتنمية الفلاحية		تم إعداد كراس الشروط وفي انتظار رصد الاعتمادات	ضرورة رصد الاعتمادات.
احداث 02 آبارا إستكشافية بكل من شريان والسواسي بكلفة 2.05 م.د قبل موفى سنة 2020.	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المنذوبية الجهوية للتنمية الفلاحية		تم إعداد كراس الشروط وفي انتظار رصد الاعتمادات	ضرورة رصد الاعتمادات.
تأهيل مخبر تحاليل التربة والمياه والنباتات بكلفة 200 أ د.	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المنذوبية الجهوية للتنمية الفلاحية	100%	أنجز بنسبة 100 %	
الإنطلاق في أشغال تعهد وإعادة تهيئة ميناء الصيد البحري بالمهدية موفى سنة 2019 بكلفة 45 م.د.	وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية الادارة العامة للمصالح الجوية والبحرية		تم عرض تقرير فرز العروض على أنظار اللجنة العليا للصفقات بتاريخ 15 جانفي 2020.	

التوصيات	المتابعة	حالة التنفيذ	الهيكل المعني بالتنفيذ	نص القرار
<b>الصناعة</b>				
	<p>تم عقد جلسة عمل بمقر ولاية المهديّة لإيجاد حلول للإشكاليات العالقة وهي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- صعوبة التزويد بالماء الصالح للشرب إضافة إلى الكلفة الباهضة حوالي 17 مليار</li> <li>- تحرير الحوزة العقارية والطبيعة الجغرافية للعقار تتطلب عملية تهيئته كلفة باهظة خاصة فيما يتعلق بحماية الجزء المتواجد على واجهة البحر</li> <li>- التكلفة المشددة المتوقعة للمتر المربع رغم عدم احتساب تكاليف الربط.</li> </ul> <p>تم إقتراح التحويل الوقتي من طرف الإدارة الجهوية لأملك الدولة بتاريخ 27 جانفي 2020 للوكالة العقارية الصناعية قبل رفع الموضوع إلى سلطة الإشراف للبت النهائي.</p> <p>تولت مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية دعوة الوكالة العقارية الصناعية لدفع قيمة العقار المقدره بحوالي 4 ملايين دينار لإتمام إجراءات التفويت.</p> <p>.تم تغيير صبغة الأرض طبقا لقرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتاريخ 18 ماي 2018</p> <p>. بصدد القيام بالتعديلات على المثال التقسيمي قبل عرضه للمصادقة</p> <p>. بصدد المصادقة على ملف الدراسة التفصيلية لمختلف الشبكات</p> <p>. تم إعادة عرض دراسة المؤثرات على المحيط للمصادقة</p> <p>. تم إعادة عرض الدراسة المائية بعد تعديلها أخذا بعين الاعتبار لملاحظات وزارة الفلاحة والموارد المائية.</p>		<p>وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وزارة المالية الوكالة العقارية الصناعية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الشركة التونسية للكهرباء والغاز الديوان الوطني للتطهير إتصالات تونس الإدارات و الهياكل الجهوية المعنية</p>	<p>الإنتلاق في أشغال تهيئة المنطقة الصناعية بالشابة موفى سنة 2019 بكلفة 8 م د مع تكفل الدولة بكلفة الربط الخارجي للشبكات والمقدرة بـ 17 مليون دينار.</p>

التوصيات	المتابعة	حالة التنفيذ	الهيكل المعني بالتنفيذ	نص القرار
<b>الصناعة</b>				
الإسراع بالتنفيذ	<p>إعلان طلب العروض بداية سنة 2020 والإنطلاق في أشغال التهيئة في الثلاثية الثانية من سنة 2020 .</p> <p>. تم الحصول على المصادقة على ملف مثال التهيئة التفصيلي من طرف لجنة الموافقات بتاريخ 17 جويلية 2018.</p> <p>. تم تغيير صبغة الأرض طبقا لقرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتاريخ 31 ماي 2018 .</p> <p>. الوكالة بصدد القيام بإجراءات إقتناء الأرض من الدولة</p> <p>. بصدد النظر في الملف التقسيمي قبل الإحالة إلى اللجنة الجهوية للمصادقة على التقسيمات .</p> <p>تم إقتراح التحويل الوقتي من طرف الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بتاريخ 27 جانفي 2020 للوكالة العقارية الصناعية قبل رفع الموضوع إلى سلطة الإشراف للبت النهائي.</p>		<p>وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة</p> <p>وزارة المالية</p> <p>الوكالة العقارية الصناعية</p> <p>الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه</p> <p>الشركة التونسية للكهرباء والغاز</p> <p>الديوان الوطني للتطهير</p> <p>إتصالات تونس</p> <p>الإدارات و الهياكل الجهوية المعنية</p>	<p>أحداث منطقة صناعية جديدة بالمسلان على مساحة 50 هك بكلفة 15 م.د كمرحلة أولى مع الحرص على إتمام الدراسات وطلب العروض قبل موفى سنة 2019 والإنطلاق في أشغال التهيئة بداية من سنة 2020.</p>

نص القرار	الهيكل المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	التوصيات
الإطلاق في إعداد الدراسات الخاصة بتهيئة 03 مناطق صناعية بكل من أولاد الشامخ وهبيرة والبرادعة بكلفة 1 م د لتكون جاهزة مع إنطلاق المخطط المقبل.	وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وزارة المالية الوكالة العقارية الصناعية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الشركة التونسية للكهرباء والغاز الديوان الوطني للتطهير إتصالات تونس الإدارات و الهياكل الجهوية المعنية		- سيتم إقتراح موقع جديد لإنجاز المنطقة الصناعية بالبرادعة. - تولت الوكالة القيام بطلب انجاز مثال أشغال خاصة و مختلفة من ديوان قيس الأراضي و المسح العقاري بالمهدية ضمن المكتوب بتاريخ 26 أوت 2019. - تولت الوكالة القيام بطلب شهادة ربط المواقع المقترحة بالتجهيزات الجماعية تاريخ 26 أوت 2019.	رصد الإعتمادات و إفادة الجهة بما تم في الغرض
الشروع في تركيز اللآقطات الشمسية لفائدة العائلات محدودة الدخل بالجهة.	وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وزارة الشؤون الإجتماعية الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.		- تمت مراسلة الوكالة بتاريخ 08 جويلية 2019	توفير الإعتمادات اللازمة ومدنا برزنامة تفصيلية.

التوصيات	المتابعة	حالة التنفيذ	الهيكل المعني بالتنفيذ	نص القرار
<b>السياحة</b>				
	<p>من المتوقع تخصيص المبلغ سنة 2021 ووضعه بالخزينة العامة للتمكن من مواصلة بقية إجراءات التصفية العقارية</p>		<p>رئاسة الحكومة " الهيئة العامة للمشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص "</p> <p>وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية</p> <p>وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي</p> <p>وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية</p> <p>وزارة السياحة والصناعات التقليدية</p> <p>شركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة</p> <p>الإدارات و الهياكل الجهوية المعنية</p>	<p>تهيئة سبخة بني غياضة :</p> <p>- الإنطلاق الفعلي في الدراسات الخاصة بسبخة بن غياضة في إطار التعاون التونسي الصيني.</p> <p>- تخصيص 12 م.د للتصفية العقارية والنهائية لحوزة مشروع سبخة بن غياضة وإحالة الأراضي التابعة لحوزة المشروع لفائدة الشركة.</p>

التوصيات	المتابعة	حالة التنفيذ	الهيكل المعني بالتنفيذ	نص القرار
<p>أن تأخذ الدراسة بعين الاعتبار أنشطة سياحية غير مستهلكة للماء والطاقة على غرار العديد من القرى السياحية الريفية .</p>	<p>-التأمت جلسة عمل يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 تحت إشراف السيد الوالي تلتها زيارة ميدانية حيث تبين من خلال ما تم تقديمه من معطيات أن المساحة المتبقية من مناب الدولة والمقدرة ب 158 هك تقريبا غير كافية لإنجاز مجمل المشاريع المقترحة والتي تتطلب مساحة قدرها 200 هك وبعد الدرس والنقاش ومع الأخذ بعين الاعتبار لأوليات التنمية بالجهة خاصة والمصلحة الوطنية عموما تم تخصيص 100 هك للوكالة العقارية السياحية.</p> <p>-تم توجيه مراسلة للوكالة العقارية السياحية بضرورة اعداد مثال أشغال مختلفة للمقاسم المطلوبة لانجاز المشروع.</p> <p>-تم عقد جلسة عمل بمقر ولاية المهدي بتاريخ 29 / 11 / 2019 بحضور جميع الأطراف المتدخلة تم خلالها ضبط المساحات التي سيتم التفويت فيها أو تخصيصها لفائدة الجهات الطالبة وفي انتظار تقديم الطلبات الرسمية وإعداد الأمثلة الفنية لإتمام إجراءات التحويز والانطلاق في انجاز المشاريع</p>		<p>وزارة السياحة والصناعات التقليدية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الديوان الوطني للتطهير الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه إتصالات تونس الإدارات و الهياكل الجهوية المعنية</p>	<p>احداث منطقة سياحية ايكولوجية بالعالية وبرمجة استغلالها بأنماط وأنشطة جديدة وذلك من خلال: - التفويت للوكالة العقارية السياحية في المساحة المتبقية (على ملك الدولة)حوالي 100 هك لتصبح بذلك المساحة الجمالية للمشروع في حدود 340 هك مع الانطلاق في تحيين دائرة التدخّل العقاري لإحداث المنطقة. - توفير اعتماد ب 5 م.د لفائدة الوكالة العقارية السياحية لإتمام الدراسات اللازمة والانطلاق في انجاز المشروع.</p>

نص القرار	الهيكل المعنى بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	التوصيات
<b>الصحة</b>				
انطلاق دراسة وبناء قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بكلفة 11م.د. إعداد الدراسات سنة 2019 للانطلاق في الإنجاز 2021.	وزارة الصحة وزارة التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية الإدارة الجهوية للصحة المستشفى الجامعي الطاهر صفر الإدارة الجهوية للتجهيز الإدارات و الهياكل الجهوية المعنية		- تم إعداد الإستشارة الخاصة بالمخطط المديرية وفي إنتظار فتح الإعتمادات.	رصد الإعتمادات و إفادة الجهة بما تم في الغرض
إحداث وحدة السموميات بقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بكلفة 400 أد	وزارة الصحة وزارة التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية المستشفى الجامعي الطاهر صفر الإدارات و الهياكل الجهوي		تم تحديد الموقع و تقدر كلفة البناءات بـ 200 أد و كلفة التجهيز حوالي 400 أد	- فتح الإعتمادات خلال سنة 2020.
توفير اعتماد 600 أد لتهيئة فضاء لإيواء السكان الثاني مبرمج إقتنائه هذه السنة 2019 لدعم المستشفى الجامعي الطاهر صفر.	وزارة الصحة وزارة التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية المستشفى الجامعي الطاهر صفر	تم توفير آلة السكان في ديسمبر 2019	- انطلقت الدراسات منذ جويلية 2019 تمت عقد جلسات و توجيه مراسلات عديدة في الغرض للأطراف المعنية . - وتم تكليف مكتب دراسات الذي رأيته بخصوص الإصلاح و تهيئة المقر عبر أقساط. - تم تنظيم زيارة ميدانية لقسم الأشعة و معاينة الأشغال من طرف لجنة مختصة من الإدارة العامة للبناءات بوزارة التجهيز أقرت بالتهيئة العامة للأسس بكلفة 11 م.د وتمت مراملة الوزارة في الغرض بتاريخ 22 جانفي 2020	- دعوة وزارة الإشراف لإعطاء الأولوية لتوفير الإعتمادات بصفة إستثنائية وعاجلة.



نص القرار	الهيكل المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	التوصيات
تهيئة فضاء لإيواء آلة التصوير بالرنين المغناطيسي "IRM" سنة 2019 وتوفير التجهيزات 2020	وزارة الصحة وزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية المستشفى الجامعي الطاهر صفر		تم تحديد موقع الفضاء	الإسراع في إعداد مخطط مديري يشتمل على مكونات المشروع والموقع والعلاقة الوظيفية بين الأقسام.
بناء وتجهيز قاعة قسرة لقسم القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي بكلفة 2 م د	وزارة الصحة وزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية المستشفى الجامعي الطاهر صفر الإدارات و الهياكل الجهوية المعنية		تم تحديد المكان بالطابق السادس بقسم القلب بالمستشفى الجامعي . - تمت استشارة شركات و مختصين في الميدان و النظر في مدى قدرة الهيكلة على تحمل التجهيزات.	الإسراع في الحصول على رأي الشركات و المختصين الذين تمت إستشارتهم. - الإسراع بتوفير الإعتمادات.
إتمام كل الإجراءات اللازمة هذه السنة والإنطلاق في إنجاز وتجهيز المستشفى الجهوي بالجم سنة 2020 بكلفة 52 م.د.	وزارة الصحة وزارة التجهيز والإسكان والهيئة الترابية الإدارات و الهياكل الجهوية المعنية		- تم إعداد مثال الأشغال الخاصة (TPD) - تسوية الوضعية العقارية - حاليا في مرحلة تغيير الصبغة والقيام بإجراءات التحويز في انتظار استكمال جميع إجراءات التخصيص. - تم إجراء المفاوضات أيام 30 و 31 ديسمبر 2019 حول بنود عقد الدراسات مع المكتب الاستشاري السعودي "سعودكونسلت" بالائتلاف مع المكتب التونسي "T2a Architects" الذي ارسي عليه طلب العروض بقيمة 1.040325 مليون دولار امريكي و حاليا بصدد اتمام اجراءات التعاقد و الانطلاق في الدراسات.	

التوصيات	المتابعة	حالة التنفيذ	الهيكل المعني بالتنفيذ	نص القرار
رصد الإعتمادات و إفادة الجهة بما تم في الغرض	تم إبرام عقد الهبة لقطعة الأرض المبرمجة لبناء المشروع وفي إنتظار موافاتنا بالبرنامج الوظيفي للإنتلاق في الدراسات .		وزارة الصحة وزارة التجهيز و	بناء قسم تصفية الدم بالشابة بكلفة 0,8 م د على أن تتم الدراسات هذه السنة 2019 والإنتجاز سنة 2020.
رصد الإعتمادات و إفادة الجهة بما تم في الغرض	في إنتظار موافاتنا بالبرنامج الوظيفي للإنتلاق في الدراسات .		الإسكان و التهيئة الترابية الادارة الجهوية للصحة الإدارات و الهياكل الجهوية المعنية	الإنتلاق في تأهيل المستشفى المحلي ببومرداس بكلفة 1,5 م.د سنة 2020
رصد الإعتمادات و إفادة الجهة بما تم في الغرض	في إنتظار موافاتنا بالبرنامج الوظيفي للإنتلاق في الدراسات .			تطوير المستشفى المحلي بالسواسي إلى مستشفى جهوي صنف " ب "

نص القرار	الهيكل المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	التوصيات
تطوير مراكز الصحة الأساسية بكل من التلالسة ومركز المدينة والحكايمة الشرقية 2 إلى صنف 4	وزارة الصحة وزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية الادارة الجهوية للصحة الإدارات و		في إنتظار موافاتنا بالبرنامج الوظيفي للإنطلاق في الدراسات .	رصد الإعتمادات و إفادة الجهة بما تم في الغرض
إحداث مركزين جديدين الأساسية صنف 3 بكل من بومرداس والمهدية المدينة	الهيكل الجهوية المعنية		في إنتظار موافاتنا بالبرنامج الوظيفي للإنطلاق في الدراسات	رصد الإعتمادات و إفادة الجهة بما تم في الغرض
تدعيم الإطار الطبي والشبه الطبي بالجهة.	وزارة الصحة	أنجز جزء منه.	-في إنتظار إنتداب اطباء الصحة العمومية من قبل المصالح المركزية	الإسراع في إنتداب أطباء الصحة العمومية من قبل المصالح المركزية

التوصيات	المتابعة	حالة التنفيذ	الهيكل المعني بالتنفيذ	نص القرار
<b>البيئة والتطهير</b>				
رصد الإعتمادات و إفادة الجهة بما تم في الغرض	<p>تم بتاريخ 26 جوان 2019 إمضاء محضر تحويز وقتي بعقار (جزء من القطعة عدد 3 التابعة للرسم العقاري 9609/2240006 المهديّة المسمى المسلان ) بين ممثل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالوسط الشرقي والمدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمهدية.</p> <p>إعلان الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بتاريخ 4 جويلية 2019 عن طلب عروض لانجاز الدراسات البيئية الأولية والمائية ودراسة الجدوى الفنية الاقتصادية لإحداث وحدة معالجة وتثمين للنفايات بالجهة وقد تم إعداد تقرير فرز العروض وإحالته على الهيئة العليا للطلب العمومي.</p>	-	وزارة الشؤون المحلية والبيئة وزارة أملاك الدولة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات	الإسراع في إتمام إجراءات التحويز لإحداث وحدة جهوية لتثمين النفايات بالمسلان.
في إنتظار توفير الإعتمادات.	تم الاتفاق على أن توفر وزارة الشؤون المحلية الإعتمادات 400 أد للأودية و600 أد للمصبات العشوائية.	-	وزارة الشؤون المحلية والبيئة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الإدارات و الهياكل الجهوية المعنية	دعم مالي للجهة ب 1 م د للقيام بعمليات التدخل لتهيئة المصبات والأودية.

نص القرار	الهيكل المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	التوصيات
إدراج المعالجة الثلاثية بقيمة 15م.د. بمحطة التطهير بالمهدية التي إنطلقت أشغالها سنة 2019 بكلفة 101 م.د.	وزارة الشؤون المحلية والبيئة الديوان الوطني للتطهير	تم إضافة العنصر %30		
الانطلاق في أشغال إنجاز محطة تطهير الجم بكلفة 11م.د. سنة 2019.	وزارة الشؤون المحلية والبيئة الديوان الوطني للتطهير	15 %	- إنطلقت الأشغال بكلفة محيئة تقدر ب 16م.د.	
إستكمال إجراءات طلب العروض لإنجاز محطة تطهير السواسي بكلفة 7.8 م.د. قبل موفى سنة 2019 والانطلاق في الأشغال سنة 2020.	وزارة الشؤون المحلية والبيئة الديوان الوطني للتطهير		- بصدد العرض على اللجنة العليا للصفقات.	

## السكن

نص القرار	الهيكل المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	التوصيات
<p>الإنتلاق في إعداد الدراسات التنفيذية لإنجاز مقاسم سكنية إجتماعية لفائدة حوالي 7500 منتفع على مساحة تفوق 139 هك بكل من "هنشير الفالطة" بمعتمدية السواسي والبرادعة بمعتمدية قصور الساف.</p>	<p>وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الوكالة العقارية للسكنى والإدارات و الهياكل الجهوية المعنية</p>		<p>- في طور إعداد الملفات الفنية للحوزات العقارية. - احراز تقدم على مستوى المدخر العقاري السكني بهنشير الفالطة بالاتفاق مع بلدية السواسي على ادماج المساحة غير المشمولة بمثال التهيئة العمرانية بمشروع التوسعة للمثال أو المصادقة عليها. - مواصلة العمل على فض الإشكاليات العقارية. - بلدية السواسي 19 هك أراضي دولية : تم إعداد مثال الأشغال المختلفة وفي إنتظار تقديم دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية السواسي للانطلاق في اعداد الدراسات العمرانية (المثال التنفيذي للتقسيم) - بلدية البرادعة وبلدية قصور الساف 120 هك : أراضي دولية منها 70 هك موضوع قضية إستحقاقية بصدد المتابعة وبصدد إعداد مثال الأشغال المختلفة لإعداد دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى.</p>	<p>أغلب هذه العقارات تكتسي صبغة فلاحية والمطلوب من الإدارات المعنية الحرص على الشروع في تغيير صبغتها. الإنطلاق في إعداد الدراسات لإنجاز مقاسم.</p>

التوصيات	المتابعة	حالة التنفيذ	الهيكل المعني بالتنفيذ	نص القرار
<p>إعداد مخطط تنسيقي.</p> <p>- تعهد البلدية بالبحث عن عقارات ملائمة لفائدة الوكالة وتقديم مقترحات قابلة للتهيئة و ذات جدوى نظرا لغياب الرصيد العقاري في كل من الزقانة و برج عريف و ارتفاع كلفة الاقتناء من الخواص.</p> <p>- اقتراح التوجه للخواص في اطار الشراكة بين القطاع العام والخاص.</p>	<p><u>بلدية بومرداس</u> : بصدد التفاوض مع المالكين للإقتناء من طرف الوكالة وفي إنتظار تقدم دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية بومرداس للإنتلاق في إعداد الدراسات العمرانية.</p> <p><u>حي الزقانة محاذية للمنطقة الصناعية برجيش (المهدية) 140 هك منها 54,8 هك ترجع ملكيتها لأرض "عزيزة عثمانة" وتحت تصرف الخواص والباقي دولية: تم إعداد مثال الأشغال المختلفة وبصدد إعداد مقترحات إحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى للمصادقة عليه من طرف بلدية المكان.</u></p> <p><u>50 هك أراضي دولية بصدد التثبيت من المرجع الترابي مع المصالح المعنية: تم إعداد مثال الأشغال المختلفة وتم طلب إعداد مثال تنسيقي للمنطقة (300هك) على المستوى الجهوي يضم مختلف التدخلات العمومية: الوكالة العقارية للسكنى, الوكالة العقارية الصناعية, مدرسة تكوين الضباط...</u></p> <p><u>بلدية المهديّة: 104 هك أراضي تابعة للخواص : بصدد التفاوض مع المالكين للإقتناء من طرف الوكالة نظرا لغلاء الأسعار.</u></p>		<p>وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الوكالة العقارية للسكنى الإدارات و الهياكل الجهوية المعنية</p>	<p>إحداث منطقة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لإنجاز مقاسم ومقاسم سكنية إجتماعية لفائدة حوالي 15800 منتفع على مساحة تفوق 304 هك بكل من بومرداس والزقانة بالمهدية و"المسلان" و"برج عريف" بالمهدية.</p>

التوصيات	المتابعة	حالة التنفيذ	الهيكل المعني بالتنفيذ	نص القرار
<p>عقد جلسة مع AFI مع AFT . AFH . إعداد دراسة مردودية المشروع نظرا لملكية الأراضي للخواص والثمن مرتفع.</p>	<p>تمت المصادقة على الأمثلة التقسيمية للعقارات الدولية الكائنة بسلقطة وأولاد مبروك والسواسي والسمره والمنصورة في انتظار إتمام إجراءات التحويز في طور إعداد الملفات الفنية للحوزات العقارية. إعداد مخطط تنسيقي. طلب العروض لإنجاز مساكن إجتماعية لفائدة حوالي 236 منتفع على مساحة تناهز 4,35 هك بكل من سلقطة وملولش وهبيرة وأولاد الشامخ وكركر, مرتبطة بالإستجابة لطلبات الممول (الصندوق السعودي للتنمية) والتمثلة في جاهزية قوائم المنتفعين وتدعيم الوحدة بالإمكانات البشرية واللوجستية.</p>		<p>وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والإدارات و الهياكل الجهوية المعنية</p>	<p>الإنتلاق في إنجاز تقاسيم للسكن الإجتماعي لفائدة حوالي 104 منتفع على مساحة تفوق 19,22 هك بكل من كركر وهبيرة وسمره أولاد الشامخ.</p>



نص القرار	الهيكل المعني بالتنفيذ	حالة التنفيذ	المتابعة	التوصيات
<b>الثقافة</b>				
الإذن بإحداث مسرح للهواء الطلق بالمهدية	وزارة الشؤون الثقافية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية الإدارات و الهياكل الجهوية المعنية		تم تكوين لجنة بين مصالح الثقافة والبلدية وأملاك الدولة والتجهيز للبحث عن قطعة أرض في أقرب الأجل.	
إسناد دعم إضافي لفائدة المهرجانات الثقافية بالجهة بقيمة 1 م د مع تامين خصوصيات كل منطقة.	وزارة الشؤون الثقافية الإدارات و الهياكل الجهوية المعنية	100%		
تأمين المواقع الأثرية بالجهة وذلك بتهيئة المعالم التاريخية على غرار المسرح الروماني بالجسم و البرج الفاطمي والمدينة العتيقة بالمهدية وبرج خديجة بالشابة وغيرها...	وزارة الشؤون الثقافية المعهد الوطني للتراث	-	تمت مراسلة الوزارة والمعهد بتاريخ 08 جويلية 2019 تم تحديد المواقع.	ضرورة ضبط برنامج في الغرض من طرف المعهد الوطني للتراث بموافقة الجهة. - المعهد مطالب بمدنا برزنامة تفصيلية

التوصيات	المتابعة	حالة التنفيذ	الهيكل المعني بالتنفيذ	نص القرار
الإسراع بتوفير إعمادات إضافية.	الشرع في تطبيق البرنامج	بصدد الإنجاز	وزارة الشؤون الثقافية وزارة التجهيز و الإسكان و الترابية التهئية المنذوبية الجهوية للثقافة الإدارات و الهياكل الجهوية المعنية	الإسراع بإتمام أشغال إعمادات وتهيئة دور الثقافة و المكتبات العمومية بالجهة.
	تم مضاعفة الميزانية من 60 إلى 120 أ.د.	أنجز	وزارة الشؤون الثقافية المنذوبية الجهوية للثقافة	مضاعفة ميزانية مركز الفنون الدرامية وركحية بالمهدية.
<b>الرياضة</b>				
		أنجز	وزارة شؤون الشباب والرياضة	مضاعفة الميزانية المخصصة للجمعيات الرياضية بالجهة.

متابعة القرارات  
المعلن عنها من طرف السيد رئيس الحكومة  
بتاريخ 20 و 22 أفريل 2017

ولاية صفاقس

عدد القرارات المعلنة عنها 60 قرارا لفائدة ولاية صفاقس شملت المجالات التالية:

في مجال الشؤون المحلية والبيئة : 10 قرارات

في مجال تحسين النقل : 4 قرارات

في مجال النهوض بالبنية الأساسية للرياضة و الثقافي : 3 قرارات

في مجال تقريب الخدمات الإدارية من المواطن : 6 قرارات

في مجال النهوض بالمجال الصناعي : 4 قرارات

في مجال تحسين الوضع الصحي : 8 قرارات

في مجال الفلاحة ودعم الموارد المائية : 4 قرارات

في مجال التنمية المندمجة : 2 قرارات

في مجال النهوض بالبنية الأساسية والوضع العمراني و السكني : 11 قرار

مجال التكوين المهني والتشغيل : 2 قرارات

في مجال الطاقة والمناجم : 2 قرارات

في مجال تسوية الوضع العقاري : 1 قرار

في مجال التعليم العالي : 3

# المشروع عدد1: تطهير 20 حي شعبي المشروع الخامس لتطهير الأحياء الشعبية

صاحب المشروع	• وزارة الشؤون المحلية والبيئة • الديوان الوطني للتطهير
مكان المشروع	• بلديات: صفاقس، قرمدة، العين، طينة و المحرس
أهداف المشروع	• تحسين نسبة الربط بالبلديات المتبناة و حماية المائدة المائية
مكونات المشروع	• مد 44 كلم من القنوات قطر 250 ببلديات: صفاقس ، قرمدة، العين، طينة و المحرس ( تطهير 20 حي شعبي ) القسط الأول: ( 7 أحياء ببلديات طينة، صفاقس و قرمدة ) القسط الثاني: ( 8 احياء ببلديات قرمدة، العين و المحرس ) القسط الثالث: ( 5 أحياء ببلديات صفاقس و قرمدة ) • ربط 2000 مسكن(حوالي 15000 ساكن)
كلفة المشروع	• 4 مليون دينار الوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD )
اجال التنفيذ	■ الانطلاق فورا في انجاز الأشغال ■ انتهاء الأشغال قبل موفى سنة 2018
تقدم انجاز المشروع	• تم انجاز الأشغال بالنسبة للقسط الأول الذي يهم 7 أحياء بمدن صفاقس ( الروضة و زنقة جديدة و زنقة الخبو و زنقة لرشة ) وقرمدة ( الامام سحنون ) و طينة ( زنقة بن سعيد وابن الجزار ) • بالنسبة للقسط الثاني الذي يهم 8 أحياء بمناطق قرمدة والعين و المحرس وانطلقت الاشغال في سبتمبر 2018 لمدة انجاز 12 شهرا وبلغت نسبة تقدم الاشغال 95% • انطلقت الاشغال التي تهم 5 احياء بمدينتي صفاقس ( الرياض و الزنقة الجديدة وحي الزياتين طريق سكرة كلم3 ) وقرمدة ( الطريق الحزامية و زنقة بن جماعة ) وبلغت نسبة تقدم الاشغال حوالي 70%

## المشروع عدد 2: توسيع وتهذيب شبكات التطهير بمدن ساقية الزيت

الشيحية، المحرس، ساقية الدائر، الحنشة، عقارب و جنيانة

صاحب المشروع	وزارة الشؤون المحلية والبيئة • الديوان الوطني للتطهير
مكان المشروع	مدن ساقية الزيت ، الشيحية، المحرس، ساقية الدائر، الحنشة، عقارب و جنيانة
أهداف المشروع	• تحسين نسبة الربط بالبلديات المذكورة • الحد من إرتفاع المائدة المائية بمنطقة صفاقس الشمالية
مكونات المشروع	• توسيع وتهذيب شبكات التطهير • مد 250 كلم من القنوات • ربط 11000 مسكن
كلفة المشروع	• 37 مليون دينار البنك الياباني ( JICA )
اجال التنفيذ	• الانطلاق في الدراسات خلال شهر ديسمبر 2017
تقدم انجاز المشروع	• إنطلاق الدراسات ديسمبر 2017 • انطلاق الأشغال: • قسط أولي لتهديب الشبكة الرئيسية بمنطقة ساقية الدائر (4 كم) بصدد إعداد الدراسة التنفيذية • قسط أولي لتوسيع الشبكة بمناطق ساقية الزيت و ساقية الدائر (30 كم) • بصدد تقييم العروض المتعلقة بالأشغال و من المنتظر انطلاق تنفيذ الأشغال خلال شهر سبتمبر 2019 (15 شهرا) • بالنسبة لبقية مكونات البرنامج لتوسيع و تهديب الشبكات لمدن ساقية الزيت و الشيحية و المحرس و ساقية الدائر و الحنشة و عقارب و جنيانة (216 كم) لقد تم اسناد صفقة انجاز الدراسات و التي انطلقت خلال شهر سبتمبر 2019 لمدة 18 شهرا

## المشروع عدد3: : مشروع توسيع وتهذيب محطة التطهير بالمحرس

صاحب المشروع	•وزارة الشؤون المحلية والبيئة •الديوان الوطني للتطهير
مكان المشروع	•المحرس
أهداف المشروع	•حماية الشريط الساحلي •توسيع محطة التطهير الموجودة ( طاقة الإستيعاب ) •الترفيغ في نسبة الربط ببلدية المحرس
مكونات المشروع	•أشغال مدنية: بناء محطة تطهير، احواض و مقر حراسة •التجهيزات: توفير و تركيب التجهيزات •ربط 11000 مسكن
كلفة المشروع	•11.5مليون دينار البنك الألماني للتنمية ( KFW )
اجال التنفيذ	•الانطلاق فورا في انجاز الاشغال . •مدة الأشغال 19 شهرا
تقدم انجاز المشروع	•انطلقت الأشغال في ماي 2017. •نسبة تقدم الأشغال 30% •مدة الأشغال : 19 شهرا •تم فسخ الصفقة نظرا لتقاعس المقاول وبصدد إعادة إعداد طلب العروض لإستكمال الأشغال

## المشروع عدد 4: مشروع تطهير مدينتي الصخيرة وبئر علي بن خليفة

•وزارة الشؤون المحلية والبيئة •الديوان الوطني للتطهير	<b>صاحب المشروع</b>
•الصخيرة وبئر علي بن خليفة	<b>مكان المشروع</b>
•تحسين ظرف عيش المتساكنين وحماية المحيط الطبيعي •حماية المائدة المائية	<b>أهداف المشروع</b>
•انجاز محطة تطهير بالصخيرة •انجاز محطة تطهير ببئر علي بن خليفة •انجاز عدد 2 محطات ضخ •إنجاز شبكة رئيسية و ثانوية	<b>مكونات المشروع</b>
<b>25 مليون دينار البنك الإفريقي للتنمية (BAD)</b>	<b>كلفة المشروع</b>
•الانطلاق في الدراسات التفصيلية خلال الثلاثية الأولى لسنة 2018	<b>اجال التنفيذ</b>
•إنطلقت الدراسات في سبتمبر 2018 علما وان الديوان قد تكفل بالدراسة •إتمام اجراءات المصادقة على إتفاقية التمويل من طرف البنك الإفريقي للتنمية (أكتوبر 2018) •إنطلقت الدراسات خلال سبتمبر 2018 بنسبة 80% يتوقع الإعلان عن طلب عروض الأشغال خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 •مدة الأشغال : 18 شهرا	<b>تقدم انجاز المشروع</b>



# المشروع عدد 5: مشروع تطهير البلديات الريفية الحزق، اللوزة، سيدي صالح الحاجب و عيون المايل

صاحب المشروع	•وزارة الشؤون المحلية و البيئة • الديوان الوطني للتطهير
مكان المشروع	•البلديات الريفية الحزق، اللوزة، سيدي صالح الحاجب و عيون المايل
أهداف المشروع	•تحسين ظرف عيش المتساكنين و حماية المحيط الطبيعي •حماية المائدة المائية
مكونات المشروع	•انجاز عدد 4 محطات ضخ •مد شبكة رئيسية و شبكة ثانوية في طول 49 كلم •ربط قرابة 2600 مسكن
كلفة المشروع	•20 مليون دينار الوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD )
اجال التنفيذ	•انطلاق الدراسات بداية سنة 2019 • انطلاق الاشغال قبل نهاية سنة 2019
تقدم انجاز المشروع	•بصدد إعداد الدراسات

**المشروع عدد 6: إنجاز محطة التطهير خصوصية  
للمناطق الصناعية الميناء ومدغشقر وسيدي سالم بصفاقس**

صاحب المشروع	•وزارة الشؤون المحلية و البيئة •الديوان الوطني للتطهير
مكان المشروع	•المناطق الصناعية الميناء ومدغشقر وسيدي سالم بصفاقس
أهداف المشروع	•حماية الشريط الساحلي •معالجة المياه الصناعية
مكونات المشروع	•انجاز محطة تطهير للمياه الصناعية بصفاقس
كلفة المشروع	•18 مليون دينار ا البنك الألماني للتنمية ( KFW )
اجال التنفيذ	•انطلاق الدراسات بداية سنة 2018 • انطلاق الاشغال قبل نهاية سنة 2019
تقدم انجاز المشروع	بصدد الدراسة •انطلاق الدراسات خلال شهر أكتوبر لسنة 2018

## المشروع عدد 7: إستصلاح وتهيئة شاطئ الكازينو بصفاقس

<p><b>صاحب المشروع</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•وزارة الشؤون المحلية و البيئة</li> <li>•وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي</li> </ul>
<p><b>منطقة التدخل</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•تمتد على طول حوالي 1 كلم.</li> </ul>
<p><b>أهداف المشروع</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•حماية الشريط الساحلي</li> <li>•تثمين وتحسين الواجهات البحرية الساحلية وتحسين جودة الحياة لمتساكني مدينة صفاقس.</li> <li>•يشكو الشريط الساحلي لمنطقة الكازينو من تدهور حاد للبيئة يتمثل أساسا في:</li> <li>•تراجع حاد لخط الشريط الساحلي واندثار الرمال البحرية،</li> <li>•صعوبة تجدد المياه في المنطقة لعدم وجود تيارات بحرية قوية،</li> <li>•تفاقم مصادر سكب المياه الملوثة الصناعية قبالة مدينة صفاقس،</li> <li>•ظاهرة المصببات العشوائية على الواجهة البحرية الجنوبية والتي ساهمت بشكل كبير في تردي قاع البحر وتواجد الأوحال.</li> </ul>
<p><b>كلفة المشروع</b></p>	<p><b>2.35 مليون دينار البنك الألماني للتنمية (KFW)</b></p>
<p><b>تقدم انجاز المشروع</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نشر طلب العروض للدراسة في جويلية 2019. Ø انطلاق الدراسة: الثلثية الرابعة 2019 لمدة 12 شهر</li> <li>• Øانطلاق الأشغال خلال الثلثية الثالثة 2021.</li> <li>• Øتم تشريك الجهة بخصوص الضوابط المرجعية للدراسة.</li> <li>• Øإعتمادات الدراسة متوفرة على ميزانية الدولة.</li> <li>• Øبخصوص الأشغال: من المنتظر الحصول على مصادقة مصالح وزارة المالية على ترسيم الاعتمادات خلال مناقشة ميزانية 2021</li> </ul>
<p><b>المقترحات</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•الإسراع بنشر طلب العروض لتعيين مكتب الدراسات</li> </ul>

## المشروع عدد 8: التصرف المندمج في المنطقة الحساسة للسهم الرملي بالشفار

•وزارة الشؤون المحلية و البيئة •وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي	<b>صاحب المشروع</b>
•تمتد على طول حوالي 12 كلم.	<b>منطقة التدخل</b>
يعتبر شاطئ الشفار بصفاقس من المناطق التي تشكو ضغطا كبيرا خلال فترة الصيف، وهو المتنافس الوحيد بالمنطقة. وقد انجر عن ذلك تدهور للوضعية البيئية وذلك من خلال تقلص مساحات الكثبان الرملية وتراجع للشريط الساحلي مع تدهور التنوع البيولوجي بالمنطقة. <b>الأهداف</b> •حماية المنطقة من الضغط خاصة خلال فصل الصيف، •المحافظة على التنوع البيولوجي، •التصرف المستدام في منطقة المشروع	<b>أهداف المشروع</b>
<b>4 مليون دينار</b>	<b>كلفة المشروع</b>
•نشر طلب العروض للدراسات مبرمج أكتوبر 2018 •انطلاق الدراسة خلال الثلاثية الأولى 2019 •مدة الدراسة 180 يوما •إنطلاق الأشغال الثلاثية الأولى من سنة 2020 •مدة الإنجاز 18 شهرا. •تم إعداد الضوابط المرجعية بطريقة تشاركية بين وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والجهة	<b>تقدم إنجاز المشروع</b>
•الإسراع بنشر طلب العروض لتعيين مكتب الدراسات	<b>المقترحات</b>

## المشروع عدد 9: التصرف المتدمج في المنطقة الحساسة لجزر الكنائس

صاحب المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>وزارة الشؤون المحلية و البيئة</li><li>وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي</li></ul>
منطقة التدخل	<ul style="list-style-type: none"><li>تمتد على مساحة تقدر بحوالي 32 ألف هكتار.</li></ul>
أهداف المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>تثمين وحماية أرخبيل جزر الكنائس بالاعتماد على الطريقة التشاركية.</li><li>تحيين المعطيات والبيانات الخاصة بالأرخبيل اعتمادا على الدراسات المنجزة والزيارات الميدانية.</li><li>إعداد تصور حول التصرف المتدمج والمستدام للمنطقة</li><li>بلورة مثال تصرف مستدام للمنطقة يهدف للمحافظة على الثروات الطبيعية وتثمينها.</li></ul>
كلفة المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>6.8 مليون دينار</li></ul>
تقدم إنجاز المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>الدراسة</li><li>وقع إعداد الضوابط المرجعية للدراسة</li><li>تم اختيار مكتب الدراسات.</li><li>انطلقت الدراسة في 23 جويلية 2018 لمدة 60 يوما</li><li>في طور المصادقة على الدراسة</li><li>الأشغال</li><li>انطلاق الأشغال خلال الثلاثية الأولى من سنة 2020.</li><li>مدة الإنجاز 24 شهر.</li></ul>

## المشروع عدد 10: برمجة مخطط استثماري للبلديات الجديدة

صاحب المشروع	•وزارة الشؤون المحلية والبيئة
منطقة التدخل	•(العامرة، العوابد الخزانات، الناظور/سيدي علي بلعابد، الحاجب، الحزق اللوزة، الاعشاش بوجربوع والنصر )
أهداف المشروع	•ضبط مخطط استثماري لفائدة البلديات الجديدة( العامرة، العوابد الخزانات، الناظور سيدي علي بلعابد، الحاجب، الحزق اللوزة، الأعشاش بوجربوع والنصر). •بناءات إدارية، إقتناء معدات نظافة وطرقات وبنية أساسية وتزوير وماء صالح للشرب وتطهير وتصريف مياه الأمطار ومشاريع إقتصادية (سوق بلدي + مسلخ ...) وتجهيزات جماعية (شباب - رياضة - ثقافة - طفولة).
تكلفة المشروع	• <b>34.6 مليون دينار</b>
تقدم انجاز المشروع	•تم الانتهاء من إعداد مخطط استثماري لكل بلدية جديدة على المستوى الجهوي •وزارة الشؤون المحلية والبيئة بصدد التفاوض مع الممولين لضمان تمويل برامج للبلديات الجديدة •في طور مد كل بلدية بعناصر المخطط الإستثماري في المدة القادمة.

## المشروع عدد 11: إحداث منطقة لوجستية بصفاقس

صاحب المشروع	•وزارة النقل
منطقة التدخل	•منطقة قرقر جنوب مدينة صفاقس
أهداف المشروع	•يهدف المشروع إلى القيام بعمليات التصرف والتحكم في نقل البضائع من وحدات الإنتاج إلى مكان الترويج وتشمل مختلف مراحل النقل والخدمات المتصلة بتجميع البضائع وتخزينها وتسليمها وعمليات اللف والتركيب والمراقبة والتأمين •يندرج المشروع ضمن المشاريع المقترحة في إطار إحداث شبكة وطنية من المناطق اللوجستية وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع
مكونات المشروع	•منطقة أنشطة لوجستية خاضعة للرقابة الديوانية •منطقة أنشطة اقتصادية ولوجستية •فضاءات للخرن وعمليات أخرى •مركز حيوي
كلفة المشروع	85 م د (17.5 م د قطاع عام و 66 م د قطاع خاص)

## المشروع عدد 11: إحداث منطقة لوجستية بصفاقس

- تم تعيين مكتب الدراسات على الصعيد الوطني لاختيار المناطق اللوجستية ذات الجدوى من المقترحات المقدمة من الجهات.
- تم وضع على ذمة المشروع مساحة حوالي 50 هكتار من الملك الدولي موضوع الرسم العقاري 3078 صفاقس كائنة على حافة الطريق الرئيسية رقم 1 الرابطة بين صفاقس والمحرس بالنقطة الكيلومترية 17 بمنطقة قرقور من معتمدية عقارب ولاية صفاقس.
- تم انجاز الأشغال الطبوغرافية لموقع المشروع .
- تم إعداد الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع (بصدد المصادقة من قبل لجنة القيادة)
- تمت موافاة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بملف إحداث دائرة مدخر عقاري (تمت المصادقة عليه من طرف النيابة الخصوصية لبلدية عقارب بتاريخ 19 ديسمبر 2017) لفائدة وزارة النقل قصد استصدار أمر حكومي في الغرض.
- تم اجابة وزارة النقل في الغرض من طرف ادارة التعمير بتاريخ 18 ماي 2018.

تقدم انجاز المشروع

- الإسراع بإحداث دائرة مدخر عقاري
- إعداد في الضوابط المرجعية لإعداد الدراسة التي تخص تمويل المشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص .

المقترحات



**المشروع عدد 12: إنجاز القسط الأول (13.5 كلم ) من شبكة للنقل الجماعي في مسالك خاصة بمدينة صفاقس (مترو صفاقس 70 كم)**

صاحب المشروع	وزارة النقل
مكان المشروع	• القسط الأول: الأحياء المتاخمة لطريق تنيور وطريق المطار وطريق سكرة ووسط المدينة.
أهداف المشروع	• النهوض بجودة خدمات النقل الجماعي وتدعيم السلامة والحد من الاكتظاظ والتلوث بصفاقس. • الحد من الاكتظاظ الكبير في حركة المرور ببعض المفترقات والمحاور بمدينة صفاقس.
مكونات المشروع	• تتكون الشبكة المستقبلية في غضون سنة 2030 من خمسة خطوط: 02 خطوط مترو (33.5 كم) و3 خطوط حافلات ذات جودة عالية (36.5 كم) • تحتوي الشبكة على 115 محطة، معدل المسافة بين المحطات 610مترًا. • محطة متعددة الوسائط و12 مركز إيواء وترايط • المعدات الضرورية: 75 عربة مترو و61 حافلة ذات جودة عالية
كلفة المشروع	• الكلفة الجمالية للمشروع: 2800 مليون دينار (القسط 1: 1040 م د محينة)
المرحلة الأولى	• إنجاز القسط الأول من خط المترو T1 (13.5 كم) من جملة 22.8 كم وتهيئة المسارات الأخرى التي تم تحديدها لتطوير التنقل بها على متن الحافلات الى جانب 04 أقطاب ترايط و03 مراكز إيواء وترايط
أجال التنفيذ	• الدراسات التمهيديّة والتفصيلية 2018-2019 • الأشغال واقتناء التجهيزات والمعدات 2019-2022 • بداية استغلال الخط المحدث 2023

## المشروع عدد 12: إنجاز القسط الأول (13.5 كلم ) من شبكة للنقل الجماعي في مسالك خاصة بمدينة صفاقس (مترو صفاقس 70 كم)

### • تقدم إنجاز الدراسات 40%

- صادقت لجنة المصادقة بتاريخ 12 جوان 2019 على مخرجات الدراسات التمهيديّة مع التوصية بالأخذ بعين الاعتبار أهمّ المقترحات الواردة بالإستشارة العمومية المنتظمة من 07 فيفري إلى 09 مارس 2019.
- تمّت دراسة جميع المقترحات المنبثقة عن الإستشارة العمومية واعتماد أغلبها في مختلف مراحل إنجاز المشروع.
- شرعت وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي في الإعداد للقيام بدراسة حول إنجاز المشروع في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (آجال الدراسة: شهر واحد) وستحدد هذه الدراسة مواصلة الدراسات التفصيلية APD من عدمها
- تمّ الإعتماد على دراسة الجدوى 2013 EGIS-RAIL/I2E محيئة حسب سعر الصرف لسنة 2016 (دون اعتبار الأداءات)
- الكلفة التقديرية المحيئة في شهر نوفمبر 2019 خلال مرحلة الدراسات التمهيديّة APS (دون اعتبار الأداءات)
- تجدر الإشارة إلى أنه في مفتح سنة 2020 ستبدأ أشغال تحويل شبكات المستلزمين العموميين وذلك بالتوازي مع تحرير حوزة المشروع. ومن المنتظر أن يدخل هذا الخط حيز الإستغلال خلال سنة 2023.

### تقدم إنجاز المشروع

# مشروع مترو مدينة صفاقس

الخطوط المبرمجة :

➤ 2 خطوط مترو (33.5 كلم) ،

➤ خط (T1) يربط طريق تنيور  
وطريق المطار مرورا بوسط  
المدينة وطريق سكرة على طول  
22.8 كلم.

➤ خط (T2) طريق قرمدة-وسط  
المدينة على طول 10.7 كلم.

➤ 3 خطوط حافلات ذات جودة عالية  
BHNS (36.5 كلم) ،

➤ خط (BH3) طريق سيدي  
منصور - وسط المدينة (عبر  
شارع مجيدة بوليلة) - طريق  
قابس : 22.9 كلم.

➤ خط (BH4) طريق منزل شاكر  
: 6 كلم

➤ خط (BH5) طريق المهديّة :  
7.5<sup>8</sup> كلم



## المشروع عدد 13: إعادة تهيئة مسطحات الضفة الجنوبية لميناء صفاقس

صاحب المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>• وزارة النقل</li><li>• ديوان البحرية التجارية والموانئ</li></ul>
مكونات المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>• تدعيم إنارة المسطحات بتركيز عدد 2 أعمدة إنارة بطول 30 متر</li><li>• إعادة تهيئة شبكات تصريف مياه الأمطار</li><li>• تدعيم 1 هك إضافي لمناولة الحاويات</li><li>• إعادة تهيئة بقية مسطحات الضفة الجنوبية بمساحة حوالي 10 هك</li><li>• إعادة تسطير مثالي الجولان وخرن البضائع بالضفة الجنوبية</li></ul>
أهداف المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>• تحسين ظروف العمل داخل الميناء</li><li>• تحسين مردودية العمل بالميناء</li><li>• الرفع من نسق العمليات التجارية داخل الميناء</li><li>• الحدّ من الأضرار التي تلحق بمعدات الشحن والمناولة</li></ul>
كلفة المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>9.2 مليون دينار</u></li></ul>
تقدم انجاز المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>• انطلاق الأشغال: 11 ماي 2016</li><li>• نسبة تقدم الإنجاز : 83 %</li><li>• تم فسخ عقد الصفقة وإعداد ملف كراس شروط محين في الأشغال المتبقية وهو في مرحلة تقييم العروض</li></ul>

## المشروع عدد 14: المدينة الرياضية

<b>صاحب المشروع</b>	وزارة شؤون الشباب والرياضة
<b>مكونات المشروع</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ملعب رئيسي أولمبي لكرة قدم معشب بطاقة استيعاب 40 ألف متفرج و 2 ملاعب فرعية،</li><li>• إقاعة رياضية متعددة الاختصاصات بطاقة استيعاب 6000 متفرج،</li><li>• مركز لألعاب القوى يتضمن ملعب ومدرج بطاقة استيعاب 1000 متفرج ومركز إقامة،</li><li>• ملعب للرقبي بطاقة استيعاب 500 متفرج</li><li>• مسبح أولمبي بطاقة استيعاب 500 متفرج</li><li>• 3 قاعات للرياضات الفردية</li><li>• مركز إقليمي للطب الرياضي</li></ul>
<b>أهداف المشروع</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• توفير البنية الأساسية اللازمة لاحتضان التظاهرات الرياضية الدولية والوطنية طبقا للمعايير الدولية. وتوفير الظروف الملائمة للنشاط الرياضي بالولاية والتي تعد أكثر من 40 جمعية رياضية</li><li>• استيعاب الجماهير في المباريات الهامة التي يخوضها نادي المكان على النطاق الوطني والعربي والإفريقي التي تستقطب عددا من الجماهير تفوق بطاقة استيعاب ملعب الطيب المهيري</li></ul>
<b>كلفة المشروع</b>	• 350 م د

## المشروع عدد 14: المدينة الرياضية

- تم تخصيص أرض على ملك الدولة مساحتها 58 هك وتمت عملية تغيير صبغة الأرض في مراحلها النهائية (بصدد إصدار الأمر الحكومي).
- تم عقد جلسة عمل لجنة القيادة في 21 ديسمبر 2017 و 20 فيفري 2018 لمتابعة تقدم تنفيذ المشروع.
- تم إعداد المسح الطبوغرافي لقطعة الأرض وتم يوم 12-09-2017 قبول الأشغال الطبوغرافية المدققة.
- تمت الموافقة على الدراسة المائية من طرف مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة.
- تم القيام باستشارة لتحديد مكتب دراسات لإعداد السبر الجيوتقني لقطعة الأرض ووقع تعيين مكتب الدراسات.
- تم الشروع في إعداد دراسة التأثير على المحيط.
- بصدد إعداد البرامج الوظيفية الأولية لبعض المنشآت وتعيين كلفتها لتتماشى مع أهداف المدينة الرياضية،
- تم عقد جلسة عمل بتاريخ 5 فيفري 2018 تحت إشراف مدير هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص للنظر في الضوابط المرجعية لإعداد الدراسة الأولية التي تخص تمويل المشروع .
- تم مد لجنة القيادة بتقديرات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالنسبة للربط الخارجي وبالنسبة للشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه فقد تم طلب توفير بعض المواصفات من صاحب المشروع لتقدير كلفة الربط.

تقدم انجاز المشروع

## المشروع عدد 14: المدينة الرياضية

• تم عرض تمويل المشروع على الندوة الدولية التي ستعقد يوم 18 سبتمبر 2018 حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

• تم فتح العروض في 14 نوفمبر 2018 لاختيار مكاتب الدراسات المتعلقة بمكونات المشروع

• تم يوم 07 أوت 2019 تمت معاينة الارض التي سيقام عليها المشروع مع المكتب الصيني المكلف باعداد دراسة الجدوى و ممثل ادارة البناءات و التجهيز صلب وزارة الاشراف . كما تمت معاينة ملعب الطيب المهيري في اطار الاعداد لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع .

تقدم انجاز المشروع

# المشروع عدد 15: إحداث مركز محلي للتأمين على المرض بقرقنة

صاحب المشروع	•وزارة الشؤون الاجتماعية
مكان المشروع	•قرقنة
أهداف المشروع	•تقريب الخدمات الإدارية من المواطن
رزمة التنفيذ	•خلال السداسي الأول من سنة 2017
تقدم انجاز المشروع	•تم الانطلاق في إسداء الخدمات بداية من 27 أفريل 2017



## المشروع 15: إحداث مركز محلي للتأمين على المرض بقرقنة

صاحب المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>وزارة الشؤون الاجتماعية</li><li>الصدوق الوطني للتأمين على المرض</li></ul>
مكان المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>قرقنة</li></ul>
أهداف المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>تقريب الخدمات الإدارية من المواطن</li></ul>
تقدم انجاز المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>تم الانطلاق في إسداء الخدمات بداية من 27 أفريل 2017</li></ul>

# المشروع عدد 16: إحداث مركز محلي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بقرقنة

صاحب المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>وزارة الشؤون الاجتماعية</li><li>الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية</li></ul>
مكان المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>قرقنة</li></ul>
أهداف المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>تقريب الخدمات الإدارية من المواطن</li></ul>
تقدم انجاز المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>تم تدشينه من قبل السيد رئيس الحكومة وفتحه للعموم يوم 21 أبريل 2017.</li></ul>

## المشروع عدد17: إحداث دار خدمات إدارية بالصخيرة

صاحب المشروع	•وزارة الشؤون الاجتماعية •الديوان الوطني للبريد
مكان المشروع	•الصخيرة
أهداف المشروع	•تقريب الخدمات الإدارية من المواطن
تقدم انجاز المشروع	•تكفل ديوان البريد بإنجاز دار الخدمات بالمقر الحالي لمركز البريد مقابل التقويت في المقر السابق للبلدية لإستغلاله كمركز بريد. •متابعة المشروع من طرف اللجنة المختصة برئاسة الحكومة •تكفلت البلدية بتاريخ 03 أكتوبر 2018 بتهيئة المقر السابق للبلدية على مواردها الذاتية •تم رصد اعتماد ب 500 ألف دينار بميزانية 2019

# المشروع عدد18: إحداث مركز محلي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بطريق منزل شاكر

	<ul style="list-style-type: none"><li>•وزارة الشؤون الاجتماعية</li><li>•الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية</li></ul>	<b>صاحب المشروع</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>•طريق منزل شاكر صفاقس</li></ul>	<b>مكان المشروع</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>•تقريب الخدمات الإدارية من المواطن</li></ul>	<b>أهداف المشروع</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>•تم تسويق المحل وقامت مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بطلب عروض لتأثيث المركز وإنجاز أشغال تركيز الشبكات الإعلامية.</li><li>•تم الإنطلاق في النشاط خلال نوفمبر سنة 2018</li></ul>	<b>تقدم انجاز المشروع</b>

# المشروع عدد 19: إحداث مكتب محلي للصندوق الوطني للتأمين على المرض بساقية الدائر

صاحب المشروع	• وزارة الشؤون الاجتماعية • الصندوق الوطني للتأمين على المرض
مكان المشروع	• ساقية الدائر
أهداف المشروع	• تقريب الخدمات الإدارية من المواطن
مدى جاهزية المشروع	• إنطلق في نشاطه منذ 19 فيفري 2018.

# المشروع عدد 20: إحداث مكتب محلي للصندوق الوطني للتأمين على المرض بطريق قرمدة

صاحب المشروع	• وزارة الشؤون الاجتماعية • الصندوق الوطني للتأمين على المرض
مكان المشروع	• طريق قرمدة،
أهداف المشروع	• تقريب الخدمات الإدارية من المواطن
تقدم انجاز المشروع	• تم الانطلاق في اسداء الخدمات بداية منذ 26 جويلية 2017.

## المشروع عدد 21: المنطقة الصناعية " مدغشقر "

<ul style="list-style-type: none"><li>• وزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية</li></ul>	<b>صاحب المشروع</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• ميناء صفاقس</li></ul>	<b>مكان المشروع</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• تسوية الوضعية العقارية للمنتصبين بالمنطقة</li><li>• إعادة تحديد حدود الملك العمومي البحري للمنطقة</li><li>• إخراج الجزء المحدد بين الملك العمومي البحري القديم والملك العمومي البحري الجديد من الملك العمومي البحري إلى ملك الدولة الخاص</li></ul>	<b>أهداف المشروع</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• تم الشروع في مراجعة تحديد الملك العمومي البحري للمنطقة في مارس 2013 وتوقفت المراجعة سنة 2014.</li><li>• تمّ عقد جلسة عمل بمقر الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بتاريخ 16 جوان 2017 وتمّ الإتفاق على دعوة اللجنة الجهوية لتحديد الملك العمومي البحري لمواصلة تحديد الملك العمومي البحري للمنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات حول الأعمال السابقة حتى يتسنى إخراجها في مرحلة ثانية من الملك العمومي البحري وإدماجها بملك الدولة الخاص.</li><li>• تمّ القيام بإستشارة بتاريخ 28 أوت 2017 لتعيين مكتب دراسات أو خبير مختص في الأشغال البحرية للتعلمق في المسائل الفتية للمنطقة وقد تم الشروع في إنجاز الدراسة بتاريخ 29 نوفمبر 2017 وبتاريخ 29 ديسمبر 2018 تم إعداد تقرير التشخيص للمنطقة وإعداد الأمثلة التوبوغرافية</li></ul>	<b>تقدم إنجاز المشروع</b>

## المشروع عدد 21: المنطقة الصناعية " مدغشقر "

• تم إعداد مثال التحديد من قبل ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وإمضائه من لجنة تحديد الملك العمومي البحري.  
• تمّ المشروع في مرحلة الاستقصاء العمومي المحدد بالفترة ما بين 01/04/2018 و 30/04/2018

• تم الإنتهاء من عملية الإستقصاء العمومي و تمت دراسة الإعتراضات وتم إعداد الأمثلة من قبل ديوان قيس الاراضي بتاريخ 01 نوفمبر 2018.

• تمت إحالة الملف كاملا حسب جدول احالتنا تحت عدد 2019/943 بتاريخ 25 فيفري 2019 إلى الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية قصد استصدار أمر بخصوص مراجعة حدود الملك العمومي البحري بالمنطقة.

تقدم انجاز المشروع



# المشروع عدد 22: المنطقة الصناعية دخان (50 هك حاليا)

## الإعلان عن توسعتها الى 75 هك

<ul style="list-style-type: none"><li>• وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة</li><li>• الوكالة العقارية الصناعية</li></ul>	<b>صاحب المشروع</b>
<b>15 مليون دينار</b>	<b>كلفة المشروع</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• توفير البنية الأساسية اللازمة لاحتضان المشاريع</li><li>• استقطاب الاستثمارات وخصوصا الأجنبية منها نظرا لأن الموقع محاذي للطريق السيارة</li><li>• حماية البيئة من الانتصاب العشوائي للمؤسسات الصناعية</li><li>• تقليص الضغط على مدينة صفاقس</li></ul>	<b>أهداف المشروع</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• تم إنجاز الشبكات الخارجية (الكهرباء، الغاز الطبيعي، الماء الصالح للشرب)</li><li>• تم إيداع الدراسة المائية منقحة لدى مصالح وزارة الفلاحة خلال شهر فيفري 2018 للمصادقة</li><li>• تم إيداع دراسة المؤثرات على المحيط خلال شهر سبتمبر 2017 وتم موافاة الوكالة بالتحفظات من طرف الوكالة الوطنية للبيئة بتاريخ 07/03/2018 .</li><li>• تم إصلاح مثال التهيئة التفصيلي وتم عقد جلسة عمل بمقر ادارة التعمير بوزارة التجهيز يوم 12 سبتمبر 2018 للنظر في الملف المحين (تمت المصادقة)</li><li>• تم الإعلان عن طلب العروض لإنجاز الدراسات المتعلقة بالتهيئة الداخلية وإعداد ملف التقسيم لفترة 165 يوما بتاريخ 24/08/2018 (تم اختيار مكتب الدراسات في ديسمبر 2018).</li><li>• سيتم تكليف مكتب دراسات جديد للقيام بالدراسة الكاملة</li></ul>	<b>تقدم انجاز المشروع</b>

## المشروع عدد 23: المنطقة الصناعية بعقارب

<ul style="list-style-type: none"><li>• وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة</li><li>• الوكالة العقارية الصناعية</li></ul>	<b>صاحب المشروع</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>11.5 مليون دينار</b></li></ul>	<b>كلفة المشروع</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• توفير البنية الأساسية اللازمة لاحتضان المشاريع</li><li>• استقطاب الاستثمارات وخصوصا الأجنبية منها نظرا لأن الموقع محاذي للطريق السيارة</li><li>• حماية البيئة من الانتصاب العشوائي للمؤسسات الصناعية</li><li>• تقليص الضغط على مدينة صفاقس</li></ul>	<b>أهداف المشروع</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• الدراسات متوقفة كلفة باهظة للشبكات الخارجية 10 م د</li><li>• تم اقتراح موقع ضيقة زروق كبديل وذلك على مساحة 310 هك و محاذي للطريق السيارة صفاقس -قابس وعلى مسافة 2,5 كم من محول المحرس</li><li>• تمت مراسلة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بتاريخ 28/02/2018 لإعداد قائمة تقديرية لربط الموقع بالشبكات الخارجية،</li><li>• تمت معاينة الموقع من طرف اللجنة الوطنية للمدخرات العقارية الصناعية بتاريخ 19/04/2018 .</li><li>• تمت المصادقة على المدخر العقاري من طرف لجنة المدخرات العقارية الصناعية</li><li>• الدراسات متوقفة مع كلفة باهظة للشبكات الخارجية قرابة 10 م د.</li></ul>	<b>تقدم انجاز المشروع</b>

# المشروع عدد 24: منطقة صناعية مساندة للقطب الصناعي والتكنولوجي بصفاقس تمتد على مساحة 17 هك.

صاحب المشروع	•وزارة تكنولوجيا الإتصال و المعلومات •شركة القطب التكنولوجي بصفاقس
مكان المشروع	•معتمدية ساقية الزيت
أهداف المشروع	•تهيئة مقاسم مخصصة للأنشطة الخدماتية الجامعية وما تابعها ووحدات انتاج غير ملوثة
كلفة المشروع	•4 مليون دينار
تقدم انجاز المشروع	•بلغت نسبة تقدم أشغال تهيئة القسط الأول على مساحة 12 هك : 85 % بكلفة 3,3 م د.

# المشروع عدد 25: بناء مقر واقتناء آلة ثانية لمعجل خطي لفائدة قسم المعالجة للأمراض السرطانية

صاحب المشروع	•وزارة الصحة
مكان المشروع	•المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة
أهداف المشروع	•الحد من الضغط الحاصل بالقسم نظرا لتطور عدد المرضى و لتوفير الخدمات الصحية لكافة متساكني الجنوب التونسي
كلفة المشروع	•6.5 مليون دينار توسعة لتركيز آلة ثانية لمعجل خطي: 1500 أد إقتناء الألة 5000 أد
تقدم انجاز المشروع	• تم مناقشة الدراسة التمهيديّة المجرة لقسط الهندسة المدنية بتاريخ 26 ديسمبر 2019 مع طلب تنقيحات
الصعوبات و المقترحات	تم إعداد البرنامج الوظيفي للبنية وتمت إحالته إلى وزارة الصحة خلال شهر أوت 2017 لمراسلة الجهة قصد القيام بإجراءات انطلاق إعداد الدراسات تم ترسيم مآقده 1500 أد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2019 لقسط إنجاز التوسعة .

## المشروع عدد 26: اقتناء آلة Pet Scan

•وزارة الصحة	صاحب المشروع
•المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة	مكان المشروع
•مواكبة التطور العلمي في مجال الطب النووي وتقريب الخدمات الصحية المقدمة للمواطن بولاية صفاقس و كامل الجنوب التونسي	أهداف المشروع
•5 مليون دينار	كلفة المشروع
•التجهيزات: تم تركيز الألة بداية من تاريخ 20 جوان 2019	تقدم انجاز المشروع

# المشروع عدد 27: اقتناء " doses " لفائدة قسم الأمراض السرطانية

## Appareil de Curiethérapie à Haut débit de " doses " لفائدة قسم الأمراض السرطانية

وزارة الصحة	صاحب المشروع
المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة	مكان المشروع
الحد من الضغط الحاصل بالقسم نظرا لتطور عدد المرضى و لتوفير الخدمات الصحية لكافة متساكني الجنوب التونسي	أهداف المشروع
0.6 مليون دينار ( الكلفة المحينة 1.059 م د )	كلفة المشروع
البناية جاهزة تبعاً لجلسة الصفقات المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2019 تم إرجاء الملف و ذلك لتنقيح محتوى كراس الشروط و لغياب المنافسة حيث تقرر إعادة طلب عروض للمرة الثالثة	تقدم انجاز المشروع

## • المشروع عدد 28: إعادة تأهيل قسم الاستعجالي وتجهيزه

صاحب المشروع	•وزارة الصحة
مكان المشروع	•المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة
أهداف المشروع	•تحسين الخدمات الإسعافية الإستعجالية للمواطن وتوفير الظروف الحسنة للإطار العامل بالقسم
تكلفة المشروع	•1.3 مليون دينار ( الكلفة المحينة 4.4 م د )
تقدم انجاز المشروع	•تم تعيين المصممين في 15 سبتمبر 2017. •تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية الأولية المنقحة APS والدراسة التمهيدية المجزئة لقسط الهندسة APD بتاريخ 15 ماي 2018 ( التكلفة 4.4 مليون دينار ) تمت إحالة الملف الفني والمالي للمشروع لوزارة الصحة تحت عدد 2830 بتاريخ 2018/07/19 قصد ترسيمه بميزانية الدولة لسنة 2019 •بصدد إعادة طلب العروض

## المشروع عدد29: بناء و تجهيز 02 مركزين لتصفية الدم بالحنشة والصخيرة

	<p>•وزارة الصحة</p>	<p>صاحب المشروع</p>
	<p>•الصخيرة •الحنشة</p>	<p>مكان المشروع</p>
	<p>•1.6 مليون دينار</p>	<p>كلفة المشروع</p>
	<p>تقريب الخدمات الصحية لفائدة المريض بمعتمدية الصخيرة و الحنشة والمناطق المجاورة لها.</p>	
	<p><b>•مركز الحنشة:</b></p> <p>•وقع توفير الأرض، بصدد إعداد ملف التفويت في الأرض (ملك البلدية) تقديرات الاختبار الفني المنجز من طرف مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة 46 أد</p> <p>-المطلوب الإسراع في تخصيص الأرض</p> <p>-الإسراع في مراسلة الجهة لتعين مختلف مكاتب الدراسات للانطلاق في إعداد الدراسات (تمت مراسلة السيد وزير الصحة لتعيين مكتب الدراسات من طرف السيد والي صفاقس بتاريخ 6 أوت 2018)</p> <p><b>•مركز الصخيرة:</b></p> <p>•تم توفير قطعة أرض تمسح 1000 م م بصدد إعداد ملف التفويت في الأرض (هبة من أحد المواطنين)</p> <p>-الإسراع في تخصيص قطعة الأرض المبرمجة لفائدة وزارة الصحة (على ملك خواص)</p> <p>-الإسراع في مراسلة الجهة لتعين مختلف مكاتب الدراسات للانطلاق في إعداد الدراسات (تمت مراسلة السيد وزير الصحة لتعيين مكتب الدراسات من طرف السيد والي صفاقس بتاريخ 6 أوت 2018)</p>	

تقدم انجاز المشروع



# المشروع عدد 30: إحداث 02 وحدتين طبيتين متنقلتين للإسعاف والإنعاش (SMUR)

صاحب المشروع	•وزارة الصحة
مكان المشروع	•معمدية جبنيانة و معمدية بئر علي بن خليفة
أهداف المشروع	•تطوير شبكة خدمات الطب الاستعجالي المتنقل بالولاية
مكونات المشروع	•بناء مقر لإقامة الإطار الطبي و الفني و الشبه الطبي و السواق و الأعوان
كلفة المشروع	•1 مليون دينار
مدى تقدم إنجاز المشروع	•تمّت مراسلة وزارة الصحة تحت عدد 4930 بتاريخ 31-05-2017 لمراسلة الجهة قصد تعيين مكاتب الدراسات. •- ضرورة تخصيص الإعتمادات بميزانية الدولة
الصعوبات والمقترحات	•المطلوب من المصالح الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاس الإسراع في تخصيص الأرض الكائنة بجبنيانة المقترحة لاحتواء المشروع تبعا لمراسلتنا عدد 360 المؤرخة في 12 جانفي 2018

# مشروع عدد 31 إحداث مستشفى جهوي ببئر علي بن خليفة

صاحب المشروع	• وزارة الصحة
مكان المشروع	• معتمدية بئر علي بن خليفة
أهداف المشروع	• تطوير البنية التحتية للتجهيزات الصحية تقرب الخدمات الصحية من المواطنين بالمعتمدية
مكونات المشروع	<p>• القسط الأول : ( قسم استعجالي - قسم التوليد (10 أسرة) - المخبر قسط أول - القبول و الاستقبال - بيت الأموات - المقرات الفنية (السوائل الفنية - التسخين الصحي- المحول الكهربائي و المولد الكهربائي للنجدة) - الحراسة)</p> <p>• القسط الثاني:(الإدارة- المسكن الوظيفي-قسم المخبر (القسط الثاني)-العيادات الخارجية-قسم الأشعة-قسم الأطفال (6 أسرة)- قسم الطب العام (20 سرير)- قسم الجراحة العامة (15 سرير) - جناح العمليات (يضم 3 قاعات للعمليات)- الصيدلية الداخلية - التعقيم المركزي المقرات الفنية (المطبخ-الغسيل-وحدة-خزان الماء-المغازة)</p> <p>• وحدة تصفية الدم تضم 12 آلة تصفية</p>
كلفة المشروع	• 11 مليون دينار
تقدم انجاز المشروع	<p>• تم القبول النهائي للقسط الأول جانفي 2012</p> <p>• تم القبول الوقي للقسط الثاني جوان 2018</p> <p>• تم القبول النهائي وحدة تصفية الدم أكتوبر 2015</p> <p>• بالنسبة لتجهيزات المطبخ والمغسلة وبيت الأموات بقيمة 388 أذ (نسبة الإنجاز 70 %)</p> <p>• تم الشروع في إستغلال مركز تصفية الدم بالمستشفى في أبريل 2018 و تم الشروع في إستغلال العيادات الخارجية والمخبر بالمستشفى الجهوي في جوان 2018.</p> <p>• - توفير الموارد البشرية الضرورية (لدى الإدارة المركزية) B11</p> <p>•-قامت وزارة الصحة بتوفير إعتمادات إضافية قدرها 73 أذ ( بعد إجراء صفقة ثانية في الغرض ) لتجهيزات الطبية الثابتة لجناح العمليات ومركزية التعقيم والتطهير و تم تمكين الشركة من بطاقة التزود</p>

# المشروع عدد 32 المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس

صاحب المشروع	• وزارة الصحة
مكان المشروع	• القاصة كلم 11 بطريق قابس - معتمدية طينة
أهداف المشروع	• تطوير البنية التحتية للتجهيزات الصحية بالجهة • رفع الضغط على المؤسسات الإستشفائيتين الجامعيتين لمدينة صفاقس وبالتالي تحسين الخدمات الصحية والإستشفائية المسدات • تقريب الخدمات الاستشفائية للخط الثالث ودعم التكوين في المجال الصحي
مكونات المشروع	• مستشفى جامعي متعدد الإختصاصات بطاقة استيعاب 246 سريرا • مقر للإدارة- مييت للأطباء - قسم جراحة الأعصاب - قسم جراحة العظام - قسم الجراحة العامة - قسم الأمراض النفسية - قسم الحروق البليغة - قسم الإنعاش - قسم الإقامة النهارية - جناح للعمليات - قسم الأشعة- قسم مخبر بيولوجي- قسم الإستعجالي المختص- قسم الصيدلة- مقرات المطبخ والمغسل- المقرات الفنية
كلفة المشروع	• 120 مليون دينار
تقدم انجاز المشروع	• تم تركيز الحاضرة وتمتم تهيئة الأرض المخصصة لإنجاز المشروع على مساحة 12 هك • الشروع في الإنجاز البناءات في أوائل مارس 2017 عن طريق الجانب الصيني • تم امضاء الاتفاقيات وعقد الصفقات الإشغال المتعلقة بالربط النهائي بشبكة التطهير، الماء الصالح للشرب، الغاز الطبيعي و الكهرباء • البناءات: نسبة تقدم الانجاز 100 %

•البناءات: نسبة تقدم الانجاز 100 %  
•أشغال ربط المستشفى الجامعي بشبكة التطهير: 30%  
•أشغال ربط المستشفى الجامعي بشبكة الماء الصالح للشرب : بصدد طلب العروض.  
المطلوب تحويل إعتمادات مالية إضافية مقدرة بـ 3100 أد طبقا للإتفاقية  
أشغال ربط المستشفى الجامعي بشبكة الكهرباء : تم القيام بعملية الربط  
أشغال ربط المستشفى الجامعي بشبكة الغاز الطبيعي: تم القيام بعملية الربط  
إقتناء تجهيزات المطبخ والمغسل وبيت الأموات ومركزية الغاز الطبيعي :بصدد الإنجاز  
30%  
قسط التجهيزات الطبية و تجهيزات التعقيم و التطهير بصدد إعداد عملية طلب  
العروض على النطاق المركزي  
تم عقد جلسة عمل بالوزارة 19 مارس 2019 المطلوب الإسراع في عملية طلب  
العروض

تقدم انجاز المشروع

•تم اقتراح تدعيم المستشفى بست قاعات عمليات اضافة باعتبار أن القاعات المنجزة لا تفي  
بالحاجة

الصعوبات والمقترحات

# المشروع : المكتبة الرقمية

صاحب المشروع	•وزارة الشؤون الثقافية
مكان المشروع	•مدينة صفاقس
أهداف المشروع	•تطوير البنية التحتية الثقافية في الجهة •مصدر للاكتشاف والبحث •تدعيم تبادل المعارف وتنمية الابتكار
مكونات المشروع	•الإدارة •مدج •قاعة عروض •مكتبة •فضاءات للاجتماعات
كلفة المشروع	•18.5 مليون دينار
تقدم انجاز المشروع	•تم الإعلان عن طلب العروض 2 ماي 2016 • وقع إختيار المقاوله. •مدة الأشغال 365 يوم • تم الإذن بانطلاق الأشغال بتاريخ 04 جويلية 2017 •بطور إعداد الدراسات التنفيذية وسبر الأسس •نسبة تقدم أشغال 15 %
الصعوبات والمقترحات	•ضرورة إستكمال إخلاء بعض الفضاءات داخل البناية •إستكمال تسوية وضعية المصممين •التسوية مع مكتب الدراسات بالتنسيق مع وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية •اسناد اعتمادات إضافية تقدر ب10 م د

# مشروع عدد 34 :دراسات تهيئة شطّ القراقنة

صاحب المشروع	•وزارة الشؤون الثقافية •بلدية صفاقس
مكان المشروع	•مدينة صفاقس
أهداف المشروع	•تطوير البنية التحتية الثقافية في الجهة
كلفة المشروع	100أد
تقدم انجاز المشروع	•تم الإذن بتحويل الإعتمادات المرصودة للدراسة (100 أد) من وزارة المالية إلى بلدية صفاقس.
الصعوبات والمقترحات	•لم يقع فتح إعتمادات إلى حد الآن. •وقع توجيه مراسلة في الغرض من السيد وزير الشؤون الثقافية إلى السيد وزير المالية مؤرخة في 24 جويلية 2018

## المشروع عدد 35: تهيئة ميناء الصيد البحري بسيدي يوسف بقرقنة

صاحب المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري</li><li>• وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية (صاحب المشروع المفوض)</li></ul>
منطقة التدخل	سيدي يوسف قرقنة
أهداف المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>• فصل نشاط الصيد البحري عن نشاط نقل المسافرين بميناء سيدي يوسف</li><li>• تخفيف العبء على ميناء إرساء الناقلات البحرية التابعة للشركة الجديدة للنقل بقرقنة</li><li>• تأمين أفضل ظروف سلامة الملاحة البحرية بالميناء،</li><li>• دفع الاستثمار وإحداث مواطن شغل بالجزر.</li><li>• تحسين ظروف عيش متساكني معتمدية قرقنة.</li><li>• إنجاز مرفأ جديد بطاقة إستيعاب 300 وحدة صيد ساحلي</li></ul>
كلفة المشروع	• <u>32 مليون دينار</u>
اجال التنفيذ	• 2017-2019 (900 يوم)
تقدم إنجاز المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>• الاذن الاداري ببدء الأشغال: 23 جانفي 2017</li><li>• الانطلاق الفعلي للأشغال: مارس 2017 (الشركة SOTUTRASM )</li><li>• مدة الأشغال 900 يوم.</li><li>• تم القيام بعملية المسح الطبوغرافي والهيدروغرافي لحوزة الأشغال وبعمليات السبر الجيوتقني</li><li>• نسبة تقدم الإنجاز 65 %</li><li>• تعرض تنفيذ المشروع إلى بعض الإشكاليات العقارية المتمثلة في التعويض لأصحاب الشرفيات المجاورة للمشروع ووجود منتزه بسيدي يوسف في منطقة المشروع وقد تم حلها بالتنسيق مع مختلف الهياكل الإدارية المعنية وتسير الأشغال حاليا بصفة عادية</li></ul>

# مشروع عدد 36 مشروع التنمية المندمجة بالحنشة ومنزل شاكر وبئر علي

<ul style="list-style-type: none"><li>• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري</li><li>• المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية</li></ul>	<b>صاحب المشروع</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• معتمديات : الحنشة - منزل شاكر - بئر علي بن خليفة</li></ul>	<b>مكان المشروع</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• تحسين ظروف العيش و تدعيم البنية الأساسية بالوسط الريفي</li><li>• المحافظة على الوسط الطبيعي من كل أشكال الانجراف</li><li>• تغذية الموائد المائية السطحية وتحسين مردودية الأراضي الفلاحية</li><li>• تجديد غابة الزياتين الهرمة وإحداث حقول جديدة للأشجار المثمرة والزياتين.</li><li>• إحداث مدخرات علفية لتنميين الأراضي وتوفير فضاءات للرعي.</li><li>• تطوير تشغيل الشباب والنهوض بالمرأة الريفية</li></ul>	<b>أهداف المشروع</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• المحافظة على المياه والتربة : 11300 هك</li><li>• التهيئة المائية: إحداث 108 بئر متوسطة العمق و73 بئر سطحي</li><li>• الإنتاج الفلاحي: إحداث 38 ألف هك غراسات جديدة على النمط البعلي و1500 هك سقوي</li><li>• الماء الصالح للشرب: تزويد 9400 منتقع بطول شبكة 137 كم</li><li>• تهيئة وتعبيد المسالك الفلاحية على طول 56 كلم</li></ul>	<b>مكونات المشروع</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 67 مليون دينار</li></ul>	<b>كلفة المشروع</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• انطلاق الدراسات التنفيذية نهاية سنة 2017 انطلاق الأشغال خلال الثلاثي الأول من سنة 2018</li></ul>	<b>اجال التنفيذ</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• تم الإنطلاق في إنجاز مختلف مكونات المشروع</li></ul>	<b>تقدم إنجاز المشروع</b>



# مشروع عدد 37 محطة تحلية مياه البحر بصفاقس

صاحب المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري</li><li>الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه</li></ul>
مكان المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>قرقرور من معتمدية عقارب</li></ul>
أهداف المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>تأمين تزويد صفاقس بمياه الشرب وتحسين نوعيتها</li></ul>
مكونات المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>بناء وتجهيز محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاج 100 ألف م<sup>3</sup>/اليوم في مرحلة أولى قابلة للتوسعة إلى 200 ألف م<sup>3</sup> في اليوم،</li><li>اقتناء ووضع 2 × 3200 متر من القنوات قطر 2000 مم من متعدد الأثلين لجلب مياه البحر،</li><li>اقتناء ووضع 4400 متر من القنوات قطر 1800 مم من متعدد الأثلين لصرف مياه الرجيع،</li><li>بناء 5 خزانات سعة الواحد 5000 م<sup>3</sup> للمياه المحلّقة وبناء و تجهيز 5 محطات لضخ المياه</li><li>اقتناء ووضع 49500 متر من القنوات من الحديد المصبوب لربط محطة التحلية بخزانات التوزيع،</li><li>بناء خزان سعة 5000 م<sup>3</sup> بموقع بومرة وخمسة أحواض لخلط المياه المحلاة مع بقية الموارد المائية المتوفرة،</li></ul>
كلفة المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>957 مليون دينار</li></ul>
اجال التنفيذ	<ul style="list-style-type: none"><li>انطلاق الدراسات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)</li><li>-الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بإتجاز المشروع في ماي 2017</li><li>-انطلاق الأشغال خلال النصف الثاني من سنة 2018</li></ul>
تقدم انجاز المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>تم الإنتهاء من الدراسة الأولية للمشروع خلال سبتمبر 2015</li><li>تمت الموافقة على دراسة المؤثرات البيئية للمشروع من طرف الوكالة الوطنية لحماية المحيط خلال شهر نوفمبر 2016</li><li>تم إمضاء اتفاقية القرض مع الجانب الياباني في 14 جويلية 2017 .</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• تم فتح العروض يوم 21 نوفمبر 2017 قصد إختيار القائمة الإنتقائية للعارضين - تمت المصادقة من اللجنة العليا للصفقات.</li> <li>• تم فتح طلب العروض لإختيار المكاتب الإستشارية للإحاطة الفنية في 18 جانفي 2018</li> <li>• إختيار المكتب الاستشاري للإحاطة الفنية: اكتوبر 2018</li> <li>• انجاز المحطة : بطور طلب العروض(المدة : 30 شهرا)</li> <li>• انطلاق تشغيل المحطة: الثلاثي الأول 2022</li> </ul>	<p><b>تقدم انجاز المشروع</b></p>
<p>المرحلة الأولى : ( - Préqualification AP-83/2017 ) بتاريخ 23 سبتمبر 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• قائمة محدودة بها ستة مصنعين</li> </ul>	<p><b>طلب العروض</b></p>
<p>المرحلة الثانية دعوة العارضين إلى تقديم عروضهم (DP-83/2017) بتاريخ 30 نوفمبر 2018</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• فتح العروض بتاريخ 10 جوان 2019 وتم حاليا تقييم العروض الفنية ومد الهيئة العليا للطلب العمومي بتقرير تقييم العروض الفنية بتاريخ 12 نوفمبر 2019 ليتم عرضه بعد موافقة الهيئة على الوكالة اليابانية للتعاون الدولي و تم الحصول على موافقة الهيئة العليا للطلب العمومي بتاريخ 13 جانفي 2020 و مد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بملف الفرز الفني بتاريخ 15 جانفي 2020 قصد الحصول على عدم الاعتراض</li> </ul>	<p><b>تقدم طلب العروض</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• فتح العروض المالية خلال النصف الثاني من شهر فيفري 2020</li> <li>• امضاء الصفقة مع المصنع خلال شهر اوت 2020</li> <li>- انطلاق أشغال إنجاز المحطة في سبتمبر 2020</li> <li>- مرحلة الاستغلال من طرف المصنع لمدة سنتين ابتداء من جانفي 2023 إلى غاية ديسمبر 2024.</li> </ul>	<p><b>ينتظر:</b></p>

# مشروع عدد 38 محطة تحلية مياه البحر بقرقنة

<p><b>صاحب المشروع</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري</li> <li>• الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه</li> </ul>
<p><b>مكان المشروع</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• جزر قرقنة</li> </ul>
<p><b>أهداف المشروع</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تعزيز الموارد المائية و تحسين نوعيتها بجزر قرقنة لتأمين حاجياتها إلى غاية 2035</li> <li>• تغطية حاجيات متساكني جزر قرقنة بالماء الصالح للشرب</li> <li>• إحداث قطب جديد للإنتاج يعتمد على تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة.</li> </ul>
<p><b>مكونات المشروع</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إعداد الدراسة الفنية و دراسة المؤثرات البيئية</li> <li>• بناء و تجهيز مكونات محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاج 6000 م<sup>3</sup>/اليوم</li> <li>• اقتناء ووضع القنوات لربط محطة التحلية بخزانات التوزيع . جلب خط كهرباء إلى محطة التحلية</li> </ul>
<p><b>كلفة المشروع</b></p>	<p><b>24 مليون دينار</b></p>
<p><b>اجال التنفيذ</b></p>	<p><b>انطلاق الأشغال سبتمبر 2019</b></p>
<p><b>تقدم انجاز المشروع</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تمت المصادقة على القرض المبرم في 21 جويلية 2016 من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية</li> <li>• تم إعداد الضوابط المرجعية لإنجاز الدراسات التفصيلية ودراسة المؤثرات البيئية وإحالتها إلى الممول في 14 جويلية قصد طلب الموافقة وتمت الموافقة بتاريخ 14 ديسمبر 2017،</li> <li>• الإعلان عن طلبات العروض لإنجاز الدراسات 23 فيفري 2018 وحدد تاريخ 19 مارس 2018 كآخر أجل لقبول العروض.</li> <li>• تمت الموافقة على تقرير الفرز من طرف اللجنة العليا للصفقات خلال سبتمبر 2018.</li> <li>• إنطلاق الدراسات : نوفمبر 2018. بطور موافقة الصندوق الكويتي لتمويل ابرام الصفقة</li> <li>• نشر طلب العروض لإنجاز المحطة : فيفري 2019</li> <li>• انطلاق اشغال إنجاز المحطة (مدة الإنجاز 20 شهرا): سبتمبر 2019</li> <li>• إنطلاق التشغيل الشبه صناعي للمحطة : ماي 2021</li> </ul>

مشروع 39: إحداء منطقة سقوية بالجهة الشرقية من معتمدية قرقنة (50 هك)

<p>•وزارة الفلاحة</p>	<p>صاحب المشروع</p>
<p>معتمدية قرقنة</p>	<p>مكان المشروع</p>
<p>-دعم الإنتاج الفلاحي السقوي بجزر قرقنة -توفير مورد رزق لمتساكني المنطقة</p>	<p>أهداف المشروع</p>
<p>-إحداء بئر عميقة - إحداء منطقة سقوية تمسح 50 هك</p>	<p>مكونات المشروع</p>
<p>• 2 مليون دينار ✓ إحداء البئر العميقة: 700 أ.د. ✓ التهيئة المائية: 1300 أ.د.</p>	<p>كلفة المشروع</p>
<p>□ إحداء البئر العميقة: انطلقت الأشغال بتاريخ 5 أبريل 2018. نسبة تقدم الأشغال : 100%. القبول الوقتي للأشغال 19 سبتمبر 2018 العمق: 362 م الصبيب: 100 ل/ث درجة الملوحة: 3.72 غ/ل إحداء المنطقة السقوية ✓ تم تخصيص 1.170 مليون دينار بعنوان ميزانية 2018 ✓ تم تعيين مكتب الدراسات ✓ الإعلان عن طلب العروض لأشغال التهيئة : فيفري 2019 ✓ انطلاق الأشغال: أبريل 2019 ✓ مدة الانجاز: 6 أشهر ✓ نسبة الانجاز 60%.</p>	<p>مدى تقدم إنجاز المشروع</p>

# مشروع عدد 40 برنامج التنمية المندمجة

## بمعمديات عقارب، الحنشة، منزل شاكر، العامرة، الغربية والصخيرة

صاحب المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي</li><li>المنشورية العامة للتنمية الجهوية</li><li>المجلس الجهوي-المجالس المحلية</li></ul>
مكان المشروع	معمديات : عقارب، الحنشة، منزل شاكر، العامرة، الغربية والصخيرة
أهداف المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>تحسين ظروف العيش و تدعيم البنية الأساسية بالمناطق المستهدفة</li><li>تعزيز مؤشرات التنمية البشرية لتحسين نوعية حياة الفرد والمحافظة على المحيط</li><li>دعم التشغيل بالجهات وتوفير الظروف الملائمة لاحتضان المشاريع الخاصة</li><li>إحداث حركة اقتصادية محلية</li></ul>
مكونات المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>مشاريع بنية أساسية</li><li>مشاريع بنية أساسية منتجة</li><li>مشاريع تحسين ظروف العيش</li><li>مشاريع تجهيزات جماعية</li><li>مشاريع فردية منتجة</li></ul>
كلفة المشروع	10 مليون دينار لكل معمديّة
تقدم إنجاز المشروع	<p>تنجز عناصر المشاريع على إمتداد 5 سنوات ( 2019-2023 ) حسب الرزنامة المحددة في عقد البرنامج - خلال سنة 2019 تم إعداد الدراسات التنفيذية الخاصة بالعناصر المبرمج إنجازها خلال 2020 والمتمثلة في :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>الماء الصالح للشرب لفائدة 700 عائلة بتكلفة جمالية تقدر ب3.5 م.د تم إعداد الصفقات وفتح الإعتمادات في موفى سنة 2019 ويصدد تسجيل الصفقات للإذن بالشروع في الإنجاز من الشركة الوطنية لإستلال وتوزيع المياه</li></ul>

\* الطرقات والمسالك : المبرمج إنجاز 100 كلم بتكلفة 18.359 م.د (2020-2023) تم الشروع في الدراسات التنفيذية نوفمبر 2019 نشر طلب العروض لإنجاز قسط 2020 (35 كلم) إنطلاقا من شهر أفريل

- المنشآت الصحية : المبرمج إنجاز عدد 5 منشآت صحية بتكلفة 3 م.د تم الشروع في الدراسات التنفيذية جانفي 2019 ، تمت جميع الإجراءات الخاصة بصفقة تأهيل قسم الاستعجالي والعيادات الخارجية بالصخرة وإختيار المقاول التكلفة 857 أ.د وإحالة الملف إلى المندوبية العامة للمندوبية العامة للتنمية الجهوية للدرس كما تم نشر طلب العروض الخاص بصفقة تطوير مركز الصحة الأساسية بالعامرة من صنف 3 إلى صنف 4 فتح العروض 24 مارس 2020 ، باقي العناصر الصحية بصدد إعداد ملفات طلب العروض
- عناصر البنية الأساسية المنتجة بصدد إعداد ملفات دراسات الجدوى
- التجهيزات الجماعية المبرمج إنجازها سنة 2021 وعددها 3(عناصر شبابية ورياضية ) تم الاذن للإدارة الجهوية للتجهيز للشروع في الدراسات التنفيذية .
- المشاريع الفردية المنتجة : منذ إنطلاق إنجاز المشاريع سنة 2019 تم إحداث 78 مشروع فردي عن طريق البنك التونسي للتضامن بتكلفة جمالية 1.4 م.د

تقدم إنجاز المشروع

# مشروع عدد 41: تهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس

صاحب المشروع	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مكان المشروع	الشريط الساحلي لمدينة صفاقس، ينطلق من منطقة سيدي منصور عبر مشروع تبرورة ثم يمر بجانب الميناء التجاري، ليربط مع الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى منطقة طينة.
أهداف المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>• التخفيف من الإختناق المروري وتسهيل حركة المرور وسط المدينة</li><li>• تدعيم النشاط الاقتصادي بالجهة بحكم مرورها قرب المنطقة اللوجستية للنقل والمناطق الصناعية بطينة وسيدي سالم و بودريار وسوق الجملة للخضر والغلال وكذلك المسرح الصيفي بسيدي منصور.</li></ul>
مكونات المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>• إنجاز طريق ذو سبيلين منفصلين لربط شمال مدينة صفاقس بجنوبها على إمتداد 28 كلم</li><li>• إنجاز مفترقات دائرية ومنشآت فنية ومائية والتنوير العمومي.</li></ul>
كلفة المشروع	150 مليون دينار (28 كم)
تقدم إنجاز المشروع	<ul style="list-style-type: none"><li>• المشروع ممول من البنك الأوروبي للاستثمار</li><li>• بصدد القيام بالإجراءات اللازمة لتحرير حوزة المشروع وتحويل الشبكات.</li><li>• القسط الأول من المشروع 13,3 كم (من التقاطع بين الحزامية كلم 11 والطريق المحلية 924 إلى نهاية تبرورة)</li><li>• تقدم الانجاز : 20%</li><li>• القسط الثاني من المشروع 14,7 كم (من شارع محمد الهادي خفشة الى طريق وطنية رقم 1 بطينة)</li><li>• تمت المصادقة على تقرير تقييم العروض من طرف اللجنة العليا للصفقات</li></ul>

## مشروع عدد 42: الطريق السريعة غرب-شرق الرابطة بين صفاقس- القصرين وسيدي بوزيد


وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	صاحب المشروع
ولايات صفاقس - سيدي بوزيد- القصرين	مكان المشروع
يندرج المشروع ضمن الممرات الاستراتيجية شرق -غرب الرابطة بين ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة بولايتي صفاقس وقابس	أهداف المشروع
إنجاز طريق سريعة غرب شرق تربط بين ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة بولايتي صفاقس وقابس بطول 200 كلم	مكونات المشروع
800 مليون دينار (200 كم)	كلفة المشروع
<ul style="list-style-type: none"> <li>انطلقت دراسة الممرات الاستراتيجية شرق-غرب الرابطة بين ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة بولايتي صفاقس وقابس منذ شهر أبريل 2015 وبلغت الدراسات التمهيديّة (APS) مراحلها النهائية، وقد انبثق عنها تحديد للمحاور الاستراتيجية ذات الأولوية ضمن المخطط 13 للتنمية، بطول 300 كلم (تهيئة طرقات موجودة جاري استغلالها)،</li> <li>تم عقد جلسة بولاية صفاقس في 4 أوت 2017 مع مكتب الدراسات المكلف بالدراسة الإجتماعية والعقارية.</li> <li>تم توجيه طلب إلى وزارة التنمية بتاريخ 30/03/2018 لإيجاد تمويلات لإنجاز المشروع.</li> <li>تم القيام بدراسة المتعلقة بتبرير اللجوء إلى اعتماد صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروع</li> <li>تم عرض تمويل المشروع على الندوة الدولية التي تم تنظيمها يوم 18 سبتمبر 2018 حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص.</li> <li>تم نشر طلب العروض لإعداد الدراسات التفصيلية و ملف طلب العروض</li> </ul>	تقدم انجاز المشروع



# مشروع عدد 43 : إحداث 8 ممرات علوية بالطريق الحزامية كم 4

<p>وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية</p>	<p>صاحب المشروع</p>
<p>معتمديات ساقية الدائر، صفاقس المدينة، صفاقس الغربية على مستوى القاصة كم 4 بصفاقس</p>	<p>مكان المشروع</p>
<p>التخفيف من الضغط المروري بمدينة صفاقس و تسهيل حركة المرور بالطريق الحزامية كلم 4 وذلك بتهيئة ممرات علوية بالتقاطعات مع الطرقات الشعاعية</p>	<p>أهداف المشروع</p>
<p>بناء 8 ممرات علوية على مستوى المفترقات التي تربط القاصة كم 4 بالطرقات التالية :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ الطريق الجهوية 82 (طريق المهديّة) * الطريق المحلية 911 (طريق تنيور)</li> <li>▪ الطريق الجهوية 81 (طريق قرمدة- طريق القائد محمد)</li> <li>▪ الطريق المحلية 923 (طريق الأفران) * الطريق المحلية 920 (طريق العين)</li> <li>▪ الطريق الوطنية 13 (طريق منزل شاكر) * الطريق الوطنية 14 (طريق المطار)</li> <li>▪ الطريق الوطنية 1 (طريق قابس)</li> </ul>	<p>مكونات المشروع</p>
<p>140 مليون دينار</p>	<p>كلفة المشروع</p>
<p>الجزء الأول من المشروع "القسطين 1 و2" (انجاز 04 منشآت):</p> <p>القسط عدد1:</p> <p>- نسبة تقدم الأشغال : 57%</p> <p>القسط عدد2:</p> <p>- نسبة تقدم الأشغال : 58%</p> <p>الجزء الثاني من المشروع "القسطين 3 و4» (انجاز 04 منشآت):</p> <p>القسط عدد3:</p> <p>نسبة تقدم الأشغال : 11%</p> <p>القسط عدد4:</p> <p>نسبة تقدم الأشغال : 5%</p>	<p>تقدم انجاز المشروع</p>

# إحداث 8 ممرات علوية بالطريق الحزامية كم 4

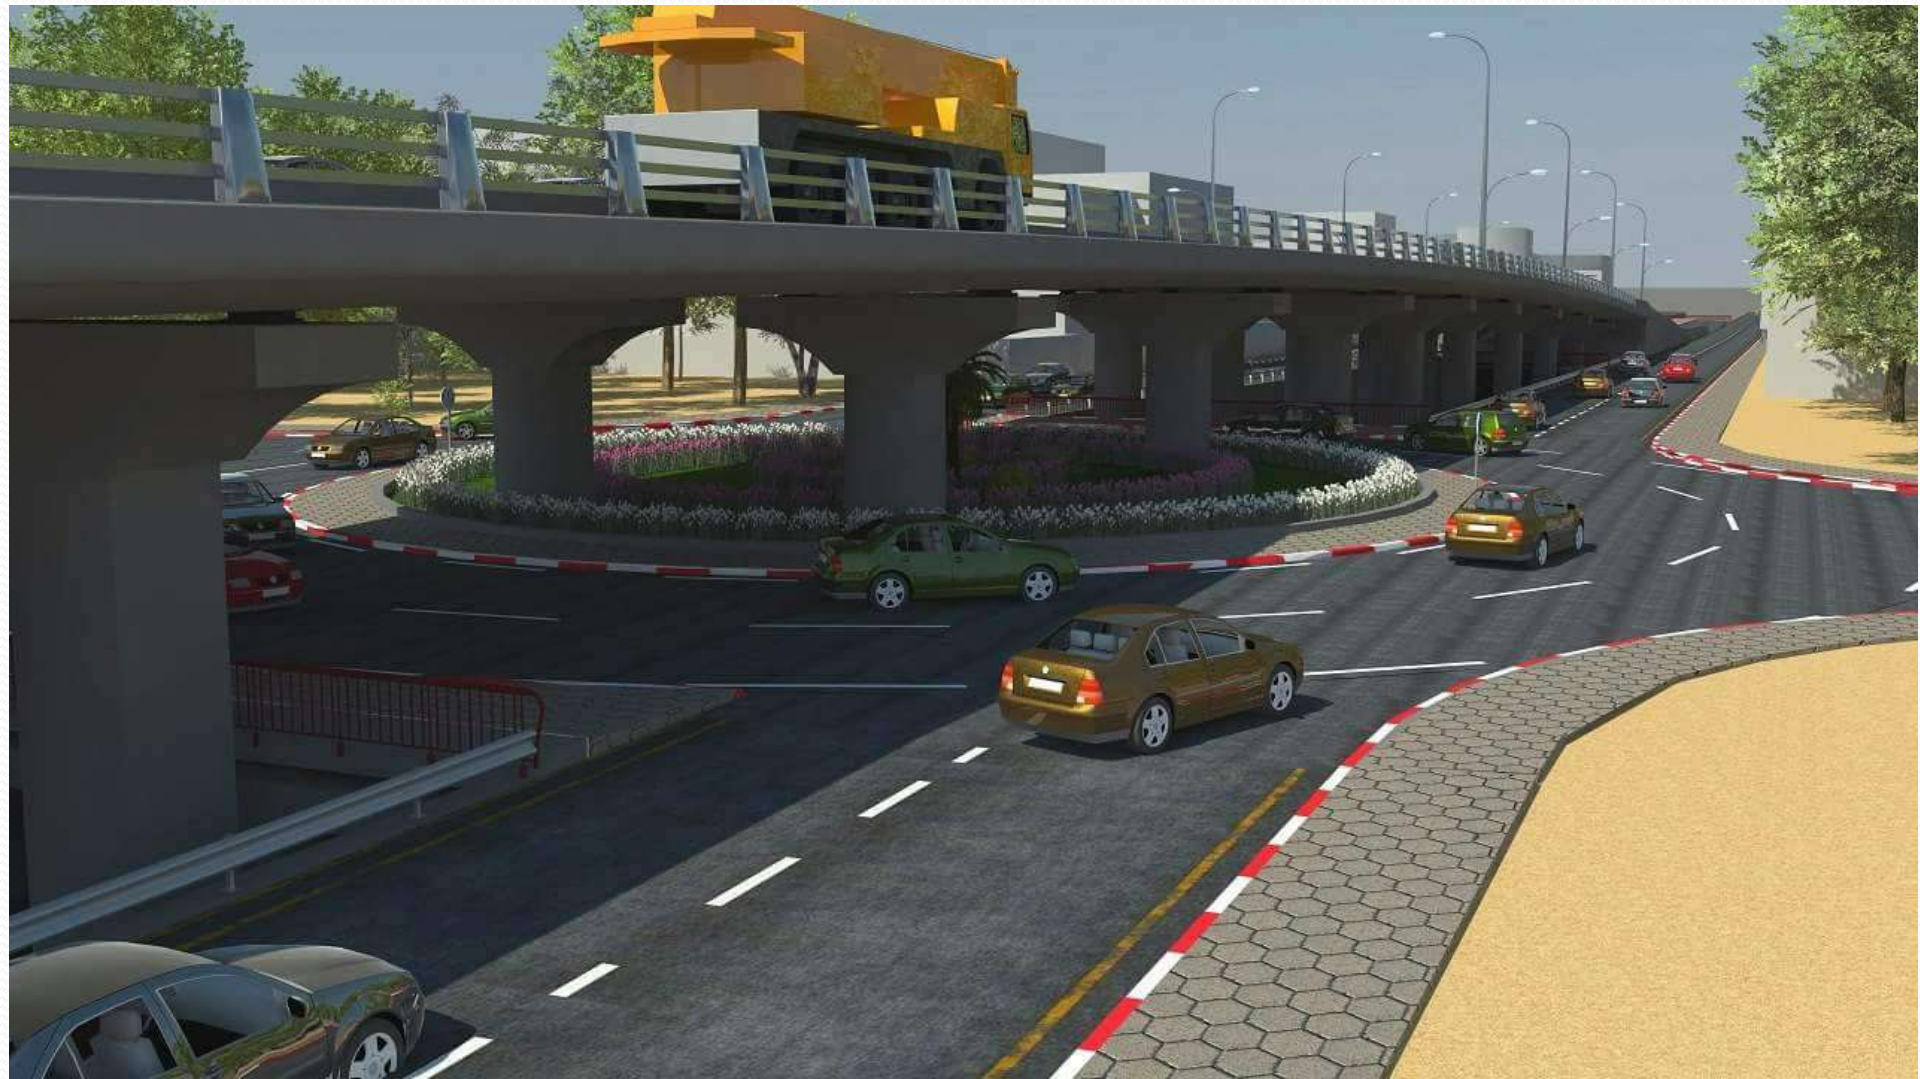

## مشروع عدد 44:تحسين السلامة المرورية بالطريق الوطنية رقم 14م من ن ك 0 إلى ن ك 14.5

صاحب المشروع	•وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مكان المشروع	•معتمديات صفاقس الغربية وصفاقس الجنوبية وطينة و عقارب
أهداف المشروع	•تحسين السلامة المرورية بالطريق الوطنية رقم 14 •التخفيف من الإختناق المروري وتسهيل حركة المرور بين وسط المدينة و المدخل الجنوبي للطريق السيارة صفاقس - قابس
مكونات المشروع	•انجاز الطبقة الأساسية بمادة الحصى •انجاز طبقة من الخرسانة الإسفلتية •تهيئة 6 مفترقات دائرية و 11 مفترق عادي •بناء الأرضية الوسطى و جوانب الطريق و الأرصفة •تركيز التشوير العمودي والأفقي ومنشآت السلامة •انجاز شبكة التنوير العمومي
كلفة المشروع	•27,8•مليون دينار
تقدم انجاز المشروع	•مشروع ممول من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي و الإجتماعي ، •انطلاق الاشغال المبرمج : 22 جانفي 2018 •المقاوله : شركة شعبان وشركاؤه •مدة الإنجاز : 24 شهر •نسبة تقدم الأشغال : 100%
رزمة التنفيذ	•جانفي 2018 إنطلاق الأشغال لمدة 24 شهرا

# مشروع عدد 45 :تهيئة الطريق الجهوية رقم 119 من المحرس الى عقارب بطول 20.7 كلم

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	<b>صاحب المشروع</b>
الطريق الجهوية 119 في جزئها الرابط بين محول الطريق السيارة صفاقس - قابس بالمحرس والطريق الوطنية رقم 14 بعقارب من ن ك 10 إلى ن ك 30.	<b>مكان المشروع</b>
تهيئة الطريق الجهوية 119 في جزئها الرابط بين محول الطريق السيارة صفاقس - قابس بالمحرس والطريق الوطنية رقم 14 بعقارب من ن ك 10 إلى ن ك 30.	<b>أهداف المشروع</b>
توسعة الطريق إلى 7.6 متر مع حواشي بعرض 2.75 متر من كل جهة تحسين مسار الطريق و معالجة النقاط السوداء و الزرقاء الموجودة حماية الطريق من الفيضانات وانجاز المنشآت المائية اللازمة - التشوير الأفقي والعمودي	<b>مكونات المشروع</b>
12.070 مليون دينار	<b>كلفة المشروع</b>
- انطلاق الاشغال : 17 جانفي 2018 - المقاوله MGTPH / SEB : - مدة الإنجاز: 22 شهر. - مبلغ الصفقة: 12071 أ.د. نسبة تقدم الأشغال : 96 %	<b>مدى تقدم إنجاز المشروع</b>

# مشروع عدد 46 : برنامج تعصير وتدعيم الطرقات داخل المناطق البلدية: بلدية صفاقس, بلدية الصخيرة, بلدية جبنانة

صاحب المشروع	بلدية صفاقس, بلدية الصخيرة, بلدية جبنانة
مكان المشروع	معمدية صفاقس المدينة, معمدية الصخيرة, معمدية جبنانة
أهداف المشروع	<ul style="list-style-type: none"> <li>• النهوض بأوضاع الأحياء الشعبية.</li> <li>• تحسين ظروف عيش متساكني المناطق المستهدفة.</li> <li>• معالجة الوضع البيئي ببعض الأحياء.</li> </ul>
مكونات المشروع	• تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية
كلفة المشروع	9 مليون دينار
مدى تقدم إنجاز المشروع	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تم انطلاق الأشغال يوم 15/11/2017</li> <li>• نسبة تقدم الإنجاز : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ بلدية صفاقس 5 م د : 100%</li> <li>✓ بلدية الصخيرة 3 م د : 100%</li> <li>✓ بلدية جبنانة 1 م د : 100%</li> </ul> </li> </ul>

# مشروع عدد 47 : تهيئة 48 مقسم فردي بمدينة الحنشة

- ✓ وزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية
- ✓ الإدارة المكلفة بمتابعة إنجاز المشروع: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب

صاحب المشروع

معتمدية الحنشة

مكان المشروع

توفير 48 مقسم إجتماعي لفائدة الفئات الإجتماعية ذات الدخل المحدود.

أهداف المشروع

- ✓ إنجاز 48 مقسما فرديا من الصنف الإجتماعي بمساحة فردية حوالي 122 م<sup>2</sup> للمقسم الواحد.
- ✓ إنجاز أشغال الربط بالشبكات المختلفة.

مكونات المشروع

594 ألف دينار      الكلفة المحينة : 700 ألف دينار

كلفة المشروع

- تم الإذن لانطلاق الأشغال بتاريخ 01 جوان 2017
- مدة الإنجاز 150 يوم- مبلغ الصفقة: 594.337 د
- تم الشروع في تهيئة التقسيم وبصدد تركيز الشبكات منذ 13 ديسمبر 2017،
- ابتداء الأشغال : 31/05/2017
- نسبة تقدم الإنجاز: 100%
- تم الاستلام الوقتي للأشغال 25/12/2018

مدى تقدم إنجاز  
المشروع

# مشروع عدد 48: بناء 155 مسكن جماعي بساقية الزيت-الانس

<p>✓ وزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية.          ✓ الإدارة المكلفة بمتابعة إنجاز المشروع: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب</p>	<p><b>صاحب المشروع</b></p>
<p>• معتمدية ساقية الزيت</p>	<p><b>مكان المشروع</b></p>
<p>✓ بناء مركب سكني جماعي بطابق أرضي وطابقين علويين يتكون من 155 شقة لفائدة الفئات الإجتماعية ذات الدخل المحدود.          ✓ موزع على 3 أقساط (48 شقة قسط 1 و 48 شقة قسط 2 و 59 قسط 3)          ✓ يتكوّن المركب السكني من 13 مدرج.          ✓ إنجاز أشغال الربط بالشبكات المختلفة.</p>	<p><b>مكونات المشروع</b></p>
<p>9 م د</p>	<p><b>كلفة المشروع</b></p>
<p>الكلفة المحينة : 10 مليون دينار</p>	<p>تم إمضاء اتفاقية إنجاز الأشغال مع المقاولين وتم إصدار الإذن الإداري لإنطلاق الأشغال          -تاريخ انطلاق الأشغال : 04/05/2018          - مدة الإنجاز 365 يوم.          - نسبة تقدم الإنجاز: تم الإستلام الوقتي للقسطين 1 و 2</p>

# مشروع عدد 49:دراسة "صفاقس 2050"

صاحب المشروع	•وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مكان المشروع	•مدينة صفاقس
أهداف المشروع	دراسة استشرافية شاملة لتطور مدينة صفاقس إلى حدود سنة 2050 إعداد وثيقة توجيهية ذات صبغة عمرانية
كلفة المشروع	•450 ألف دينار
مدى تقدم إنجاز المشروع	<p><b>الصور الجوية:</b> تم إبرام الصفقة مع مجمع المركز الوطني للاستشعار عن بعد وديوان قيس الأراضي تمّ استلام الصور الجوية خلال شهر ديسمبر 2017 وتم قبول الصور الجوية من قبل إدارة التعمير</p> <p><b>المناظرة:</b> تم عقد جلسة عمل ببلدية المكان بتاريخ 18 جوان 2019 للنظر في الخطوط المرجعية والاعلان عن مناظرة أفكار في الغرض.</p>



# مشروع 50: دراسة مثال تنسيقي لجزيرة قرقنة

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	صاحب المشروع
معتمدية قرقنة	مكان المشروع
✓ إعداد وثيقة مرجعية التي تضمن ملاءمة مختلف أمثلة التهيئة العمرانية للجزيرة ✓ الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الطبيعية للجزيرة ✓ المحافظة على البيئة والمحيط	أهداف المشروع
•مناظرة أفكار	مكونات المشروع
•100 ألف دينار	كلفة المشروع
- تم الإعلان عن طلب عروض مع مناظرة لإعداد مثال تنسيقي للجزيرة بتاريخ 14 جويلية 2017 . - تم الإعلان عن نتيجة المناظرة موضوع الدراسة بتاريخ 11 جانفي 2018 الكلفة 75 أد. - تم عقد جلسة عمل بمقر إدارة التعمير بتاريخ 25 جانفي 2018 وتمّ النظر في ملاحظات لجنة التحكيم مع مجمع المصممين والتي تم فيها ضبط التوجهات الكبرى التي سيقع اعتمادها في مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية. - تم انجاز دراسة المثال التنسيقي وتمت المصادقة من إدارة التعمير. بصدد إعداد الخطوط المرجعية لطلبات العروض الخاصة بأمثلة التهيئة العمرانية (سيتم برمجة جلسة عمل مع البلدية في الغرض).	مدى تقدم إنجاز المشروع

# مشروع 51: مشروع تهذيب حي السلطانية و منطقة المصلى ببلدية ساقية الداير

صاحب المشروع	• بلدية ساقية الداير و بلدية صفاقس
مكان المشروع	• معتمدية ساقية الداير
أهداف المشروع	• معالجة إرتفاع مستوى المائدة السطحية بمنطقة صفاقس الشمالية
مكونات المشروع	- طرقات - تطهير - تنوير عمومي
كلفة المشروع	• تهذيب حي السلطانية : 11,5 مليون دينار • تهذيب منطقة المصلى : 13,2 مليون دينار
مدى تقدم إنجاز المشروع	- تهذيب حي السلطانية : انتهت الأشغال وتمّ القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 21 أفريل 2017. - تهذيب منطقة المصلى : نسبة تقدم الأشغال 100 %.

# مشروع: 52 تخصيص تمويل بمبلغ 5 م د لتحسين الشبكة الطرقية بمعتمديات المحرس وقرقنة وبئر علي بن خليفة.

صاحب المشروع	<ul style="list-style-type: none"> <li>وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي</li> <li>المجلس الجهوي-</li> </ul>
مكان المشروع	معتمديات المحرس - قرقنة و بئر علي بن خليفة
أهداف المشروع	تحسين البنية الأساسية لشبكة المسالك الريفية بالمعتمديات المستهدفة
كلفة المشروع	5 م.د
مدى تقدم إنجاز المشروع	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم برمجة إنجاز هذا المشروع ضمن البرنامج الجهوي</li> <li>تم إعداد الدراسات وملف طلب العروض وتمت المصادقة على الصفقة بتاريخ 21 جوان 2018</li> <li>تمت مراسلة وزارة المالية من طرف وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي في 24 جويلية 2018 وتم برمجة فتح الاعتمادات في جانفي 2019</li> <li>بصدد الانجاز</li> </ul>

# مشروع 53: بناء المركب الجهوي للتكوين المهني والتشغيل

صاحب المشروع	•وزارة التكوين المهني والتشغيل •الإدارة الجهوية بصفاقس +المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية
مكان المشروع	•مدينة صفاقس
أهداف المشروع	-تمكين الإدارة الجهوية ومصالح التكوين المستمر من مقر قار وعلى ملكها(المقرات الحالية على وجه الكراء) -ضمان أفضل ظروف للعمل حتى تتمكن الإدارة من الإضطلاع بمهامها على أحسن وجه - تجميع المصالح وتقريب الخدمات من المواطن و ضمان سهولة التعامل والتواصل بين مختلف المصالح الإدارية
مكونات المشروع	-إدارة جهوية للتكوين المهني والتشغيل -وحدة جهوية للتكوين المستمر -معهد الترقية العليا للشغل
كلفة المشروع	•2314842 (أ د)
مدى تقدم إنجاز المشروع	- انطلقت الأشغال بتاريخ 22 سبتمبر 2016 - مدة الأشغال : 365 يوما. -نسبة تقدم الأشغال : 99%. تم ربط البناية بمختلف الشبكات العمومية في انتظار الماء الصالح للشرب

# مشروع 54: تهيئة وتوسعة مركز التكوين والتدريب المهني بقرقنة

وزارة التكوين المهني والتشغيل	صاحب المشروع
معتمدية قرقنة	مكان المشروع
<ul style="list-style-type: none"><li>- إعادة هيكلة البناية نظرا لتقدمها وضيق الفضاءات البيداغوجية ومكاتب الإدارة</li><li>- توفير الفضاءات البيداغوجية والإدارية وفضاءات الإقامة والإعاشة اللازمة</li><li>- توفير التجهيزات التقنية المتطورة التي تواكب التقدم التكنولوجي</li><li>- تطوير الإختصاصات التي تتماشى ومتطلبات سوق الشغل</li></ul>	أهداف المشروع
10239 (أ د)	كلفة المشروع
<ul style="list-style-type: none"><li>• تمت المصادقة على ملف الهندسة المعمارية (APD)</li><li>• تم إنجاز الدراسات الجيوتقنية</li><li>• بصدد المصادقة على ملفات الدراسات الفنية لقسط الهيكله والأقساط الفنية (APD)</li><li>• تم إعداد مثال تركيز المعدات ومتطلبات الطاقة من قبل إدارة المركز</li><li>• تم الاتفاق خلال الجلسة الوزارية ليوم 20 سبتمبر 2018 لفض اشكال تعطل إنجاز المشروع</li><li>• تقدم النجاز في طور إعداد ملف طلب العروض</li></ul>	مدى تقدم إنجاز المشروع

# مشروع عدد 55: إيقاف نشاط الوحدات الملوثة لشركة السياب والإنتلاق في تفكيكها.

المجمع الكيميائي التونسي

صاحب المشروع

مدينة صفاقس

مكان المشروع

• إيقاف نشاط الوحدات الملوثة لشركة السياب والإنتلاق في تفكيكها مع المحافظة على مواطن الشغل ومكتسبات إطارات المجمع الكيميائي بصفاقس على أن يتحول نشاطها إلى قطب للبحث العلمي و تكنولوجيا البيئة والمحيط ومركزا للتطوير في مجال الأسمدة الكيميائية مع المحافظة على ملكية المجمع الكيميائي التونسي للأراضي والعقارات المقام عليها المصنع

أهداف المشروع

75 م د

كلفة المشروع

• تم تفكيك مدختي وحدتي الحامض الكبريتي جزئيا منذ جويلية 2017.  
 • تم تنظيف أحواض تذيب الكبريت و تفكيك كل معداتها و خزنها.  
 • تم تنظيف كل صهاريج تخزين الحامض الكبريتي ومعالجتها من كل الترسبات ( interage )  
 • تم إفراغ برج التحويل من الحافز و تخزينه في براميل محكمة السد.  
 • بصدد تنظيف الموقع من جميع الشوائب ( بقايا مادة الكبريت,.... )  
 • وقع عرض تقييم العروض المتنافاة الخاص بدراسة تفكيك وحدات الحامض الكبريتي ووحدة الحامض الفسفوري على لجنة الصفقات المنشأة بتاريخ 25 جوان 2018 وتم إسناد الصفقة إلى مكتب الدراسات "TECI"

مدى تقدم إنجاز المشروع

➤ مبلغ الصفقة: 120 ألف دينار .

➤ آجال الدراسات: 60 يوم.

➤ نسبة تقدم الدراسات 75%

➤ العقد AM18.3.0049GCT/TECI.

➤ بصدد تنظيف الموقع من جميع الشوائب ( بقايا مادة الكبريت ..... )

• وقع تلقي العروض الخاصة بدراسة تهيئة مواقع الورشات المفككة وكوم الفوسفوجيبس وسيتم عرضها على أقرب جلسة للجنة العليا للصفقات (خلال شهرمارس 2019)

➤ المبلغ التقديري المرصود: 250 ألف دينار.

➤ الآجال التقديرية لإنجاز الدراسة: 13 شهر

• تم الشروع في إنجاز بعض التدخلات لتفكيك بعض المنشآت و تهيئتها بالإمكانات المتوفرة لدى الشركة.

• تم تكوين لجنة داخلية من إطارات المجمع وقد وقع تكليفها بإعداد الدراسة الخاصة بتفكيك الوحدات التي وقع إقرار إيقافها وأشغالها تجري بخطى حثيثة.

• **تم تكوين لجنة قيادة مشتركة** بين المجمع الكيميائي التونسي والوكالة الوطنية للمحافظة على المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تكون لها المرجعية التامة في متابعة الدراسات و الأشغال مشروع تحويل معمل صفاقس بكل مكوناته من ذلك :

➤ دراسة تفكيك الوحدات و إعداد خطة لمعالجة النفايات و المواد الخطرة.

➤ دراسة إستصلاح الموقع بعد تفكيك المعدات وكذلك إستصلاح كوم الفوسفوجيبس.

➤ متابعة إنجاز الدراسات الضرورية للمشاريع البديلة (دراسة المؤثرات على البيئة)

• **تم تحديد آجال الإنتهاء من إنجاز مختلف العناصر:**

• تفكيك الوحدات الملوثة : السداسي الأول 2021

• إستصلاح الموقع و تهيئة كوم الفوسفوجيبس: الثلاثي الثالث 2023

• قطب التكنولوجيا : آخر 2023

• تم الاتفاق خلال جلسة 20 سبتمبر 2018 برئاسة الحكومة على تكليف الادارة العامة

للمناجم والمجمع الكيميائي التونسي لاعداد خارطة زمنية دقيقة لتنفيذ المشروع ومد الجهة بها

**الصعوبات والمقترحات:**

تأخر صدور قرار الوكالة الوطنية لحماية المحيط بشأن دراسة المؤثرات البيئية للمشروع

**مدى تقدم إنجاز  
المشروع**

## الوضعية الحالية للمصنع

توقفت وحدات الإنتاج بالمصنع تدريجيا كما يلي :

- \* يوم 20-11-2014 وحدة الحامض الكبريتي 300 طن في اليوم
- \* يوم 26-08-2016 وحدة الحامض الكبريتي 750 طن في اليوم
- \* يوم 20-04-2017 وحدة الحامض الفوسفوري
- \* يوم 07-08-2019 وحدات ثلاثي الفسفاط الرفيع

تبعاً

### ❑ لإيقاف وحدات الإنتاج:

- الحامض الفسفوري والحامض الكبريتي (سنة 2016)
- ثلاثي الفسفاط الرفيع (سنة 2019).

- ❑ وللاتفاق الموقع تحت اشراف رئاسة الحكومة يوم 30 اكتوبر 2019 بين وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمجمع الكيميائي التونسي من جهة والاتحاد التونسي للشغل من جهة أخرى سيتم:
  - ❑ إقامة مشاريع بديلة مشغلة وغير ملوثة على أرض المعمل.
  - ❑ تفكيك الوحدات المتوقفة واستصلاح الموقع بما في ذلك كوم الفسفوجبس.
  - ❑ بالتوازي مع الانطلاق الفعلي لإنجاز مكونات المجمع الاقتصادي، سيتمّ الشروع في تفكيك الوحدات المتوقفة بالاعتماد أساسا وكلّما أمكن ذلك على الموارد البشرية واللوجستية للمجمع الكيميائي التونسي وذلك في إطار ترشيد النفقات.
  - ❑ أمّا فيما يتّصل باستصلاح الموقع بما في ذلك "الطابية" فإن الملف في طور إصدار طلب العروض وينتظر الشروع الفعلي في التهيئة في شهر جوان 2020 وذلك بالتوازي مع إنجاز مشروع محطة الكهرباء بالطاقة الشمسية.

مدى تقدم إنجاز  
المشروع



## أشغال التفكيك والاستصلاح

- ❑ بالتوازي مع الانطلاق الفعلي لإنجاز مكونات المجمع الاقتصادي، سيتمّ الشروع في تفكيك الوحدات المتوقّفة بالاعتماد أساسا وكلّما أمكن ذلك على الموارد البشرية واللوجستية للمجمع الكيميائي التونسي وذلك في إطار ترشيد النفقات.
- ❑ أمّا فيما يتّصل باستصلاح الموقع بما في ذلك "الطابية" فإن الملف في طور إصدار طلب العروض ومنتظر الشروع الفعلي في التهيئة في شهر جوان 2020 وذلك بالتوازي مع إنجاز مشروع محطة الكهرباء بالطاقة الشمسية.
- ❑ تبلغ الميزانية الإجمالية لإنجاز المشاريع المكونة للمجمع الاقتصادي بما في ذلك تهيئة موقعه حوالي 145 مليون دينار.
- ❑ ينطلق إنجاز هذه المشاريع بداية من سنة 2020 على أن يستكمل إنجاز كل مكونات المجمع الاقتصادي في نهاية 2023 على أقصى تقدير

مدى تقدم إنجاز  
المشروع

المساحة التقديرية (هكتار)	آجال الإنجاز	التكلفة التقديرية (م دينار)	العنوان
			I- المجمع الاقتصادي :
2	1.5 سنة بداية من جويلية 2020	15	(1) مركز البحوث
1.5	2 سنوات بداية من جانفي 2021	10	(2) مركز التكوين والتوثيق والأرشفة
سطح الطابية	2 سنوات بداية من سبتمبر 2020	10	(3) محطة إنتاج الكهرباء بواسطة اللاقطات الضوئية
8	1.5 سنة بداية من جوان 2020	5	(4) وحدة مزج وتخزين وتوزيع الأسمدة
1	1.5 سنة بداية من جويلية 2020	10	(5) تهيئة موقع المجمع الاقتصادي
2.5	2.5 سنوات بداية من جانفي 2021	15	(6) مركز تصنيع قطع الغيار والمواد الاستهلاكية
1	2.5 سنوات بداية من جانفي 2021	10	(7) مركز المراقبة الفنية
1	2 سنوات بداية من سبتمبر 2021	10	(8) محطة تحلية لمياه الآبار
3	2 سنوات بداية من سبتمبر 2020	15	(9) فضاء ترفيهي ومعيشي
20		<b>100</b>	المجموع :
		45	II- تفكيك وحدات الإنتاج واستصلاح مواقعها
		<b>145</b>	المجموع العام :

# مشروع 56: الشبكة الذكية للكهرباء

صاحب المشروع	- وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة - الشركة التونسية للكهرباء والغاز
مكان المشروع	مدينة صفاقس
أهداف المشروع	تركيز 400 ألف عداد ذكي بجهة صفاقس
مكونات المشروع	✓ عدادات ذكية ✓ محطات تحكم ✓ وسائل الاتصالات
كلفة المشروع	250 مليون دينار
مدى تقدم إنجاز المشروع	➤ وقع تكوين فريق يضم عديد الخبرات من المستوى المركزي و الجهوي. ➤ إنطلقت الدراسات خلال شهر أفريل 2017. ➤ مدة الإنجاز : 36 شهرا ➤ وقع تكوين فريق يضمّ عديد الخبراء على المستوى المركزي و الجهوي. ➤ تم إعداد كراس الشروط . ➤ تم إصدار طلب العروض في 20 أوت 2019. ➤ تم فتح العروض المقدمة في أواخر شهر فيفري 2020.

# مشروع 57: تسوية الوضعية العقارية والقانونية للعقارية للتجمع المعروف بالحاج قاسم

صاحب المشروع	•وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
مكان المشروع	منزل شاكر
أهداف المشروع	تسوية الوضعية العقارية والقانونية للمستغلين للعقار المعروف بالحاج قاسم
مكونات المشروع	مساحة حوالي 4000 هك تم رفع الصبغة الغابية عنها بمقتضى قرار صادر عن السيد وزير الفلاحة بتاريخ 16/05/2017
مدى تقدم إنجاز المشروع	<p>تم رفع الصبغة الغابية على مساحة حوالي 4000 هك من العقار الدولي المعروف بهنشير الحاج قاسم وتم حصر عدد 427 متصرف وعدد 4 تجمعات سكنية ،</p> <p>- تقدم حوالي 127 متصرف بمطالب في تسوية وضعيتهم بالكرء للمساحة المستغلة من طرفهم وشرعت مصالح الإدارة الجهوية في إعداد عقود الكراء</p> <p>-تم إبرام عدد 27 عقد كراء بالمراكنة وتسليمها إلى أصحابها من طرف السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم 06/09/2018 .</p> <p>- في ما يتعلق بتمتع أهالي منطقة الحاج قاسم بالعمو عن الخطايا المالية الهامة الناجمة عن الأحكام الجزائية الصادرة ضدهم تم تكوين لجنة على مستوى ولاية صفاقس للتعهد بالتسريع في استقاء شروط التمتع بالعمو الخاص وعقدت جلسة عمل في الغرض يوم 26/10/2017 . كما تم عقد جلسة بتاريخ 14 مارس 2018 بحضور ممثلة وزارة العدل حيث تم التأكيد على ضرورة مد اللجنة بالأحكام النهائية وتحديد المعايير التي سيقع اعتمادها في دراسة المطالب. تمت دراسة 42 مطلب مع رئيس فرع المحكمة العقارية لصفاقس وتمت إحالتها إلى السيد وزير العدل خلال شهر جوان 2018.</p>

# مشروع 58: مركز التنشيط الثقافي والرياضي

صاحب المشروع	وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ديوان الخدمات الجامعية للجنوب
مكان المشروع	مدينة صفاقس
أهداف المشروع	التنشيط الثقافي و الرياضي للطلبة
كلفة المشروع	814 أد الكلفة المحينة 913 ألف دينار
مدى تقدم إنجاز المشروع	منجز

# مشروع 59: المركب الرياضي بالقطب التكنولوجي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ديوان الخدمات الجامعية للجنوب	صاحب المشروع
معتمدية ساقية الزيت	مكان المشروع
✓ تحسين الخدمات الجامعية ✓ تنشيط المحيط الطالبى	أهداف المشروع
- قاعة مغطاة - ملعب متعدد الإختصاصات - إدارة - حجرة ملابس - مخزن معدات - ملعب معشب لكرة القدم	مكونات المشروع
الكلفة المحينة 3087 ألف دينار الاعتمادات المخصّصة حسب الميزانية : 1200 ألف دينار	كلفة المشروع
<p>التامت اللجنة الفنية للبنىات المدنية بالإدارة الجهوية للتجهيز بصفاقس بتاريخ 26 افريل 2018 وصادقت على الدراسات المفصلة وطلبت من صاحب المشروع مدها بمكتوب يفيد توفر الاعتمادات المطلوبة لاعداد الملف الاولي لطلب العروض.</p> <p>-أبدى الممول البنك الأوروبي للاستثمار موافقته على التمديد في آجال القرض الى غاية 2020 في انتظار مد الولاية برأى وزارة التعليم العالي</p> <p>-تم الترفيع في كلفة المركب الرياضى للقطب التكنولوجى من 1,2 م د بميزانية 2018 إلى 2,5 م د بميزانية 2019</p> <p>-ضرورة مد الولاية برأى الممول قصد إستكمال الدراسات وإعداد طلب العروض</p> <p>-في انتظار إعلان طلب العروض من طرف الولاية على موقع TUNEPS</p> <p>- مدة الأشغال : 14 شهرا</p>	مدى تقدم إنجاز المشروع

# مشروع عدد 60: المبيت الجامعي بالقطب التكنولوجي

صاحب المشروع	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مكان المشروع	معتمدية ساقية الزيت
أهداف المشروع	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ تحسين الخدمات الجامعية</li> <li>✓ توفير الإيواء لطلبة القطب التكنولوجي</li> </ul>
مكونات المشروع	<ul style="list-style-type: none"> <li>- إدارة</li> <li>- 3 أجنحة للإيواء 530 سرير</li> <li>- وحدات صحية</li> <li>- فضاءات ثقافية</li> <li>- 2 مساكن وظيفية</li> <li>- قاعات مراجعة- قاعات للتلفاز مشرب</li> </ul>
كلفة المشروع	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ الكلفة المحينة 12.500 مليون دينار</li> <li>الاعتمادات المخصصة : 10.700 مايون دينار</li> </ul>
مدى تقدم إنجاز المشروع	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم إحالة ملف طلب العروض على الممول بتاريخ 30 ديسمبر 2017 لتوفير تمويلات إضافية لتشر طلب العروض (قيمة المشروع 12 م د)</li> <li>مدة الأشغال : 600 يوم</li> <li>-أبدى الممول البنك الأوروبي للاستثمار موافقته على التمديد في آجال القرض الى غاية 2020 في انتظار مد الولاية برأي وزارة التعليم العالي</li> <li>تم الترفيع في كلفة المبيت الجامعي بالقطب التكنولوجي من 10,7 م د د بميزانية 2018 إلى 12,5 م د بميزانية 2019 في انتظار إعلان طلب العروض</li> </ul>

# الوضع التتموي بولايات إقليم الشمال الشرقي (نابل-زغوان-بنزرت)

22 جوان 2020



## محتوى العرض


- تقديم عام
- مؤشرات اقتصادية
- مؤشرات اجتماعية
- متابعة المشاريع العمومية ضمن المخطط التنموي 2016-2020
- المشاريع العمومية المعطلة

## تقديم عام


الوطني	الاقليم	بنزرت	زغوان	نابل	
11608.3	<b>1627.4</b>	591	187.2	849.2	(2019) عدد السكان
	<b>9392</b>	3750	2820	2822	المساحة (كلم)
1322	<b>380</b>	200	-	180	الشريط الساحلي (كلم)
1.03	<b>1.13</b>	0.81	0.95	1.28	نسبة النمو السكاني (2014-2004) %
0	<b>7054</b>	-6001	-447	13502	صافي الهجرة الداخلية (2014-2009)
-22281	<b>-3340</b>	-1305	-350	-1685	صافي الهجرة الخارجية (2014-2009)
350	<b>53</b>	17	8	28	عدد البلديات
274	<b>36</b>	14	6	16	عدد المعتمديات



## ولايات الشمال الشرقي

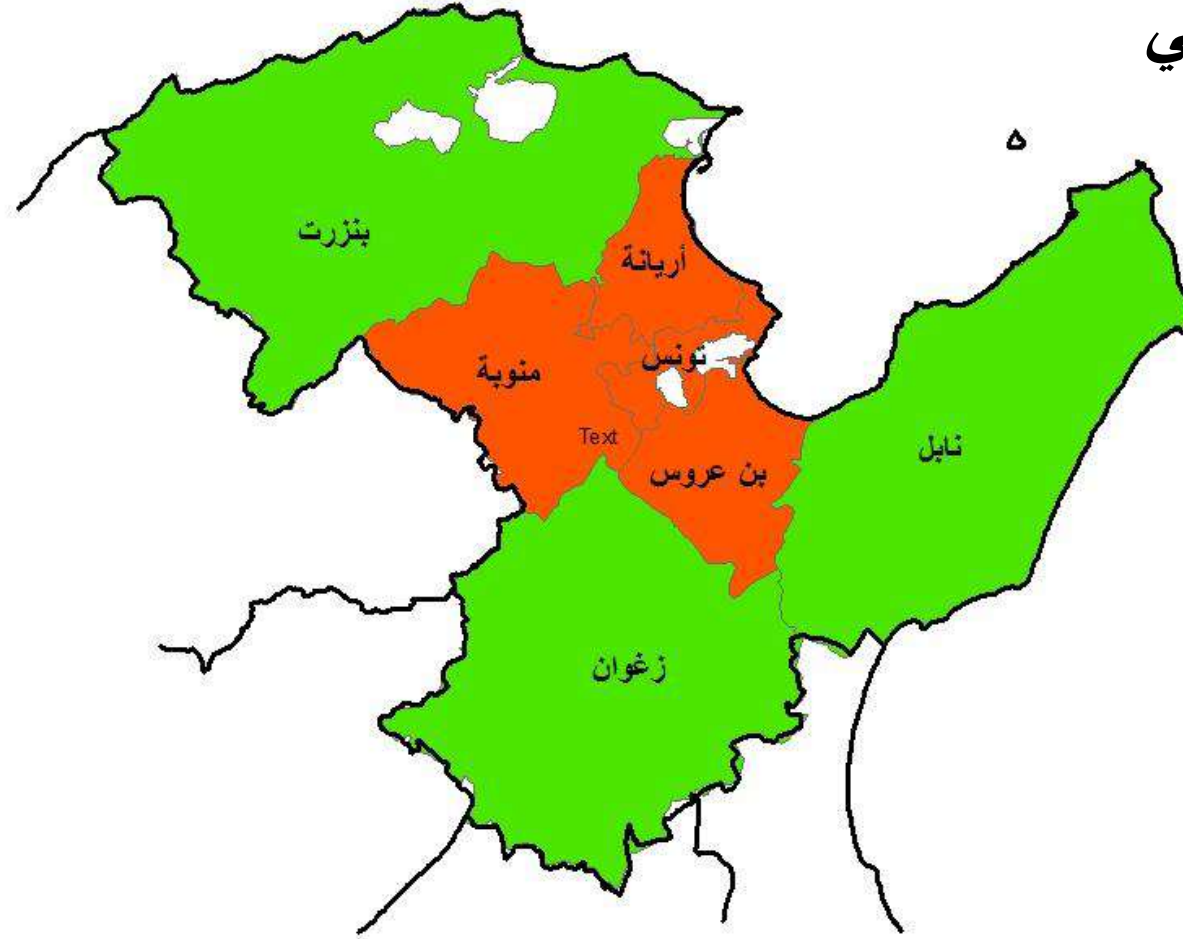

## مؤشر التنمية الجهوية (2018)

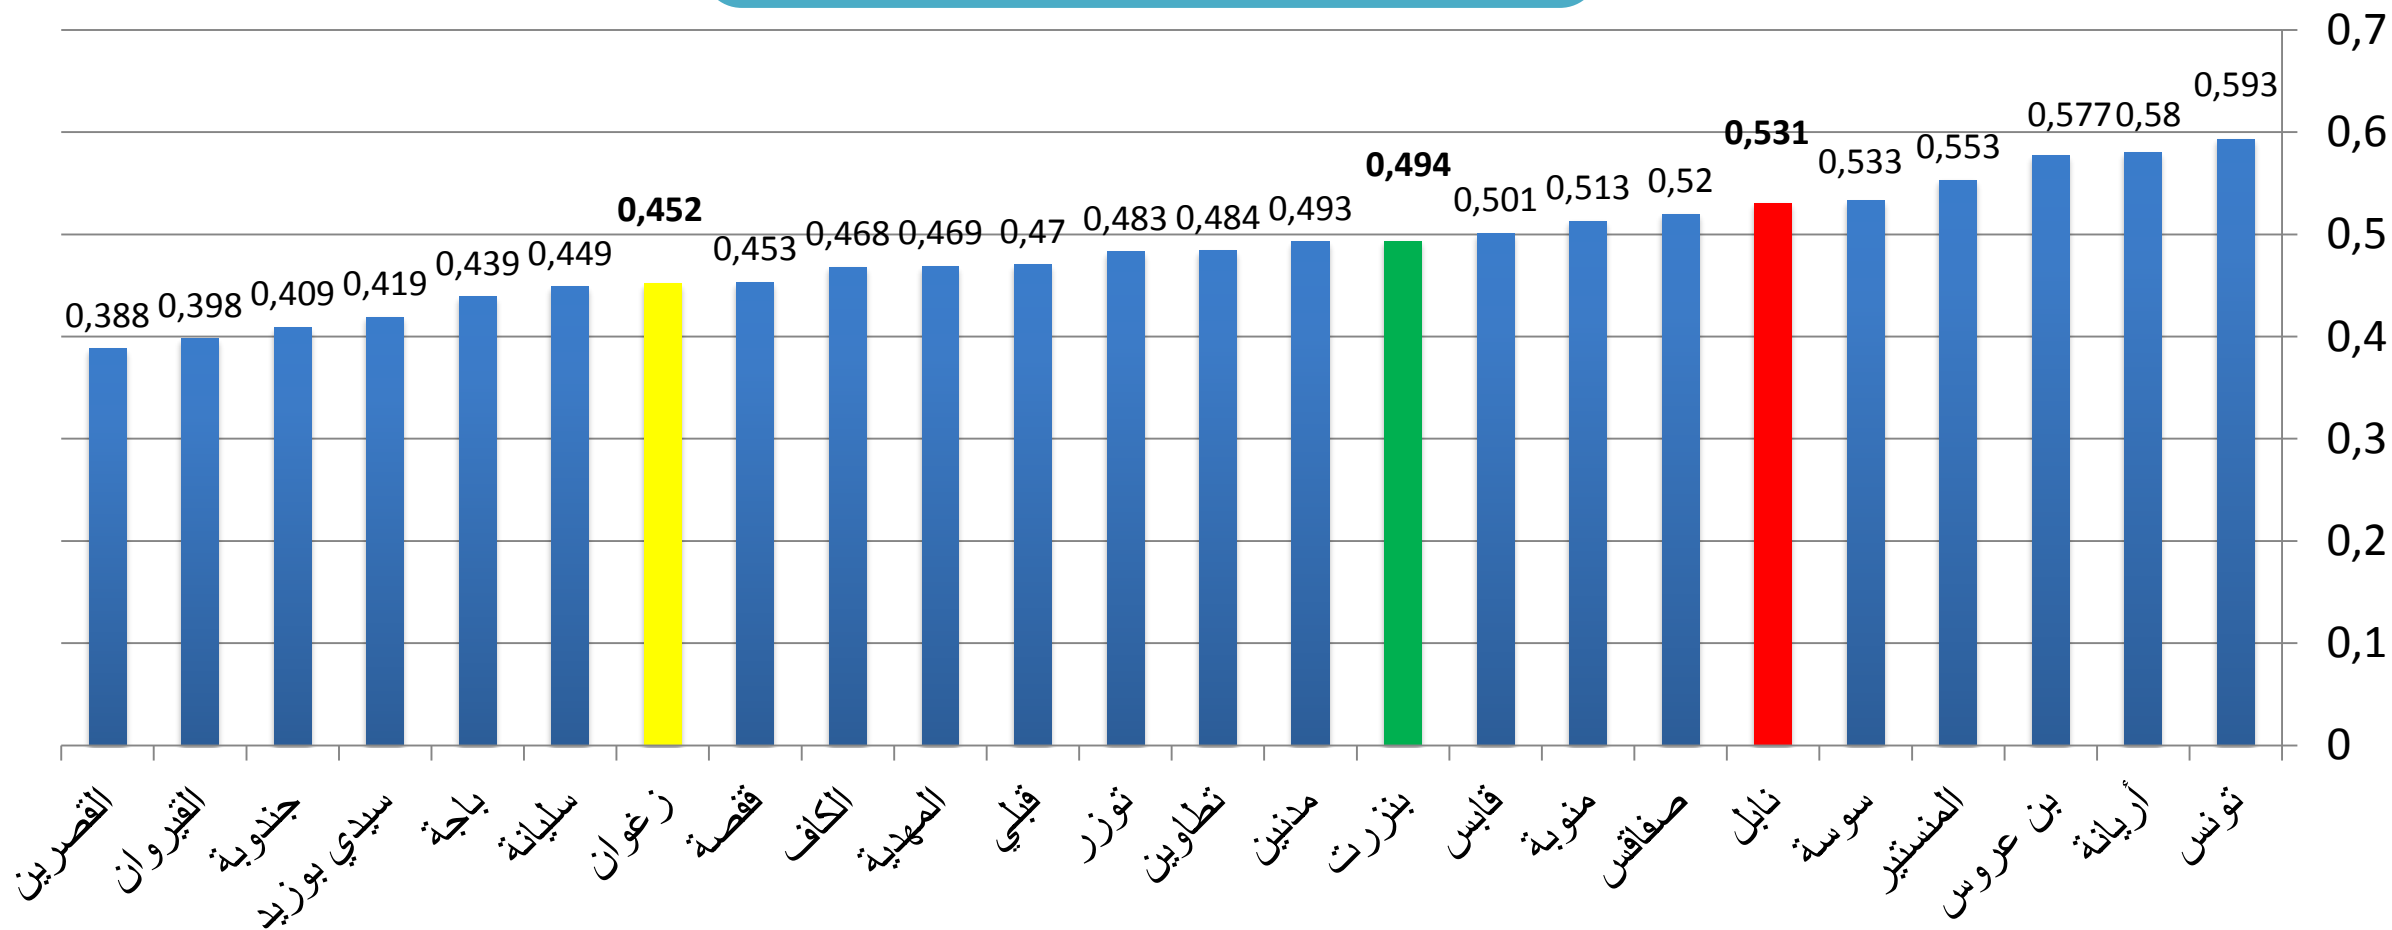

### •الموارد الطبيعية

- شواطئ تمتد على طول 180 كم.
- 60 000 هك من الغابات والمراعي
- 200 000 هك من الأراضي الفلاحية الخصبة
- \* مقاطع الحجارة الكلسية والطينية المميزة للجهة
- \* حمامات استشفائية طبيعية بكل من حمام الجديدي وقربص
- \* موارد مائية جوفية تقدر بـ 213 م<sup>3</sup>

### المؤسسات الكبرى

- المنطقة السياحية ياسمين الحمامات 150 مؤسسة سياحية
- حوالي 700 مؤسسة صناعية منها 435 مصدرة كليا
- مناطق سقوية على مساحة 49500 هك
- 4- موانئ للصيد البحري
- \* 9 مؤسسات جامعية تضم 9760 طالب
- \* 7مراكز تكوين قطاعية بطاقة 2840موطن تكوين
- \* القطب التكنولوجي للبيئة و المياه ببرج السدرية

## الموارد الطبيعية :

- \* مساحة الاراضي الفلاحية المحترثة : 207500 هك \* ثروة غابية حوالي 100 ألف هك خاصة بمنطقة سجنان
- مناطق طبيعية متميزة على غرار محمية إشكل، غابات سجنان، جزيرة جالطة، رأس إنجلة،
- 3بحيرات (بنزرت، إشكل، غار الملح) \* 8 سدود بطاقة خزن 421 مليون م 3
- موارد مائية متجددة بحوالي 592 مليون متر مكعب ما يمثل 13 % من الموارد الوطنية
- مواقع أثرية عالمية منها المدينة الأثرية بأوتيك والحصن الاسباني والمدينة العتيقة والمرسى العتيق ببنزرت

## المؤسسات الكبرى بالمتواجدة:

- 8 مؤسسات تعليم عالي تضم حوالي 7.5 ألف طالب \* 250 مؤسسة صناعية منها 168 مصدرة كليا
- 10 مراكز تكوين مهني قطاعية بطاقة 2800 موطن تكوين \* 25 الف هك من المناطق السقوية
- ميناء تجاري يؤمن 25% من المبادلات التجارية البحرية \* 4 مؤسسات صناعية عمومية كبرى
- القطب التكنولوجي للصناعات الغذائية بمنزل عبد الرحمان \* 5 موانئ للصيد البحري

### الموارد الطبيعية :

- 87000 هك من الغابات والمراعي
- 185 000 هك من الأراضي الفلاحية الخصبة
- معدل كميات الامطار 400-600 مم
- موارد المائية متجددة بحوالي 148 م.م.3
- \* السدود والسدود الجبلية :21
- \* تنوع نباتي وحيواني
- \* مواقع طبيعية مميزة (جبال وكهوف) و2 عيون مياه ساخنة
- \* مواد انشائية من رمال وحجارة وطين

### • المؤسسات الكبرى

- 3 مؤسسات جامعية تضم 1821 طالب
- 2 مراكز تكوين مهني قطاعية بطاقة 985 موطن تكوين
- 13.3 ألف هك مناطق سقوية
- \* حمام معدني بالزريرة ومركب استشفائي بجبل الوسط
- \* مصنع الاسمنت بجبل الوسط يوفر خمس الإنتاج الوطني
- \* 260 مؤسسة صناعية منها 86 مصدرة كليا.



المندوبية العامة للتنمية الجهوية  
Commissariat Général au  
Développement Régional

## المؤشرات الاقتصادية



## توزيع المشتغلين حسب القطاع الاقتصادي (%)

مجموع الجمهورية	الاقليم	زغوان	بنزرت	نابل	الولاية
10,47	15.13	13,05	14,57	15,87	الفلاحة و الصيد البحري
18,29	27.8	34,34	28,14	26,33	الصناعات المعملية
14,45	12.81	13,64	14,29	11,76	البناء و الأشغال العامة
13,15	10.85	7,84	10,08	11,90	التجارة
25,15	18.15	20,51	21,85	15,49	التربية و الصحة والخدمات الادارية
11,75	10.38	5,78	5,55	14,15	خدمات أخرى

## المناطق الصناعية و توزيع المؤسسات الصناعية سنة 2019

الأقليم	بنزرت	زغوان	نابل	القطاع
36	14	10	12	عدد المناطق الصناعية
1104,6	395	475	234,6	المساحة المهيئة ( هك )
1696	543	625	528	عدد المقاسم
1201	250	260	691	عدد المؤسسات الصناعية

## اهم الانشطة الفلاحية و الصيد البحري سنة 2019

الأقليم الشرقي	بنزرت	زغوان	نابل	القطاع
560698	270410	170000	120288	إنتاج الحبوب (طن)
1273500	294590	74220	904690	الخضروات (طن)
111566	11452	4855	95259	اللحوم (حمراء وبيضاء)(طن)
235150	137800	12350	95000	الحليب (طن)
19905	6370		13535	منتجات الصيد البحري (طن)

## السياحة سنة 2019

الأقليم	بنزرت	زغوان	نابل	القطاع
174,0	25	4	150	عدد الوحدات السياحية
55017	3083	336	51598	طاقة الأيواء (سرير)
6110.2	107.1	2.5	6006,6	عدد الليالي المقضاة ( بالألف )
1359	39.5	2	1318	الوافدون ( الف )
-	15,7	13	39,8	نسبة الاستغلال



المندوبية العامة للتنمية الجهوية  
Commissariat Général au  
Développement Régional

# مؤشرات اجتماعية

## نسبة البطالة حسب نتائج استمارة النصف الأول من سنة 2019

الولاية	عدد العاطلين (الف)	نسبة البطالة (%)
نابل	36,2	10,4
زغوان	7,1	10,4
بنزرت	21,8	10,8
الشمال الشرقي	248.4	14.2
الوطني	634.6	15.4

## مؤشرات اجتماعية

بنزرت	زغوان	نابل	الولاية
20.8	17.75	19.9	بطالة حاملي الشهادات (2014) %
17.5	12.1	7.4	نسبة الفقر (2015) %
95.8	98.6	99.2	نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب (2018) %
89.6	85.3	95	نسبة ربط الأسر بشبكة الماء الصالح للشرب 2018
14	6	16	عدد الوحدات المحلية للنهوض الإجتماعي
16	6	21	جمعيات رعاية المعوقين
15775	3803	2127	المعوقون

## التحديات المستقبلية للتنمية بالإقليم

- معالجة اختلال التوازن التنموي داخل المناطق المكونة لولايات الاقليم :
  - تباين نسق التنمية بين شمال وجنوب ولاية نابل
  - تفاوت كبير بين مدن ولاية زغوان والمناطق الريفية
  - اختلال بين مقومات التنمية بالمناطق الغربية والمناطق الشرقية بولاية بنزرت
- الرفع من نسق تثمين الموارد الطبيعية المحلية
- معالجة الانعكاسات السلبية للانشطة الاقتصادية على البيئة البرية والبحرية
- اعتماد مقاربات تنموية تعتمد التغير المناخي حاضرا ومستقبلا
- انجاز مشاريع كبرى مهيكلت تثن موقع ولايات الاقليم للاندماج مع القطب التنموي باقليم تونس الكبرى
- تباين في نشاط الاقطاب التكنولوجية حيث تثن نتائج البحث بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية بنابل مقابل ضعف اشعاع القطب الجهوي في الصماعات الغذائية بمنزل عبد الرحمان ببنزرت



## المشاريع المهيكلة الجارية او المبرمجة بالأقليم:

### -ولاية بنزرت :

- \* الوصلة الدائمة لضفتي القنال بمدخل مدينة بنزرت ( بكلفة 774 م.د.)- يضم انجاز جسر بطول 2.1 كلم و 4 محولات وتهيئة 7.4 كلم من الطرقات ( تم تحرير حوزة المشروع و اعلان طلب عروض دولي للانجاز
- تزويد ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي (15 بلدية) بكلفة 145 م.د.- مد شبكة رئيسية بطول 228 كلم ( مشروع بصدد الانجاز)
- تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب حول محاور سجنان بكلفة 70 م.د لتزويد 35 الف ساكن بالماء الصالح للشراب
- تحسين تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب لتزويد 613 تجمع سكني بكلفة 330 م.د- تم اقتناء عقارات لازمة لتركيز المنشآت الرئيسية لجلب المياه- تم الاعلان عن طلب العروض.
- تحسين الوضع البيئي ببحيرة بنزرت يهم تهيئات مختلف لازالة التلوث بالبحيرة بكلفة 270 م.د- تم تركيز وحدة تصرف حسب الاهداف واعداد استراتيجية تواصل ويتم اعداد ملفات طلب العروض.
- توسيع الميناء التجاري بمد 300 م من الرصيف وتهيئة 5هك من المسطحات المائية وتركيز تجهيزات مختلفة بكلفة 35 م.د- في مرحلة فتح حوزة المشروع.

## الوصلة الدائمة لمدينة بنزرت



# شبكة الغاز الطبيعي



## - ولاية زغوان

- تثنية الطريق الجهوية رقم 133 بين جبل الوسط وزغوان على مسافة 22 كلم بكلفة 40 م.د- تم القبول الوقتي للاشغال
- مضاعفة الطريق الوطنية رقم 3 (جبل الوسط- الفحص) على مسافة 28 كلم بكلفة 26 م.د- تم القبول الوقتي للاشغال. وفي مرحلة تركيز التنوير العمومي بالطريق
- تثنية الطريق الوطنية رقم 4 بين مدينتي الفحص وحدود ولاية سليانة على مسافة 28.2 كلم بكلفة 60 م.د- تم القبول الوقتي للاشغال.
- تهيئة منطقة صناعية المرجة بالفحص على مساحة 50 هك- في مرحلة تحيين الدراسة
- تهيئة المنطقة اللوجستية ببئر مشاركة على مساحة 100 هك بتكلفة تقديرية 300 م.د- مبرمج بالمخطط الحالي.
- تهيئة القاعدة التجارية للمواد الفلاحية الطازجة ببئر مشاركة- كلفة القسط الاول 30.6 م.د- في مرحلة تحيين الدراسة

## - ولاية نابل :

- حماية الشريط الساحلي بسليمان من الانجراف البحري على مسافة 5 كلم- عن طريق وزارة الشؤون المحلية والبيئة بكلفة 18 م.د- مشروع يتواصل انجازه منذ سنة 2018.
- مضاعفة الطريق الجهوية 27 (نابل-قليبية) على مسافة 54 كلم (نابل-قربة-منزل تميم-قليبية) مع احداث منحرج على مدينة قربة على طول 13 كلم- مشروع في مرحلة الانجاز على 3 اقساط بكلفة 160 م.د
- تهيئة الطريق المحلية 604 (منزل تميم-ازمور) على مسافة 21.5 كلم-بصدد الانجاز
- اعادة تهيئة ميناء الصيد البحري بقلبية -ينجز عن طريق وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري- مشروع في مرحلة الانجاز على 5 اقساط بكلفة 23 م.د
- احداث منطقة صناعية بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية على مساحة 82 هك تختص في مجال أنشطة التطوير والتجديد التكنولوجي بكلفة 28.د- مشروع في مرحلة الانجاز
- احداث منطقة صناعية بمنزل تميم على مساحة 55 هك بكلفة 21 م.د- في مرحلة المصادقة على دراسة المؤثرات البيئية .
- تركيز محطة انتاج طاقة الرياح بجبل سيدي عبد الرحمان - تم الاعلان عن طلب العروض سنة 2018 وينجز عن طريق الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

## الاستثمارات العمومية المنجزة خلال المخطط للفترة 2016-2019

الولاية	الاستثمارات المبرمجة ( م د ) خلال الفترة 2016-2020	الاستثمارات المنجزة ( م د ) خلال الفترة 2016-2019	نسبة الإنجاز (%)
<b>ولاية نابل</b>	<b>4844.9</b>	<b>3314.7</b>	<b>72,8</b>
القطاع العام	1144,9	797,4	69,6
القطاع الخاص	3700	2517,4	68,
<b>ولاية بنزرت</b>	<b>4143,7</b>	<b>2398,7</b>	<b>57,9</b>
القطاع العام	1639,5	781,5	47,6
القطاع الخاص	2504.2	1617,2	64,6
<b>ولاية زغوان</b>	<b>1464,4</b>	<b>720,5</b>	<b>49,2</b>
القطاع العام	648,4	239,5	36,9
القطاع الخاص	816	481,0	58,9
<b>الشمال الشرقي</b>	<b>10453.1</b>	<b>6463.1</b>	<b>58,4</b>

## المشاريع التي تواجه صعوبات حسب الولايات :

الولاية	عدد المشاريع المعطلة	الكلفة (م د)
نابل	9	54,128
بنزرت	12	42,872
زغوان	2	17,500

العدد	المشروع	كلفة المشروع	سنة البرمجة	الصعوبات
1	بناء منحرج قرنبالية على طول 7 كم	23605	2008	الاشغال متوقفة منذ 3 سبتمبر 2019 لأسباب عقارية
2	تهيئة وصيانة مركز التكوين المهني الفلاحي بتاكلسة	645	2014	لم يتم توفير الاعتمادات الكافية من طرف وزارة الفلاحة (1645,د)
3	إحداث منطقة صناعية سيدي بوزكري بقرنبالية على مساحة 38 هك	12333	2010	تأخر في الاعلان عن طلب العروض
4	إحداث منطقة صناعية بتاكلسة على مساحة 17 هك	3540	2014	تأخر في الاعلان عن طلب العروض
5	إحداث المدرسة الإبتدائية دوار هلال بقرمبالية	400	2016	إشكال عقاري , عدم وجود أرض
6	إحداث دار ثقافة بحمام الأغزاز	1000	2012	عدم وجود أرض لانجاز المشروع
7	إحداث مكتبة عمومية بزواوية المقايير الهوارية	500	2013	الأرض المقترحة أرض حبس خاص



العدد	المشروع	كلفة المشروع	سنة البرمجة	الصعوبات
8	بناء مركب طفولة وفضاء للطفولة المبكرة (بئر مروة) بتاكلسة	1228	2012	لم يتمّ توفير الاعتمادات من طرف وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
9	بناء مركب طفولة بحمام الغراز	1444	2012	لم يتمّ توفير الاعتمادات
10	بناء نادي أطفال بالميدة	355	2008	نقص في الاعتمادات بعد تحيين الكلفة الى 355 أ.د.
11	بناء مقر الإدارة الجهوية للديوانة	12000	2016	رفض منح رخصة البناء لغياب دراسة التأثير على الحركة المرورية

العدد	المشروع	كلفة المشروع	سنة البرمجة	الصعوبات
1	إحداث طريق حزامية على مستوى مدينة ماطر	23 000	-	عدم توفر الإعتمادات رغم تسوية الوضع العقاري.
2	إحداث مضمار إسطناعي لألعاب القوى (دراسة)	200	2008	في انتظار المعاوضة بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وديوان المساكن العسكرية.
3	تعشيب الملعب الفرعي والأسيجة المركب الرياضي 15 أكتوبر ببنزرت	1054	2013	بطئ نسق الأشغال وتوقفها في عيد المرات.
4	إعادة تعشيب الملعب الرئيسي المركب الرياضي بمنزل بورقيبة	453	2012	إشكاليات فنية اثر معاينة فريق فني مختص في العشب الطبيعي. تمّ الإتفاق على إعادة أشغال التعشيب. تكفل بلدية منزل بورقيبة بتوفير الإعتمادات اللازمة وإعداد صفقة جديدة
5	توسعة الميناء التجاري ببنزرت	35000		تعطّل تحرير حوزة المشروع بسبب المغازات المستغلة من طرف الشركة التونسية للسكر المتواجدة بالميناء
6	إحداث مركب ثقافي ببنزرت	4000	2020	عدم ترسيم المشروع ضمن ميزانية الدولة لسنة 2019 رغم تقدم إجراءات طلب العروض وإختيار المقاوله منذ شهر نوفمبر 2017.
7	إحداث مكتبة عمومية بجومين	500	2014	البحث عن عقار جديد بعد العدول عن الهبة المتحصل عليها لعدم استجابته للمقاييس المعتمدة
8	بناء المعهد الثانوي بجرزونة	1800	2013	تمّ الاستيلاء على قطعة الأرض المخصصة لإنجاز المشروع من طرف مجموعة من المواطنين

لم ينطلق - في انتظار تسوية الوضعية العقارية لقطعة الأرض	2013	2750	بناء المعهد الثانوي بالماتلين	9
عجز مجمع الصيانة والتصريف عن توفير مساهمته	2007	2 750	إعادة تهيئة المنطقة الصناعية بأوتيك (35,5 هك)	10
	2007	1 200	إعادة تهيئة المنطقة الصناعية بماطر (45,5 هك)	11
نسق انجاز بطيئ وتوقف متكرر للاشغال نتيجة تعدد الأقساط والمقاولات وإشكالية التنسيق بينها، تم تكوين لجنة قارة للغرض،		5652	مركز التوليد ببنزرت الشمالية	12
			<p>قسط 1: هيئة وتهذيب أقسام مركز التوليد ببنزرت وتجديد الشبكات الفنية</p> <p>قسط 2: تهيئة وتهذيب أقسام مركز التوليد ببنزرت وتجديد الشبكات الفنية</p> <p>تهيئة قاعة العمليات ووحدة التعقيم المركزي بقسم التوليد</p>	
		<p>2641</p> <p>1247</p> <p>1764</p>		

ولاية زغوان

العدد	المشروع	كلفة المشروع	سنة البرمجة	الصعوبات
1	تهيئة الطريق الحزامية لمدينة الفحص على طول 3,2 كلم	15000	2019	البحث عن تمويل المشروع
2	إحداث مركز جهوي لألعاب القوى بزغوان	2500	2012	بصدد توفير عقار من طرف بلدية زغوان



المندوبية العامة للتنمية الجهوية  
Commissariat Général au  
Développement Régional

شكرا

# الوضع التتموي بإقليم تونس الكبرى (تونس-أريانة-بن عروس-منوبة)

26 جوان 2020

## محتوى العرض

- تقديم عام للإقليم
- مؤشرات اقتصادية
- مؤشرات اجتماعية
- متابعة المشاريع العمومية ضمن المخطط التنموي 2016-2020
- المشاريع العمومية المعطلة



## الخصوصيات الكبرى المميزة للإقليم


- الاندماجية العميقة والرابط الوثيق بين مختلف مناطق الإقليم في مجالات التشغيل والحركة السكانية والاقتصادية مع تواصل توسع الرقعة العمرانية التي أصبحت تمتد على شعاع 20 كلم من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب
- حافظت مدينة تونس وسط العاصمة على موقعها كنواة وحيدة لاستقطاب أهم الأنشطة الإدارية والتجارية رغم تعدد الأحياء الكبرى الكثيفة المحيطة بها



## تقديم عام

المؤشر	تونس	اريانة	بن عروس	منوبة	الاقليم	الوطني
عدد السكان (2019)	1072,1	649,7	697,7	413,7	2833,2	11608,3
المساحة (كلم2)	356	482	761	1137	2736	163610
الشريط الساحلي (كلم)	14	28	20	-	62	1322
نسبة النمو السكاني (2014-2004) %	0,7	3,16	2	1,4	2.17	1,03
الهجرة الداخلية (2014-2009)	-22133	2842	26999	8577	53872	
الهجرة الخارجية (2014-2009)	5456	40429	-168	-618	7512	-22281
عدد البلديات	8	7	13	10	38	350
عدد المعتمديات	21	7	12	8	48	279

## مؤشر التنمية الجهوية

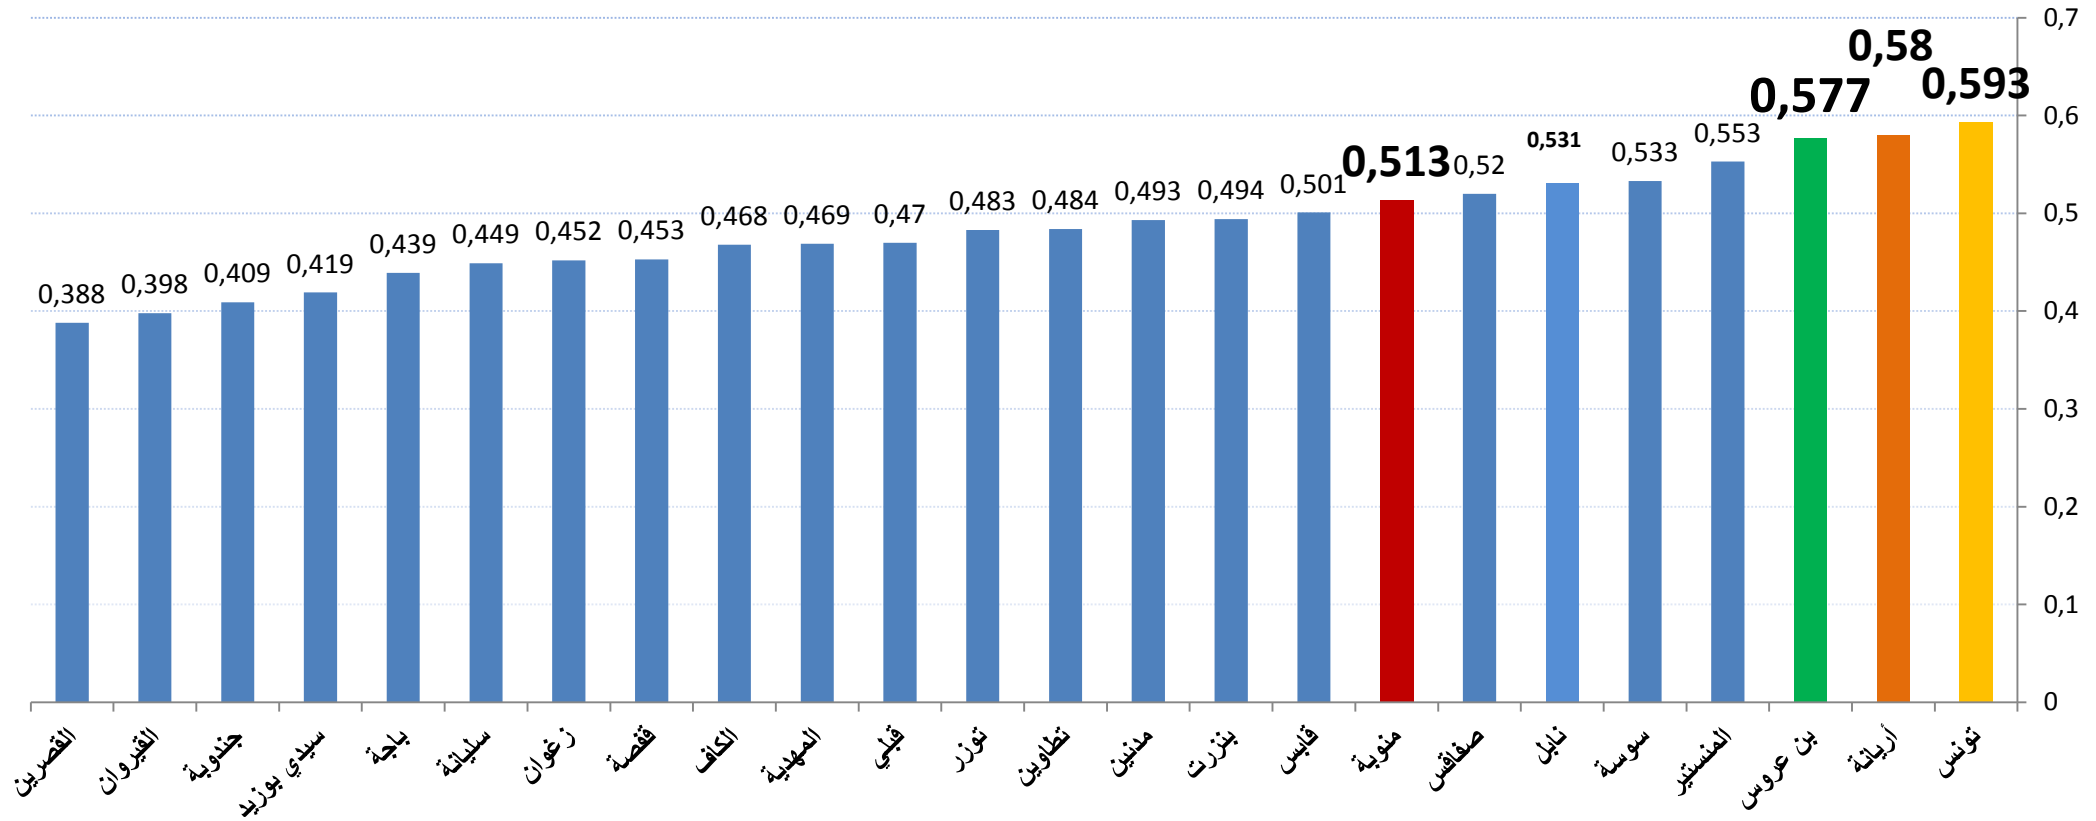



المندوبية العامة للتنمية الجهوية  
Commissariat Général au  
Développement Régional

## المؤشرات الاقتصادية

الولاية	تونس	اريانة	بن عروس	منوبة	تونس الكبرى	مجموع الجمهورية
الفلاحة و الصيد البحري	0,61	2,49	2,78	8,05	2,55	10,47
الصناعات المعملية	13,51	15,48	23,84	18,71	17,11	18,29
البناء و الأشغال العامة	7,62	12,71	7,96	13,06	9,59	14,45
التجارة	16,38	14,60	14,94	12,75	15,15	13,15
التربية و الصحة والخدمات الادارية	32,47	28,32	28,24	28,25	29,95	25,15
خدمات أخرى	20,34	18,42	13,08	11,47	16,99	11,75

القطاع	تونس	أريانة	بن عروس	منوبة	تونس الكبرى
عدد المناطق الصناعية	6	5	22	8	28
المساحة المهيئة ( هك )	530	185	1060	137	1318
عدد المقاسم	568	586	1051	262	2467
عدد المقاسم المباعة او المكتراة	564	324	1051	221	2160
توزيع المؤسسات الصناعية	334	292	485	194	1301
عدد المؤسسات المصدرة كليا	126	136	168	109	537

## الإنتاج الفلاحي و الصيد البحري سنة 2019

القِطاع	تونس	أريانة	بن عروس	منوبة	تونس الكبرى
إنتاج الحبوب (طن)	3506	19550	18385	79137	120578
الخضروات (طن)	1270	18825	13013	54100	87208
اللحوم (طن)	894	4985	12780	20327	38986
الحليب (طن)	10800	50500	17600	38118	117018
منتجات الصيد البحري (طن)	2929	107	243		3279

القطاع	تونس	أريانة	بن عروس	منوبة	تونس الكبرى
عدد الوحدات السياحية	90	3	7		100
طاقة الإيواء	14480	335	4282		19097
عدد الليالي المقضات ( بالألف )	1714	55,9	117,2		1887
الوافدون	694481	16391	32,9		710905
نسبة الإيواء %	35,4	45,7	15,9		97

## اهم المؤسسات العمومية الكبرى المتواجدة

### • ولاية تونس :

- ميناء حلق الوادي يؤمن 95% من جملة المسافرين والعربات على النطاق الوطني
- مطار تونس قرطاج الدولي يمر عبره 6 مليون مسافر سنويا
- المترو الخفيف 6 خطوط والنقل السريع
- 37 مؤسسة جامعية تضم 56942 طالب
- قطب تكنولوجي للسنا بقمرة
- 11 مركز قطاعي للتكوين بطاقة 8441 موطن تكوين

### ولاية اريانة :

- قطب تكنولوجي الغزالة (65هك) يحتوي على اكثر من 100 مؤسسة
- المدرسة الوطنية في علوم الاتصالات بالغزالة
- قطب تكنولوجي سيدي ثابت يضم المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا النووية والمعهد العالي للبحث والتحليل الفزيائي والكيميائي والمعهد العالي للبيوتكنولوجيا



## • ولاية بن عروس :

- ميناء تجاري برادس يؤمن عبور 85% من الحاويات والمجمرات
- سوق الجملة ببئر القصعة تمر عبره 50% من المواد الفلاحية الطازجة
- المنطقة البترولية برادس بطاقة تخزين 70% من الطاقة الوطنية
- منطقة صناعة نموذجية بالمغيرة على مساحة 250 هك
- محطة انتاج الطاقة الكهربائية برادس
- 6مركز قطاعية للتكوين بطاقة 6400 موطن تكوين

## ولاية منوبة:

- قطب تكنولوجي في الصناعة الرقمية بمنوبة (50هك)
- جامعة منوبة تضم حوالي 15000 طالب
- القطب الصناعي التكنولوجي الفجة-المنستير والمنطقة الصناعية بالفجة 116 هك.
- 3 مراكز تكوين قطاعية 2080 موطن تكوين
- محطة انتاج الطاقة الكهربائية بالمرناقية



المندوبية العامة للتنمية الجهوية  
Commissariat Général au  
Développement Régional

## المؤشرات الاجتماعية

## نسبة البطالة حسب نتائج استمارة النصف الاول من سنة 2019

الولاية	عدد العاطلين (الف)	نسبة البطالة (%)
تونس	81,1	18,7
اريانة	26,5	10
بن عروس	48,3	17,5
منوبة	27,9	17,3
الوطني	634,6	15,5

## أهم المؤشرات بإقليم تونس الكبرى

المؤشرات	تونس	أريانة	بن عروس	منوبة	إقليم تونس الكبرى
متوسط كثافة الفصول بالتعليم الأساسي (2019)	25,9	30	26,6	26,8	
متوسط كثافة الفصول بالتعليم الإعدادي والثانوي (2019)	28,67	29	27,79	27,7	
عدد الطلبة بالمؤسسات العمومية (2019)	56492	9012	6914	15014	87432
عدد الوحدات المحلية للنهوض الإجتماعي	21	7	12	8	48
جمعيات رعاية المعوقين (2019)	17	10	12	7	46
عدد المعوقون (2019)	30118	12692	760	12390	55960
نسبة الفقر (%) (2015)	3,5	5,4	4,3	12,1	
المرتبة الوطنية لنسبة الفقر (2015)	24	22	23	17	

## التحديات المستقبلية للتنمية بالاقليم

### • تحديات مجالية

- - تراجع القدرة التنافسية لتونس الكبرى على المستويين الوطني والاقليمي المتوسطي .
- - التفاوت الكبير بين ولايات ومعتديات الإقليم من حيث الخدمات والمرافق الاجتماعية والشبابية
- - ضغط سكاني وديموغرافي متزايد مع حركية سكانية داخلية في نسق تصاعدي.
- - تقلص المدخرات العقارية وانتشار البناء الفوضوي على حساب الأراضي الفلاحية.
- - اقتصار اصدار امثلة التهيئة العمرانية ومراجعتها على مسايرة الحركة العمرانية.
- - كثرة الأحياء الشعبية الكبرى المفتقرة للتهيئة والتجهيزات الأساسية والشبابية والثقافية.
- - أحزمة عمرانية عشوائية بالمناطق العمرانية الكبرى.
- -التنافس الحاد على الأراضي بين جميع القطاعات من فلاحية وسكن وصناعة وخدمات.
- -صعوبة الحركة المرورية بالاقليم وبالمداخل الرئيسية للمدن الكبرى واختلال هيكله شبكة النقل الجماعي الموجهة لتهيئة الفضاء الترابي.
- - صعوبة حوكمة المجال الترابي لكثرة المتدخلين وضعف التنسيق في انجاز المشاريع المتعلقة بالبنية الاساسية المهيكلة.

## \* تحديات قطاعية

- محدودية قدرة القطاع الصناعي على التحول من قطاع يركز على المناولة في أنشطة صناعية ذات قيمة مضافة ضعيفة إلى قطاع يتموقع ضمن سلاسل القيمة المتطورة .
- معالجة اشكاليات المياه العمرانية مع توسع الرقعة الجغرافية العمرانية للإقليم وطاقة الشبكات المتواجدة لصرف مياه الأمطار
- ضعف تنويع منتج القطاع السياحي ومحدودية استغلال المخزون الأثري والثقافي والايكولوجي على الوجه المطلوب.
- تراجع دور القطاع الخاص في خلق الثروة ودفع الاستثمار وإحداث مواطن الشغل .
- صعوبات القطاع الخاص في التموقع في الأسواق الخارجية وفي سلسلة القيم ومنظومات الإنتاج بالإضافة إلى محدودية تواجده في الأنشطة والقطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية.
- محدودية التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص وغياب شبه كلي لمشاريع الشراكة بينهما
  - -تفاقم ظاهرة التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي.
  - - تفاقم الظواهر الاجتماعية رغم تكثف دور المجتمع المدني وكثرة الجمعيات النشيطة في المجال الاجتماعي

## المشاريع المهيكلة الجارية بالاقليم:

- الشبكة الحديدية السريعة** بتكلفة جمالية 1200م.د- انطلق الانجاز سنة 2010- حاليا يتواصل انجاز الخط D (تونس-القباعة) على مسافة 12.3 كلم وE (تونس-بوقطفة) على مسافة 6.3 كلم مع اشغال هندسة مدنية وتركيز 11 محطة.
- حماية الجهة الغربية لمدينة تونس من الفيضانات** : معتمديات باردو-الزهور- الحرايرية والسيجومي يهم تغطية الممرات المائية الطبيعية بكلفة 100.5 م.د- مشروع يتواصل انجازه على 4 مراحل.
- بناء الرصيفين 8-9 بميناء رادس**: مشروع ينجز عن طريق القطاعين العمومي والخاص- في مرحلة الاستشارات الادارية بين كل المتدخلين
- تهيئة سبخة السيجومي** : مشروع ينجز عن طريق وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية تمت الدراسة وفي مرحلة البحث عن التمويل. تكلفة التهيئة حوالي 400 مليون دينار
- تعصير المناطق السقوية العمومية بكل من منوبة واريانة وبن عروس** :- مشروع ينجز على اقساط- تم انجاز قسط 1 بولاية منوبة على مساحة 4500 هك بكلفة ويتواصل انجاز قسط اول بولاية بن عروس على مساحة 1000 هك بكلفة 48 م.د وتعصير المنطقة السقوية بسيدي ثابت على مساحة 5040 هك بكلفة 89 م.د.
- المشروع السكني حدائق تونس** : ينجز عن طريق الوكالة العقارية للسكنى على مساحة 331.6 هك ( انتهت اشغال التهيئة الداخلية والخارجية وفي مرحلة التسويق على اجزاء) ويضم تجهيزات عمومية ( 26.2 هك)- مناطق خضراء 68.5 هك- طرقات 67.5 هك- سكن 170 هك ( 13000 مسكن)
- استكمال الطريق الحزامية 20x** في الجزء الرابط بين الطريق الجهوية رقم 31 والمخرج الغربي للعاصمة بطول 15 كلم بكلفة 60 م.د

## الاستثمارات المنجزة خلال المخطط للفترة 2016-2019

نسبة الإنجاز (%)	الاستثمارات المنجزة ( م د ) خلال الفترة 2016-2019	الاستثمارات المبرمجة ( م د ) خلال الفترة 2016-2020	الولاية
57,4	3455,601	6020,000	ولاية تونس
65,8	1329,101	2020,000	القطاع العام
53,2	2126,500	4000,000	القطاع الخاص
58,8	1607,455	2732,704	ولاية اريانة
61,7	402,637	652,704	القطاع العام
57,9	1204,818	2080,000	القطاع الخاص



نسبة الإنجاز (%)	الاستثمارات المنجزة ( م د ) خلال الفترة 2020-2016	الاستثمارات المبرمجة ( م د ) خلال الفترة 2020-2016	الولاية
71,3	1637,933	2298,416	ولاية منوبة
53,1	423,908	798,416	القطاع العام
80,9	1214,025	1500,000	القطاع الخاص
64,6	3154,559	4885,133	ولاية بن عروس
45,4	381,744	840,533	القطاع العام
68,6	2772,815	4044,600	القطاع الخاص
61,8	9855,548	15936,253	اقليم تونس الكبرى

## المشاريع العمومية المعطلة

الكلفة (م د)	العدد الجملي للمشاريع المعطلة	مراحل الإنجاز
14,711	7	تونس
14,695	5	أريانة
19,148	3	بن عروس
64,300	2	منوبة
113.854	16	المجموع

العدد	المشروع	كلفة المشروع	الصعوبات
1	- بناء مركب ثقافي بالحرائرية	4000	تسريع إجراءات <b>تخصيص العقار</b> المقترح
2	- بناء وحدة محلية للنهوض الإجماعي بالسيجومي	150	- <b>تفويت عقار</b> على ملك SNIT لفائدة الوزارة وبصدد تحديد قيمته الشرائية من قبل مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية .
3	- مركب شبابي بالزهور	150	إنجاز المشروع على <b>الأرض الدولية</b> التي تم استرجاعها مؤخرا بمنطقة الزهور (أرض تعاضدية ديوان الزيت)
4	- توسعة المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت	3950	- <b>في التقاضي بخصوص التعويض</b> للمقاولة (وزارة التعليم العالي متشبثة بالتوسعة بالرغم من عدم إمكانية ذلك في ظل عدم تقدم المعهد الوطني للتراث بالحل الفني)
5	- بناء المطعم الجامعي برأس الطابية	2592	- وجود أنفاق بموقع المشروع ، توقفت الأشغال في انتظار <b>إعداد دراسة جيوفيزيائية</b> للموقع من طرف ديوان المناجم.
6	- توسعة كلية العلوم الإقتصادية والتصريف بتونس	1184	- ضرورة <b>إعادة الدراسات</b> المتعلقة بالأسس لتعميقها نظرا لنوعية التربة بالموقع والاشكاليات التي تم تسجيلها في البناءات القديمة والجديدة (إمكانية إنجاز الدراسة)
7	- توسعة كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس	1802	
	المجموع 1 :	14711	

الولاية : أريانة

العدد	المشروع	كلفة المشروع	الصعوبات
1	دار ثقافة بحي التضامن	1500	بصدد البحث عن قطعة أرض لتخصيصها لفائدة المشروع
2	تهيئة دار الثقافة ابن حزم بقلعة الأندلس	390	العقار المنجز عليه المشروع على ملك بلدية قلعة الاندلس . قامت البلدية بإجراء اختبار لتحديد قيمة قطعة الارض ومراسلة الوزارة لتوفير الاعتمادات اللازمة.
3	إحداث ملعب بلدي بالمنيهلة	600	تم إقتراح تخصيص قطعة أرض على ملك الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية ذات صبغة صناعية وحاليا في إنتظار تحديد القيمة الشرائية للقطعة المذكورة من قبل الشركة
4	بناء مكتب جهوي للديوانة ومقر فرقة التفتيش الديوانية بأريانة	2100	صبغة الأرض مخالفة لمثال التهيئة العمرانية (عدم توفر عقار على ملك الدولة الخاص مناسب للمشروع)
5	المعهد العالي للإعلامية بأريانة	10105	تم اقتراح إنجاز هذا المشروع داخل حوزة مشروع توسعة القطب التكنولوجي بالغزالة.

		الولاية : منوبة	
العدد	اسم المشروع	كلفة المشروع	الصعوبات
1	أشغال الهندسة المدنية :احداث الخط الحديدي السريع (D)برشلونة الملاسين باردو -البرطال -منوبة -حي البرتقال -القباعة على طول 19,2 كلم/ قسط ولاية منوبة 12,3 كلم	47000	- تم سنة 2019 تكليف شركة SOMATRAT باتمام الاشغال بعد فسخ العقد مع الشركة الاولى. نسبة تقدم الاشغال حاليا 82% للبنية الاساسية والهندسة المدنية
	البنية التحتية للشبكة الحديدية السريعة الخط -D	17.3 م.د	
	إحداث 8 محطات على طول الخط D	12.9 م.د	تم الانجاز
2	انجاز 5 مراكز تحويل النفايات ( المرناقية، الفجة، دوار هيشر، وادي الليل، طبرية)	2500	1 - تم فتح الاعتمادات بالنسبة لمعمديتي طبرية (الانصارين) -وادي الليل ) وتم اعلان طلب العروض ولم يتم تخصيص الأرض من طرف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. 2-دوار هيشر : تم اقتراح موقع جديد 3 - المرناقية والفجة تم رفض الموقع : إقترحت مصالح وزارة الداخلية استغلال نفس المركز بالفجة 4- ضرورة فتح الاعتمادات من قبل وزارة الشؤون المحلية لبقية المراكز

الولاية : بن عروس

العدد	المشروع	كلفة المشروع	الصعوبات
1	بناء معهد ثانوي ببومهل	3748	<b>العقار المقترح مهدد بالفيضانات- في انتظار اقتراح قطعة أرض ثانية</b>
2	وحدة معالجة وتثمين النفايات	9400	تم التخلي عن المشروع من طرف الوزارة وسيقع إعادة برمجته في حال <b>توفر عقار</b>
3	إزالة التلوث وتهذيب منطقة الخردة باليهودية	6400	تم الإتفاق على <b>إلغاء الأمر المحدث لوحدة التصريف</b> حسب الأهداف الصادر سنة 2010 و بصدد البحث عن موقع بديل



المندوبية العامة للتنمية الجهوية  
Commissariat Général au  
Développement Régional

شكرا

للإطلاع على التقرير الكامل للجنة التنمية الجهوية بخصوص الأوضاع  
والمشاريع التنموية في الجهات والمتضمن لكافة الملاحق :

<http://www.arp.tn>

\* بوابة المجلس في الجزء المخصص لمحاضر وتقارير لجنة التنمية الجهوية

للإطلاع على نشاط لجنة التنمية الجهوية :

\* بوابة المجلس في الجزء المخصص للجنة التنمية الجهوية <http://beta.arp.tn/commissiondev>

<http://www.arp.tn>

\* الصفحة الخاصة لمجلس نواب الشعب باليوتيوب

<https://www.youtube.com/channel/UCPuzHxQuP5Roi7wvQ97NHpg>

\* صفحة الفيسبوك الخاصة بمجلس نواب الشعب <https://www.facebook.com/Tunisie.arp>

\* حساب المجلس على موقع تويتر <https://twitter.com/arptn>

\* موقع النقل الفوري للجلسات العامة لمجلس نواب الشعب <https://storify.com/ARPtN>

\* صفحة الفيسبوك الخاصة بلجنة التنمية الجهوية

<https://www.facebook.com/La-commission-du-développement-régional->

للاتصال بلجنة التنمية الجهوية:

\* مجلس نواب الشعب ، باردو 2000.

الهاتف 7115700 المكتب 2231 / 2228

\* البريد الإلكتروني [arp.commission.developpement@gmail.com](mailto:arp.commission.developpement@gmail.com)

\* الميسنجر وعبر صفحة الفيسبوك الخاصة بلجنة التنمية الجهوية

<https://www.facebook.com/La-commission-du-développement-régional->
